

מדינת ישראל
משרד הממשלה

מס' _____

מ.ס.ר. מבני
משנת הביטוח
י"ט כ"ד
28/11/84 29/12/85

מחלקה _____

חיק מס' 15200/15

שם: בנינים - הנהלה ומחוזות - בריאו

מזהה פולי: **גל - 15 / 15200**


מזהה לוגי: 142.0/7 - 154 מס פריט: 172721

כתובת: 02-113-01-02-01 תאריך: 17/12/2013




15200/15


proposed programme

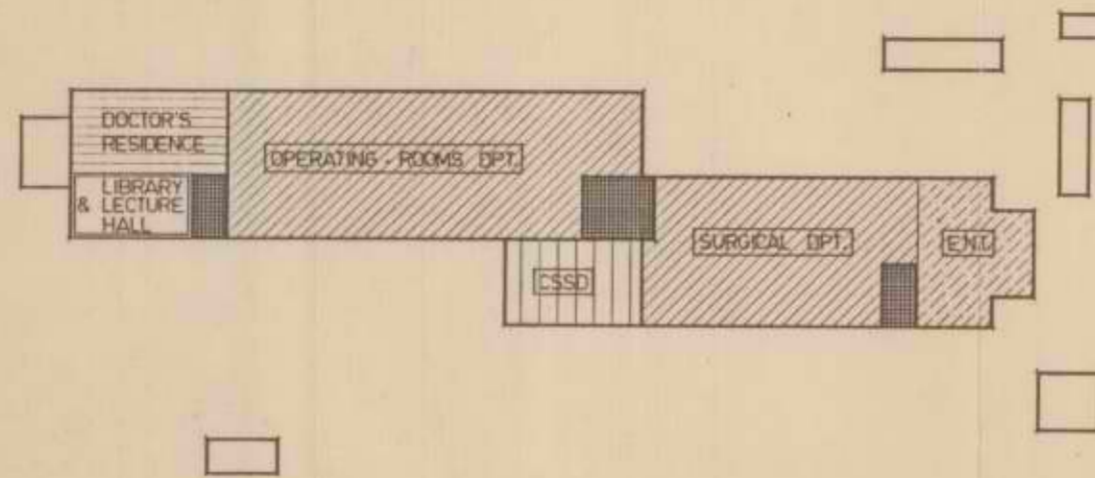

second floor 30 beds

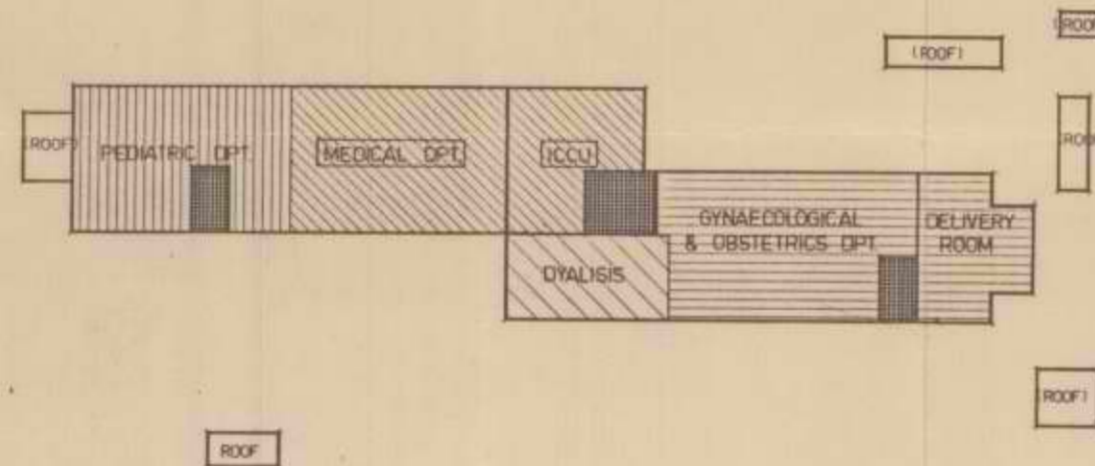


first floor 69 beds

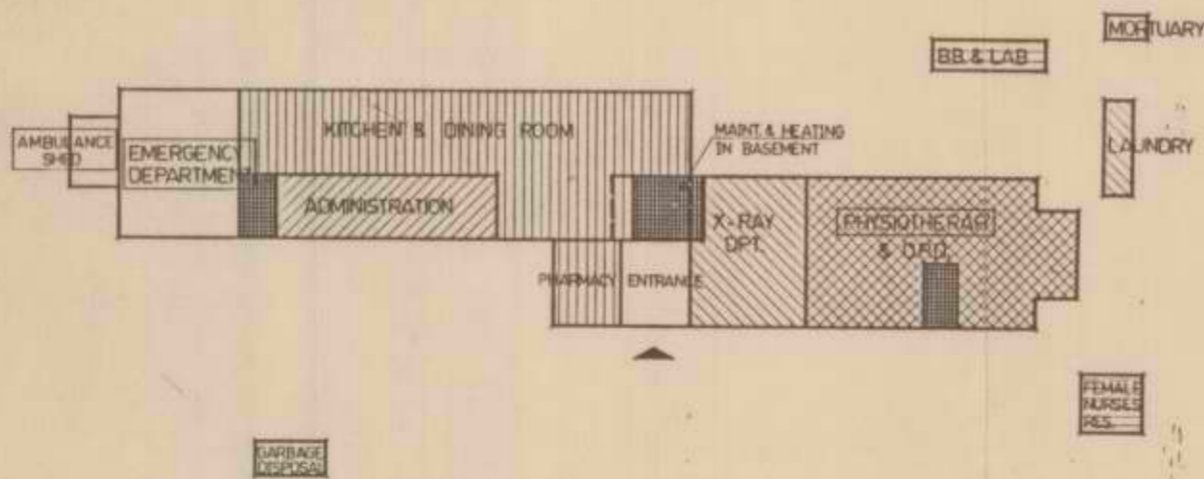


ground floor (5 beds)

total (5)+99 beds


existing situation

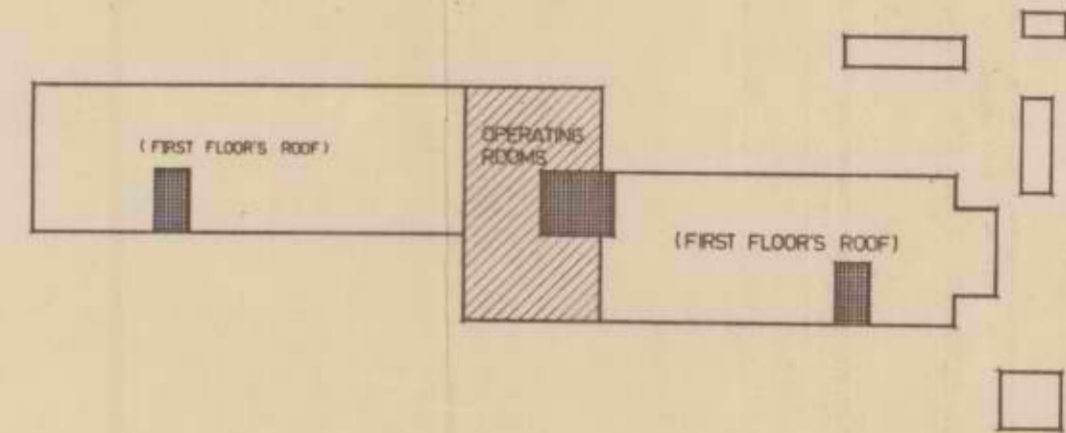

0 beds second floor

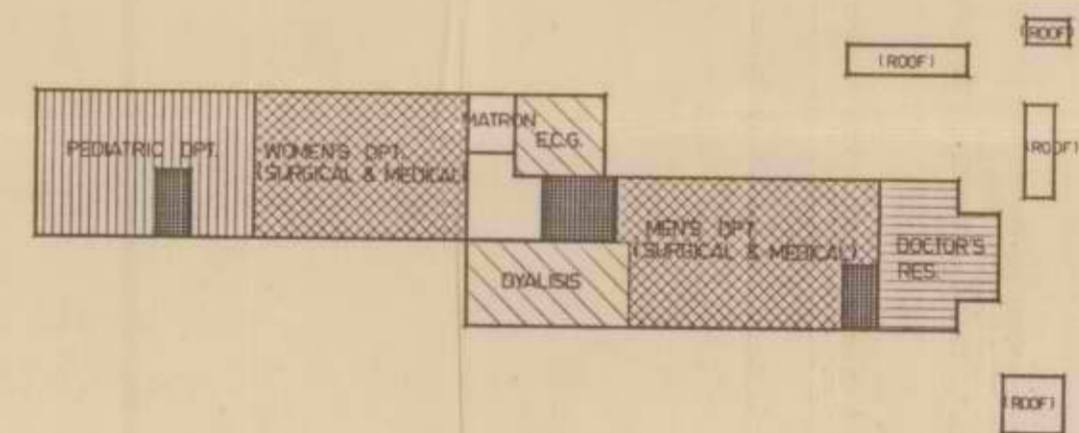

80 beds first floor

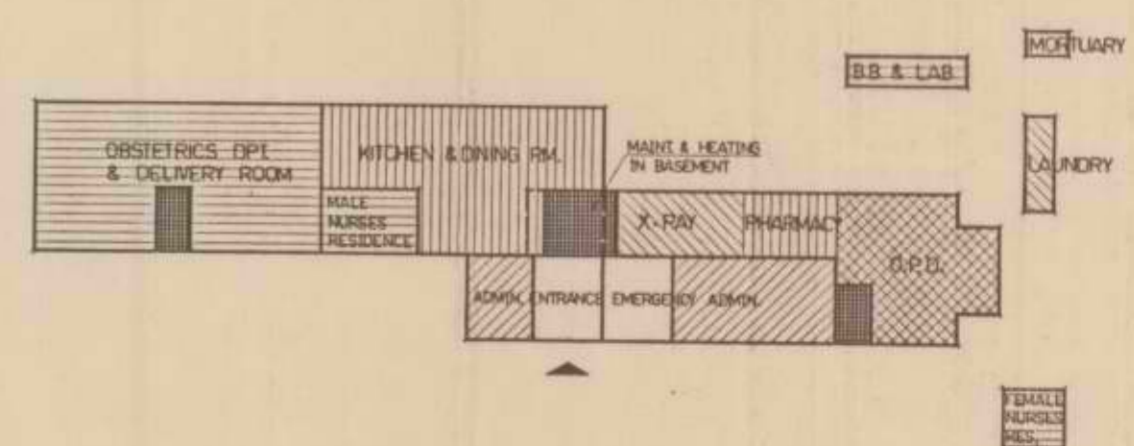

20 beds ground floor

100 beds











HEALTH SERVICES • CIVIL ADMINISTRATION JUDEA & SAMARIA
MINISTRY OF CONSTRUCTION & HOUSING • PUBLIC WORKS DEPARTMENT

HEBRON HOSPITAL
existing situation and
proposed programme

PROGRAMMATIC DESIGN: Z. ACKER • H. KASSIS
EDITING: SHLOMO KOPILOV, ENGINEERING & MANAGEMENT LTD


proposed programme

existing situation

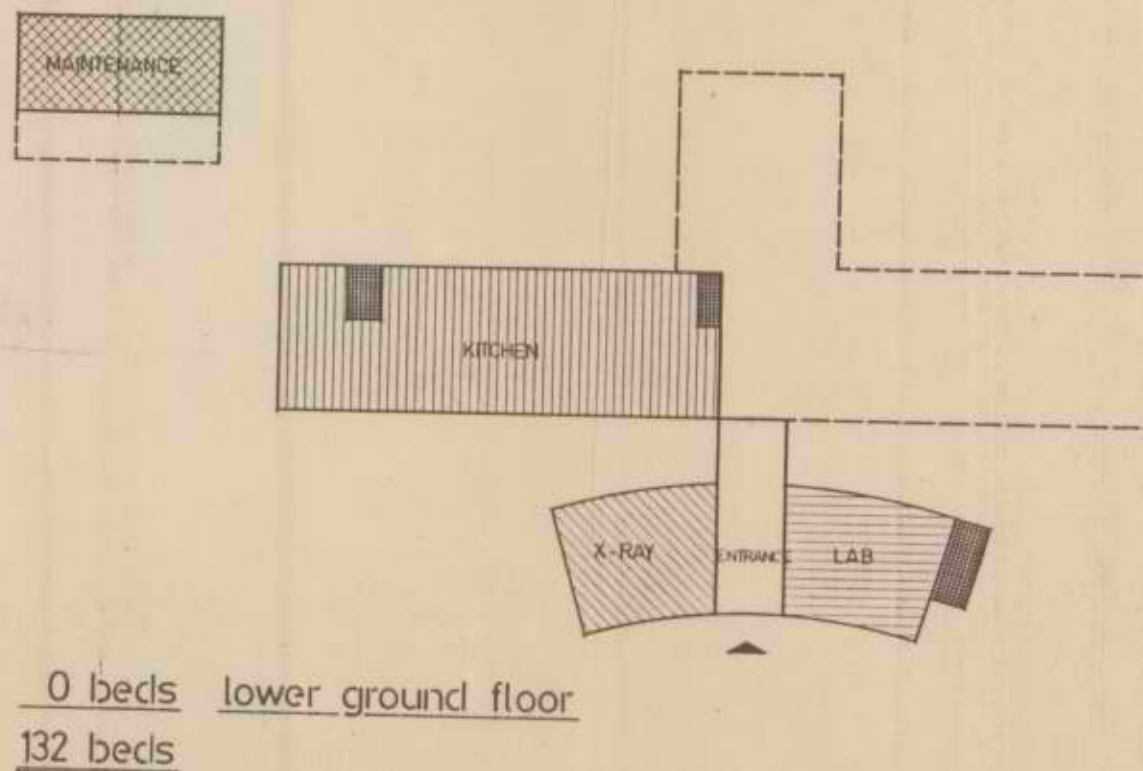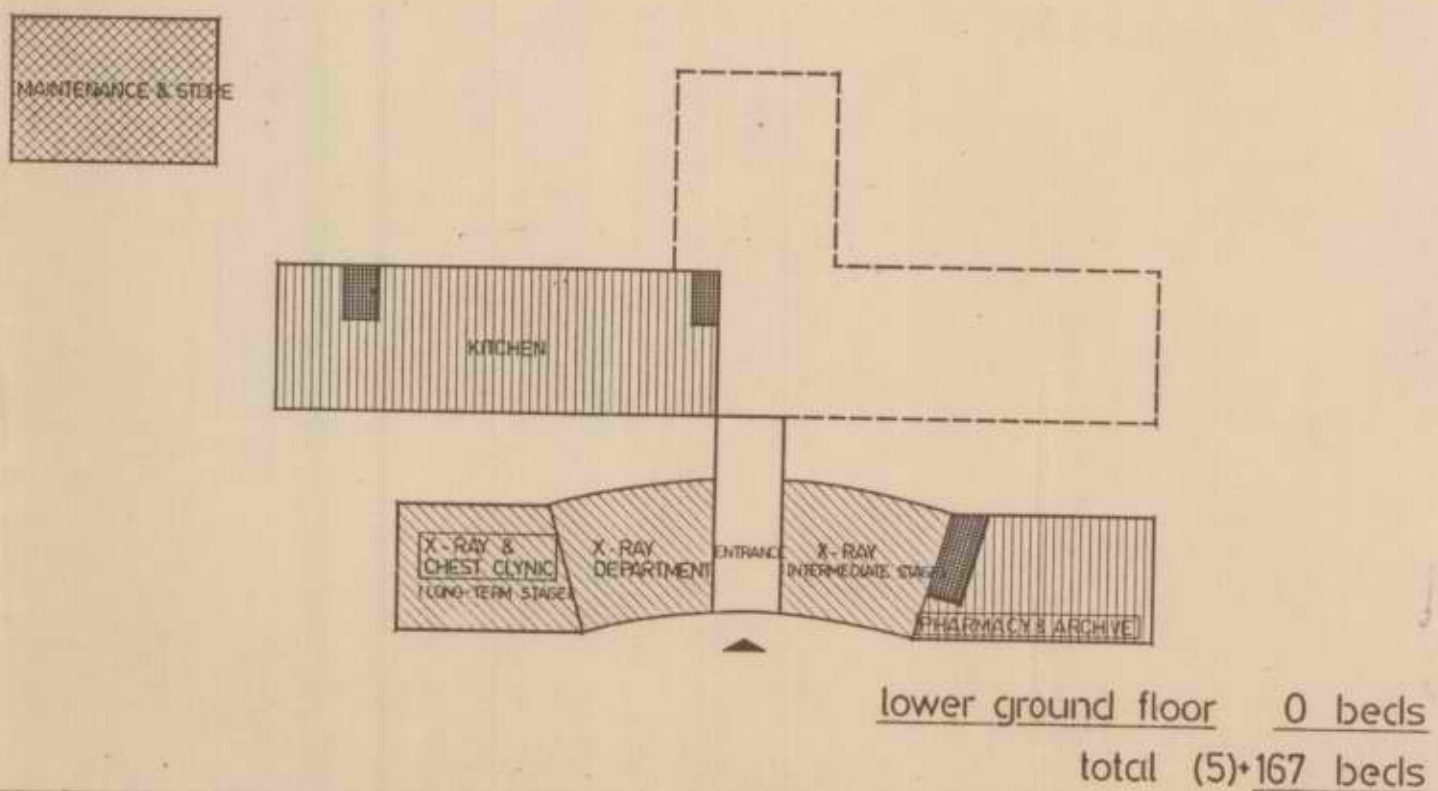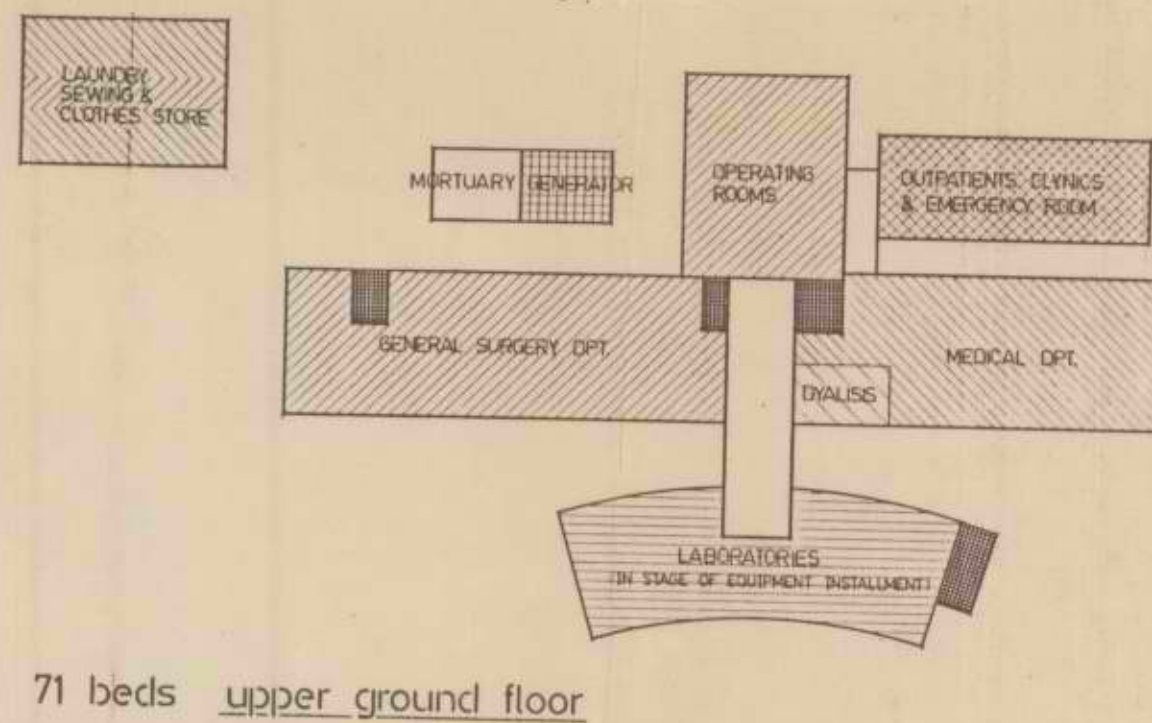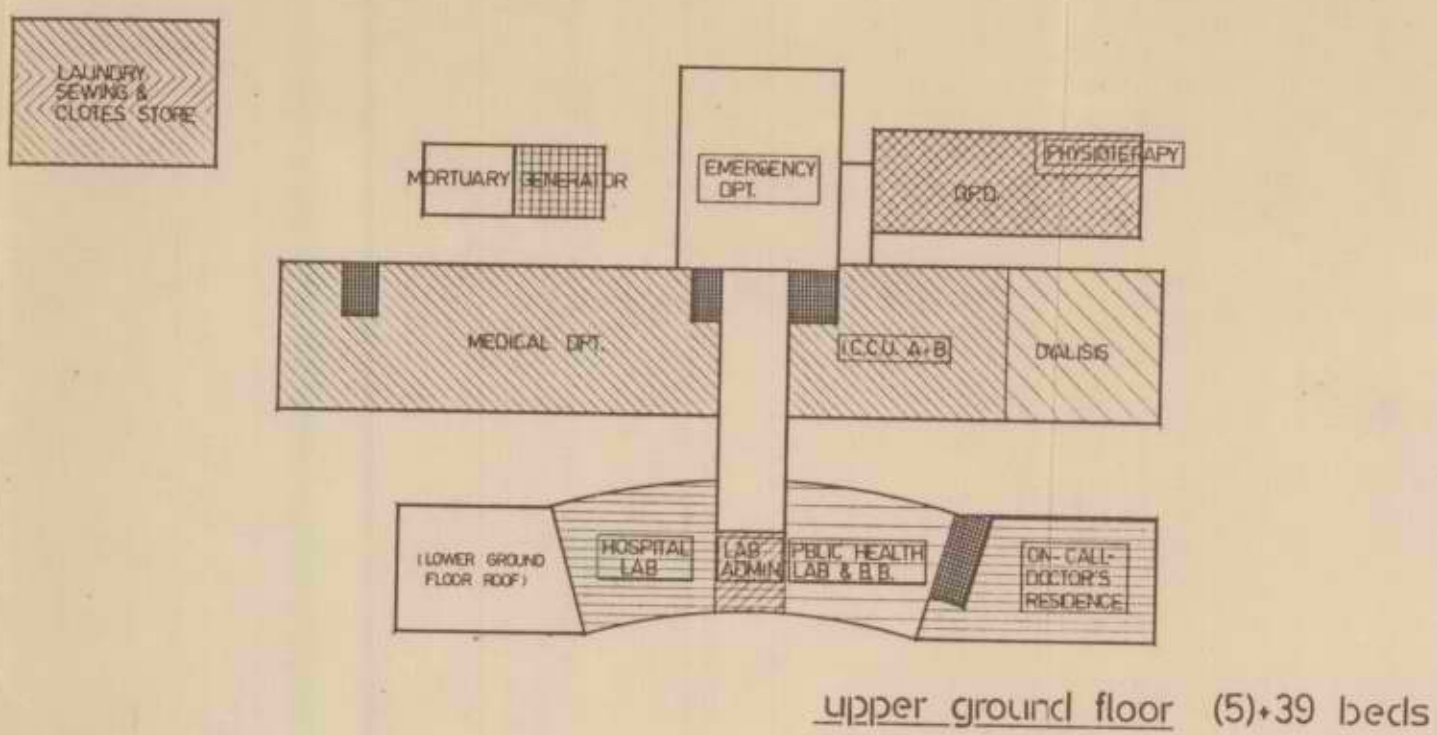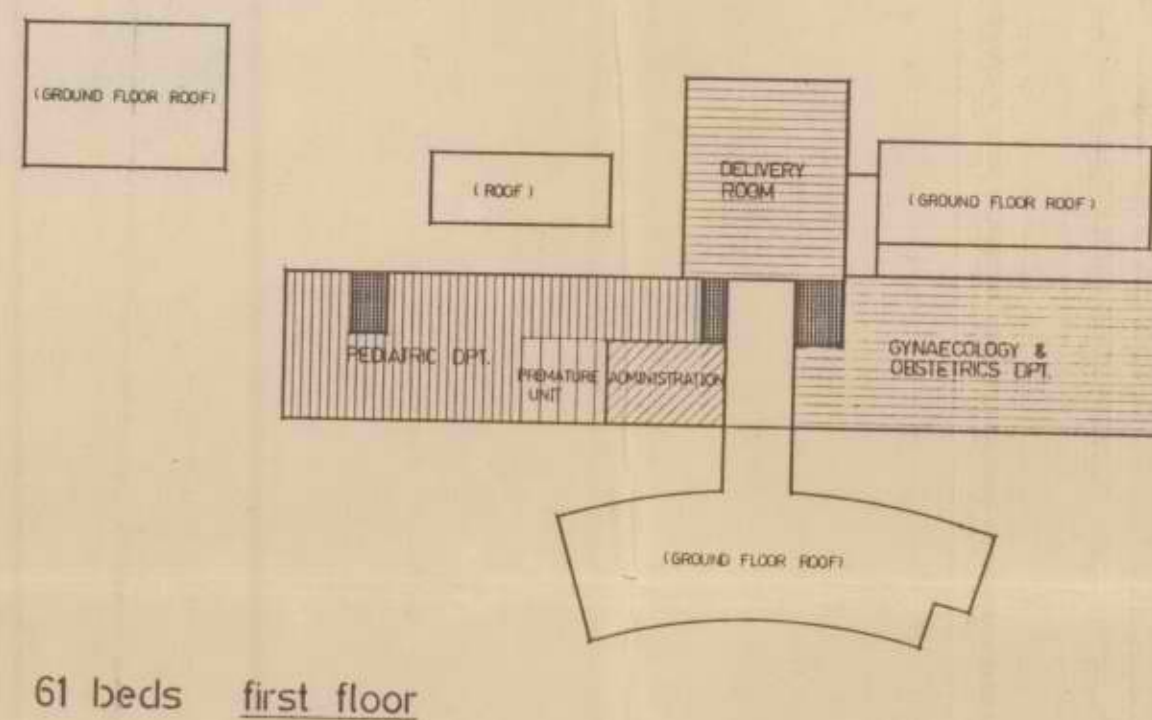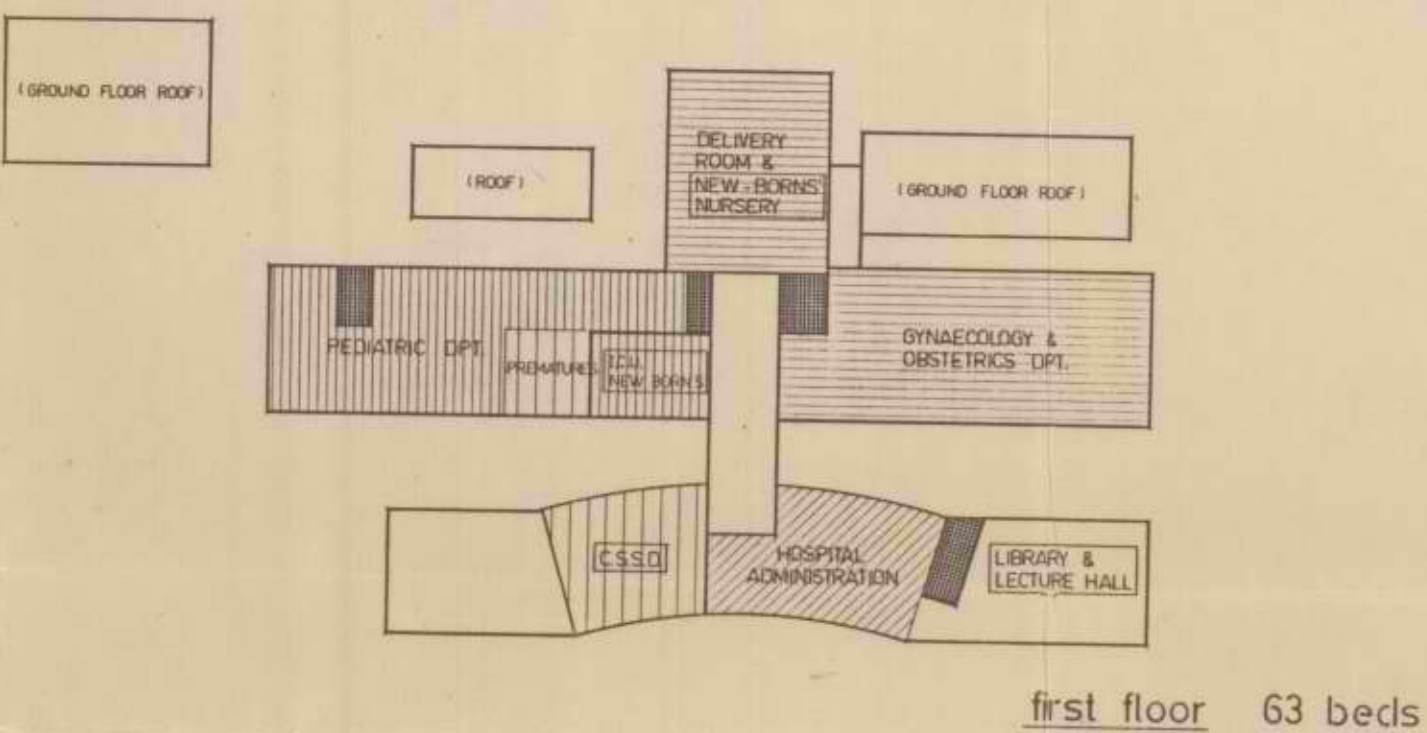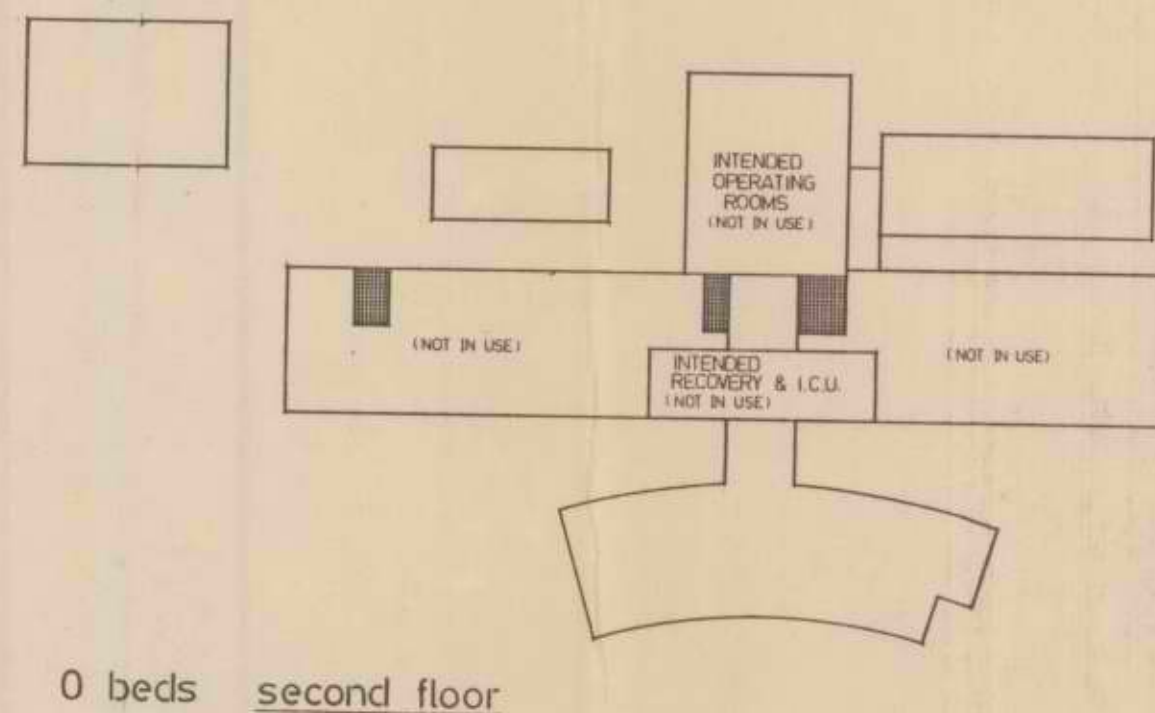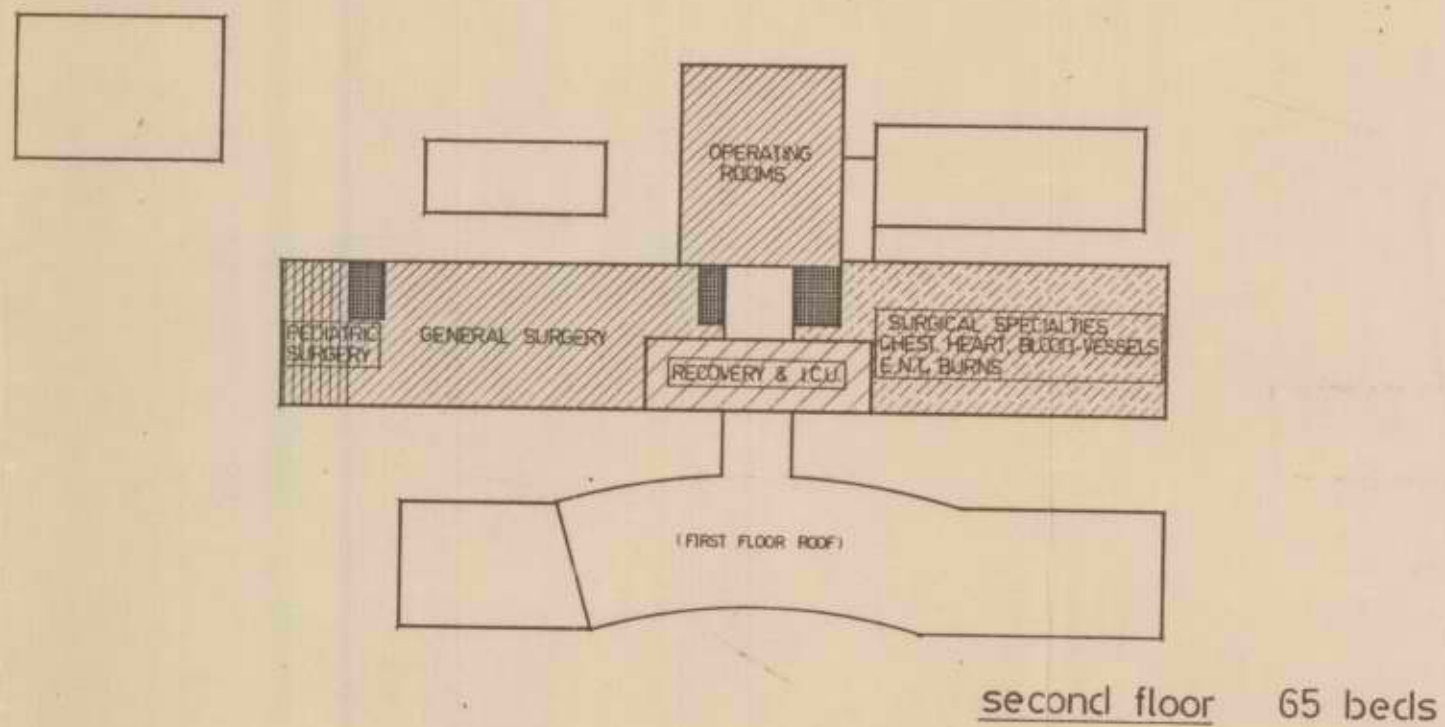

total (5)•167 beds

132 beds




HEALTH SERVICES • CIVIL ADMINISTRATION JUDEA & SAMARIA
MINISTRY OF CONSTRUCTION & HOUSING • PUBLIC WORKS DEPARTMENT

RAMALLAH HOSPITAL
existing situation and
proposed programme

PROGRAMMATIC DESIGN: Z. ACKER • H. KASSIS
EDITING: SHLOMO KOPILOV, ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.


proposed programme

existing situation

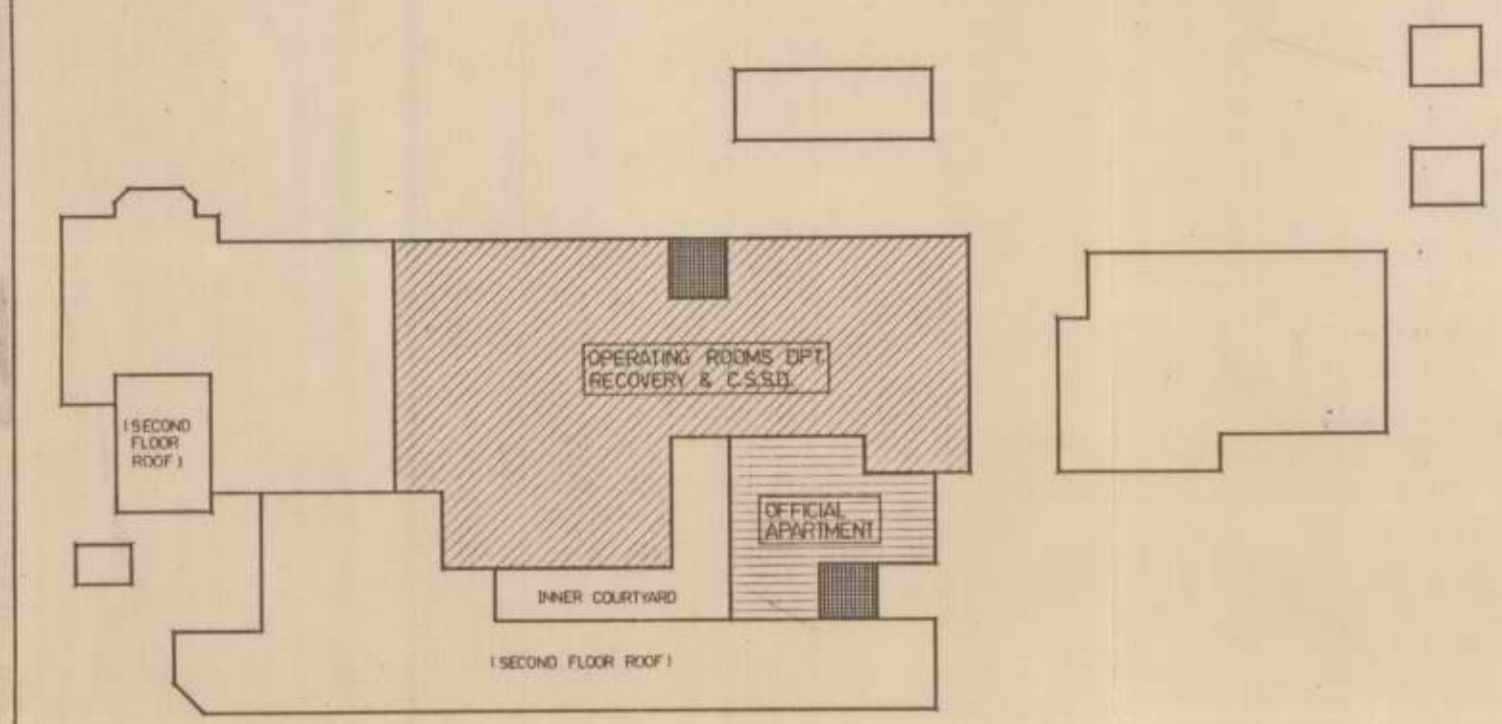


third floor

0 beds

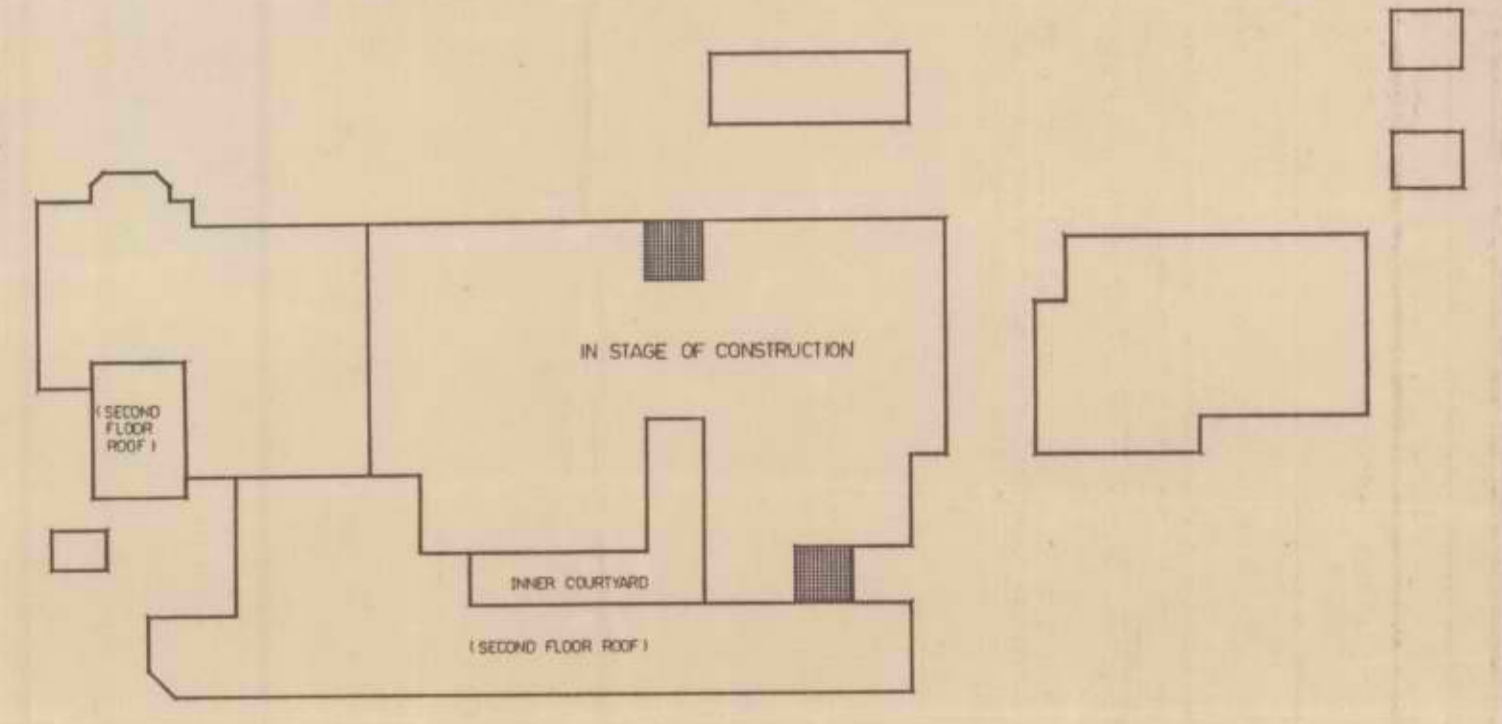


third floor

0 beds

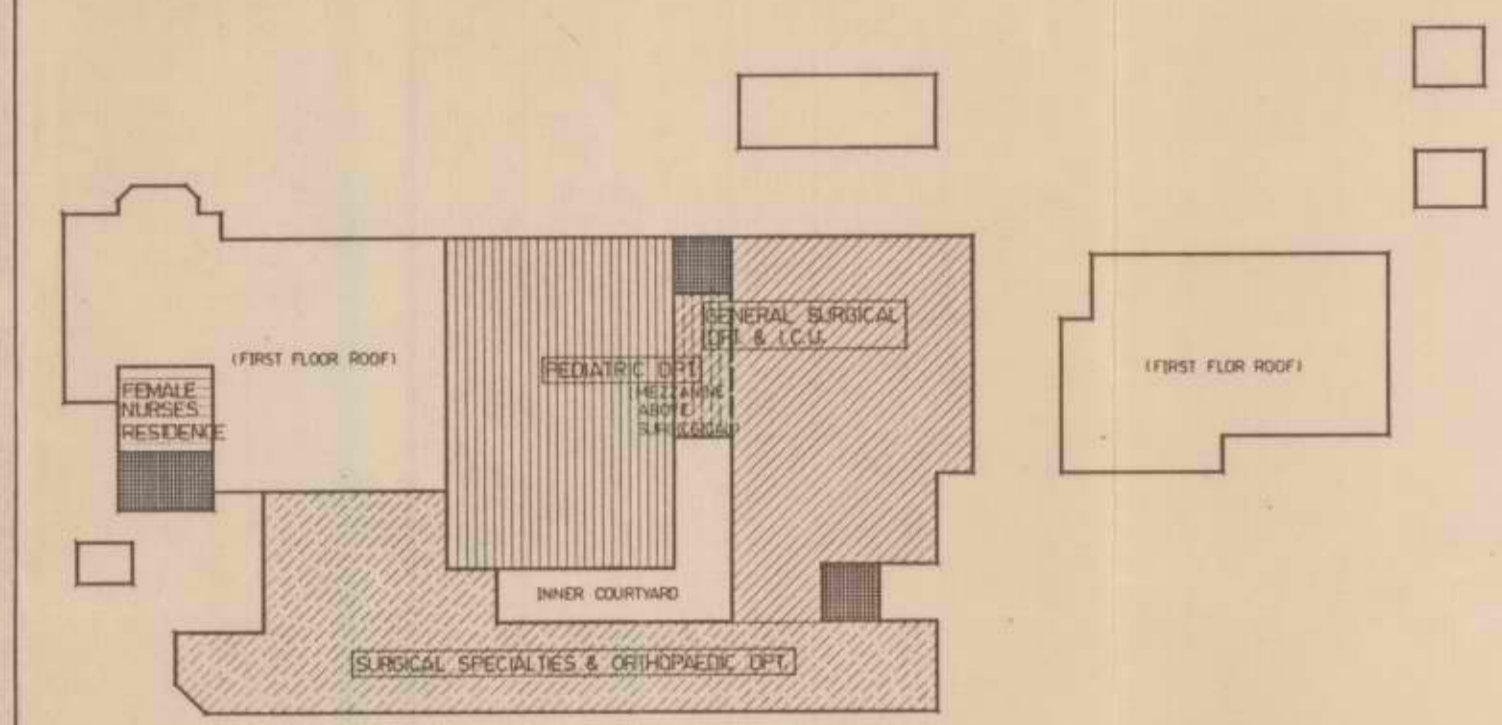

second floor

50 beds

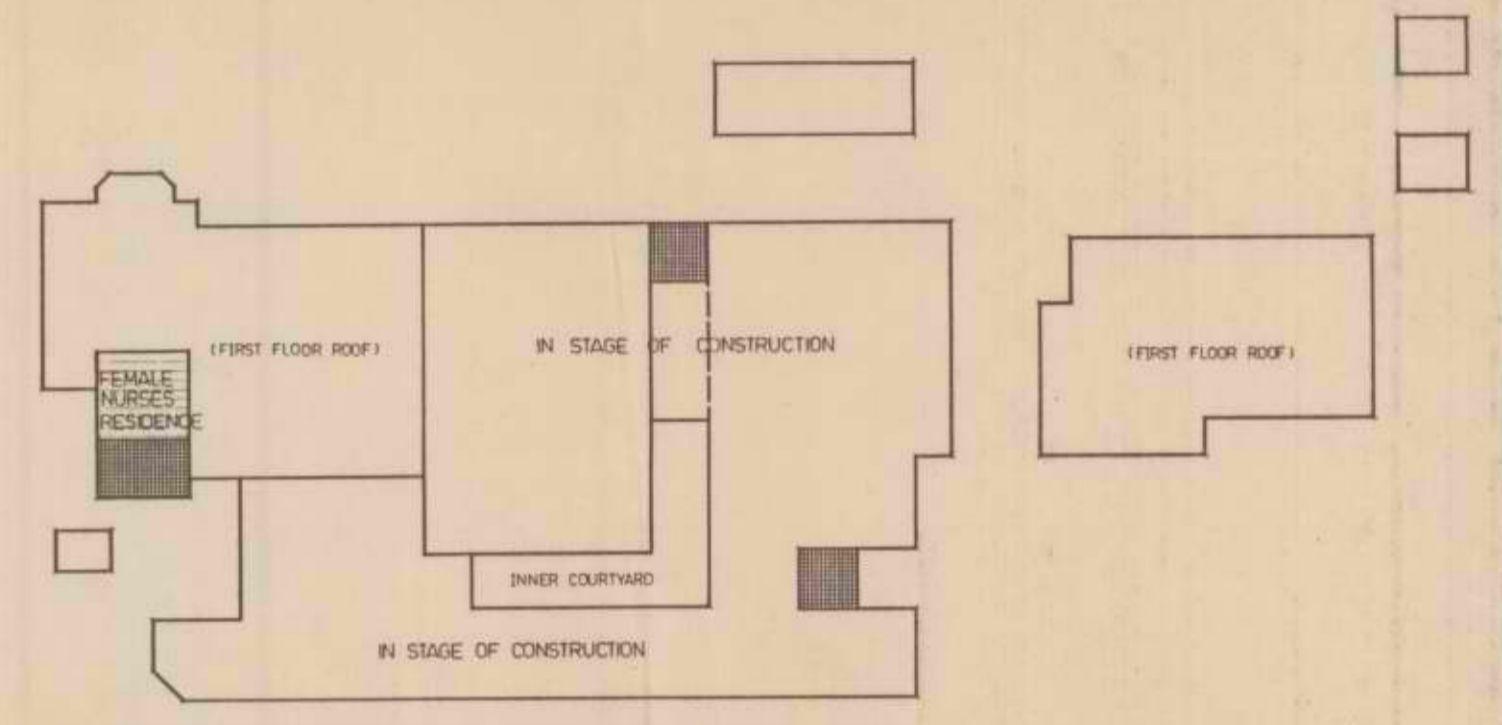


second floor

0 beds




first floor

52 beds

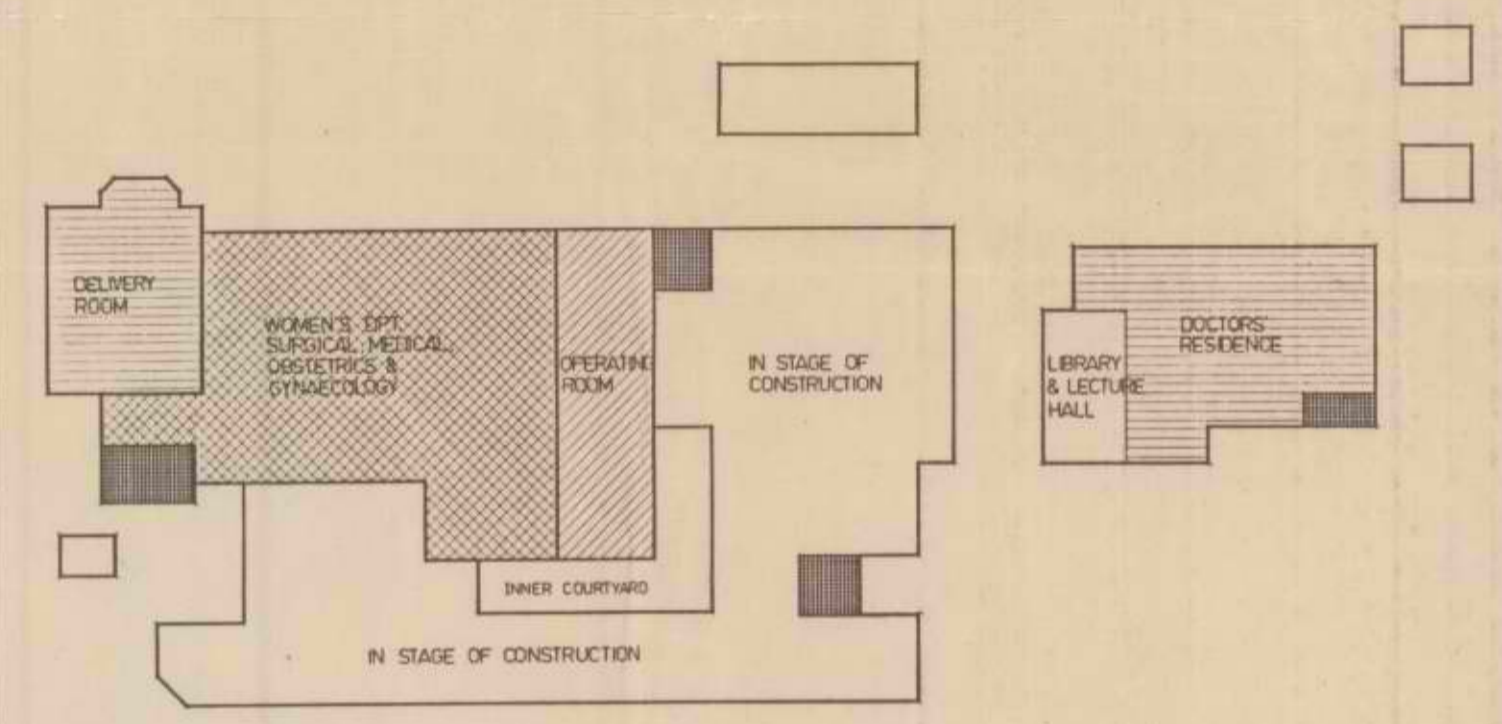


first floor

32 beds

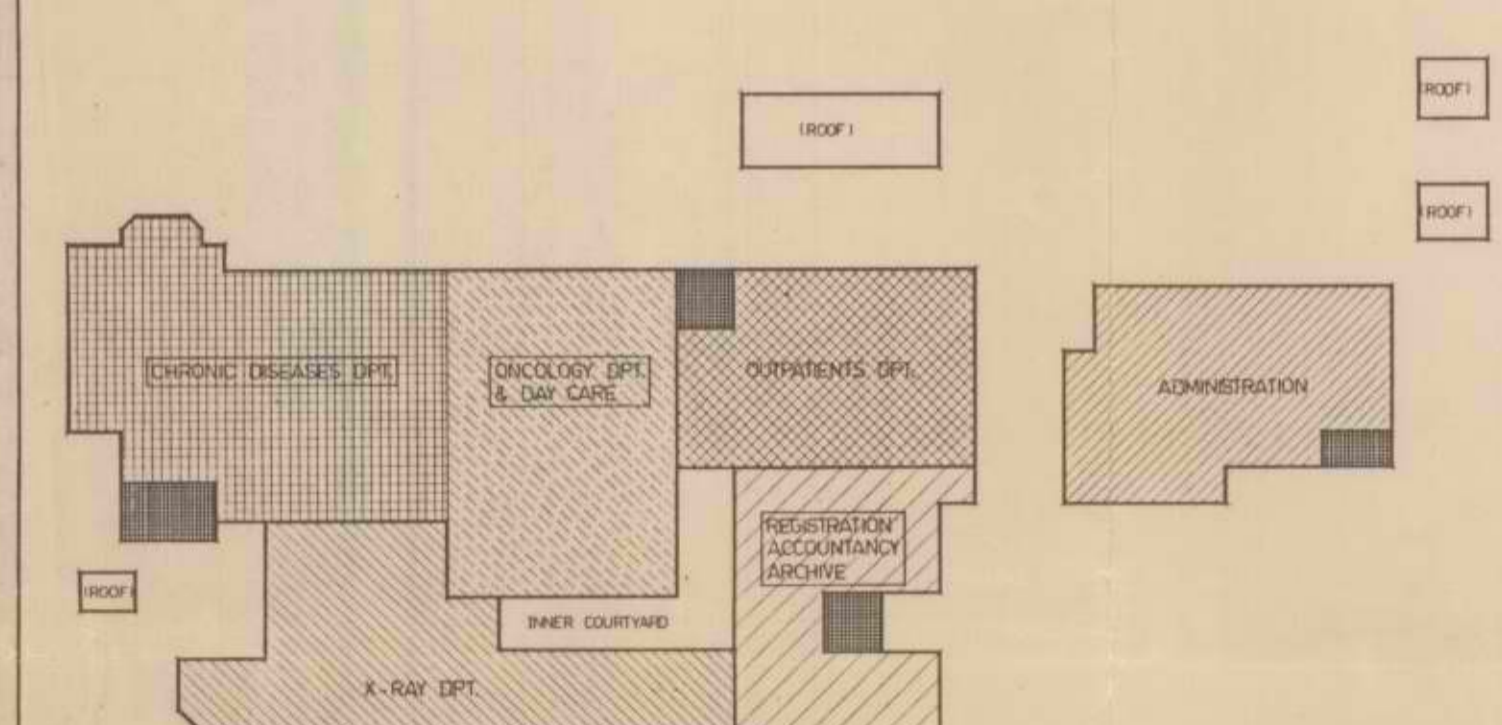


upper ground floor

32 beds

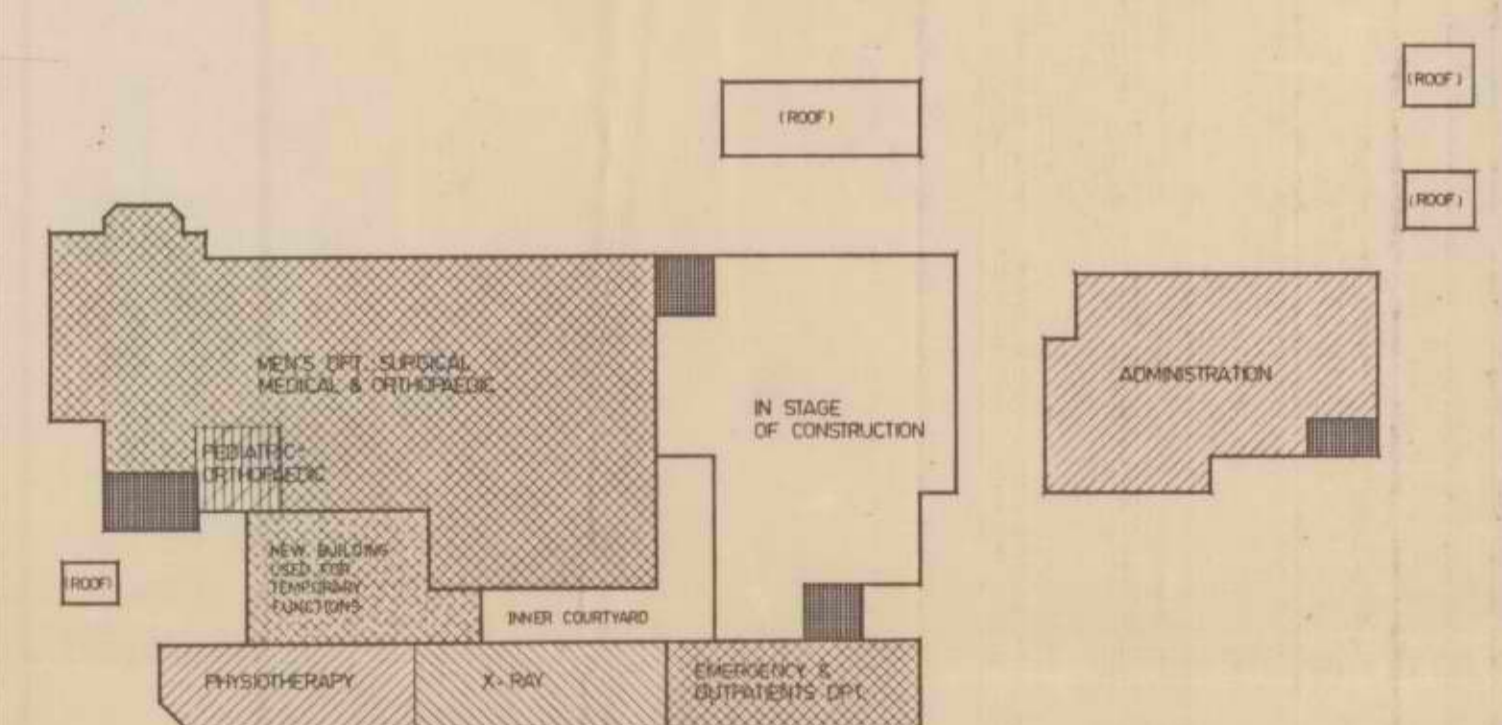


upper ground floor

32 beds

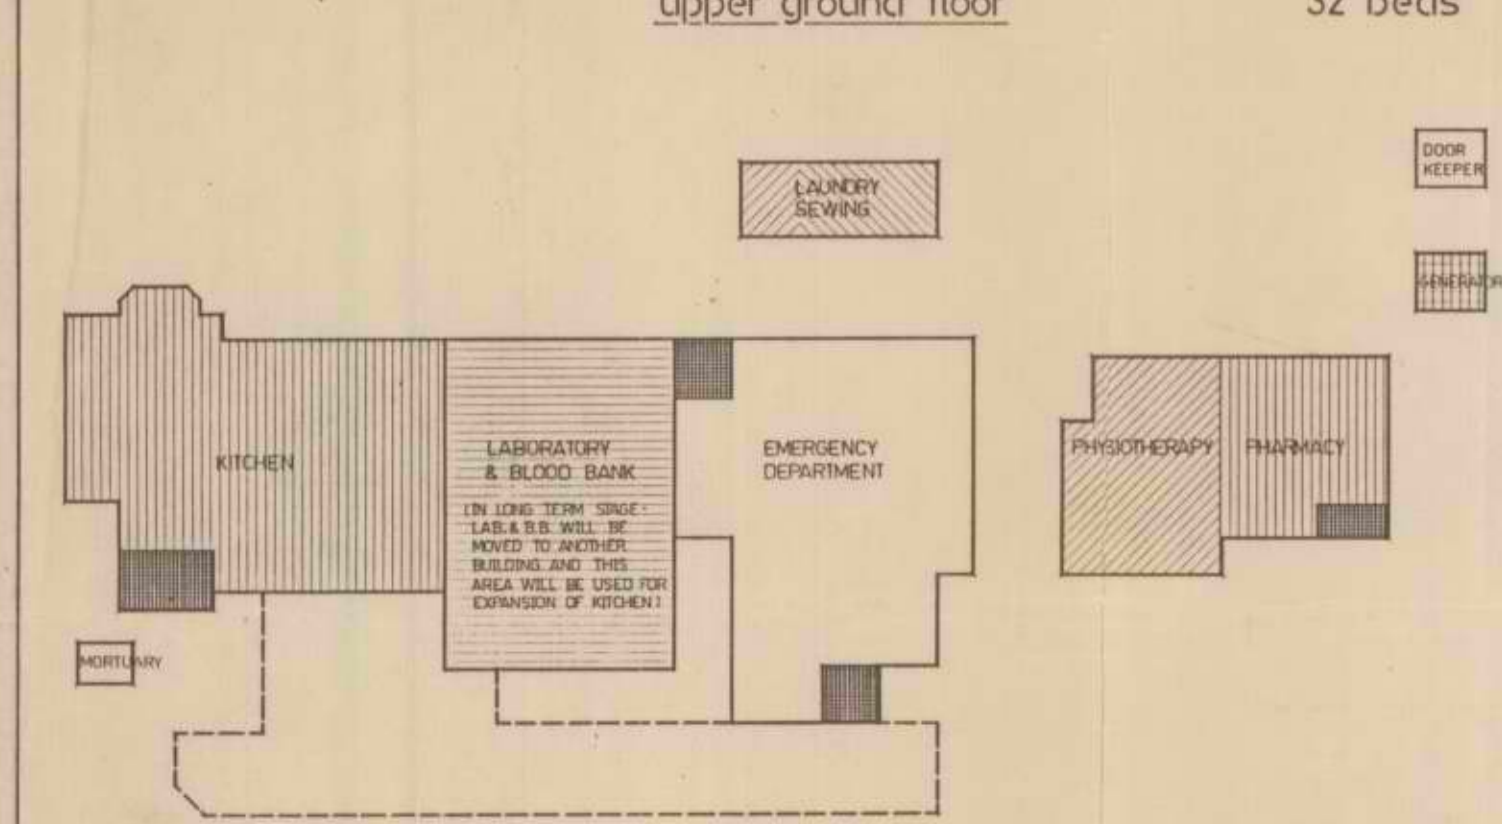

lower ground floor

(5) beds
total (5)•134 beds

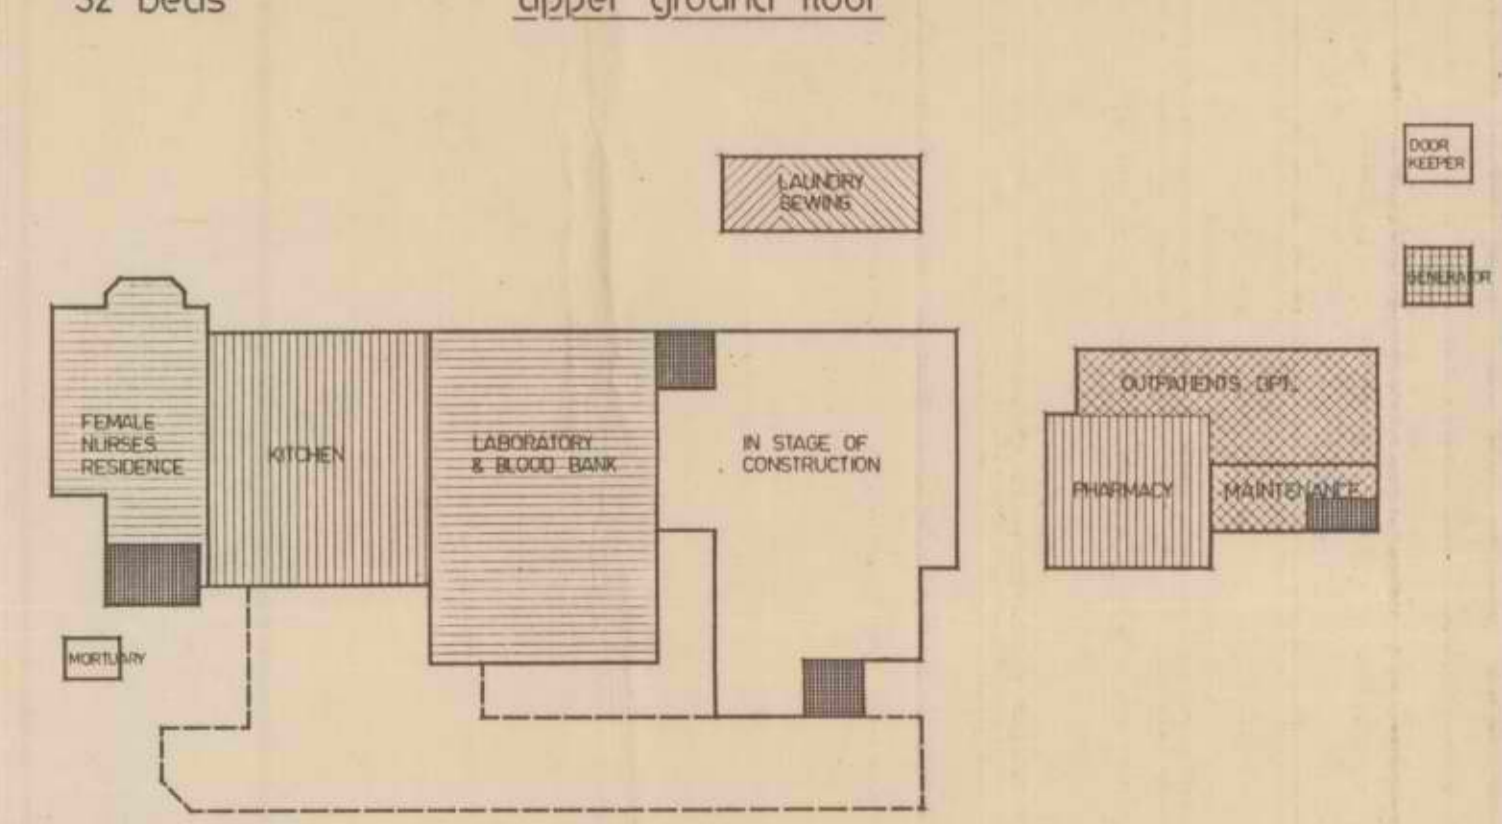

lower ground floor

0 beds
64 beds



HEALTH SERVICES • CIVIL ADMINISTRATION JUDEA & SAMARIA
MINISTRY OF CONSTRUCTION & HOUSING • PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BET-JALA HOSPITAL
existing situation and
proposed programme

PROGRAMMATIC DESIGN: Z. ACKER • H. KASSIS
EDITING: SHLOMO KOPILOV, ENGINEERING & MANAGEMENT LTD

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: יז' בטבת תשמ"ה
29 בדצמבר 1985

מספר: 5/11/7

אל: מר יוסי שכטר, אמרכל בריאות, איו"ש, ת.ד. 17, בית-אל.

הנדון: פיתוח בתי חולים באיזור יהודה ושומרון

הנכם מוזמנים למפגש ביום 9.1.86 בשעה 15.00 בכפר המכביה (אולט הערב) שהמשך עד שעה 18.00 לערך.

בפגישה יוצגו כפני המשתתפים תכניות הפיתוח של בתי החולים בית ג'אלה, ומאלה, חברון ורפידיה (שכם) בעזרת מתכנני הפרויקטים בעזרת תכניות.

מוזמני הפגישה מצדכם לקבעו ויוזמנו על ידכם.

מטעם מע"צ ישתתפו ראשי המחלקות במשרד הראשי, סגן מהנדס מחוז ירושלים וכן מתאם ומרכז הפקויקטים מר שלמה קופילוב ואלה יוזמנו על ידי.

ב כ ר ב ה

א. גל
סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

העתק: סגן אדריכל ראשי, גב' גונן
מר ש. קופילוב, רח' ישראלים 15 ת"א
מהנדס ראשי בבית
מהנדס ראשי מערכות
מהנדס ראשי ביצוע
סגן מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ

STATE OF TEXAS

County of _____
City of _____
I, _____
do hereby certify that _____
is the true and correct _____

Witness my hand and seal of office
this _____ day of _____ 19____

County Clerk

Notary Public for the State of Texas, My Comm. Expires _____

NOTARY PUBLIC STATE OF TEXAS

My commission expires _____
(My term begins on _____)


My office is located at _____
City of _____, State of Texas.

My office hours are _____

My office is open to the public _____
and I am available for consultation _____

My office is located at _____
City of _____, State of Texas.
My office hours are _____
and I am available for consultation _____

My office is located at _____
City of _____, State of Texas.
My office hours are _____
and I am available for consultation _____



REF.: 26/1/39

DATE: 1.12.85

מחלקת תכנון ויישום ייבוניות
המשרד הראשי
האגף לבנות מוסדות ממשלה
לשכת מנהל האגף
נכנס בית 24.12.85

הפרויקט: פרויקטים ביו"ש - תכנית אב מעליות

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 11.12.85 בנושא תכנית אב - מעליות

מקום הישיבה: מש' קופילוב

נוכחים: ה"ה ש.גונן, מ.שניידר (מע"צ); ש.קופילוב, א.נצר (מש' קופילוב)

תפוצה: הנוכחים; ה"ה ד"ר י.סבר, י.שכטר, צ.אקר, מ.אבו-עג'מיה (שרותי הכריאות, יו"ש); א.גיל, א.ערמון, א.גולדשלגר, י.רוז'נסקי, א.גורבץ' (מע"צ); ג.צפור; י.גרשון; י.האן; א.בלזיצמן.


סוכם ע"י: אבי נצר

סעיף	ה נו ש א	הטפול באחריות	עד תאריך
	כללי:		
	הישיבה נערכה על מנת לבחון את ההצעות למעליות בכיה"ח ביו"ש		
	נדון וסוכם כלהלן:		
1.	ביה"ח חברון		
1.1	אשרה ההצעה למעלית, עם ליווי, שתוכננה לשמש בעיקר את אגף אספקה סטרילית מרכזית. גמור התא יהיה נירוסטה לרבות דלתות.	צפור	15.12.85
1.2	אשרה ההצעה לתכנן מעלית נוסעים ומיטות בפינה המערבית של הגוש המרכזי בבנין. תבדק אפשרות למקם את המעלית בתוך הבנין ולא בצמוד אליו, על מנת שלא יהיה צורך לאטום חלונות בקומות האשפוז.	צפור/גורבץ'	19.12.85
2.	ביה"ח רפידה:		
2.1	אשרה ההצעה למיקום המעליות בתוך הפטיו עפ"י הצעת האדריכל.	האן	19.12.85
2.2	תבדק האפשרות לתכנן את המעליות כך שיציאה מהן תהיה בניצב למבנה.	האן	19.12.85

סעיף	ה נו ש א	הטפול באחריות	עד תאריך
2.3	האן יביא הצעה מפורטת יותר לאחר בחינה קונסטרוקטיבית של המיקום שתבוצע ע"י גורבץ'.	האן/גורבץ'	19.12.85
.3	<u>ביה"ח רמאללה:</u>		
3.1	אושרה ההצעה למיקום המעליות לקטע המבנה המחבר את שני הגושים. גרשון	גרשון	31.12.85
3.2	תבדק האפשרות לתכנן את שתי מעליות לנוסעים ולמיטות, בגודל זהה.	גרשון	31.12.85
3.3	תבדק אפשרות לבנות את הפיר למעליות באופן שלא יהיה צורך לאטום חלונות בקומות האשפוז.	גרשון	31.12.85
.4	<u>ביה"ח בית-ג' אלה:</u>		
	אושרה ההצעה למקם שתי מעליות נוסעים ומיטות במבנה החדש המקשר בין המבנה המרכזי לבין בנין המינהלה.	בלזיצמן	

אבי נצר
מינכ

גל 9 N



REF.: 26/1/38

DATE: 28.11.85

הפרויקט: בתי-חולים ביו"ש, תקציבים

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 25.11.85 בנושא דוח תקציבי לשרותי הבראות

מקום הישיבה: מש' א. גיל, מע"צ מחוז ירושלים

נוכחים: ה"ה י. שכטר, אפי, דני (המינהל האזרחי איו"ש); א. גיל, ע. לוקסמבורג, ש. גונן, א. גולדשלגר (מע"צ); ש. קופילוב, ד. ימין (מש' קופילוב).

תפוצה: הנוכחים.

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

עד תאריך	הטיפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		כללי:	
		מטרות הישיבה שהיו	1.
		לסכם את נושא הדוח התקציבי לשרותי הבריאות על העברות כספים והוצאות בפרויקטים השונים.	1.1
		לדון בנושא הגשת תחזית הוצאות.	1.2
		נדון וסוכם כלהלן:	
		הדוח התקציבי	2.
		דו"ח ההוצאות שגובש והוגש לשרותי הבריאות כולל דוח וחשובים של העברות כספים למע"צ והוצאות מע"צ לתכנון ולבצוע הן במונחים שקליים אמיתיים והן חשוב בערכים דולריים.	2.1
		לדברי אנשי שרותי הבריאות - הדוח שגובש מתאים לצרכיהם ועונה על דרישותיהם.	2.2
		דו"ח מעודכן עד סוף חודש 10/85 יוגש לשרותי הבריאות עד	2.3
15.12.85	גולדשלגר/ קופילוב		15.12.85

עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		<u>תחזית תקציבית</u>	.3
		מע"צ תגיש תחזית תקציבית לתקופה של 3 חדשים. התחזית תקח בחשבון את ההוצאות המשוערות בתקופה הנ"ל תוך התייחסות לכספים שהועברו עד כה והאם דרושה העברה תקציבית בתקופה הנ"ל.	3.1
		התחזית תצוין גם את האומדן המעודכן עד סוף הפרויקט, וזאת בהתחשב בשנויים בפרויקט, בהתיקרויות ועוד.	3.2
		התחזיות תהיינה עבור הרבעונים המתחילים בתאריכים: 1.4, 1.7, 1.10, 1.1.	3.3
		התחזיות תוגשנה כחודש לפני תחילת הרבעון.	3.4
3.12.85	גולדשלגר/ קופילוב	כנון מסמך התחזית יוכן בהתייעצות עם שרותי הבריאות וכן עם ה"ה ע. לוקסמבורג וא. גולדשלגר תוך כחודש.	3.5
5.12.85	גולדשלגר/ קופילוב	תחזית מיידית לתקופה שעד 31.3.86 תוגש בהקדם האפשרי.	3.6


 שלמה קופילוב

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

מחלקת עבודות ציבוריות - המשרד הראשי
האגף לבניה מוסדות ממלה
ת.ד. 3198, ירושלים 91131, טל' 277290 - 02

א.ת.ק

ירושלים 24.11.85

מס' 5/11/4

לכבוד
ש. קאפולוב
רח' ישראלים 150
תל-אביב

א.נ.

הנדון: הסכם מע"ב/ה / 45/85 נ 16.11.85
קיימחל"ס קול"ס מעקת תקציב (א"פ) ש"א

מצורפים בזה 5 עותקים של ההסכם הנדון. נא לחתום ולהטביע מס כולים במשרד האוצר על ש"א המקור בסך שייקבע ועוד בול בסך - 1 שקל על העתק הראשון.

אופן החתימה: בכל דף בצד המודפס במכונה או הכתוב ביד וכן בתחתית - בראשי חיבות ובדף האחרון - חתימה סלאה במקום המיועד.

נא להחזיר ליחידה ההקשרויות במשרדנו את כל העותקים בהקדם, בגרוף הצלום פוליסת הבטוח המקצועיים, בהתאם לסעיף 16, בחוזה ההכנות.

בכבוד רב

ב/א.א. עמרון
מנהל הכלכלי

Handwritten signature

העמק:
מח' אדריכלות - יחידת ההקשרויות
לחיק הבנין

מחלקת עבודות צבוריות
המשרד הראשי
האגף לבניית מוסדות ממשלה
לשכת מנהל הענף
נכנס ביום 2.12.85

משרד הבינוי והשיכון
מ"מ עבודות צבוריות, המשרד הראשי
2-12-1985
5/11/7

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST. TEL AVIV 64 282, ISRAEL

טל. 245296; 230870

טלפקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64 282

REF. 26/1/37

DATE: 22.11.85

לכבוד
מר י. שכטר
אמרכ"ל שרותי הבריאות, יו"ש
ח.ד. 17
בית-אל

א.נ.נ.

הנדון: פתוח בתי-חולים ביו"ש -
סדר יום להצגת הנושא

רצ"ב סדר היום לדיון שיתקיים ביום ד' 27.11.85.

נא הפץ למשתתפים.

בברכה,

שלמה קופילוב

העתקים:


ה"ה ד"ר י. סבר, צ. אקר, שרותי הבריאות, יו"ש
א. גיל, ע. לוקסמבורג, ש. גונן, מע"צ

פ ת ו ח כ ת י - ח ו ל י מ ב י ו " ש

הישיבה תחקים ביום ד' 27.11.85 בשעה 14.00 במע"צ, משרד ראשי,
קומה א', חדר 130.

<u>שעה</u>	<u>הנושא</u>
14.00	פתיחה, א.גיל ס/מנהל מע"צ ומנהל האגף לבניית מוסדות ממשלה.
14.15	פרויקטים בבניה"ח רמאללה
14.45	פרויקטים בבניה"ח רפידיה
15.15	פרויקטים בבניה"ח חברון
15.45	פרויקטים בבניה"ח בית-ג'אלה


ר.ע.ק



REF.: 26/1/36

DATE: 15.11.85

Handwritten initials: SK/2/11/85

הפרויקט: בתי-חולים ביו"ש

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 12.11.85 בנושא מכרזי רהוט וציוד


מקום הישיבה: מש' ש. גונן, מע"צ

נוכחים: ה"ה צ. אקר (שרותי הבריאות, יו"ש); ש. גונן, י. זיסקינד, צ. וגנר (מע"צ); י. האן; א. נצר (מש' קופילוב).

תפוצה: הנוכחים; ה"ה ד"ר י. סבר, י. שכטר (שרותי הבריאות, יו"ש); א. גיל, ע. לוקסמבורג, **א. גולדשלגר (מע"צ)**.

סוכם ע"י: אבי נצר

סעיף	ה נושא	הטפול באחריות	עד תאריך
	<p><u>כללי:</u></p> <p>מטרות הישיבה היו:</p> <p>1. לגבש נוהלי הכנת מפרטי הרהוט וציוד במסגרת המכרזים לבתי החולים ביו"ש.</p> <p>2. לעדכן ולהשלים מכרזי רהוט וציוד עבור מחלקות הרנטגן בבתי-החולים ברמאללה, בית-ג' אלה וחברון.</p> <p><u>נדון וסוכם כלהלן:</u></p> <p>1. מע"צ יטפל ברכישת כל הציוד המתוכנן והנדרש, הקבוע והנייד בפרויקטים כפי שיקבע ע"י שרותי הבריאות.</p> <p>2. הנחיות מפורטות בנושא תלתנה לאדריכלים המטפלים בפרויקטים.</p> <p>3. רשימת הרהוט וציוד שתכללנה במכרז, תהיינה מורכבות משני חלקים: הציוד והרהוט המתוכנן (יצור מיוחד). הציוד והרהוט הנרכש (פריטים מוכנים או חלקי פריטים מוכנים).</p> <p>4. רשימת הציוד הנרכש תערך בהתייעצות עם ה"ה צ. וגנר וי. זיסקינד.</p> <p>5. לגבי מחלקות הרנטגן שבעבודה - י. האן יכניס את התקונים הנ"ל.</p>	קופילוב	

עד תאריך	הטיפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
20.11.85	האן	רשימות הציוד חערכנה בהתייעצות עם מ.לוי מהמחוז.  אבי נעד	.5

א. ת. א. ז.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

מחלקת עבודות ציבוריות - המשרד הראשי
האגף לבניה מוסדות ממשלה
ח.ד. 3198, ירושלים 91131, טל' 277290 - 02

11.11.85 ירושלים

5/11/1 כס"

לכבוד
ט' קאסל
רח ושילאים 15
חסיאביז 64382

א.נ.

8.11.85

הנדון: הסכם מע"צ/ה/85 וא"נ

חברו נטח מתאגיד - סקר בעלות לקאפא

סגורפים בזה 5 עותקים של ההסכם בנדון. נא להחזיר ולהטביע פס בולים במשרד האוצר על המקור בסך שייקבע ועוד כול בסך - 1 שקל על העתק הראשון.

אופן החתימה: בכל דף בצד המודפס בסכונה או הכתוב ביד וכך בחתימה - בראשי חיבות ובדף האחרון - חתימה סלאה במקום המיועד.

נא להחזיר ליחידה ההקשרויות במשרדנו את כל העותקים בתקדם, בגרוף תצלום פוליסת הבטוח המקצועים, בהתאם לסעיף 16, בהודעה התכונן.

מכבוד רב

ב/ח. ע. ערמוך
אדרכל ראשי

ערמוך

העמק:
מח' אורכלות - יחידת התקשרויות
לתיק הבנין

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

בחשון השמ"ו
באוקטובר 1985 04 נוב' 1985

מספר:

5/11/7

לכבוד

אלכס שמיר - יועץ לבטיחות אש

רח"כ סמ"י 29

ירושלים

א.ג.

הנדון: בחי החולים ביהודה ושומרון יעוץ בנושא כבאות אש.
הסכם מע"צ מס"ח/22/84 מיום 26.7.84

הוראת שינוי מס' 1

נא לרשום לפניכם את השינויים הבאים:-

1. סכום ההסכם המקורי: - 606,050 שקל

2. עיכון סחיר שעות עבודה בהתאם לחוזה המקורי והשבונות שאושרו לחילום

סה"כ שעות לפי החוזה - 100

שולמו: 43 שעות x - 8,090 שקל =

נותר לחילום: 57 שעות x - 30,240 ש" =

3. חוטפה מס ערך מוסף: - 2,071,550 שקל x 15% =

סה"כ סכום ההסכם לאחר הוראת שינוי מס' 1

שקל 347,670.-

" 1,723,680.-

" 310,732.-

שקל 2,382,082.-

28.10
לבקש
אלכס

בכבוד רב,

א. גיל
סגן מנהל מע"צ

א. בוכמן
חשב מע"צ

מטה האוכייקט
מס' 39003
0144
חתימת אגרת אל"מ

העמקו חשב מע"צ
מחלקת בצוע
אוריכל ראשי

RECEIVED
DATE: 11/15/2001
BY: [Signature]

NOV 15 2001
[Stamp]

TO: [Name]
FROM: [Name]

DATE:

RE: [Subject]

1. [Text]

2. [Text]

3. [Text]

4. [Text]

5. [Text]

6. [Text]

7. [Text]

[Text]

א.ק.ס

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64382, ISRAEL

טל. 245296: 230870
TELEX: 35770-1 COIN IL טלקס:

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382



REF.: 26/1/34

DATE: 20.10.85

לכבוד
מר א. גולדשלגר
מהנדס ראשי לבצוע בנינים
מחלקת עבודות צבוריות
משרד ראשי/ירושלים

א.ק.ס.

הנדון: פרויקטים בבתי חולים ביו"ש, מעקב תקציבי
שכר טרחה
(מכתב מס' 5/11/7 מתאריך 16.10.85)

בהתיחס למכתב הנ"ל ברצוני לציין כלהלן:

1. עבודתנו בנושא כנון מערכת המעקב התקציבי כולל דווח ראשון - בוצעה עבור כל הפרויקטים בבתי החולים בחו"ש, עשרה פרויקטים במספר על חלקיהם השונים.
2. עבודתנו החלה בסוף חודש מאי '85, והדווח על התשומות שלנו הוא על תקופה של כארבעה וחצי חודשים.
3. עבודתנו כללה אל המרכיבים הבאים:
 - 3.1 גבוש מערכת המעקב התקציבי לרבות היקפה, צורתה, הנתונים שיכללו בתוכה ושיטות החשוב במונחים שקליים וריאליים.
נושא זה גובש לאור אלטרנטיבות שונות ורבות שהכנו והצענו, חוץ קבלת הנחיות, שינויים ולבסוף אשורים מנציגי המזמין ואנשי מע"צ במשרד הראשי ובמחוז ירושלים.
 - 3.2 אסוף ורכוז הנתונים של העברות כספיות מהמזמין וכן כל פריטי ההוצאות שבוצעו הן במשרד הראשי והן במחוז - עבור כל פרויקט ופרויקט.
ודאי קיבלת דווח על כך שמידע זה לוקט במאמצים רבים וכפגישות חוזרות ונשנות.
 - 3.3 בצוע נתוח, בדיקה והתאמות כנתונים הרכים שנתקבלו, בין השאר בגלל אי התאמות בדווח המחשב.


Handwritten mark at the top center of the page.

ZHLOMO KOPILOV M.Sc

M.Sc ZHLOMO KOPILOV

ד"ר ז'למו קופילוב

מנהל מחלקת הנדסה



TEL: 2277-1111 FAX: 2277-1111

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

18 ISRAELI ST. TEL-AVIV 64-081 ISRAEL

DATE: 20.10.88 REF: 201/88

מס' תיק: 201/88
תאריך: 20.10.88
שם: ז'למו קופילוב

מס' תיק: 201/88
תאריך: 20.10.88
שם: ז'למו קופילוב

מס' תיק: 201/88

1. מטרת המחקר היא לבדוק את השפעת שינוי תנאי הפעלה על ביצועות המכונה.

2. המבחנים יבוצעו על פי התקן הישראלי הישן.

3. מיקום המבחנים יבוצע כמתואר בתוכנית.

4.1. המבחנים יבוצעו על פי התקן הישראלי הישן.

4.2. המבחנים יבוצעו על פי התקן הישראלי הישן.

4.3. המבחנים יבוצעו על פי התקן הישראלי הישן.

4.4. המבחנים יבוצעו על פי התקן הישראלי הישן.

3.4 אסוף נתונים, נתוח ועובד נושא האומדניטשניתנו בשלבי העבודה השונים בכל פרויקט ופרויקט, והבאתם למונחים ריאליים - וזאת על מנה לספק גם אינפורמציה זו לכל פרויקט.

3.5 עריכת הדוח הראשון שכלל את כל ההכנסות וההוצאות מתחילת כל פרויקט. בצוע כפול של כל החשובים, במונחים שקליים וריאליים. עיון מדוקדק בטבלאות שנמסרו לכם יוכיח את מורכבות העבודה ואת ריבוי הסעיפים והחשובים שבוצעו.

4. בוצעו במשך התקופה 30 פגישות עם נציגי המזמין ומע"צ ולא 74 כמצוין במכתבך.
למעלה ממחציתה הפגישות היו עם אנשי משרדכם.
הפגישות נערכו לצורך גבוש ואשור המערכת המעקב התקציבי, אסוף נתונים וקבלת אשורים בשלבי העבודה השונים.

5. לפי בקשתך בדקתי שוב את הנושא ולא מצאתי כל טעות בהיקף התשומות כפי שנמסר לכם.

בברכה,
שלמה קרפלינג
- 6 -

העתקים:

הגב' ע. לוקסמבורג, ס/מהנדס מחוז ירושלים - מע"צ מחוז
מר א. ערמון, אדריכל ראשי - מע"צ ראשי

2601

משרד המדע והטכניקה
מנהל המידע והמסמך הראשי
27-10-1985
שמי חייק

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

טלפקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64 382

REF.: 26/1/33

DATE: 18.10.85

מחלקת עבודות צבוריות
המשרד הראשי
האגף לבניית מוסדות ממשלה
לשכת מנהל האגף
נבס ביום 27.10.85

לכבוד
מתכנני ויועצי תכנית האב

א.נ.א.

הנדון: כתי חולים ביו"ש, תכנית אב -
שכר-טרחה

לפי הנחית מע"צ, הינכם מתבקשים להגיש בתחילת כל חודש
חשבון עבור תשומות העבודה שהוגשו לכל פרויקט בחודש שחלף.

שלמה קופילוב

העתקים:

ה"ה א.גיל, א.ערמון, י.רוז'נסקי, א.גולדשלגר - מע"צ

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: 16
" חש"י חש"ו
אוקטובר 1985
מסמך:
5/11/7

אלו פר"ש. קומפילוב, רחוב ישראלים 15 חל-אביב 64382

הנדון: פרויקט כתי חולים כיו"ש, מעקב הקציבי"שכר טרחה
סימוכין: סכהבך מס' 26/0/1 מתאריך 6.10.85

להלן הערוחיי לתוכן סכהבך הנ"ל:

- א. איני מקבל הצרחתך "מעקב הקציבי" - שכר טרחה, כאשר העבודה שהינך מבקש לעשות מחייססה לריכוז המידע בדבר העברה הקציביוח וריכוז השלופים, נחוגים שכולם נסצאים במע"ץ מחוז ומשרד הראשי, מידע זה נמסר לך ע"י עובדים שלנו לריכוז ועיבוד לטי סער חדולר.
- ב. הינך מקבל אצלנו אח סלוא העזרת העובדים לביצוע המסימות שחוטלו עליך בענין זה בעוד שהרקע לנושא ידוע לך מסיפולך השוטף בנושא יו"ש.
- ג. לאור הנ"ל ונסיוננו בנושא נראה לי שכמות סעוה העבודה שהינך מבקש עבור עבודה זו לא סביר, מהדווח שלך אני סבין שקיימתה 74 ישיבות לגיבוש הנושא כאשר ההנחיות ופרטים רבים נמסרו על ידינו. לפיכך גם זה לא נראה לי סביר לנושא סכפדון.
- ד. אבקש אח בדיקתך החוזרה לגבי החסומות לעבודה הנ"ל והפרדה המוחלטת של הנושא התקציבי.
- ה. אשר לעדכונים נסכס זאה במשרדי.
- ו. עס קבלת הסברייך הנ"ל יועבר הנושא לאיסור בועה, תכנון הוץ של מע"ץ.

ב בר ב ה,

ד"ר א. גולדסלגר אינג'
מהנדס ראשי לביצוע

העחק: מהנרס מחוז ירושלים
אוריכל ראשי
מחלקת ביצוע

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL AVIV 64382, ISRAEL

טל. 245296; 230870
TELEX: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382

REF.: 26/0/1

DATE: 6.10.85



לכבוד
מר א. גולדשילד
מהנדס ראשי לבצוע בניינים
מחלקת עבודות צבוריות
משרד ראשי/ירושלים

א.נ.

הנדון: פרויקטים בבתי חולים באיו"ש, מעקב תקציבי -
שכר טרחה

1. בהמשך לשיחתנו בנושא, רצ"ב החשבון עבור כנון מערכת המעקב התקציבי לכל הפרויקטים בבתי החולים באזור יהודה ושומרון.

התשומות לכנון המערכת היו סה"כ (החל בחודש מאי '85) 61 שעות למהנדס שותף ועוד 131 שעות למהנדס בכיר, כפי שמפורט בנספח לחשבון.

נא הוציאו לנו הזמנת עבודה בהתאם.

2. המשך עבודתנו בנושא צפוי כלהלן:

2.1 בחודשיים הבאים אנו נקבל הערות נוספות מהגורמים השונים למערכת הטופעת עתה רשמית, ואנו נשפר את המערכת בעדכוני הבאים.

2.2 עדכון המצב התקציבי לפרויקטים השונים בכל חודש.

אני מעריך שבחודשיים הקרובים התשומות לטפוח המערכות תהיינה סה"כ כ 40 שעות.

עדכון חודשי של המערכת יהיה להערכתי כ 20 שעות לחודש.

תשומות אלו הן בהערכה. החשבונות ילוח כרגיל בפרוט התשומות, וישולמו בהתאם.

בברכה

שלמה קופילוב

העתק:

מר א. גיל, סגן מנהל מע"צ, ירושלים

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64382, ISRAEL

טל. 245296; 230870
TELEX: 35770-1 COIN IL טלקס:

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64382

REF:

26/0/2



עוסק מורשה מס': 510839756

לכבוד

מחלקת עבודות צבוריות

משרד ראשי/ירושלים

לידי מר א. גולדשילגר, מהנדס ראשי לבצוע בנינים

א.נ.א.

הנדון: בתי חולים ביו"ש, מעקב תקציבי -
חשבון מצטבר מס' 260/1

הננו מתכדיים להגיש חשבון עבור כבון מערכת המעקב התקציבי בתקופה
5/85 - 6.10.85 (ראה מכתבנו מס' 26/0/1 מוזאריך 6.10.85), כלהלן:

מגיע (ללא מע"מ)

לתקופה 5/85 - 6.10.85:

מהנדס שותף: 61 x 30,240 ש' = 1,844,640 ש'
מהנדס בכיר: 131 x 27,300 ש' = 3,576,300 ש'

ש' 5,420,940

סה"כ מגיע:

חשבונות קודמים (ללא מע"מ)

ש' 5,420,940

יתרה:

ש' 813,141

15% מע"מ:

ש' 6,234,081

סה"כ לתשלום:

(ששה מליון מאתיים שלושים וארבע אלף שמונים ואחד שקלים)

נא העבירו התשלום לחשבוננו מס' 126969 בבנק דיסקונט, סניף ככר והלם, רמת-גן.

כברטה,

שלמה קופילוב

הערה:

* מהנדס בכיר
השאר מהנדס שותף

נספח לחשבון מס' 260/1 מתאריך 6.10.85

פרוט תשומות לחדש: מאי '85 - 6.10.85

תאריך	שעות עבודה	סדר ט
		הערה: "במשרד" - חכוננה לעבודות הכנה רכוז חומר וחשובים שנעשו במשרדנו.
	1½	ישיבה עם שכטר, גולדשלגר, וייס בנושא.
	2	במשרד
	2	במשרד
	1	ישיבה עם עזה לוקסמבורג
	2	במשרד
	1½	במשרד
	2	ישיבה עם קרול וולדמן *
	2½	ישיבה עם שכטר, דני, אפי (בבית אל) *
	2	במשרד
	1	במשרד
	1½	במשרד
	1½	במשרד *
	2	ישיבות בירושלים
	3	ישיבה עם פנינה וייס *
	4	ישיבות בירושלים ובבית אל
	1	במשרד
	3	ישיבות עם פנינה וייס וקרול *
	1	ישיבה עם גיל
	2	במשרד
	5	ישיבות עם גיל וגולדשלגר
	2	במשרד
	1½	ישיבה עם שכטר
	3	במשרד *
	3	במשרד *
	4	ישיבה עם קרול *
	1	במשרד
	4	ישיבות עם פנינה, קרול *
	1½	במשרד
	2	ישיבה עם גולדשלגר *
	1	ישיבה עם גיל
	2	במשרד *

הפרויקט:

נספח לחשבון מס' מתאריך

פרוט תשומות לחודש:

תאריך	שעות עבודה	סדר
13.8	2	ישיבה עם שכטר גולדשלגר, לוקסמבורג
13.8	3	ישיבה עם גולדשלגר וע. לוקסמבורג *
14.8	2	במשרד
15.8	4	במשרד *
16.8	3½	במשרד *
19.8	4	ישיבה עם קרול *
19.8	1	ישיבה עם שכטר
22.8	2	ישיבה עם פנינה וויקטור *
22.8	1	ישיבות בירושלים
23.8	5	ישיבה עם קרול *
26.8	5	ישיבה עם קרול *
27.8	1½	ישיבה בירושלים
28.8	2½	במשרד *
29.8	2	ישיבה עם קרול *
30.8	3	במשרד *
1.9	4	ישיבה עם קרול *
3.9	4	במשרד *
4.9	4	במשרד *
5.9	3	במשרד *
6.9	4	במשרד *
8.9	6	ישיבות עם גולדשלגר וקרול *
9.9	2	במשרד
10.9	1	ישיבה עם קרול *
12.9	2	במשרד *
12.9	2½	ישיבה עם ע. לוקסמבורג
13.9	5	במשרד *
15.9	4	במשרד *
18.9	1½	במשרד *
18.9	2	במשרד
20.9	3	ישיבות עם קרול וג'נס *
22.9	5	במשרד *
23.9	1	במשרד
24.9	5	במשרד *
26.9	2	במשרד

הפרויקט:

נספח לחשבון מס' מתאריך

פרוט תשומות לחודש:

תאריך	שעות עבודה	פרוט
27.9	3	במשורד *
27.9	2	במשורד
2.10	3	במשורד *
2.10	1½	במשורד
3.10	3	ישיבה עם ד"ר (בית אל) *
4.10	2½	במשורד *
4.10	2	במשורד
6.10	4	במשורד *
6.10	2	במשורד
<u>סה"כ:</u>		
מהנדס שותף: 61 ש"ע		
מהנדס בכיר: 131 ש"ע		

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870
TELEX: 35770-1 COIN IL

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382



REF.: 26/0/2

26/0/2 510839756

עוסק מורשה מס': 510839756

לכבוד
מחלקת עבודות צבוריות
מסרד ראשי/ירושלים

לידי מר א. גולדשלגר, מהנדס ראשי לבצוע בנינים

א.ג.

הנדון: כתי חולים ביו"ש, מעקב תקציבי -
חשבון מצטבר מס' 260/1

הגבו מתכבדים להגיש חשבון עבור כגון מערכת המעקב המעקב התקציבי בתקופה
5/85 - 6.10.85 (ראה מתבנו מס' 26/0/1 מתאריך 6.10.85), כלהלן:

מגיע (ללא מע"מ)

לתקופה 5/85 - 6.10.85:

מתנדס שותף: 61 x 30,240 ש' = 1,844,640 ש'
מתנדס בכיר: 131 x 27,300 ש' = 3,576,300 ש'

5,420,940 ש'

סה"כ מגיע:

חשבונות קודמים (ללא מע"מ)

5,420,940 ש'

יתרה:

813,141 ש'


15% מע"מ:

6,234,081 ש'

סה"כ לתשלום:

(ששה מליון מאתיים שלושים וארבע אלף שמונים ואחד שקלים)

נא העבירו התשלום לחשבוננו מס' 126969 בבנק דיסקונט, סניף ככר תנהלם, רמת-גן.

כבוד

שלמה קופילוב

תערה:

מתאריך 6.10.85

נספח לחשבון מס' 260/1

* מהנדס בכיר
השאר מהנדס שוהף

פרוט תשומות לחורש: נאי '85 - 6.10.85

פ ר ו ט	שעות עבודה	תאריך
<u>תערה: "במשרד" - חכונת לעבודות חכנה רכוז הופר וחשובים שנעשו במשרדנו.</u>		
ישיבה עם שכטר, גולדשלגר, וייס בנושא.	1½	28.5
במשרד	2	30.5
במשרד	2	4.6
ישיבה עם עדו לוקסמבורג	1	11.6
במשרד	2	14.6
במשרד	1½	17.6
ישיבה עם קרול וולדמן	2	18.6
ישיבה עם שכטר, דני, אפי (בבית אל)	2½	19.6
במשרד	2	20.6
במשרד	1	23.6
במשרד	1½	3.7
במשרד	1½	5.7
ישיבות בירושלים	2	9.7
ישיבה עם פנינה וייס	3	9.7
ישיבות בירושלים ובבית אל	4	11.7
במשרד	1	12.7
ישיבות עם פנינה וייס וקרול	3	12.7
ישיבה עם גיל	1	18.7
במשרד	2	19.7
ישיבות עם גיל וגולדשלגר	5	23.7
במשרד	2	24.7
ישיבה עם שכטר	1½	30.7
במשרד	3	2.8
במשרד	3	4.8
ישיבה עם קרול	4	5.8
במשרד	1	5.8
ישיבות עם פנינה, קרול	4	7.8
במשרד	1½	9.8
ישיבה עם גולדשלגר	2	9.8
ישיבה עם גיל	1	11.8
במשרד	2	12.8

הפרויקט:

נספח לחשבון מס' מתאריך

פרוט תשומות לחודש:

ס ד ו ט	שעות עבודה	תאריך
ישיבה עם שכטר גולדשלגר, לוקסמבורג	2	13.8
ישיבה עם גולדשלגר וע. לוקסמבורג	3	13.8
במשרד	2	14.8
במשרד	4	15.8
במשרד	3½	16.8
ישיבה עם קרול	4	19.8
ישיבה עם שכטר	1	19.8
ישיבה עם פנינה וויקטור	2	22.8
ישיבות בירושלים	1	22.8
ישיבה עם קרול	5	23.8
ישיבה עם קרול	5	26.8
ישיבה בירושלים	1½	27.8
במשרד	2½	28.8
ישיבה עם קרול	2	29.8
במשרד	3	30.8
ישיבה עם קרול	4	1.9
במשרד	4	3.9
במשרד	4	4.9
במשרד	3	5.9
במשרד	4	6.9
ישיבות עם גולדשלגר וקרול	6	8.9
במשרד	2	9.9
ישיבה עם קרול	1	10.9
במשרד	2	12.9
ישיבה עם ע. לוקסמבורג	2½	12.9
במשרד	5	13.9
במשרד	4	15.9
במשרד	1½	18.9
במשרד	2	18.9
ישיבות עם קרול וג'נט	3	20.9
במשרד	5	22.9
במשרד	1	23.9
במשרד	5	24.9
במשרד	2	26.9

הפרויקט:

מתאריך

נספח לחשבון מס'

פרוט תשומות לחדש:

תאריך	שעות עבודה	סדר
27.9	3	במשרד *
27.9	2	במשרד
2.10	3	במשרד *
2.10	1½	במשרד
3.10	3	ישיבה עם דני (בית אל) *
4.10	2½	במשרד *
4.10	2	במשרד
6.10	4	במשרד *
6.10	2	במשרד
<u>סה"כ:</u>		
מתנדט שוחף: 61 ש"ע		
מתנדט בכיר: 131 ש"ע		

27.9.1985



Handwritten notes:
 3790's
 אר פתח
 אר פתח
 אר פתח
 310.85

Handwritten note:
 אר פתח

לכב' מר י. זיסקינד
 מ.ע.צ.
 ירושלים
 א.ג.

הנדון: כתי חולים: רפאלה, חברון וביה ג'אלה; מחלקת רנטגן; שילוט + אופדן ורשימת קבלנים

לבקשתך, הנני מפרט להלן אופדן לעלות העבודות הנ"ל שנעשה על ידי לאחר החיבור עם אדר' שלמה לוי. כמו-כן מצורפת רשימת קבלנים, כפי שנפסרה לי על ידו.

האופדן:

בי"ח רפאלה	-	1,250,000 ש'
בי"ח חברון	-	800,000 ש'
בי"ח ביה-ג'אלה	-	1,000,000 ש'
סה"כ		3,050,000 ש'

רשימת הקבלנים:

1. "אביה" פעלה אפרים טל. 941166 (02); 941284 (02)
2. "איילון-שליטים" רח' גבורי ישראל 133, תל אביב; טל. 260887 (03); 218992 (03)
3. "כדור" רח' שבח 1, תל אביב; טל. 370361 (03); 383881 (03)
4. פולקובסקי שביל המפעל, קריה הפלאכה, תל אביב; טל. 831243 (03)
5. "תפוח" רח' בר-ירוחאי 26, תל אביב; טל. 833808 (03)

בכבוד רב
 ישראל האן, אדריכל

העמקים: אדר' ש. לוי, מ.ע.צ.
 ש. קופילוב

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 250870

טלפקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב, 64 382

REF.: 26/1/31

25.8.85

מס' פרויקט: 9900

תאריך: 27-08-85

5/11/7

② למא - ש/אמח
 ר"ר ג'ון / סלון /
 עמית
 26.8.85

①
 על שירותי
 תכנון
 אדריכלות
 וניהול
 פרויקט
 תחנת
 טורבינות
 מים
 בג'ניבה
 שווייץ
 בשנת
 1985
 על ידי
 חברת
 "א.נ.א."
 תל-אביב
 26.8.85

לכבוד
 מר א. גיל
 סגן מנהל מע"צ
 מע"צ ראשי / ג'ניבה

א.נ.א.

הנדון: בתי חולים ביו"ש - שכר טרחה לעבודות שונות.

במסגרת עבודות ניהול ותאום הפרויקטים השונים ביו"ש, אנו נדרשים לבצע טפעס לפעם עבודות שונות שאינן קשורות לפרויקט מסויים.

27.8.85

לדוגמא, בצענו באשורכם תיק תוכניות של כל הפרויקטים עבור גיוס סמון בארצות ערב, כולל שנויי כותרות וכתיבה באנגלית וכך פרוט כל הפרויקטים, עם הבחנה בין פרויקטים שהבצוע מומן לבין פרויקטים שעדיין אין להם תקציב לבצוע; וכן אומדני בצרע ולוחות זמנים.

כמו כן בצענו עבור שרותי הבריאות - לצורך התארגנות להקפאות אפשרויות של פרויקטים - פרוט של כל הפרויקטים ביו"ש (כולל פרויקטים בתכנון), לפי הבחנה בין בניה חדשה בקומות השונות או תוספות ושנויים. העבודה כללה פרוט שטחים ואומדנים תקציביים לכל סוג עבודה וכך לוח זמנים לבצוע כל שלב.

מכיון שהעבודות הנ"ל מתיחסות לכל בתי החולים, אני מציע שהחירב יהיה על תכניות האב של 4 בתי החולים (רטאללה, חברון, בית ג'אלה ורפודיה).

לפי הצעתנו זו, יוכנו הוראות שנוי לארבעת החוזים שלנו לתאום וניהול תוכניות האב. יוקצבו סו"כ 400 ש"ע (דהיינו 100 ש"ע לכל פרויקט).

העבודות יבוצעו על ידנו - כפי שבוצעו בעבר - ע"י קבלת אשור מראש והנחיות מטע"צ. החשבונות יוגשו בצרוף פרוט התשומות שהושקעו, כמקובל.


בכבוד רב
 שלמה קופילוב

שלמה קופילוב

M 80 212121 212121
0123 4567 8910
1111 2222 3333 4444

ZHOMO KOPILOV M 80
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.
19 ISRAEL ST. TEL-AVIV 6102 ISRAEL
TEL: 3402344, 3402345
FAX: 3402346 - 00972 3402347

Handwritten notes in Hebrew:
מכתב - חשבון
מס' 1111
מס' 2222
מס' 3333



Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten signature in Hebrew, possibly reading 'ד"ר ז'למה קופילוב' (Dr. Zloma Kopilov).

עדה האזרחי הבריאות	חבל	אזור המינהל משרד
900		כללי
התשמי"ו 1985	תשרי ספטמבר	יא' 26

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת תכנון ומידות, המשרד הראשי
4-10-1985
5/11/7
מ"ע תתיק

Handwritten notes:
אזור המינהל
משרד
אזור המינהל
משרד
אזור המינהל
משרד

Handwritten: פ"ד

לכבוד
מר אבימר גיל / מהנדס ראשי
מ "ע" צ

Handwritten signature: 6/10/85

לאבימר שלום רב ושנה טובה,

לקראת סוף שירותי כקמייט בריאות בחבל עזה, ברצוני להודות לך בשמי ובשם משרד הבריאות על ההענות המהירה לבקשתי שכתוצאה ממנה שלחת את מר ש. קופילוב לעזרתנו.

היטב אני זוכר את התקופה שלפני בואו של מר קופילוב ועוזריו לאיזור ובמיוחד את כל הקשיים שהיו לנו בבניית בתי-החולים - הן מבחינת לוח הזמנים והן מבחינת טיב העבודה. כל זאת השתנה בין לילה - או מוטב להגיד בין יום, יום הופעתו של קופילוב באיזור. פתאום השתנה הכל - לוח הזמנים היה לוח זמנים, תכנון קציבי היה תכנון תקציבי, ובעיקר - רמת הבצוע עלתה במידה כזו שהפכה מבושה לכבוד למדינת ישראל. דבר זה קיבל בטוי בביקורים החוזרים ונישנים במבנים של אחמייים ישראלים - כגון מתאמי הפעולות בשטחים ושר הבטחון, מר משה ארנס וכן של אורחים רבים מחוייל - רופאים ולא רופאים.

אחת התגובות המעניינות ביותר היתה לחדרי הניתוח המתועשים בבי"ח שיפא - אחרי שבאחד הימים ביקר בהם מתאם הפעולות בשטחים דאז - חייכ בנימין בן-אליעזר (פואד), קבלנו למחרת טלפון בהול בומודיעים לנו על ביקורו של שר הבטחון - "הוא סקרן לראות את פלאי הטכניקה בעזה". למותר לציין שרכישת חדרי ניתוח אלה היה פרי יזמתו הברוכה של שלמה קופילוב.

שיתוף הפעולה בין היחידה שאני עומד בראשה לבין שלמה קופילוב התהדק והתרחב מאד בשלוש שנות עבודה משותפת והקיפה הרבה פרויקטים - בית היולדות המודרני בשיפא אשר מעורר - התפעלות בעיני כל מבקר, (מהו - דבר כזה קיים בעזה?). הבנין המרכזי של בית-החולים אשר בנייתו הולכת ומתקדמת למרות כל הקשיים התקציביים, חדרי הניתוח בחן-יונס אשר הם המפעל הראשון שתוכנן ומבוצע מתחילתו ועד סופו בפיקוחו של שלמה קופילוב. וכמוכן לאחרונה - תכנית האב לבי"ח שיפא בפרט וכן לכל מערכת האשפוז בחבל.

שיתוף פעולה זה צנח מתוך אפיו של שלמה קופילוב - שהוא מחד נעים הליכות ואיש צוות, ומאידך בעל מרץ וחריצות בלתי נלאים. כפי שאמרנו לא פעם - "קופי משגע את כולנו. כבר אין לנו כח אליו" - אבל - כל הכבוד. צריך אחד אשר אינו מוכן לקבל את המלים "לא" - "אי-אפשר" - "אין לי זמן", כדי לדחוף את המערכת קדימה. וקופילוב עשה זאת בצורה מאד משכנעת. וזה היה נכון לא רק כלפי המערכת בעזה אלא גם כלפי האדריכלים, המתכננים, היועצים וכולי.

לא פחות חשוב הוא כמוכן הידע המקצועי הרב והמעמיק של שלמה, אשר מקיף לא רק את החלק ההנדסי של מבני בתי-החולים, אלא גם את הציוד הבסיסי, החל ממנורות חדרי ניתוח ועד - לשולחנות. הידיעה הרחבה שקופי פרס לפנינו חסכה כמוכן זמן רב וייעלה מאד את העבודה.

מהר למדנו שיש על מי לסמוך, ושלקביעתו של קופילוב היה בסיס. אני אישית גם התרשמתי לטובה מנכונותו להקשיב וללמוד מכל אחד - זאת למרות שלעיתים היה ברור שהוא יודע יותר טוב.

כן יש לציין את יכולתו בדפלומטיה ואת יחסי הציבור המצויינים ששלמה פיתח כתוצאה מכך, דברים אשר הוכיחו את עצמם דווקא בעבודתו בשטחים שהם כידוע מערכת מסובכת במיוחד, הכוללת יהודים וערבים, אזרחים ואנשי צבא וכן אזרחים מזדמנים, אשר לא תמיד מצטיינים ברצון טוב כלפי מדינת ישראל. אני חייב לציין בהערכה רבה שקופילוב מצא מהר מאד נתיבים אל לב כל הגורמים השונים ורכש לעצמו אוהדים רבים.

בסכום ברצוני לציין שבחירתו של שלמה קופילוב הייתה ללא ספק הבחירה הטובה ביותר - האפשרית - כל הכבוד. אני כשלעצמי נהנתי מאד לעבוד איתו ואני מקוה שיזדמן לנו עוד לעבוד במשותף. בינתיים אני מאחל לך ולו הצלחה והמשך עבודה פוריה עם יורשי לתפקיד.

בכבוד רב
עלי
דייר קמייט
לש
בריאות

העתקים :

- מר י. קופ, מעייצ - באר שבע
- אליימ לוי-נגר - ס. רמאייז, עזה
- מר ש. קופילוב - תל-אביב
- פרופ' מיכאלי - מנכל משרד הבריאות, י-ם
- דייר טולצ'ינסקי - מתאם פעולות משרד הבריאות בשטחים, י-ם
- אליימ פרדי - ס. מתאם פעולות משרד הבטחון בשטחים, הקריה תייא

דעל / שרה

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: יד' באלול תשמ"ח
30 באוגוסט 1985

מספר: 5/11/7
אל: מר יוסי שכטר, אמרכל שרותי הבריאות, ת.ד. 17, בית-אל.

הנדון: כמי חולים ביו"ש - חלוקת הפרויקטים השונים
לפי סוג העבודה
סמוכין: מכתבו של מר קופילוב מס' 26/1/30 מ-21.8.85

אינני יודע על איזו חקפאה מדובר - כל פעם יש "סוג" אחר.
צו החקפאה הנוכחי אינו חל, כידוע, על איזור יו"ש (רק על
מדינת ישראל)

בברכה,

א. גיל
סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

העתק: אדריכל ראשי

מר ש. קופילוב, רח' ישראלים 15, ת"א

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ

Вопросы истории
и культуры
Средневековья
в России

№ 10
1988 г.

СВЕТ

№ 10: 1988 г., 10-й выпуск, 10-й выпуск, 10-й выпуск.

Содержание: 10-й выпуск - 10-й выпуск
10-й выпуск

10-й выпуск: 10-й выпуск - 10-й выпуск

10-й выпуск: 10-й выпуск - 10-й выпуск
10-й выпуск: 10-й выпуск - 10-й выпуск

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ

10-й выпуск: 10-й выпуск - 10-й выпуск

10-й выпуск: 10-й выпуск - 10-й выпуск

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

TELEX: 35770-1 COIN IL טלסקס:

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382

מחלקת עבודות צבוריות

המשרד הראשי

האגף לבניית מוסדות ממשלתיים

לשכת ניהול האגף

27.8.85

לכבוד

מר י. שכטר

אמרכ"ל שירותי הנדסאות, יו"ש

בית-אל

REF.:

26/1/30

DATE

21.8.85

משרד הבינוי והשיכון
מח' עבודות צבוריות, המשרד הראשי
22-08-1985
5/11/7
מח' הנדסה

..א.נ.

הנדון: בתי חולים ביו"ש - חלוקת הפרויקטים השונים לפי סוג העבודה

לצורך העדכון להקמת של הפרויקטים השונים, להלן פרוט הפרויקטים המתבצעים או המתוכננים להתבצע בעתיד - מחולקים לפי סוג העבודה.

" הטבלה מסווגת את הפרויקטים לפי "שפוצים ושנויים בבנין קיים"; בניה חדשה, קומת קרקע"; ו"בניה חדשה, קומות עליונות". הפרויקטים של בניה חדשה, עליהם עלולה לחול ההקפאה-מצוינים גם האומדנים לבצוע ולו"ז צפוי.

לתשומת לבך - הפרויקטים של בניה חדשה הם בעיקר עבור תכניות אב. השטחים, האומדנים ולוח הזמנים מבוססים על פרוגרמות ולא על תכנון והדיוק קטן.

לגבי ביה"ח רפידיה, תבנית האב - עדיין לא נקבעה פרוגרמה ולכן לא נרשמו פרטים.

בברכה,
ש.ל. קופילוב
שלמה קופילוב

העתק:

מר א. גדל, סגן מנהל מע"צ - ירושלים

SHLOMO KOPILOV M.Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.
10 GILBERT ST. TEL AVIV 61002 ISRAEL
FAX: 972-3-5220111

SHLOMO KOPILOV M.Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.
10 GILBERT ST. TEL AVIV 61002 ISRAEL
FAX: 972-3-5220111

מס' תיק: 28.8.16
תאריך: 28.8.16

מס' תיק: 28.8.16
תאריך: 28.8.16
מס' תיק: 28.8.16
תאריך: 28.8.16

מס' תיק: 28.8.16
תאריך: 28.8.16

מס' תיק: 28.8.16
תאריך: 28.8.16

מס' תיק: 28.8.16
תאריך: 28.8.16

מס' תיק: 28.8.16
תאריך: 28.8.16

מס' תיק: 28.8.16
תאריך: 28.8.16

מס' תיק: 28.8.16
תאריך: 28.8.16

מס' תיק: 28.8.16

מס' תיק: 28.8.16
תאריך: 28.8.16

מס' תיק: 28.8.16
תאריך: 28.8.16

שם הפרויקט		שפוצים בבנין קיים (שטח מ"ר)		בניה חדשה קומת קרקע		בניה חדשה בקומות עליונות	
		עלות (\$)		עלות (\$)		עלות (\$)	
		משך בצוע צפוי (שנים)		משך בצוע צפוי (שנים)		משך בצוע צפוי (שנים)	
<u>1. ביה"ח רמאללה</u>							
	350						
	110						
1,540,000		440,000	400			1400	
	3500		(5 שנים)				
1.1 אגף רנטגן							
1.2 חדרי נתוח							
1.3 תכנית אב							
1.4 פרויקט משולב							
	430	390,000	350				
			(שנתיים)				
1.4.1 השלמת אגף נתוחים							
1.4.2 מרפאות חוץ							
1.4.3 אגף חדרי מיון							
	220						
1.4.4 אספקה סטרילית							
	250						
ובית מרקחת							
<u>2. ביה"ח בית-ג'אלה</u>							
	280						
2.1 אגף רנטגן							
	430						
2.2 אגף נתוחים							
	3600						
2.3 תכנית אב							
<u>3. ביה"ח חברון</u>							
	185						
3.1 אגף רנטגן							
3.2 חדרי נתוח (אזור סטרילי)							
3.3 מערכות לסדרי נתוח							
3.4 אגף נתוחים:							
	160						
3.4.1 השלמה							
	160						
3.4.2 מחלקת אספקה סטרילית							
550,000		1,430,000	1300			506	
	3000		(5 שנים)			(5 שנים)	
3.5 תכנית אב							
<u>4. ביה"ח רפידה</u>							
4.1							
	190						
4.1.1 אגף רנטגן							
	220	770,000	700				
			(שנתיים)				
4.1.2 חדר מיון							
4.1.3 מרפאות חוץ							
4.1.4 בית מרקחת							
4.1.5 מינהלה							
110,000		200,000	180			100	
			(שנתיים)			(שנתיים)	
4.2 תכנית אב							
טרם נקבעה פרוגרמה							

מ"ח 87/10

משרד הבינוי והנדסה ושרת ישראל
מח' אכזרית, אגודות, המשרד הרישוי
23-08-1985
5/11/7

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

ד' באבול תשמ"ה
21 באוגוסט 1985

מספר:

Handwritten signature

לכבוד
מר ש. קופילוב
רח' ישראלים 15
תל-אביב

א"נ,

הנדון: במי הולים ביו"ש - עדכון לוחות זמנים,
הנזכר: מכתב ת-8.8.85

נפלה טעות בלוח הזמנים לגבי שפוז מכוני הונסגן בבי"ח חברון ובית ג'אלה,
בשני הבניינים העבודה צריכה להתבצע בשני שלבים;

שלב א': גמר שפוז חלק מהחדרים כולל הרכבת והפעלת מתקני הונסגן ע"י
חברת "סימנט" בבית ג'אלה וחברת "ליונס" בחברון.

שלב ב': פירוק מתקני הונסגן הקיימים, וגמר שפוז יתר החדרים.

אנו נעביר אליכם לוח זמנים מעודכן, לאחר שנקבל את התאריכים להתקדמות העבודה
מחברת "סימנט" ו"ליונס".

בכבוד רב,

עדה לוקסמבורג

עדה לוקסמבורג
פ/מהנדס המחוז
ב/מהנדס המחוז

העתק: הי"ח תא"ל א. בקנפטיין (סגן מתאם הפעולות בטטהים)
ד"ר ח.ה. מולצינסקי (מתאם שרותי הבריאות בטטהים)
ד. אפרתי, מ.אהרון, צ.סער (מינהל אזרחי, יו"ם)
ד"ר י. טבר, י.סכטר, צ.אקר, ס. ביציין (שרותי הבריאות, יו"ם)
א. גיל, ע. ~~א.ערמון~~, י. רוז'נסקי, א. גורבץ', ש. גונן, פ. וייס, מע"צ

011
FCS
File

Very faint text on the right side of the page, possibly bleed-through or a stamp.

Very faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Very faint, illegible text in the middle section of the page.

Very faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Very faint, illegible text in the lower section of the page.

Very faint text located in the lower right quadrant of the page.

Very faint, illegible text in the bottom section of the page.



20.8.85

תאריך

445/85

תאריך

מס' תיק: 10-09-1005
 5/11/7
 משרד הבריאות, המשרד הרפואי

מחלקת עבודות ייחודיות
 המשרד הרפואי
 האגף לבטיח מסדר
 לשכת גודל דיור
 מבט ביום 10.9.85

חיל מש
 9-08-1985
 מ. ע. צ. מרזו וירושלים

רע"ן מו"ש
 קמ"ט אוצר
 סגן רמ"א
 קמ"ט בריאות
 מר גיל אבימר
 מר שלמה קופילוב

הנדון: הפסקת בניה ציבורית חקנות שעת חרום 1985

1. כוונת חוזר החשב הכללי המדבר על הפסקת בניה ציבורית היא הפסקת בניית מבנים חדשים ואינו מתכוון לשיפוצים בחוך המבנים הקיימים.
2. עיקר תוכניות הפיתוח שלנו מתרכזות בשיפוצים בחוך מבנים קיימים להוציא בייח רפידיה שבו נבצע תוספת בניה בסדר גודל של כ-700 מ"ר (פרוייקט הרנטגן, מרפאות חוץ, בית מרקחת וחדר מיון).
3. בטווח הארוך יותר אנו מתכננים תוספת בניה בבית חולים רמאללה שחעשה כנראה עיי אגודת ידידי בית החולים ותוספת בניה בבייח חברון (אגף יולדות) והשלמת פרוייקט בייח רפידיה.
4. מ"ל מכתבו של מר קופילוב 26/1/30 מיום 21.8.83 ובו מפרט את המצב שבו הפרוייקטים נימצאים.
5. בשיחתי עם סגן יועמ"ש משרד השיכון המטפל בנושא ההקפאה נימסר לי שתקנה זו לא חלה על אינ"ש - כדאי לבדוק טענה זו.

בכבוד רב
 יוסי שכטר
 אמנסל בריאות
 במנהל האזרחי לאינ"ש

יש/טס

RECEIVED
10 01

RECEIVED
10 01

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

טלקס: 35770-1 COIN IL

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64 382

REF.: 26/1/30

DATE 21.8.85

לכבוד
מר י. שכטר
אמרכ"ל שרותי הבריאות, יר"ש
בית-אל

..נ.א


הנדון: בתי חולים ביר"ש - חלוקת הפרויקטים השונים
לפי סוג העבודה

לצורך הערכות להקפאות של הפרויקטים השונים, להלן פרוט הפרויקטים המתבצעים או המתוכננים להתבצע בעתיד - מחולקים לפי סוג העבודה.

הטבלה מסווגת את הפרויקטים לפי "שפוצים ושנויים בבנין קיים"; "בניה חדשה, קומת קרקע"; ו"בניה חדשה, קומות עליונות". הפרויקטים של בניה חדשה, עליהם עלולה לחול ההקפאה מצוינים גם האומדנים לבצוע ולו"ז צפוי.

לתשומת לבך - הפרויקטים של בניה חדשה הם בעיקר עבור תכניות אב. השטחים, האומדנים ולוח הזמנים מבוססים על פרוגרמות ולא על תכנון והדיוק קטן.

לגבי ביה"ח רפידיה, תכנית האב - עדיין לא נקבעה פרוגרמה ולכן לא נרשמו פרטים.

בכח

שלמה קופילוב

העתק:

מר א. גיל, סגן מנהל מע"צ - ירושלים

בניה חדשה בקומות עליונות		בניה חדשה קומת קרקע		שפוצים בבנין קיים (שטח מ"ר)	שם הפרויקט
עלות (\$)	שטח (מ"ר) (משך בצווע עפוף)	עלות (\$)	שטח (מ"ר) (משך בצווע עפוף)		
					<u>1. ביה"ח רמאללה</u>
				350	1.1 אגף רנטגן
				110	1.2 חדרי נתוח
1,540,000	1400	440,000	400 (5 שנים)	3500	1.3 תכנית אב
					1.4 פרויקט משולב
				430	1.4.1 השלמת אגף נתוחים
		390,000	350 (שנתיים)		1.4.2 מרפאות חוץ
				220	1.4.3 אגף חדרי מיון
				250	1.4.4 אספקה טרילית ובית מרקחת
					<u>2. ביה"ח בית-ג'אלה</u>
				280	2.1 אגף רנטגן
				430	2.2 אגף נתוחים
				3600	2.3 תכנית אב
					<u>3. ביה"ח חברון</u>
				165	3.1 אגף רנטגן
				בוצע	3.2 חדרי נתוח (אזור טרילי)
				מוקט בשטח משופץ	3.3 מערכות לחדרי נתוח
					3.4 אגף נתוחים:
				160	3.4.1 השלמה
				160	3.4.2 מחלקת אספקה טרילית
550,000	506 (5 שנים)	1,430,000	1300 (5 שנים)	3000	3.5 תכנית אב
					<u>4. ביה"ח רפידיה</u>
					4.1
				190	4.1.1 אגף רנטגן
				220	4.1.2 חדר מיון
		770,000	700 (שנתיים)		4.1.3 מרפאות חוץ
					4.1.4 בית מרקחת
110,000	100 (שנתיים)	200,000	180 (שנתיים)		4.1.5 מינהלה
					4.2 תכנית אב
					טרם נקבעה פרוגרמה

גד ארמון

תאריך 19.9.85



משרד הבינוי והסכונ
מחלקת עבודות צבוריות
מהנדס מחוז ירושלים
טל' 02-249411
ח.ד. 132 ירושלים מיקוד 91000

בתי חולים כיהודה ושומרון

תפוצת מסמכים

גד ארמון
29.8.85

סיכום ישיבה/מכתב. 16.9.85

<u>משרד הבריאות יו"ש</u>	<u>מע"צ משרד ראשי</u>
י. שכטר	א. גיל
ס. ביצ'ין	א. ערמון
צ. האקר	א. גורבץ
.....	א. גולדשלגר
.....	י. רוז'נסקי
.....	א. טל
.....	א. הרסקוביץ
.....	פ. שניידר
<u>מהכננים ויועצים</u>	ש. גונן
ג. צפור	י. לויין
בלעד ושוחפו
י. האן
ו. אלישע - ש. פרנקל
איצקוביץ' - שפירא - האן
ש. קופילוב
	<u>מע"צ ירושלים</u>
	ע. לוקסמבורג
	ס. פרבר
	י. ציגלמן
	י. הוכברג
	פ. וייס

א. ארמון

X

*

*

1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802
1801
1800

תיק: 5/11/2/17/1
 תאריך:
 97 מתוך

משרד הבינוי והשיכון
 מחלקת עבודות צבוריות
 מהנדס המחוז - ירושלים
 טל': 02-249411
 ת.ד. 132 ירושלים מיקוד 91000
 טלפון באחד העבודה 051-22231

בית חולים ע"ש מנחם בגין - רמלה - רטיבות

סיכום ישיבה / דיון מיום 16.8.85 כ.
 בהשתתפות: מר ארמוני
 וגב' וייס

עד תאריך	טפול באחריות	ה נ ו א	סעיף
	<p>פנימה וייס</p> <p><i>שני א.ו.</i></p>	<p>השלד מבוסס כנראה על קירות נושאים מבטון דבש המבוססים על יסודות עוברים, בעוד המחיצות בנויות מבלוקי בטון, מבוססות על יסודות עוברים.</p> <p>פני היסודות העוברים הם כ-20 ס"מ מתחת לריצוף.</p> <p>הריצוף בקומת הקרקע מונח על מילוי.</p> <p>הופיעו כתמי רטיבות בקירות פנימיים וחצוניים שמקורם ככול הנראה בעליה קפילרית של רטיבות מן הקרקע.</p> <p>גובה הסמנים באופן כללי כ-40-50 ס"מ מפני הריצוף למעט מקרים שבהם גובה הרטיבות עולה יותר.</p> <p>הכתמים נמצאו בבנין כאשר התחילה העבודה, והופיעו גם לאחר הצביעה על אף חודשי הקיץ.</p> <p>התקרות עשויות מצלעות עם בלונים ובקטעים שונים בתקרת קומת הקרקע (ביחוד באזור המעבדה), הופיעו כתמי רטיבות ויש לחפש את מקור הרטיבות קודם כול בצנרת פגומה של המעבדה.</p> <p>נראה שניתן להתגבר על בעיה עלית הרטיבות בקרקע בקירות הורדת הפנלים והטיה עד לגובה של 1 מ' וטיה מחדש, עם חומרי מליטה אטימים ומיוחדים עומדים בפני רטיבות, על פי המלצה של מר ארמוני.</p> <p>ערכה</p>	



מדינת ישראל
המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
קצין מסה בריאות

5/11/7

13.8.85 תאריך
ק - 200/85

לכבוד
מר א. גיל, סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית מוסדות ממשלה
המשרד הראשי
ירושלים

הנדון: בתי חולים ביו"ש - חכנון מערכות
סימוכין: מכתב 5/11/7 מיום 13.5.85

הערותייך מקובלות עלי, הזרתי למהנדס האחזקה מר סלומון ביצ'ין להפסיק להתכתב איתך, וקשרי התכתבות בנושאים מקצועיים שלו עמך יהיו רק באמצעות האמרכל של יחידתי הממונה עליו ישירות, או דרכי.

ב ב ר כ ה
ד"ר י. סבר
קמ"ט בריאות
במינהל האזרחי לאיו"ש

העתקים:
סא"ל צ. סעד - רע"נ מו"ש איו"ש.
י. שכטר, גב' צ. אקר, מר ס. ביצ'ין - שרותי הבריאות איו"ש.
מר ערמון, רוזנסקי, ג'ונן - מע"צ.
מר ש. קופילוב - רח' ישראלים 15 חי"א.



72 אל

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

18 ISRAEL'S ST. TEL-AVIV 64382, ISRAEL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 18, תל-אביב 64382

טל. 245294; 230870

TELEX: 35770-1 COIN IL

משרד הבינוי והשיכון
מפי בכורת בבורית, המשרד הראשי
18-08-1985
5/11/7

REF.: 26/1/29

DATE 8.8.85

לכבוד

ה"ה תא"ל א. בקנשטיין (סגן מתאם הפעולות בשטחים)
ד"ר ת.ה.טולצ'ינסקי (מתאם שרותי הבריאות בשטחים)
ד.אפרתי, מ.אהרון, צ.סער (מינהל אזרחי, יו"ש)
ד"ר י.סבר, י.שכטר, צ.אקר, ס.ביצ'ין (שרותי הבריאות, יו"ש)
א.גיל, ע.לוקסמבורג, א.ערמון, י.רוז'נסקי, א.גורביץ', ש.גרונך, פ.וייס (מע"צ)

א.ג.נ.

הנדון: בתי-חולים ביו"ש - עדכון לוחות זמנים

להלן דו"ח עדכון לוח זמנים (מתיחס לדו"ח קודם בנדון מס' 26/1/24 מתאריך 17.6.85). דו"ח זה מהווה סכום ביניים לפרויקטים השונים ביו"ש וכולל:

1. דוח מפורט עפ"י נושאים.

2. לוח זמנים - תרשים גנט (תאור גרפי).

דוח מפורט עפ"י נושאים

1. ביה"ח רמאללה

1.1 אגף הרנטגן

העבודה מתקדמת לפי לוח זמנים ומתוכננת להסתיים בסוף חודש זה למרות שנתקלנו בקשיים בהשלמת העבודה ע"י הקבלן העובד בשטח, עכובים של חב' אלסינט בהכנות ובהרכבת הציוד וכד'.

הו"ט - החומר למכרז נמצא בהדפסה. פרסום המכרז ומשך הביצוע כולל הרכבת הציוד צפויים להסתיים עד חודש 11/85.

שלוט - נמצא בשלב תכנון. השלמת התכנון, פרסום המכרז והביצוע צפויים להסתיים עד חודש 11/85.

1.2 אגף נתוחים, האזור הסטרילי

עבודות הכנה והקמה שונות מבוצעות בשטח. הציוד מגיע לביה"ח בימים אלו. צפוי שהעבודה תושלם לפי לוח הזמנים בחודש 11/85.

אין להחזיר
בתי-חולים
האבולוציה
אנשים קופילוב
16.8.

1.3 תכנית-אב

השלב הפרוגרמטי/אדריכלי הסתיים בעיקרו. הוחל בתכנית האב למערכות, ובמקביל - השלמת התכנון האדריכלי. השלמת תכנית האב צפויה לחודש 2/86.

1.4 אגף חדרי נתוח, אספקה סטרילית, בית מרקחת, מיון, מרפאות חוץ

שלב התכנון מתקדם לפי לוח הזמנים וצפוי להסתיים בחודש 2/86. בהתאם לפרוט המופיע בדו"ח הקודם (מתאריך 17.6.85 מס' 26/1/24) התכנון יבוצע ויושלם לפי סדרי קדימויות; החומר למכרז יוכן בהתאם. משך הבצוע לשלביו השונים מותנה בתקציבים שיועמדו לרשות מע"צ.

2. ביה"ח בית-ג' אלה

2.1 אגף הרנטגן

תחילת עבודת הקבלן נדחתה עקב אי פנוי אתר הבניה ע"י ביה"ח, בגלל חדר המיון באזור. בצוע העבודה יחל בעוד כשבועיים. משך הבצוע הצפוי 5½ חדשים. השלמת הפרויקט צפויה עד חודש 2/86.

2.2 אגף חדרי נתוח

התכנון הארכיטקטוני והכנת החומר למכרז מתקדמים לפי לוח הזמנים. השלמת התכנון והחומר למכרז צפויה עד חודש 12/85. פרסום המכרז ובחירת הקבלן - עד חודש 2/86, מותנה בהתחייבות תקציבית. משך הבצוע לפרויקט יהיה 10 עד 12 חדשים.

2.3 תכנית אב

גובש סופית צוות תכנית האב. הוחל בתכנון בשלב הפרוגרמטי/אדריכלי. לאור הערות ביה"ח לפרוגרמה שהוכנה בזמנו, צפוי ששלב זה יושלם עד 11/85. נושאי קונסטרוקציה ומערכות יגובשו בהתאם ללוח הזמנים וצפויים להסתיים בחודש 7/86.

3. ביה"ח חברון

3.1 אגף הרנטגן

הקפאת ההתקשרויות של הממשלה עכבה את חתימת חוזה עם קבלן. החוזה נחתם והעבודה החלה. משך הבצוע הצפוי כ 5½ חדשים. מסירת הפרויקט צפויה עד חודש 1/86. הכוונה היא להשלים בשלב ראשון את האזור החדש של האגף, לרבות התקנה והפעלה של המכונה החדשה ופרוק המכונה הקיימת. יתכן והשלב הראשון יסתיים לפני המועד המצויין.

3.2 אגף נתוחים - אזור סטריילי

עבודת ההקמה של האזור הסטריילי נסתיימה לפי לוח הזמנים.

3.3 השלמת מערכות לאזור הסטריילי ולאגף הנתוחים כולו

3.3.1 מערכת החשמל

בוצעה התקשרות חוזית עם הקבלן.

העבודה מתקדמת לפי לוח הזמנים וצפוי שתושלם עד 12/85.

3.3.2 מערכת מזג-אוויר

בוצעה התקשרות חוזית עם הקבלן.

העבודה מתקדמת לפי לוח הזמנים וצפוי שתושלם עד 12/85.

3.3.3 אספקת מיס, גזים וביוב

פרסום המכרז מתעכב עקב הדיון באפשרות הגדלת היקף מערכת הגזים והתאמתה לערכים העתידיים של ביה"ח.

יש להשלים ההחלטה תוך שבועיים על מנת שלא לעכב הפעלת אגף הנתוחים.

3.4 השלמת אגף הנתוחים ומחלקת אספקה סטריילית לביה"ח

לאור הערות אנשי ביה"ח עודכן התכנון האדריכלי.

צפוי שהתכנון הכולל יושלם עד חודש 11/85.

פרסום המכרז ובחירת קבלן צפויה עד 1/86.

השלמת הבעוה צפויה עד 6/86.

לוח זמנים מפורט יותר, המפריד בין השלמת אגף הנתוחים ומחלקת האספקה הסטריילית - יעודכן לקראת השלמת התכנון.

3.5 תכנית-אב

התכנון הפרוגרמט/אדריכלי בשלב מתקדם ואף הוצג בפני המשלחת האמריקאית.

צפוי שלב זה יגובש עד חודש 10/85, לפי לוח הזמנים.

שלב תכנון קונסטרוקציה והמערכות יגובש עד חודש 5/86.

4. ביה"ח רפידיה

4.1 רנטגן, בית מרקחת, מיון, אדמיניסטרציה ומרפאות חוץ

אושר התכנון האדריכלי-העקרוני. השלמת התכנון האדריכלי ותכנון המערכות ימשך עד חודש 1/86.

שלבי הבעוה המתוכננים (ראה מסמך מס' 27/1/9 מתאריך 11.6.85) מותנים

בהקצבות הכספיות. ניתן להשלים הפרויקט בתקופה של 12 עד 18 חדשים.

לוח הזמנים יעודכן עם גבוש התכנון וקבלת החלטות בנושא התקציבי.

4.2 תכנית-אב

נקבע צוות המתכננים לתכנית האב.
בצוע השלב הפרוגרמטי אדריכלי עפוי להתבצע במשך 4 חדשים עד חודש 12/85.
שלב נושא קונסטרוקציה ומערכות עפוי להתבצע תוך 8 חודשים עד חודש 7/86.

במבור רב,

שלמה קורנלוב

לוחות זמנים

חורש																	הפרויקט			
3/87	2/87	1/87	12/86	11/86	10/86	9/86	8/86	7/86	6/86	5/86	4/86	3/86	2/86	1/86	12/85	11/85	10/85	9/85	8/85	
1. ביה"ח רמאללה																				
1.1 רנטגן																				
כנון																				
בצוע																				
רהוט																				
1.2 ח. נחוח אזור סטרילי																				
בצוע																				
2.3 תכנית אב שלב פרוגרמטי/אדריכלי																				
הושלם בעיקרו לפי לוח																				
תכנית אב למערכות																				
1.4 אגף נחוח, אספקה סטרילית, ביה-מרקחת, מיון, מרמאות חוץ																				
כנון																				
בצוע																				
2. ביה"ח בית-ג' אלה																				
2.1 רנטגן																				
כנון																				
בצוע																				
2.2 אגף חדרי נחוח																				
כנון																				
מכרז																				
בצוע																				
2.3 תכנית אב שלב פרוגרמטי/אדריכלי																				
קונסטרוקציה ומערכות																				
3. ביה"ח חכרון																				
3.1 רנטגן																				
כנון																				
בצוע																				
3.2 אגף נחוחים																				
אזור סטרילי																				
3.3 השלמת מערכות לאזור הסטרילי																				
בצוע מע' חשמל רמ/א																				
מערכות גזים ואינסטלציה																				
3.4 השלמת קומת נחוחים ומחלקת אספקה סטרילית																				
כנון																				
מכרז																				
בצוע																				
3.5 תכנית אב פרוגרמטי/אדריכלי																				
שלב מערכות																				
4. ביה"ח רפידה																				
4.1 רנטגן, מיון, בית-מרקחת, אדמינסטרציה																				
כנון																				
מכרז וכיפוע																				
מותנה בהקצאת תקציבים																				
4.2 בית אב פרוגרמטי/אדריכלי																				
שלב מערכות																				

שלמה קופילוב

TEL: 245294; 230870
TELEX: 35770-1 COIN IL

ר"ח ישראל ס 300 ת"א אביב 44 382
משרד המידע והדפוס
8-08-1985
5/11/7

REF: 26/1/29

DATE 8.8.85

מחלקת עבודות צבוריות
המשרד הראשי
דואר לבנית מוסדות ממשלתי
לשכת מנהל האגף
19.8.85

לכבוד
ה"ה ת"א ל א.בקנשטיין (סגן מתאם הפעולות בשטחים)
ד"ר ת.ה.טולצ'ינסקי (מתאם שרותי הבריאות בשטחים)
ד.אפרתי, מ.אהרון, צ.סער (מינהל אזרחי, יו"ש)
ד"ר י.סנר, י.שכטר, צ.אקר, ס.ביצ'ין (שרותי הבריאות, יו"ש)
א.גיל, ע.לוקסמבורג, א.ערמון, י.רוז'נסקי, א.גורביץ', ש.גרנך, פ.וידיס (מע"צ)

א.ג.נ.א

הנדון: בתי-חולים ביו"ש - עדכון לוחות זמנים

להלן דו"ח עדכון לוח זמנים (מתיחס לדו"ח קודם בנדון מס' 26/1/24 מתאריך 17.6.85). דו"ח זה מהווה סכום ביניים לפרויקטים השונים ביו"ש וכולל:

1. דוח מפורט עפ"י נושאים.

2. לוח זמנים - תרשים גנט (תאור גרפי).

דוח מפורט עפ"י נושאים

1. ביה"ח רמאללה

1.1 אגף הרנטגן

העבודה מתקדמת לפי לוח זמנים ומתוכננת להסתיים בסוף חודש זה למרות שנתקלנו בקשיים בהשלמת העבודה ע"י הקבלן העובד בשטח, עכובים של חב' אלסינט בהכנות ובחרכבת הציוד וכד'.

רהוט - החומר למכרז נמצא בהדפסה. פרסום המכרז ומשך הביצוע כולל הרכבת הציוד צפויים להסתיים עד חודש 11/85.

שלוט - נמצא בשלב תכנון. השלמת התכנון, פרסום המכרז והביצוע צפויים להסתיים עד חודש 11/85.

1.2 אגף נתוחים, האזור הסטרילי

עבודות הכנה והקמה שונות מבוצעות בשטח. הציוד מגיע לביה"ח בימים אלו. צפוי שהעבודה תושלם לפי לוח הזמנים בחודש 11/85.

1.3 תכנית-אב

השלב הפרוגרמטי/אדריכלי הסתיים בעיקרו. הוחל בתכנית האב למערכות, ובמקביל - השלמת התכנון האדריכלי. השלמת תכנית האב צפויה לחודש 2/86.

1.4 אגף חדרי נתוח, אספקה סטרילית, בית מרקחת, מיון, מרפאות חוץ

שלב התכנון מתקדם לפי לוח הזמנים וצפוי להסתיים בחודש 2/86. בהתאם לפרוט המופיע בדו"ח הקודם (מתאריך 17.6.85 מס' 26/1/24) התכנון יבוצע ויושלם לפי סדרי קדימויות; החומר למכרז יוכן בהתאם. משך הבעוה לשלביו השונים מותנה בתקציבים שיועמדו לרשות מע"צ.

2. ביה"ח בית-ג' אלה

2.1 אגף הרנטגן

תחילת עבודת הקבלן נדחתה עקב אי פנוי אתר הבניה ע"י ביה"ח, בגלל חדר המיון באזור. בצוה העבודה יחל בעוד כשבועיים. משך הבעוה הצפוי 5½ חדשים. השלמת הפרויקט צפויה עד חודש 2/86.

2.2 אגף חדרי נתוח

התכנון הארכיטקטוני והכנת החומר למכרז מתקדמים לפי לוח הזמנים. השלמת התכנון והחומר למכרז צפויה עד חודש 12/85. פרסום המכרז ובחירת הקבלן - עד חודש 2/86, מותנה בהתחייבות תקציבית. משך הבעוה לפרויקט יהיה 10 עד 12 חדשים.

2.3 תכנית אב

גובש סופית צוות תכנית האב. הוחל בתכנון בשלב הפרוגרמטי/אדריכלי. לאור הערות ביה"ח לפרוגרמה שהוכנה בזמנו, צפוי ששלב זה יושלם עד 11/85. נושאי קונסטרוקציה ומערכות יגובשו בהתאם ללוח הזמנים וצפויים להסתיים בחודש 7/86.

3. ביה"ח חברון

3.1 אגף הרנטגן

הקפאת ההתקשרויות של הממשלה עכבה את חתימת חוזה עם קבלן. החוזה נחתם והעבודה החלה. משך הבעוה הצפוי כ 5½ חדשים. מסירת הפרויקט צפויה עד חודש 1/86. הכוונה היא להשלים בשלב ראשון את האזור החדש של האגף. לרבות התקנה והפעלה של המכונה החדשה ופרוק המכונה הקיימת. יתכן והשלב הראשון יסתיים לפני המועד המצויין.

3.2 אגף נתוחים - אזור סטרילי

עבודת ההקמה של האזור הסטרילי נסתיימה לפי לוח הזמנים.

3.3 השלמת מערכות לאזור הסטרילי ולאגף הנתוחים כולו

3.3.1 מערכת החשמל

בוצעה התקשרות חוזית עם הקבלן.

העבודה מתקדמת לפי לוח הזמנים וצפוי שתושלם עד 12/85.

3.3.2 מערכת מזג-אוויר

בוצעה התקשרות חוזית עם הקבלן.

העבודה מתקדמת לפי לוח הזמנים וצפוי שתושלם עד 12/85.

3.3.3 אספקת מים, גזים וביוג

פרסום המכרז מתעכב עקב הדיון באפשרות הגדלת היקף מערכת הגזים והתאמתה

לצרכים העתידיים של ביה"ח.

יש להשלים ההחלטה תוך שבועיים על מנת שלא לעכב הפעלת אגף הנתוחים.

3.4 השלמת אגף הנתוחים ומחלקת אספקה סטרילית לביה"ח

לאור הערות אנשי ביה"ח עודכן התכנון האדריכלי.

צפוי שהתכנון הכולל יושלם עד חודש 11/85.

פרסום המכרז ובחירת קבלן צפויה עד 1/86.

השלמת הבצוע צפויה עד 6/86.

לוח זמנים מפורט יותר, המפריד בין השלמת אגף הנתוחים ומחלקת האספקה

הסטרילית - יעודכן לקראת השלמת התכנון.

3.5 תכנית-אב

התכנון הפרוגרמט/אדריכלי בשלב מתקדם ואף הוצג בפני המשלחת האמריקאית.

צפוי ששלב זה יגובש עד חודש 10/85, לפי לוח הזמנים.

שלב תכנון קונסטרוקציה והמערכות יגובש עד חודש 5/86.

4. ביה"ח רפידה

4.1 רנטגן, בית סרקחת, מזון, אדמיניסטרציה ומרפאות חוץ

אושר התכנון האדריכלי-העקרוני. השלמת התכנון האדריכלי ותכנון המערכות

ימשך עד חודש 1/86.

שלבי הבצוע המתוכננים (ראה מסמך מס' 27/1/9 מתאריך 11.6.85) מותנים

בהקצבות הכספיות. ניתן להשלים הפרויקט בתקופה של 12 עד 18 חדשים.

לוח הזמנים יעודכן עם גבוש התכנון וקבלת החלטות בנושא התקציבי.

4.2 תכנית-אב

נקבע צוות המתכננים לתכנית האב.

בצוע השלב הפרוגרמטי אדריכלי עפוי להתבצע במשך 4 חדשים עד חודש 12/85.

שלוש נושא קונסטרוקציה ומערכות צפוי להתבצע תוך 8 חודשים עד חודש 7/86.

בסביו רב,

שלמה קרעלוב

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: י"ט באב תשמ"ה
6 באוגוסט 1985

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
כ א נ

5/11/7

מספר:

הנדון: פיתוח כתי חולים הממשלתיים
באזור יהודה ושומרון

הנבי מוצא לנכון להביא לידיעתך תוכן מכתב מס' ק-178/85 מיום 24.7.85 מאת המינהל האזרחי לאיו"ש, קצין מטה הבריאות אל סגן מנהל מע"צ (בבנינים), צלמו מע"ב.

כ ב ר כ ה,

ט. שניידר
מ"מ מנהל מע"צ

העוק:
מר גיל, כאן
חיק ת'

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: אב תשס"ה
5
1985 אוגוסט
מספר: 5/11/7

אלו מהנדס מחוז ירושלים, מע"ץ

הנדון: בתי חולים ביהודה ושומרון - דוח כספי
סימוכין: מכתב מיום 25.7.85

מאשר קבלה מכתבכם שבסימוכין.

אודה לך אם חומר זה יועבר אלי בצורה סטורטת יוהר לצורך הכנת דו"ח כנדרש ע"י המסמין.

לנוחותכם מצ"ב דוגמה טבלה שהוכנה ע"י משרד קומילוב למטרה זו.
נא פעולתכם בהתאם.

ב ב ב ב

א. בולדלגר אינג'
מהנדס ראשי לביצוע

העמק: טר ש. קומילוב, רחוב ישראלים 15 הל-אביב מיקוד 64382
מחלקת ביצוע

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

אל: מהנדס ראשי בניה
מהנדס ראשי ביצוע

תאריך: יד' באב תשמ"ה
4 באוגוסט 1985

מסמך: 5/11/7

הנדון: כתי חולים ביו"ש - תכנון קונסטרוקציה
בדיקות מוקדמות

סכמתי כדלקמן:

הבדיקות באחריות מהנדס ראשי בניה שיפעיל לשם כך את משרד
ש. קופילוב.

את עבודות החפירה/החציבה/הסיתות וכדומה לגילוי יסודות,
קורות, עמודים, תקרות, זיון ועוד יבצעו פועלי מע"צ באישור
יהודה ושומרון (שמשרדו הראשי הוא בשכונת שיח' גראח בירושלים
על יד תמטה הארצי של המשטרה). (טלפון 272896/7).

העבודות בבתי"ח רמאלה, בית ג'אלה וחברון יבוצעו באחריותו
של מפקח מע"צ אברהם מזרחי (שמושב במשרד הראשי כנ"ל) העבודה
בבתי"ח שכס תבוצע באחריותו של מהנדס הג' איברהים במע"צ שכס
(על יד הממשל הצבאי) (053-70016)

בסוף העבודה תגיש מע"צ יו"ש לשלמה קופילוב את החשבון ותוא
יאשר אותו ויגיש למהנדס ראשי לביצוע (בניכים) להעברת התקציב
למע"צ יו"ש.

ב ב ר כ ה

העתק: מע"צ יו"ש - לשיחתו מיום 4.8.85 עם
דוד דהאן ואברהם מזרחי.
סגן מנהל מע"צ
מר ש. קופילוב, רח' ישראלים 15, ת"א. ומנהל האגף לבניה
מוסדות ממשלה

SECRET
NO FORN DISSEM
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED
NO UNCLASSIFIED

SECRET
NO FORN DISSEM

SECRET
NO FORN DISSEM

SECRET

SECRET
NO FORN DISSEM

SECRET

SECRET
NO FORN DISSEM

SECRET
NO FORN DISSEM

SECRET
NO FORN DISSEM

SECRET
NO FORN DISSEM

9/9 מ א תש"ב 5 א. 5

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

13.8.85
11.8.85
טניצר
המפקח
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

תאריך: י"ד באב תשמ"ה
1 באוגוסט 1985
5/11/7
מספר:

אלו:
סגן אדריכל ראשי - גב' גורן
מנהל ראשי בניה
מנהל ראשי מערכות
מנהל ראשי ביצוע
סגן מנהל מחוז ירושלים, מע"צ
משרד קופילוב, רח' ישראלים 15, מ"א.

הנדון: עבודות שונות בבני-חולים ביו"ש הכנון והשלכות על הביצוע

מעיון בירחוי'ת מתקבל אבלי הרושם, ויהאן שהוא פוטעה במקצה, שלא ניהנה מטטיק השומה הלב להשלכות האופרטיביות של ההכנון על אפשרויות הביצוע של הקבלן בהחשב שזה מבנה בו מחקיימת מעילות שוטפת וכן על התגבלות והתפרקות שיחולו במעילות זו. אילוים אלה מחייבים בדיקת חלופות שונות וקבלת החלטה מבוקרת, שקולה ומנומקת. את כל אלה רצוי להעלות גם על הכתב.

אבקש לשתף בכך גם את סגן מנהל מחוז ירושלים ולהקטין ככל האפשר את השינויים העשויים לצדף בזמן הביצוע.

בברכה,

א. גיל
סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניה
מוסדות ממשלה

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

גב' גונן
152

אל:

תאריך: יד' באב תשמ"ה
1 באוגוסט 1985
מספר: 5/11/7

סגן אדריכל ראשי - גב' גונן
מהנדס ראשי בניה
מהנדס ראשי מערכות
מהנדס ראשי בליוע
סגן מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ
משרד קופילוב, רח' ישראלים 15, ת"א.

הנדון: עבודות שונות בבתי-חולים כיו"ש תכנון והשלכות על הביצוע

מעיון בדוחו"ת מתקבל אצלי הרושם, ויתכן שהוא מוטעה במקצת, שלא ניתנה מספיק תשומת הלב להשלכות האופרטיביות של התכנון על אפשרויות הביצוע של הקבלן בהתחשב שזה מבנה בו מתקיימת פעילות שוטפת וכן על ההגבלות וההפרעות שיחולו בפעילות זו. אילו צימם אלה מחייבים בדיקת חלופות שונות וקבלת החלטה מבוקרת, שקולה ומנומקת. את כל אלה רצוי להעלות גם על הכתב.

אבקש לשתף בכך גם את סגן מהנדס מחוז ירושלים ולהקטין ככל האפשר את השינויים העשויים לצוץ בזמן הביצוע.

כ ב ר כ ה ,

א. גיל
סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

אל:

סגן אדריכל ראשי - גב' גונן
מהנדס ראשי בניה
מהנדס ראשי מערכות
מהנדס ראשי ביצוע
סגן מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ
משרד קופילוב, רח' ישראלים 15, ח"א.

תאריך: יד' באב תשמ"ה
1 באוגוסט 1985
מספר: 5/11/7

הנדון: עבודות שונות בתי-חולים ביו"ש תכנון
והשלכות על הביצוע

מעיון בדוחות מתקבל אצלי הרושם, ויתכן שהוא מוטעה במקצה,
שלא ניתנה מספיק תשומת הלב להשלכות האופרטיביות של התכנון
על אפשרויות הביצוע של הקבלן בהתחשב שזה מבנה בו מחקימה
פעילות שוטפת וכן על ההגבלות וההפרעות שיחולו בפעילות זו.
אילו ציטט אלה מחייבים בדיקה חלופות שונות וקבלת החלטה מבוקרת,
שקולה ומנומקת. את כל אלה רצוי להעלות גם על הכתב.

אבקש לשתף בכך גם את סגן מהנדס מחוז ירושלים ולחקטין ככל
תאפשר את השינויים העשויים לצוץ בזמן הביצוע.

ב ת ר כ ה ,

א. גיל
סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניה
מוסדות ממשלה

CONFIDENTIAL
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
PROCESS

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area. This information is being provided to you for your information only and should not be disseminated to other personnel.

CONFIDENTIAL
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
PROCESS

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

The [redacted] is a [redacted] organization that has been active in the [redacted] area since [redacted]. The [redacted] has been identified as a [redacted] organization and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] has been identified as a [redacted] organization and is currently active in the [redacted] area.

This document contains information that is [redacted] and is being provided to you for your information only. This document contains information that is [redacted] and is being provided to you for your information only.

CONFIDENTIAL
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION
PROCESS

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: יג' באב תשמ"ה
31 ביולי 1985
מספר:

אל: מהנדס ראשי מערכות
משרד קופילוב, רח' ישראלים 15, ת"א.

הנדון: בתי חולים באיזור יו"ש - תכניות אב למערכות

אבקש שתבנתן גם תשומת לב לנושא האחזקה בעתיד (כח אדם, תקציבים) וששקולים אלה יובאו בחשבון בהימוש אחר הפתרון הנכון. הדיבר צריך גם להרשם בפרוטוקולים.

בברכה,

א. גיל
סגן מנהל מ"צ
ומנהל האגף לבניית
מוסדות ממשלה

א.א.א

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

מחלקת עבודות ציבוריות - המשרד הראשי
האגף לבניה מוסדות ממשלה
ח.ד. 3198, ירושלים 91131, טל' 277290 - 02

ירושלים 30785

מס' 5/11/7

לכבוד
צ"ר ברנט
ד"ר הנריקו איוף 64
וולסהוף

א.א.א

הנדון: הסכם מע"ב/ח/ 26/85
התיאום ג'ו.י.ס רמאלסה קוואלסה, תהרון

מפורטים בזה 5 עותקים של ההסכם בנדון. נא לחתום ולהטביע מס בולים במשרד האוצר על המקור בסך מייקבע ועוד בול בסך 1 שקל על העתק הראשון.

אופן החתימה: בכל דף בצד המודפס כמסונה או הכתוב ביד וכן בחתימה - בראשי היבות ובדף האחרון - חתימה מלאה במקום המיועד.

נא להחזיר ליחידה ההתקשרויות במשרדנו את כל העותקים בהקדם, בטרופ הצלום פוליסת הבטוח המפצועים, בהתאם לסעיף 16, בחוזה התכנון.

בכבוד רב

ב/א.א.א
דוד כץ ראשי

העתק:
מח' אדריכלות - יחידת התקשרויות
לתיק הבניין



משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

תאריך: ז' באב תשמ"ה
25 ביולי 1985

מספר:

אל: מר א. גולדשלגר
מהנדס ראשי לביצוע
מע"צ המשרד הראשי
ירושלים

הנדון: בתי חולים ביהודה ושומרון - דו"ח כספי.
הנזכר: פגישתך עם גב' וייס ל. ג. פ.

להלן פירוט הוצאות ל-30.6.85 לבתי חולים הנ"ל.

א. בי"ח חברון - בבית שלד וחדרי נהנה מתועשים.

סה"כ הוצאות:

1.	עבודות שלד של הקומה הנוספת (כוצע ע"י קבלן בן גיאח).	90,811,239.-
2.	חדרי נהנה מתועשים (כוצע ע"י פ. ח. ח. הסכום הנ"ל הועבר לאפסנאות במשרד הראשי).	199,000,000.-
3.	תכנון אדריכלות (אדריכל ב. צפור).	11,667,679.-
4.	תכנון קונסטרוקציה (משרד צ. ברזי"ק).	1,195,392.-
5.	תכנון מזוג אויר (משרד איצקוביץ' שפירא - האן).	637,719.-
6.	תכנון חשמל (משרד גלעד).	257,461.-
7.	עבודת הארט ופקוח (מר ש. קופילוב).	1,795,507.-
8.	עבוד פיקוח חדרי נהנה מתועשים הועבר למשרדך.	10,000,000.-
9.	הוצאות עבור העתקי שמש	125,475.-
10.	הועבר למשרד הראשי לפי בקשתם (פרטים לא ידועים לי).	24,000,000.-
11.	הומרים שונים.	217,277.-

5.8.85
5/11/7

STATE OF TEXAS

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE
DALLAS, TEXAS

DEPARTMENT OF REVENUE
DALLAS, TEXAS

TO THE COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE
DALLAS, TEXAS

RECEIVED
MAY 15 1901

RECEIVED FROM THE STATE OF TEXAS
MAY 15 1901

STATE OF TEXAS
MAY 15 1901

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מחוז ירושלים

תאריך:

- 2 -

מספר:

28,399.-	מכון התקנים	.12
" 14,309,512.-	הוצאה מע"צ	.13
" 165,224.-	רכב שכור (עבור המפקח)	.14
<u>" = 354,045,650.-</u>	סה"כ הוצאות עד 30.6.85	

" 559,547,580.- עד עכשיו קיבלנו
" 205,501,930.- ועומדה לרשותינו יתרה של

ב. בית הוליס חברון - שיפוץ מכון רנטגן.
התקבלה התחייבות בסך - 142,000,000 שקל
עד 30.6.85 לא היו הוצאות.

ג. בית הוליס חברון - רהוט עבור מכון רנטגן.
התקבלה התחייבות בסך - 3,000,000 שקל
עד 30.6.85 לא היו הוצאות.

ד. בית הוליס בית ג' אלה - שיפוץ מכון רנטגן.
התקבלה התחייבות ע"ס - 204,000,000 שקל
עד 30.6.85 לא היו הוצאות.

ה. בית הוליס רמאללה - שיפוץ מכון רנטגן.
היות והעבודה עומדה להסתיים ישלח דו"ח
מפורט עם סיום העבודה.

בכבוד רב,

א. ס. לוקסמבורג
עדה לוקסמבורג
ס/מהנדס המחוז
ב/מהנדס המחוז

העמק: גב' רייס פנינה

ט/22

STATE OF ...
COUNTY OF ...

11.
12.
13.

...
...

14. ...
...
...

15. ...
...
...

16. ...
...
...

17. ...
...
...

...

...

...



משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
מס' תיק 4-08-1005
תאריך 24.7.85
מס' תיק 178/85

2) מ"מ 4-08-1005
מ"מ 4-08-1005
25.8
לכבוד

תאריך 24.7.85
מס' תיק 178/85

מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
האגף לכביח מוסדות ממשלה
ל-ית מנהל היגוף
נכנס ביום 4.8.85

מר א. גיל, ס/מנהל מע"צ
דמנהל האגף לבנית מוסדות ממשלה
מע"צ משרד ראשי
ירושלים

מר גיל הנכבד,

Handwritten notes and signatures on the left side of the document.

Handwritten signature and date 5/8/85.

הנדון: הערכה והוקרה על פעילות מע"צ למען קידום ופיתוח בתי החולים הממשלתיים באזור יהודה ושומרון

Handwritten signature and date 29/8/85.

ברצוני להביע תודתי והערכתי על עזרתכם בקידום הפרוייקטים השונים בבתי החולים באיו"ש.

המעורבות הנמרצת של מחלקת עבודות ציבוריות החלה לפני כשנתיים, ומאז אני עד לשיפור ניכר ברמת התכנון של כל הפרוייקטים ובאיכות העבודה של הפרוייקטים שהגיעו לכלל ביצוע.

תרומתכם ניכרת גם בקידום ללא לאות של הפרוייקטים השונים וכן בחסכוניות כספיים ע"י תכנון יעיל ואופטימלי.

ברצוני לציין את גורמי מע"צ במשרד ראשי ובמחוז ירושלים, איתם אני נמצאים במגע ישיר ומדוק, לרבות ש. גונן, י. רוז'נסקי, א. גולדשלאגר ועוזריהם בנושאי תכנון; ע. לוכסבורג, פ. נייס ועוזריהם בנושאי ביצוע, וכן את ש. קופילוב ועוזריו - מנהלי ומרכזי הפרוייקטים מטעמכם.

אני גם יודע שאתה מעורב אישית בעבודותיננו השונות, בקידום הנושאים ובהחלטות רבות - ועל כך נבונה לך תודתי האישית.

ב ב כ ה
ד"ר י. סבר
קמ"ט בריאות
במינהל האזרחי לאיו"ש

העתקים:
תא"ל א. בקנשטיין - סגן מתאם הפעולה בשטחים.
אל"מ פ. זך - תאום הפעולה בשטחים.
אל"מ א. סנה - ראש המינהל האזרחי לאיו"ש.
ד"ר ת. טולצ'ינסקי - מתאם פעולות משרד הבריאות בשטחים.

Handwritten notes in the top left corner, including a circled '1' and some illegible scribbles.

DEPT. RECEIPT
NO. 80-A

RECEIVED
DATE 28-11-19

Faint printed text, likely a header or form label, mostly illegible.

THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, this 28th day of November, 1919.

Main body of the document containing several paragraphs of faint, mostly illegible text. The text appears to be a legal or official document, possibly a receipt or a contract, but the specific details are too faded to read accurately.

Handwritten text at the bottom right, possibly a signature or date.

Additional faint text at the bottom left, possibly a footer or a list of items.



משרד הביטוי והבריאות
 מ"עבודות צבאיות, המשרד הראשי
 מס' תיק 1008-4
 מחלקת עבודות צבאיות
 המשרד הראשי

24.7.85

תאריך

178/85 - 7

מחלקת עבודות צבאיות

המשרד הראשי

האגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

4.8.85

צבאית ביום

לכבוד

מר א. גיל, ס/מנהל מי ע

דמנהל האגף לבניית סו דרת ממשלה

מע"צ משרד ראשי

ירושלים

מר גיל הנכבד,

פאסול כאל

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

מ/אגף לביצוע מוסדות ממשלתי

ליחידת מנהל היגום

הנדון: הערכה והוקרה על פעילות מע"צ למען קידום ופיתוח בתי החולים הממשלתיים באזור יהודה ושומרון

ברצוני להביע תודתי והערכתי על עזרתכם בקידום הפרוייקטים השונים בבתי החולים באי"ש.

המערבות הנמרצת של מחלקת עבודות ציבוריות החלה לפני כשנתיים, ומאז אני עד לשיפור ניכר ברמת התכנון של כל הפרוייקטים ובאיכות העבודה של הפרוייקטים שהגיעו לכלל ביצוע.

תרומתכם ניכרת גם בקידום ללא לאות של הפרוייקטים השונים וכן בחסכוניות כספיים ע"י תכנון יעיל ואופטימלי.

ברצוני לציין את גורמי מע"צ במשרד הראשי ובמחוז ירושלים, איתם אני נמצאים במגע ישיר ורבות ש. גונן, י. רוז'נסקי, א. גולדשלאגר ועוזריהם בנושאי תכנון, ע. לוכסבורג, פ. וייס ועוזריהם בנושאי ביצוע, וכן את ש. קופילוב וצוותו - מנהלי ומרכזי הפרוייקטים מטעמכם.

אני גם יודע שאתר מעורב אישית בעבודותינו השונות, בקידום הנושאים ובהחלטות רבות - וע" כן נצונו לי תודתי האישית.

6/9: ביאור
 (2) עמרי האזנסקי
 נא לה

ב ב ר כ ה
 ד"ר י. סנר
 קמ"ט בריאות
 במינהל האזרחי לאי"ש

נא להעביר לי
 3 קולומים: איון
 הקולומים
 סני'ר

27.8.85
 העתרים
 תא"ל א. גהנשטיין - סגן מתאם הפעולה בשטחים.
 אל"ם פ. זר - תאום הפעולה בשטחים.
 אל"ם א. סנר - ראש המינהל האזרחי לאי"ש.
 ד"ר ת. טולצ'ינסקי - מתאם פעולות משרד הבריאות בשטחים.

ל. מ. ש.

REF.: 26/1/28

DATE: 19.7.85



לכבוד
מר א. גיל
סגן מנהל מע"צ
משרד ראשי
ירושלים

..א.ג.

Handwritten signature/initials on the left margin.

הנדון: פרויקטים בבתי-חולים ביו"ש - הכנת תכניות
ואומדנים לעורך גיוס כספים

בהמשך לשיחתנו בנושא, נתבקשתי ע"י י. שכטר להכין חומר עבור גיוס כספים
בארצות ערב, עבור פרויקטים שונים ביו"ש.

החומר יכלול את הפרטים הבאים:

1. תכניות אדריכליות 1:50 של כל הפרויקטים וכך תכניות כלליות של תכניות
האב השונות.
התכניות תהיינה עם כתיבה באנגלית; ללא כתיבה בעברית; ללא כותרות אורגינליות;
עם כותרות שתכלול את שם הפרויקט בלבד.

2. אומדן כספי משוער לבצוע הפרויקטים השונים אשר אינם ממומנים כיום.

אבקש את אשורכם להפעיל את האדריכלים של הפרויקטים השונים לבצוע סעיף 1 לעיל,
וכך אשור לבצע העתקות של סמי-אורגינלים על מנת להקטין את עבודה המטכננים.

משרדי יכין את האומדנים הכספיים, וזאת בהתבסס על האומדנים שגובשו לפרויקטים
השונים.

בברכה,
שלמה קופילוב

העתקים:

ה"ה ד"ר י. סבר, י. שכטר - שרותי הבריאות, יו"ש

ש. גונן, ס/אדריכל ראשי - מע"צ



תאריך: 4.7.85
סדר: 354/85

לכבוד
מר רוז'נסקי
סגן מהנדס ראשי למערכות
מע"צ ירושלים

מחירוקאלה

shuk

תאריך: 18.7.85

הנדון: מערכות גזים רפואיים באיו"ש

1. בכל בתי החולים קיימים מערכות גזים רפואיים ומדובר אך ורק בהגדלות של אותה מערכת עם ניצול כל האביזרים הקיימים.
2. כל המערכות בוצעו ע"י חברת "זילברמן", ומתפקדים לשביעות רצוננו והשירות מעולה.
3. כמהנדס האחזקה של המערכת אני פונה אליך ומבקש להמשיך הגדלת מערכות עם אותה חברה כדי למנוע בעיות בעתיד בגלל התערבות של חברה נוספת ובו מדובר במערכת של חיי אדם שמסוגלת להשביח בית חולים.
4. נא להתחשב במרחק של מתן השירות, זמן נסיעה וכדי למנוע שבאותו זמן לא נצטרך להזמין שתי חברות לצורך טיפול במערכת אחת. שלא לדבר על החקציב המוגבל שנימצא ברשותינו.

בכבוד רב
סלומון ביצרון
מנהל שרותים טכניים
בשרותי הבריאות איו"ש

מחירוקאלה 19.7.85

העתק: קמ"ט בריאות
יוסי שכטר
שלמה קופילוב

גב' עדה לוכסמבורג - מע"צ י-ם

יש לקבל את הנסח באלקטרוניקה
ולשלוח את התקנים למחלקת
המספר אינה מדויקת מאד ביחס למערכת
הק"מא אספר בהתאם לזמן במידת כו
נדרש 3 או 3 מתוצרת גילמן - בהתאם
למערכת הק"מא. 18.7.85 תאריך:

המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
 סניף סמ"ה - כבידות פמ"ח, המשרד הראשי
 תאריך: 23.7.85
 מס' תיק: 388/85
 שם: שליף שליף

לכבוד
 מר גיל
 סגן מנהל מע"צ ראשי
 ירושלים

מחלקת עבודות צבאיות

המשרד הראשי

האגף לבניית מוסדות ממשלה

לשכת כוחל האגף

2.8.85

בנוס' בית

הנדון: חדרי ניתוח מתועשים

1. בלימוד יסודי של חדרי ניתוח מתועשים התברר לי שבעתיד הקרוב יתעוררו בעיות עם הצורך למתן שרות לחדרים הנ"ל.
2. יהיה צורך בפניה לחברה ישראלית המייצגת את היצרן של חברה שבונה את החדרים.
3. לצורך זה אבקש להעביר אלי בהקדם האפשרי את שם החברה, כתובת ומספר טלפון של נציג ישראלי שמייצג את החברה האנגלית.
4. אודה לך מראש על תשובתך.

<p>כוחל</p> <p>שליף שליף</p> <p>5/8/85</p>	<p>שילוח אל:</p> <p>למנהל</p> <p>4/8/85</p>
--	---

בכבוד רב
 סלומון ביצי'ן
 מנהל שרותים טכניים
 בשרותי הבריאות איו"ש

העחק: קמ"ט בריאות
 אמרכל בריאות
 גב' עדה לוכסמבורג
 רע"ן מו"ש

CHRYSLER CREDIT CORPORATION
100 WALL STREET
NEW YORK, N. Y. 10038
YOUR COPY 18-8-6

DATE	AMOUNT

מדינת ישראל

משרד סגן מתאם הפעולות
 הכטחון ביהודה שומרון וחבל עזה
 תאריך: 28 יוני 85
 מספר: גמ/2 (11) 780

מ-ג-ב ל

- מינהל אזרחי איו"ש/רע"נ מו"ש
 מתאם הפעולות באיו"ש ובאזח"ע
 מ"מ סגן רמ"א איו"ש
 ד"ר טולצ'ינסקי - מתאם פעולות משרד הבריאות
 מר ש. קופילוב - מהנדס יועץ
 גב' שרה בונן - מע"צ, סגן אדריכל ראשי
 מר אבירם גיל - מע"צ, סגן מנהל
 מר י. ויסברג - האוצר/את"ק
 מינהל אזרחי איו"ש/קמ"ט אוצר
 מינהל אזרחי איו"ש/קמ"ט בריאות
 מינהל אזרחי איו"ש/יח' קמ"ט בריאות - אחות ראשית
 מינהל אזרחי איו"ש/אמרכל בריאות
 מר י. זכאי - תפ"ש
 101
 105

הנדון: פיתוח בתי חולים באיו"ש

כ ל ל

Handwritten signature/initials

1. ב - 20 יוני 85 נערך דיון בנושא בראשות סגן מתאם הפעולות באיו"ש ובאזח"ע תא"ל אריה בקנשטיין ובהשתתפות:-
- א. ד"ר ת. טולצ'ינסקי - מתאם פעולות משרד הבריאות.
 - ב. סא"ל ציון טעד - איו"ש/רע"נ מו"ש.
 - ג. גב' שרה בונן - מע"צ/סגן אדריכל ראשי.
 - ד. מר שלמה קופילוב - הנדסה וניהול.
 - ה. ד"ר יצחק סבר - איו"ש/קמ"ט בריאות.
 - ו. מר מנשה אהרון - איו"ש/קמ"ט אוצר.
 - ז. מר אבירם גיל - סגן מנהל מע"צ.
 - ח. גב' צילה אקר - איו"ש/יח' בריאות - אחות ראשית.
 - ט. מר יוסי שכטר - איו"ש/אמרכל בריאות.
 - י. סא"ל דהאן שלמה - תפ"ש/רע"נ מו"ש.

2. הדיון נועד לקבלת תמונת מצב על תהליך פיתוח בתי החולים הממשלתיים באיו"ש מבחינת תכניות ביצוע, שלבים ולוח זמנים והעברות תקציביות בהתאם.

פרויקטים בבתי - חולים

3. רמאללה:-

- א. אגף רנטגן - לו"ז לסיום העבודות - אוג' 85. עד כה הועברו 232.3 מיליון שקל ב - 3 שנות תקציב (83 - 85) מתוך זה בשנת 85 - 70 מיליון שקל.
- ב. אגף ניתוחים - אזור סטרילי - הרחל בביצוע יושלם לקראת אוק' - נוב' 85, ניתן יהיה להתחיל בביצוע ניתוחים בסוף שנת 85. מימון הביצוע כ - 85.000 דולר מהאגודה.
- ג. תכנית אב - עפ"י התכנית תפוסת ביה"ח תגדל מ - 132 מיטות ל - 167 מיטות. תכנית בנית אגף נפרד שישמש מרפאות חוץ. עד כה הועברו 77 מיליון שקל ב - 3 שנות תקציב (83 - 85), מתוך זה בשנת 85 - 73 מיליון שקל. מחצית מעלות התכנון ממומנת ע"י האגודה. יודגש כי בצורת הכנת תכנית האב משתתפים רופאים מקומיים.
- ד. אגף ניתוחים - מיון, בית מרקחת, אספקה סטרילית, ארכיב מרכזי - חדר מיון יושלם לקראת דצמ' 85 המשך העבודות לאחר השלמת מרפאות החוץ.

מדינת ישראל

משרד
סגן מתאם
ביהודה שומרון וחבל עזה
הכטחון
הפעולות
תאריך:
מספר:

מ ו ג ב ל

- 2 -

4. בית ג' אלה

- א. אגף רנטגן - פורסם מכרז המכשירים נמצאים. משך ביצוע כ - 5.5 חודשים. סיוע של UNDP לאחר פניית האזור, עד כה הועברו 241.8 מיליון שקל ב - 3 שנות תקציב (83 - 85) מתוך זה בשנת 85 - 121.5 מיליון שקל.
- ב. אגף חדדי ניתוח - בשלבי תכנון ע"י מהנדס מקומי. בשנת 84 הועבר סכום של 16.5 מיליון שקל.
- ג. תכנית אב - להגדיל תפוסה כללית ל - 134 מיטות תוך הפעלת מחלקות יחודיות לכלל האזור כגון: מח' אונקולוגיה, חירוגית ילדים. בשנת 85 הועבר סכום של 12 מיליון שקל.

5. חברון

- א. אגף רנטגן - הושלם התכנון ופורסם המכרז. בימים אלה הוחל בביצוע שימשך כ - 5.5 חודשים. עד כה הועברו 176.2 מיליון שקל ב - 3 שנות תקציב (83 - 85) מתוך זה בשנת 85 - 121.5 מיליון שקל.
- ב. אגף ניתוחים, אזור סטריילי - הושלם ונמסר באפר' 85. במהלך 3 שנות התקציב (83 - 85) הועבר סך של 784 מיליון שקל, מתוך זה בשנת 85 - 324 מיליון שקל.
- ג. מערכות לאגף ניתוחים - בשלבי תכנון סופיים לקראת אישור. משך הביצוע כ - 5.5 חודשים עד ינוי 86.
- ד. שיפוץ אגף הניתוחים והקמת מחלקת אספקה סטריילית - ישולב בתהליך השלמת שאר העבודות באגף זה. השלמת תכנון עד נוב' 85 והביצוע עד מאי 86.
- ה. תכנית אב - תוגדל תפוסת בית החולים ל - 100 מיטות. התכנון יושלם לקראת סוף שנת 85 והשלמת הביצוע עד מחצית שנת 86. בשנת 85 הועבר סכום של 13.3 מיליון שקל.

6. רפידיה/שכס

- א. מחלקות רנטגן, מיון, מרפאות חוץ - תנתן עדיפות להפעלת מכון הרנטגן. התכנון העקרוני אושר, השלמת התכנון כולל המערכות השונות ימשך עד ינו' 86. כד כה הועבר ב - 2 שנות תקציב 84 - 85 סך של 51.8 מיליון שקל מתוך זה בשנת 85 הועבר סכום של 40.3 מיליון שקל.
- ב. בית מרקחת ואדמיניסטרציה - נמצא בשלבי תכנון עם מע"צ.

7. בי"ח לחולי נפש/בית לחם

- א. ריהוט למחלקה כרונית - נמצא בתהליך השלמת הריהוט למחלקה הכרונית. עד כה הועבר ב - 2 שנות תקציב (84 - 85) סכום של 64.5 מיליון שקל, מתוך זה בשנת 85-83 מיליון שקל.
- ב. עבודות גמר כולל מערכת חשמל (גם חיצונית) - יושלם בהתאם לתכנית הכללית ע"י קמ"ט שיכון.

סיכום

8. לפיתוח בתי החולים הממשלתיים באיו"ש ניתנו בתקציב 85 סכומים ניכרים ומשמעותיים היכולים להציע את תחום הרפואה מספר צעדים קדימה.
9. הן בשלבי התכנון והן בשלבי הביצוע קיימת חשיבות כאשר מערכת זו תבוא לידי ביטוי והפעלה מירביתם שהיקף האישפוזים בישראל ילך ויקטן ויאפשר הקצאת משאבים נוספים לפיתוח עתידי.

מדינת ישראל

משד
סגן מתאם הפעולות
כיהודה שומרון וחבל עזה
תאריך:
מספר:

מ ר ג ב ל

- 3 -

10. מאחר והפרוייקטים מתבצעים בבתי החולים השונים במקביל יש לוודא שהזמנת העיוד וקבלתו תתבצע עפ"י מועדי הסיום של כל שלב ושלב ולהמנע, עד כמה שניתן, ממצב בו העיוד קיים ולא ניתן להפעילו בשל אי השלמת הבינוי/המערכות הדרושות.

11. קבלת סיוע מארגונים בינ"ל (כגון: UNDP) יתאפשר לאחר קבלת מכתב מפורט בהתאם למקובל.

ב ב ר ס ה

דהאן שלמה
רע"ג
סא"ל
מר"ש

דש/דב


התאריך 28.6	אל: ל ש ג
חיק מס'	מסמך: א. ערסון אדניל ראשי סניף

הנדון:

פגוע ואל קפולא

הפגוע הפק עשו לו כעג
 אלא - עם אלוטו כפולא
 אלוט, ואלא עשו הפג
 שפולא אוניו קווה פול.
 פול עשו עשו
 אלו קפולא (במיוולד שאלו קפולא
 או, אלו קפולא "איוולד" גולא.

(Handwritten signatures and scribbles)





משרד הביטחון והבריאות
 מנ"ח פיקודת צבאית, המשרד הראשי
 24-06-1985
 5/11/7
 מסי החייק

תאריך: 18.6.85
 تاریخ: 121/85 - ק

[Handwritten signature]

מחלקת עבודות צבאיות
 המשרד הראשי
 דאגה לבניית מוסדות ממשלה
 לשכת עזרת האגף
 24-6-85

לכבוד
 מר שלמה קנפילוב,
 הנדסה וניהול בע"מ
 רח' ישראלים 15
 ת"א - 64382

הנדון: הערכה והוקרה על פעילותך למען קידום ופיתוח בתי החולים הממשלתיים באזור יהודה ושומרון.

מזה זמן רב שאנו נמצאים בקשרי עבודה הדוקים מאז קיבלת על עצמך את המשימה של ריכוז, פיקוח ותאום כל פעולות הפיתוח בבתי החולים הממשלתיים באזור יהודה ושומרון.

הייתי נעדיין הנני עד אישית לעבודתך הברוכה והפוריה בפיתוח בתי החולים באזורנו. יוזמותיך, חריצותך ומסירותך והשקעת הידע המקצועי שלך רכל זאת תוך פעילות אינטנסיבית ללא לאות - כל אלו תרמו את חלק הארי בתנופת הפיתוח בבתי החולים, וההישגים נאים ובוולטים בשטח: בבתי החולים הכלליים, חברון, בית-ג' אלה ורמאללה, כאשר היעד הבא הוא ביה"ח רפידה - שכס.

גם משלחת ארגון הבריאות העולמי בבקורה באזור התרשמה עמוקות ופעילותך למען פיתוח בתי החולים, התרשמה שמצאה את ביטחון בדו"ח על מצב שרותי הבריאות בשטחים. על כל אלה אני מביע בפניך את הערכתי והוקרתי מקרב לב.

למתר לציין את הנאתי מאישיותך הלבבית ומהקומניקציה הנפלאה איתך לאורך כל תדרך המשותפת.

אני בטוח שעוד נכונה לך דרך ארוכה של שיתוף פעולה עמנו ותרומה רבה לקידום ופיתוח בתי החולים באזור יהודה ושומרון, משימה אותה אתה רואה כאתגר. חיוני נקטם.

בברכה
 ד"ר י. סבר
 קמ"ט בריאות
 במינהל האזרחי לאיו"ש

העתקים:
 תא"ל א. בקנשטיין - סגן מתאם הפעולה בשטחים משרד הבטחון.
 אל"מ פ. זך - ראש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון.
 אינג' א. גיל - מנהל מחלקת עבודות ציבוריות.
 ד"ר ת. טולצ'ינסקי - מתאם פעולות משרד הבריאות בשטחים.

י"ס/ד

למיון

26/85 ח

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

מחלקת עבודות צבוריות - המשרד הראשי
האגף לבניית מוסדות ממשלה
ת.ד. 13198, ירושלים 91131, טל' 02-277290

ירושלים

מס' התיק 19.6.85

לכבוד

ר"ג ע"ג

א.ב.

הנדון: יעוץ קרקע וביסוס בג' אולם ב'ו"ם: ראמת, ג' ע"ג

1221/11, רפ"ב

הנבו להודיע כי הוחלט למסור לך את התכנון הנדון. כבסיס לעריכת החוזה
אנו משתמשים בקובץ העריפלי מע"צ - משרד הבינוי והשיכון (מצורף קטע) ובהתבסס
הבאים -

- 1. שטח המבנה 80 מ"ר (10'x8')
- 2. סוג המבנה 2. ג'ו ל ג' א"ב - 65 - (8'x8')
- 3. תנאי האתר 3. א"ב - 65 -
- 4. מכסת שכר היסוד 4. רפ"ב
- 5. אומדן ערך המבנה שקל/מ² (משוער). 80 - (10'x8')
- 6. שכר טרחה 290.00 א"ב

שכר הטרחה יעודכן לאחר שמכרז בהתאם להערת הקבלה.

אבקש להודיע על הסכמתך ו/או הערוחך, ישירות למהנדס ראשי לבניה.

בכבוד רב,
אישור מס

העתק:
מהנדס ראשי לבניה
מח' אדריכלות - יח' התקשרויות
תיק בנין.

מיום

מע"צ - המשרד הראשי
האגף לבניית מוסדות ממשלה

אל: יו"ר הועדה להזמנת תכנון (חוץ)
מאת: (המחלקה) בניה

מספר התיק
תאריך 19.6.85

הנדון: תכנון חוץ - המלצה להזמנה

שם הפרויקט: בתי חולים ביו"ש - רמאללה, בית-ג'אלה, חברון, רפדייה

מהות התכנון הדרוש: יעוץ קרקע

סעיף תקציבי (כולל אשור קיום תקציב תכנון - מאת מהנדס ראשי לביצוע): 270 ו 110, 194, 265

מחשבת הערים והמיון האק יפוג טקציות כליות הוודו

1/100 ה-א

20/6

85%

אני מציע להזמין תכנון הפרויקט הנ"ל בהיקף השרווחים החלקיים

לאחר המתכננים הבאים:-

1. ד"ר א. פרדיס - רח' הנביאים 64, ירושלים

2. אינג' מ. יוגר - רח' חביבה ריין 15, רעננה

3. אינג' ד. דוד - רח' יהודה הנשיא 39, רמת-אביב

אני ממליץ להזמין את העבודה אצל: ד"ר א. פרדיס

מחנמוקים הבאים: יעוץ ירושלמי


חתימה
א. גורבץ
שם ראש המחלקה

החלטת הועדה

הועדה בישיבתה מס' 468 מיום 23.6.85 החליטה להזמין את העבודה אצל:

1/2 מס' האשור

מהנמוקים הבאים

חתימות חברי הועדה

שם	תפקיד	חתימה
1. א. גיל	סגן מנהל מע"צ - יו"ר	
2. א. ערמון	אדריכל ראשי	
3. א. בוכמן	חשב מע"צ	
4. א. גולדשלאגר	מהנדס ראשי לבצוע	

29/85/1

בי"ח - רמלה, בית גאלה, חברון, רמדיה - (מבט), יוקץ שיקע

מדד הבסיס: גורם מקום - יולי 1985

- ערך העבודה:
- א. בי"ח רמלה - 80 שקות עבודה, יוקץ בכיר - 30,240 ש"ש/שנה
 - ב. בי"ח בית גאלה - 65 שקות עבודה יוקץ בכיר - 30,240 ש"ש/שנה
 - ג. בי"ח חברון 65 שקות עבודה, יוקץ בכיר - 30,240 ש"ש/שנה
 - ד. בי"ח רמדיה-מבט - 80 שקות עבודה, יוקץ בכיר - 30,240 ש"ש/שנה

ערך ברוט העבודה

$$\begin{aligned}
& \text{א. } 80 \text{ ש"ע} \times 30,240 \text{ ש"ח} = 2,419,200 \text{ ש"ח} \\
& \text{ב. } 65 \text{ ש"ע} \times 30,240 \text{ ש"ח} = 1,965,600 \text{ ש"ח} \\
& \text{ג. } 65 \text{ ש"ע} \times 30,240 \text{ ש"ח} = 1,965,600 \text{ ש"ח} \\
& \text{ד. } 80 \text{ ש"ע} \times 30,240 \text{ ש"ח} = 2,419,200 \text{ ש"ח} \\
& \hline
& \text{ש"ח } 8,769,600
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{סעי"ב - } 15\% \times 8,796,600 \text{ ש"ח} = 1,319,490 \text{ ש"ח} \\
& \hline
& \text{ס"ח } 10,085,040
\end{aligned}$$





REF: 26/1/26
מחלקת עבודות צבוריות
המשרד הראשי
האגף לבניית מוסדות ממשלה
לשכת מנהל האגף
צבט ביח
24.6.85

DATE: 19.6.85

לכבוד
ה"ה תא"ל א. בקנשטיין (סגן מתאם הפעולות בשטחים)
ד. אפרתי, מ. אהרון, ע. סער (מינהל אזרחי, יו"ש)
י. סבר, י. שכטר, צ. האקר, ס. ביצ'ין (שרותי הבריאות, יו"ש)
א. גיל, ע. לוקסמבורג, א. ערמון, י. רוז'נסקי, א. גורבץ, ש. גונן, פ. רייס (מע"צ)

א.ג.נ.

הנדון: ביה"ח ביו"ש - עדכון לוחות זמנים

מכתב זה בא להשלים את מסמך מס' 26/1/24 מתאריך 17.6.85, בנושא ביה"ח בבית-לחם, כסעיף נוסף ל 4 סעיפי המסמך הנ"ל.

5. ביה"ח בית-לחם

5.1 רהוט, ציוד, גמר

התכנון הושלם.
הבצוע יהיה כלהלן:

- 5.1.1 רהוט ופריטי ציוד הניתנים לרכישה: הרהוט יוזמן ע"י אפסנאות מע"צ.
- 5.1.2 עבודות אחרות, לרבות רהוט לפי הזמנה (ארונות שונים, דלפקים וכו'); חלונות אלומיניום; סורגים; עבודות נירוסטה; תקרה אקוסטית; עבודות גמר - הטפול בנושא יהיה באחריות קמ"ט שכונ.

5.2 מערכת חשמל

הכונה לתכנון ובצוע רשת חשמל חיצונית חדשה וכן לשפוע מתקני החשמל בבניינים השונים.

הנושא נמצא בנרור ולמוד. לוח הזמנים לתכנון ולבצוע יעודכן בקרוב.

בברכה,
שלמה קופילוב

גר 1.2.85

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

שלמה קופילוב M. Sc.
הנדסה וניהול בע"מ

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64382, ISRAEL

טל. 245296; 230870
טלפקס: 35770-1 COIN IL

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382

משרד המיוון והשיכון
מנהל מחלקת בנאים ומערכת המעורר הראשי
24-06-1985
מ"ח חוק 5/11/7

REF: 26/1/25 DATE: 18.6.85

Handwritten signature

מחלקת המעורר הראשי
המשרד הראשי
המנהל
לשכת מנהל המעורר
24.6.85

לכבוד
ה"ה י. רוז' נסקי מהנדס ראשי למערכות
ש. גונן ס/אדריכל ראשי
מע"צ משרד ראשי
ירושלים

א.ג.נ..

הנדון: פרויקטים בתי-חולים ביו"ש - רשימת מתכננים
ויועצים בנושא אדריכלות ואלקטרוטכניקה

להלן רשימת המתכננים והיועצים בפרויקטים השונים של בתי החולים ביו"ש.
כמו כן מעורפת רשימת כתובות וטלפונים של היועצים.

בהמשך לשיחותנו בנושא, יש להעביר בוועדה מתכננים אחדים (בנושא יועצי
אלקטרוטכניקה לרמאללה - תכנית אב, ולרמאללה - נתוחים, מיון, ובית-מרקחת).
וכך להחליט על אדריכל לבית-ג' אלה - תכנית אב.

המסמך יעודכן בהתאם.

בברכה
שלמה קופילוב

העתקים:

ה"ה א. גיל, ע. לוכסמבורג, א. ערמון, א. גולדשילד - מע"צ

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245294; 230870
TELEX: 35770-1 COIN IL :טלקס

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64 382

REF.:

DATE: 20.6.85

רשימת כתובות וטלפונים של היועצים (לפי א"ב)

טלפון	כתובת	השם
03-444162/3	צירלסון 4, תל-אביב	מש' איסקוביץ-שפירא-האן
04-244913/4	האורן 23, חיפה	מש' אלישע-פרנקל
02-741532	Community Development Group P.O.Box 690, Beit-Lehem	ארג' ג'מל
03-228589	ארלוזורוב 90, תל-אביב	בן-צבי משה
02-765328	גומא 1, ירושלים	בלום ערן
03-448223/4	בירנבוים 10, תל-אביב	מש' גלעד
02-665412	עמק רפאים 32, ירושלים	מש' דיסקינד
03-278208	החשמנאים 42, תל-אביב	י. האן
03-725871	חיבת ציון 62, רמת-גן	לרנטל ראובן
03-262562	חפץ חיים 18, תל-אביב	סמו
03-452271	נחום א' 27, תל-אביב	פולק צבי
02-244067	הלל 24, ירושלים	שפיר אלכסנדר



אבי נצר

פרויקטים במי-חוליים ביו"ש - רשימת מתכננים ויועצים

לאדריכלות ומערכות אלקטרומוכניות

כבאות	השם הקשרת	אלקטלציה בנוב וגזים	מזוג אורז	קונסטרוקציה	אדריכלות	ה פ ר י ק ט	ה	בית"ח
א.שפיר	גלעד	ט.דיסקינד	איסקוביץ-שפירא-האזן	מע"צ	מע"צ - תכנון רעיוני י.גרשון - תכנון מפורט	תכנית-אב	תכנית-אב	רמאללה:
א.שפיר	גלעד	ט.דיסקינד	איסקוביץ-שפירא-האזן	מע"צ	י.האזן	אגף הרנטגן	אגף הרנטגן	
א.שפיר	גלעד	ט.דיסקינד	איסקוביץ-שפירא-האזן	מע"צ	מע"צ - תכנון רעיוני י.גרשון - תכנון מפורט	תכנון מפורט, נתוחים, אספקה סטרוילית, מיון, ארכיב, בית- מרקחת	תכנית-אב	חברון:
א.שפיר	גלעד	אלישע-פרנקל גלעד	איסקוביץ-שפירא-האזן	מע"צ	י.האזן	רנטגן	רנטגן	
-	גלעד	אלישע-פרנקל גלעד	איסקוביץ-שפירא-האזן	-	-	אגף נתוחים, השלמת מערכות	אגף נתוחים	
א.שפיר	גלעד	אלישע-פרנקל גלעד	איסקוביץ-שפירא-האזן	מע"צ	ג.צפור	אגף נתוחים - בנוי באזור הקיום ומחלקה סטרילית	אגף נתוחים	בית-ג'אלה:
א.שפיר	ראובן לרנעל	עולק	איסקוביץ-שפירא-האזן	מע"צ	עדיין לא נקבע	תכנית-אב	תכנית-אב	
ג' ארז'	ג' ארז' (ג.נאיר)	ג' ארז'	ג' ארז' (שוקד הרמי)	ג' ארז'	ג' ארז'	אגף חדרי נתוח	אגף חדרי נתוח	
א.שפיר	גלעד	אלישע-פרנקל גלעד	איסקוביץ-שפירא-האזן	מע"צ	י.האזן	אגף הרנטגן	אגף הרנטגן	
א.שפיר	סמו	ט.דיסקינד	מע"צ / כז-צבי	מע"צ	מע"צ - תכנון רעיוני י.האזן - תכנון מפורט	רנטגן, בית-מרקחת, מרפאות-חוצ', אדמיניסטרציה	רנטגן, בית-מרקחת	רפזניה:
			יועצים	ולא	לא התקבל	עדיין לא	תכנית-אב	
	מע"צ/בלום	-	-	-	פסקואל	רוט, צוד, גמר מערכת השמל	רוט, צוד, גמר מערכת השמל	בית-לחם:

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.
15 ISRAEL'S ST., TEL AVIV 64382, ISRAEL

ארי רוסלנסקי
20/7
26/1/25

טל. 245296; 230870
טלפקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.
הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15 תל-אביב 64382
משרד הבינוי והשיכון
מח' מכונות נבדיות, המשרד הראשי
24-06-1985
מס' התיק 5/117

REF: 26/1/25

DATE: 18.6.85

לכבוד
ה"ה י. רוז'נסקי מהנדס ראשי למערכות
ש.גונן ס/אדריכל ראשי
מע"צ משרד ראשי
ירושלים

א.ג.נ.

הנדון: פרויקטים בתי-חולים ביו"ש - רשימת מתכננים
ויועצים בנושאי אדריכלות ואלקטרומכניקה

להלן רשימת המתכננים והיועצים בפרויקטים השונים של בתי החולים ביו"ש.

כמו כן מצורפת רשימת כתובות וטלפונים של היועצים.

בהמשך לשיחותנו בנושא, יש להעביר בועדה מתכננים אחדים (בנושא יועצי
אלקטרומכניקה לרמאללה - תכנית אב, ולרמאללה - נתוחים, מיון, ובית-מרקחת),
וכן להחליט על אדריכל לבית-ג' אלה - תכנית אב.

המסמך יעודכן בהתאם.

בברכה
שלמה קופילוב

העתקים:

ה"ה א.גיל, ע.לוקסמבורג, א.ערמון, א.גולדשלגר - מע"צ

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245294; 250870
TELEX: 35770-1 COIN IL טלקסט:

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64 382

REF.:

DATE: 20.6.85

רשימת כתובות וטלפונים של היועצים (לפי א"ב)

טלפון	כתובת	השם
03-444162/3	צירלסון 4, תל-אביב	מש' איסקוביץ-שפירא-האן
04-244913/4	האורן 23, חיפה	מש' אלישע-פרנקל
02-741532	Community Development Group P.O.Box 690, Beit-Lehem	ארג' ג'מל
03-228589	ארלוזורוב 90, תל-אביב	בן-צבי משה
02-765328	גומא 1, ירושלים	בלום ערן
03-448223/4	בירנבוים 10, תל-אביב	מש' גלעד
02-665412	עמק רפאים 32, ירושלים	מש' דיסקינד
03-278208	החשמונאים 42, תל-אביב	י. האן
03-725871	חיבת ציון 62, רמת-גן	לרנטל ראובן
03-262562	חפץ חיים 18, תל-אביב	סמו
03-452271	נחום א' 27, תל-אביב	פולק צבי
02-244067	הלל 24, ירושלים	שפיר אלכסנדר


אבי נצר

פרויקטים במי-חוליס ב"ר ש" - רשימת מתכננים ויועצים

לאדריכלות ומערכות אלקטרומוכניות

כבאות	חשמל תקשורת	אינסטלציה בידוב וגזים	מזוג אוויר	קונסטרוקציה	אדריכלות	ה פ ר י ק ט	בית"ח
א.שפיר	גלעד	ט.דיסקינד	איסקוביץ-שפירא-האן	מע"צ	מע"צ - תכנון ועיוני וג.רשון - תכנון מפורט	תכנית-אב	רמאללה:
א.שפיר	גלעד	ט.דיסקינד	איסקוביץ-שפירא-האן	מע"צ	ג.האן	אגף הרנטגן	
א.שפיר	גלעד	ט.דיסקינד	איסקוביץ-שפירא-האן	מע"צ	מע"צ - תכנון ועיוני וג.רשון - תכנון מפורט	תכנון מפורט, נתוחים, אספקה טריילית, מיון, ארכיב, בית- מרקחת	
א.שפיר	גלעד	אלישע-פרנקל	איסקוביץ-שפירא-האן	מע"צ	ג.צפור	תכנית-אב	חברון:
-	גלעד	אלישע-פרנקל	איסקוביץ-שפירא-האן	-	ג.האן	רנטגן	
א.שפיר	גלעד	אלישע-פרנקל	איסקוביץ-שפירא-האן	מע"צ	ג.צפור	אגף נתוחים, השלמת מערכות	
א.שפיר	גלעד	אלישע-פרנקל	איסקוביץ-שפירא-האן	מע"צ	ג.צפור	אגף נתוחים - בנוי באזור הקידום ומחלקה טריילית	בית-ג'אלה:
א.שפיר	גלעד	אלישע-פרנקל	איסקוביץ-שפירא-האן	מע"צ	ג.האן	אגף חדר ג'נתח	
א.שפיר	גלעד	אלישע-פרנקל	איסקוביץ-שפירא-האן	מע"צ	ג.האן	אגף הרנטגן	
א.שפיר	סמו	ט.דיסקינד	מע"צ / בז-צבני	מע"צ	מע"צ - תכנון ועיוני וג.האן - תכנון מפורט	רנטגן, בית-מרקחת, מרפאות-חויץ, אדמיניסטרציה	רפידה:
מע"צ/בלום	-	-	-	-	עדיין לא התקבל	תכנית-אב	

עדיין לא התקבל תקיב ולא נבחרו יועצים

מע"צ/בלום

פסקואל

רוח, ציוד, גמר מערכת חשמל

בית-לחם:

גר' י. קופילוב
10/11/85
טל. 245294; 230070
TELEX: 35770-1 COIN IL



REF: 26/1/24

DATE: 17.6.85

ה"ה ת"ל א. בקנשטיין (סגן מתאם הפעולות בשטחים)
ד. אפרתי, מ. אהרון, צ. סער (מינהל אזרחי, יו"ש)
י. סבר, י. שכטר, צ. האקר, ס. ביצ'ין (שרותי הבריאות, יו"ש)
א. גיל, ע. לוכסמבורג, א. ערמוך, **י. רנדז'נסקי**, א. גורביץ', ש. גונד, פ. דייס (מע"צ)

א.ג.נ.

הנדון: כתי-חולים ביו"ש - עדכון לוחות זמנים

דו"ח זה כא לעדכן את לוח הזמנים מס' 26/1/21 מתאריך 14.4.85, ומהווה סיכום
בלניים לפעולות התכנון והכצוע בפרויקטים השונים.
דוח זה מורכב משני חלקים:
1. דוח מפורט עפ"י נושאים.
2. לוח זמנים - תרשים גנט (תאור גרפי).

דוח מפורט עפ"י נושאים

1. כיה"ח רמאללה

1.1 אגף רנטגן

הפרויקט מתקדם עפ"י לוח הזמנים. סיום העבודה צפוי עד חודש 8/85.
הוט ושלוט יושלמו עד חודש 9/85, מותנה באשור לחתימת חוזים בזמן ההקפאה.

1.2 אגף נתיחים, האזור הסטרילי

עבודות ההכנה כשטח החלר. צפוי שהעבודה תושלם לפי לוח הזמנים, בחודש 11/85.

1.3 תכנית אב

השלב הפרוגרמטי/אדריכלי הסתיים בעיקרו לפי לוח הזמנים שנקבע. מספר פרטים
יושלמו במקביל לתכנית האב למערכות שהחלה וצפוי שתושלם לפי לוח הזמנים,
בחודש 2/86.

1.4 אגף חדרי נתוח, מיון, בית מרקחת ומחלקת אספקה סטרילית

הכוונה ל תכנון ובצוע מספר מחלקות שדחיפותם לביה"ח רבה, ופתוחם אפשרי לאור השלמת פרויקטים הנמצאים בבצוע.

הפרויקט כולל את השלמת קומת הנתוחים (לרבות אגף הנתוחים והמחלקה הכרורגית); אגף המיון (במקום אגף הנתוחים הקיים המעבר לקומה השניה בביה"ח כסוף השנה); וכן בבית המרקחת והמחלקה הסטרילית שיוקמו במבנה מרפאות החוץ הנוכחי (בתוספת בניה).

בשלב זה הועבר חלק מהתקציב, לתכנון בלבד.

משך התכנון הוא כ- 8 חדשים, וצפוי שיסתיים בחודש 2/86.

משך הבצוע של הפרויקט המורכב משלבים שונים - מותנה בתקציבים שיועמדו לרשות מע"צ.

2. ביה"ח בית-ג' אלה

2.1 אגף הרנטגן

התכנון הושלם, המכרז התפרסם ב- 12.5.85, ונקבע קבלן לבצוע העבודה. תחילת הבצוע: 25.6.85.

משך הבצוע הצפוי: 5½ חדשים. מסירת הפרויקט צפויה עד לחודש 12/85.

2.2 אגף חדרי נתוח

התכנית הארכיטקטונית נמצאת בשלבי סיום. תכנון המערכות החל. השלמת התכנון והכנת החומר למכרז צפויה תוך כ 6 חדשים, עד חודש 12/85.

יש לציין שהתכנון כולו מבוצע ע"י מתכנן מקומי, תחת פקוח מע"צ.

מע"צ עושה מאמצים רבים שהתכנון יהיה ברמה מקובלת ומהר, אך עלולות לחול דחירות.

לו"ז לפרסום המכרז ולבצוע מותנים בהעברות תקציביות. במשוער, מדובר בפרויקט שבצועו כ- 10 - 12 חדשים, ושיסתיים עד חודש 2/87.

הלו"ז יעודכן עם השלמת התכנון.

2.3 תכנית אב

התחלת תכנית האב התעכבה עקב בעיות של קביעת חלוקת העבודה בין המתכנן המקומי לצאת מתכננים ישראלי, כפי שצוין בדו"ח הקודם, ס' 9.

עם גבוש הנושא והחלטות סופיות שנתקבלו בישיבה אצל רע"נ מו"ש בתאריך 11.6.85 - יגובש מיד צוות המתכננים.

צפוי שהשלב הפרוגרמטי/אדריכלי ימשך כ 4 חדשים, עקב בעיות שונות והערות ביה"ח לפרוגרמה שגובשה. נושאי קונסטרוקציה ומערכות יגובשו במשך כ - 8 חדשים נוספים. צפוי שעבודת הצוות תמשך בעיקרה עד חודש 7/86.

3. ביה"ח חברון

3.1 אגף הרנטגן

המכרז נפתח ב 12.5.85. נקבע קבלן לבצוע העבודה. תחילת העבודה נקבעה לתאריך 25.6.85. משך בצוע צפוי - כ 5½ חדשים. מסירת הפרויקט צפויה עד חודש 12/85.

3.2 אגף נתוחים - אזור סטרילי

עבודת החקמה של האזור הסטרילי נסתיימה לפי לוח הזמנים.

3.3 השלמת מערכות לאזור הסטרילי ולאגף הנתוחים כולו

3.3.1 מערכת חשמל

מכרז לבצוע נפתח ב 12.5.85. התקשרות חוזית ותחילת עבודה צפויים עד סוף חודש 6/85. משך הבצוע הצפוי: כ 5 חדשים.

3.3.2 מזג אוויר

מכרז נפתח ונבחר קבלן. התקשרות חוזית ותחילת עבודה צפויים עד סוף חודש 6/85. משך הבצוע הצפוי כ 5 חדשים.

3.3.3 אספקות מיס, גזים וביוב - מכרז מתעכב עקב הדיון באפשרות הגדלת היקף מערכת הגזים כך שתהיה מסוגלת לספק צרכים עתידיים בביה"ח. לאחר שתפול החלטה בנושא, יעודכן לוח הזמנים.

3.4 השלמת אגף הנתוחים ומחלקת אספקה סטרילית לביה"ח

סוכמו לאחרונה שדנויים בפרוגרמה של אגף הנתוחים וכן שקומת הנתוחים תכלול גם את מחלקת האספקה הסטרילית. מבוצע עתה שתכנון להשלמת אגף הנתוחים (לרבות שפויים ושינויים באגף הקיים ישולבו במסגרת האגף החדש); וכן תכנון מחלקת האספקה הסטרילית. צפוי שהתכנון יושלם עד חודש 11/85, והבצוע עד חודש 5/86, לפי לוח הזמנים. לוח זמנים מפורט יותר, המפריד בין השלמת אגף הנתוחים ומחלקת האספקה הסטרילית - יעודכן לקראת השלמת התכנון.

3.5 תכנית אב

הוחל בדיונים בנושאים פרוגרמטיים/אדריכליים שונים, לרבות קומת הנתוחים קומת הכניסה ועוד.

הנושא הפרוגרמטי/אדריכלי יגובש עד חודש 10/85. שלוב נושא קונסטרוקציה ומערכות יגובש בעיקרו עד חודש 5/86.

4. ביה"ח רפידיה

רנטגן, בית-מרקחת, מירון, אדמינסטרציה

התכנון האדריכלי העקרוני אושר.
הפרויקט יכלול תוספות בניה בשטח כולל של 625 מ"ר ושינויים ותוספות
בבנין הקיים בשטח נוסף של 1,000 מ"ר.

השלמת התכנון האדריכלי ותכנון המערכות ימשך עד חודש 1/86.

הוגש פרוט שלבים אפשרי לבצוע הפרויקט לפי תקציבים שיועברו לרשות
מע"צ (מסמך מס' 27/1/9 מתאריך 11.6.85).

יש לקחת בחשבון בשלבי הבצוע בעיות של המשך תפקוד ביה"ח עם מינימום
הפרעות. מותנה בהקצבות הכספיות, ניתן להשלים את הפרויקט בתקופה של
12 - 18 חדשים.

לוח הזמנים יעודכן עם גבוש התכנון וקבלת מידע לגבי ההקצבות הכספיות.

נכבד רב,

שלמה דופילוב

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST. TEL AVIV 64382, ISRAEL

טל. 245296; 230870
TELEX: 35770-1 COIN IL טלקס:

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, הלאביב 64382

REF: 26/1/23

DATE: 10.6.85

מחלקת ייעוץ ייבואיות
המושרד הראשי
האגף לבניית מוסדות ממשלה
לשכת קנהל האגף
19.6.85 זכנס ביום



לכבוד
ד"ר ת.ה. טולצ'ינסקי
משרד הבריאות
רח' אורקניה 8
ירושלים

..ג.א

הנדון: בתי-חולים ביו"ש - פרויקטים בתכנון ובצוע

רצ"ב עלום מסמך מס' 26/1/23 מתאריך 14.4.85, המפרט את הפרויקטים השונים בנושאי בנוי, תוספת, שנויים ושפוצים בבתי חולים ביו"ש - בשלבי תכנון ובצוע.

המסמך כולל דרוח על שלבי הפרויקט השונים לרח זמנים משוער.

מסמך כזה אנו מפיצים אחת לשלושה חדשים ולפי הנחיות שירותי הבריאות ביו"ש - להבא אתם תהיו כלולים בתפוצה.

לתשומת לבך - בעדכון הבא יבואו לידי ביטוי שינויים אחדים, שחלו מהעדכון האחרון, לרבות פרויקטים חדשים וכן לוחות זמנים מעודכנים לבצוע אגפי הרנטגן בחברון ובבית-ג'אלה.

בברכה
שלמה קופילוב

העתקים:

ד"ר י. סכר, קמ"ט בריאות, יו"ש


מר י. שכטר, אמרכ"ל שירותי הבריאות, יו"ש

מר א. גיל, סגן מנהל מע"צ

DATE: 10.6.88

10/6/88

TO: THE COMMISSION
FROM: SHLOMO KOPLOV
SUBJECT: [illegible]



SHLOMO KOPLOV
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.
1000 WEST AVENUE SUITE 1000
HOUSTON, TEXAS 77006
TEL: 713-865-1111

STATE OF TEXAS - COMMISSION ON THE FUTURE OF TEXAS

The Commission on the Future of Texas is pleased to receive your contribution to the study of the future of the state. Your input is essential to the success of this project.

Thank you for your contribution to the study of the future of Texas.

Your contribution is being reviewed and will be included in the final report.

The Commission on the Future of Texas is a non-profit organization dedicated to the study of the future of the state. We are grateful for your support and participation.

[Handwritten signature]
S. Koplov

STATE OF TEXAS

COMMISSION ON THE FUTURE OF TEXAS
1000 WEST AVENUE SUITE 1000
HOUSTON, TEXAS 77006

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: יג' בסיון תשס"ה
2 ביוני 1985

מספר: 5/11/7
3/4/1

לכבוד
מר ש. קופילוב
הנדסה וניהול בע"מ
רח' ישראל'ס 15
הל-אביב 64382

..א.נ.

הנדון: בתי הולים ביו"ע דיווח הקציבי - שגיטה שנער נכיוס 28,5.85 בנדרדי.
סיסוכין: דו"ח ישיבת הנ"ל

הנני מסתייג מסעיף סס" 4 בדו"ח באשר לאחריות, סוכם כי הנוסא יידון במשרד הראשי.

לאחר שיקול נוסף הריני מסכמ אה הנוסא כך:

כל החומר שהמחוזות ומשרד הראשי ירוכז ע"י הסהאס - ש. קופילוב ויועבר אלי לסיכום לצורך העברתו למזמין. לפי הצורך נקיים במשרדו דיונים להבהרה הנוסאים שאינם ברורים דיים. בחומר שיועבר למזמין חייב להיות ספורט, כאשר המגמה היא לתת לו כלים לקביעה סדרי העדיפויות בהעברת התקציב במועד וניצולו האופטימלי. ייתכן שצריך היה להיות סודגש יותר בדו"ח שלך כי זה מה שהמזמין ביקש בישיבה.

אנא לסיפולך.

ב ב ר כ ה,

ד"ר א. גולדשלבג, אינג'
מהנדס ראשי לבצוע בפועל

העתיק: מר י. סכטר - שרותי הברואות, יו"כ
מהנדס מחוז ירושלים, מפ"צ
מחלקת ביצוע

155

REF.: 26/1/22

DATE: 28.5.85

משרד המינוף והשיכון
מכירת גזי המגורים והמגורים
30-05-1985
5/11/7

הפרויקט: כתי-חולים ביו"ש

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 28.5.85 בנושא דווח תקציבי

מקום הישיבה: משרד א. גולדשלגר, מע"צ

נוכחים: ה"ה י. שכטר, ד. קובי, א. בנאי (שרותי הבריאות, יו"ש); א. גולדשלגר, פ. רייס (מע"צ); ש. קופילוב, א. נצר (מש' קופילוב).

תפוצה: הנוכחים; ה"ה ד"ר י. סבר (שרותי הבריאות, יו"ש); א. גיל, ע. לוכסמבורג (מע"צ).

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

סעיף	ה נו ש א	הטפול באחריות	עד תאריך
	<p><u>כללי</u></p> <p>הישיבה נערכה לצורך קביעת נוהל דווח לשרותי הבריאות בנושא תקציבים לתכנון ובצוע עבור הפרויקטים השונים.</p> <p><u>נדון וסוכם כלהלן</u></p> <p>1. הדווח יהיה תלת חודשי וימסר בתאריכים 1.3, 1.6, 1.9 ו-1.12 בכל שנה. העדכון יהיה לחודש אחד מוקדם יותר.</p> <p>2. <u>הדווח יכלול את הנושאים הבאים:</u></p> <p>2.1 <u>תקציב הוצאות יתרה</u></p> <p>פרוט עבור כל פרויקט בנפרד, של הסכומים שהועברו למע"צ, הסכומים שהוצאו ויתרת התקציב. הסכומים בכל סעיף יפורטו לפי סכום שוטף (לרבעון) וסכום מצטבר. ההוצאות יפורטו לפי הוצאות עבור תכנון וניהול והוצאות עבור בצוע.</p> <p>בסעיף הסכומים שהועברו למע"צ - תפורט הפרדה בין הסכומים כרוטו ונטו (בנכודי הוצאות מע"צ).</p> <p>2.2 <u>עדכון משוער לעלות השלמת הפרויקט</u></p> <p>חלקו השני של הדווח יכלול עדכון משוער לעלות השלמת הפרויקט וזאת על פי יתרת עלות הפרויקט כולל התיקרויות במשוער, 2/..</p>		

עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		<p>וכן תוספות ושינויים במידה ויחולו במהלך הפרויקט. העדכון יהיה לסוף הרבעון, ויצוין בערכים דולריים.</p> <p><u>עדכון לוח זמנים</u></p> <p>חלקר השלישי של המסמך יכלול דוח מפורט על קדום ולוח הזמנים של כל פרויקט, כפי שנושא זה בוצע בעבר.</p>	2.3
		<p><u>רשימה מעודכנת של הפרויקטים</u></p> <p>ביה"ח רמאללה - אגף הרנטגן.</p> <p>ביה"ח רמאללה - מכבסה.</p> <p>ביה"ח רמאללה - הסקה מרכזית.</p> <p>ביה"ח רמאללה - הקמת האזור הסטרילי.</p> <p>ביה"ח רמאללה - תכנית אב.</p> <p>ביה"ח רמאללה - הקמת קומת הנתוחים; אגף מירן; בית מרקחת וארכיב.</p> <p>ביה"ח חברון - אגף הרנטגן.</p> <p>ביה"ח חברון - אגף נתוחים (לרבות הקמת האזור הסטרילי; מערכות לאגף הנתוחים; שינויים, שפוצים ותוספות באגף הנתוחים הקיים והקמת מחלקת אספקה סטרילית).</p> <p>ביה"ח חברון - תכנית אב.</p> <p>ביה"ח בית ג'אלה - אגף רנטגן.</p> <p>ביה"ח בית ג'אלה - אגף נתוחים.</p> <p>ביה"ח בית ג'אלה - תכנית אב.</p> <p>ביה"ח בית לחם - רהוט ותקרת ביניים.</p> <p>ביה"ח רפידיה - אגף רנטגן, מרפאות חוץ; בית מרקחת ואדמינסטרציה.</p> <p>ביה"ח רפידיה - תכנית אב.</p>	.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15
28.6.85	רייס/ קופילוב	 <p>שלמה קופילוב</p>	.4

5/11/7

21.5.85

① נח לקין

בישיבה האחרונה אלוטו בארזה
למכון חול הארבעים בסומ:

1. ג'וז הבון, גבניג אב - איזקאל ספיר
2. ג'וז גורג'אלי, גבניג אב - איזקאל ספיר
3. ג'וז רפידו, טכס הבון - גן צבי

אני הבנתי את הפנייה לארזה
בהראם למסכם ביננו

י. סולניץ

② למא אליה
למיזם
2.6.85
317
c.c. 85

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: 13
אייר תשמ"ה
במאי 1985
מס': 5/11/7

אל: ד"ר סבר, קמ"ט בריאות יו"ש.

הנדון: בתי חולים כיו"ש - תכנון מערכות

בהתיחס למכתבו של מר ס. ביצי'ן מס' 202/85 מתאריך 24.4.85 ברצוני לציין כלהלן:-

1. דנו בנושא פעמים כה רבות. אציין שוב שפרוגרמה לתכנון כולל של מערכות תעשה במסגרת תכניות האב שהוזמנו אצלנו לאחרונה עבור בתי החולים רמלה, בית ג'אלה וחברון.
רק במסגרת זו ניתן לבדוק עבור כל בתי החולים את הדרישות של המערכות תוך קביעת פרוגרמה הדרושה, סוג המערכת לכל אגף וכדו'.
2. ברוב המקרים לא ניתן לפתור את הדרישות לפרויקט ספציפי ע"י מערכת מרכזית, וזאת הן מסיבות תקציביות והן מבחינת לוח זמנים.
כזכור ישנה הנחיה חד משמעית שלכם שאין לעכב כל פרויקט מהפרויקטים המתוכננים והמבוצעים עתה עד לביצוע פתרונות כוללים לכל בית החולים, מה עוד שברוב המקרים תוספת העלות גבוהה ביותר.
3. בנושא מיזוג אויר עבור אגפי הרנטגן בבתי החולים רמלה, בית ג'אלה וחברון - הנושא נדון ביסודיות בהשתתפותם והוברר שאין סיכוי שבקרוב יהיו תקציבים למערכות מיזוג אויר מרכזיות לבתי החולים. כמו כן, הפתרונות שסוכם עליהם, דהיינו, מזגנים מפוצלים - ביתנים לביצוע בעלות נמוכה יותר ובזמן קצר.
4. נציגי שרותי הבריאות השתתפו ומשתתפים בכל שלבי התכנון, לרבות תכניות האב ותכנון מפורט - ומקבלים החקיקים של כל סיכומי הישיבות, התכנון והחומר למכרז.
5. בנוסף לכאמר לעיל ברצוני להוסיף שעל מנת להוזיל ולזרז את התכנון הביצוע של הפרויקטים למעשה עלי לבקשכם שוב שהערות לסכומים ולתכנון יהיו מידיות.
מתן הערות לאחר שבועות ארוכים גורם לעיכוב בביצוע הפרויקטים ולהגדלת עלותם.
אבקש לא להמשיך בהתכתבות מעין זו.

בברכה,
א. גיל
סגן מנהל מע"צ
ועמדה האגף לבניית
מוסדות ממשלה

העוק: רע"ן מו"ש
מר י. שכטר, גב' צ. אקר, מר ס. ביצי'ן - שרותי בריאות.
מ"ת צמון, רוזנסקי, גובן - מע"צ
מר ש. קופילוב, רח' ישראלים 15, תל-אביב.



المجموعة
الاستشارية
للتنمية والاعمار

community development group

Mr. Rojansky,
Chief Engineer, E/M systems,
Public Works Dpt.,
P.O.Box 13198,
Jerusalem.

Subject: Electro-Mechanical drawing of K.H.Hospital.

Dear Mr. Rojansky,

Please find enclosed a draft preliminary of :

- 1- Furniture layout & Key.
- 2- Electrical preliminary.
- 3- Heating/Refrigeration generating plant.
- 4- Ducts and grills.
- 5- Machine layout.

Your quick feedback will greatly enhance the progress of this project.
Looking forward for your comments.

Sincerely,

Jamal P. Araj

Jamal Araj
Director

c.c. Mrs. S. Gonen.
Mr. Y. Shechter.
Mr. Z. Hacker.
Mr. S. Kopilov.
Mr. Salamon.



19.12.84

A. Reception Transfer Area

1. Trolley from outside.
2. Trolley from the operating area.
3. Rail + door.
4. Parking for trolleys of patients which are at the operation.

B. Anaesth Room

1. Work table + cabin below; shelving above (cabinet), sink; writing desk (pull type).
2. Stool.
3. Dressing trolleys.
4. Patient's trolley.
5. Towel dispenser.
6. Anaesthetic machine.
7. Infusion stand.
8. Shock trolley.
9. Light ceiling mounted.
10. Gases ceiling mounted.

C. O.R

1. Operating table.
2. Anaesthetic machine.
3. Sterile instruments.
4. Suction bottle trolley.
5. Diathermy unit.
6. Lotion bowl.
7. Triple viewing box.
8. Swab board.
9. Clock.
10. Mobile swab rack.
11. Exist for disposal trolley.
12. Ceiling outlet.
13. Adjust center light.

D. Scrub

1. Scrub-up for two people.
2. Waist basket.
3. Open shelve cabinet.

E. Preparation Room

1. Above shelving.
2. Heater for solutions.
3. Closed shelving above.

.../2



F. Recovery Area

1. Patient's trolley.
2. Curtains.
3. Shelves behind beds.
4. Nurses working top + lower cabine; above shelving; sink.
5. Nurses station.
6. Frigids + closet above for clean sheets.
7. Extra storage.
8. Recession trolley.

G. Changing Room

1. Double deck lockers.
2. Wash room.
3. Shower.
4. Bench + hangers.
5. Shelving for suits towels.

H. Nurses Working

1. Work top + sink; kitchen cabinet below; shelving above.
2. Small office: table; high shelving; chairs.
3. High speed autoclaving.
4. Bulletin board.

I. Head Nurse

1. Table; 2 chairs; director chair.
2. Cupboard; shelves.
3. Bulletin board.

J. Doctor's Office

1. Table; chairs; shelves.
2. Couch.
3. Closet.

K. Staff Rest Room

1. Arm chairs; coffee tables.
2. Writing desk; book shelves above.
3. Kitchen type cupboard; sink; refrigerator.

L. Store

Low equipment; high shelving.

M. Jenitor Room; Slop Sink.

N. Trolley Parking

O. Area to clean trolley + extra storage (high shelves) if necessary.

.../3



المجموعة
الاشارة
للتنمية والاعمار

community development group

-3-

P. Sluice

1. Sluice; shelves above.
2. Top working area; sink.
3. Dirty linen cabinet.

Q. Receiving and Cleaning

1. Double sink; dripping; working area; shelves above; cabinets below.
2. Area to clean trolleys.
3. Hot air blower.
4. Big bowl of dettol.
5. Working top.
6. Trolley for laundry.

R. Packing

1. Packing unit for instruments.
2. Packing unit for linens.
3. Extra working top.

S. Sterilising Area

1. 2 autoclaving.

T. Sterile Store

1. Fixed shelving.

U. New Material



24.4.85
202/85

תאריך
מסד הביווי והשיכון
מחלקת פמ"ח, המשרד הראשי
5-05-1985
5/11/7

(2)
למחלקת
מ"ר גיל אבימר
מע"צ ראשי
ירושלים

מחלקת עבודות צבוריות
המשרד הראשי
האגף לבניית מוסדות ממשלה
לתיירות מנהל האגף
5.5.85

הנדון: תכנון מערכות עבור בתי חולים ביו"ש

1. לאחרונה בזמן התיכנון ניתקלתי בבעיה שחלק ממערכות של בתי חולים שלנו מתוכננים אך ורק למחלקות שמע"צ מטפל בהם כגון: בי"ח חברון אגף ניתוחים - מתכננים מערכת גזים רפואיים ללא שום התחשבות לצורך כל בית החולים לעתיד ולכן יוצר מצב של מערכות כפולות, מערכות של מיזוג אויר מתוכננות בכל מני אפשרויות ללא התחשבות שזה בי"ח יחסית קטן ואפשר היה לתכנן מערכת מרכזית יעילה ובעתיד הקרוב יהיה צורך להכניס מערכות נוספות עבור מיזוג אויר.

2. אודה לך אם צורת המתכננים ישתף פעולה עם האגף הטכני של בריאות יו"ש לפני תחילת התיכנון.

1
עילום על:
ש' קאסילוב
5/5
נשלח
מ"ר גיל אבימר
מחלקת פמ"ח

בכבוד רב
שלמון ביצי'ך
מנהל שרותים טכניים
בשרותי הבריאות איו"ש

העתק: רע"ן מו"ש
קמ"ט בריאות
יוסי שכטר
שלמה קופילוב

על הנושא



Handwritten notes: 10.5.85, 17.5.85, 19.5.85, 23.5.85, REF: 26/1/14, 6/5/85

DATE: 14.4.85

ה"ח: תא"ל א.בקנשטיין (סגן מתאם הפעולות בשטחים) ד.אפרתי, מ.אהרון, צ.סער (מינהל אזרחי, יו"ש) י.סבר, י.שכטר, צ.האקר, ס.ביצ'ין (שרותי הבריאות, יו"ש) א.גיל, ע.לוכסנבורג, א.ערמון, י.רוז'נסקי, א.גורביץ', ש.גונן, פ.רייס (מע"צ)

Handwritten signature and date: 6/5/85

Handwritten date: 23.5.85

א.ג.כ.

הנדון: בתי-חולים ביו"ש - עדכון לוחות הזמנים

בהתייחס ללוח הזמנים מתאריך 18.1.85 (שצורף למסמך מס' 26/1/14 מתאריך 18.1.85) - להלן דוח על מעב הפרויקטים השונים ולוח זמנים הצפוי לקדומם - מעודכן לאור הארועים וההתפתחויות בחודשים האחרונים. במסמך וכלוח הזמנים המצורף מפורטים גם הפרויקטים החדשים שהועבר להם תקציב ראשון לאחר פרסום הדוח הקודם.

1. ביה"ח רמאללה, אגף הרנטגן

העבודה בשטח החלה כמתוכנן ונמצאת בעצומה, צפוי שהעבודה תושלם לפי לוח הקודם, בחודש 8/85.

2. ביה"ח רמאללה, אגף חדרי נתוח

המכרז הופץ ונפתח לפי לוח הזמנים המקורי, ב 28.1.85. האגודה הערבית לרפואה וריוחה ברמאללה הזמינה את העבודה ב 28.2.85, אך עקב בעיות התקשרות עם הספק (ערבויות בנקאיות וכד') העבודה החלה רק בתחילת אפריל. לוח זמנים: צפוי שהעבודה תושלם עד חודש 11/85.

3. ביה"ח בית-ג'אלה, אגף הרנטגן

התכנון והכנת החומר למכרז הושלמו לפי לוח הזמנים. לאחר שהחומר הושלם (כולל הדפסה וכריכה!) נתבקשנו ע"י שרותי הבריאות לשנות פרטים טכניים אחדים (צנרת אינסטלציה מנחושת במקום מפלדה) והחומר יצא למכרז באחור. אנו צופים שתוצאות המכרז יודאו בחודש 5/85 ושהעבודה תושלם בתחילת חודש 11/85.

4. ביה"ח חברון, אגף הרנטגן

התכנון והכנת החומר למכרז הושלמו לפי לוח הזמנים. לאחר שהחומר הושלם (כולל הדפסה וכריכה!) נתבקשנו ע"י שרותי הבריאות לשנות פרטים טכניים אחדים (צנרת אינסטלציה מנחושת במקום מפלדה) והחומר יצא למכרז באחור. אנו צופים שתוצאות המכרז יוצאו בחודש 5/85 ושהעבודה תושלם בתחילת חודש 11/85.

5. ביה"ח חברון, אגף חדרי נתוח

השלב הראשון כהקמת האגף - הקמת האזור המתועש - בוצעה לפי לוח הזמנים, המסירה נערכה ב 3.4.85, ולמעט השלמת הערות אחדות - העבודה הסתיימה.

השלב השני - בצוע מערכות אלקטרוטכניות: החומר נמצא עתה במכרז. השלמת המערכות לאזור המתועש צפויה בחודש 11/85. במקביל יתארגן ביה"ח להפעלת האגף החדש (העברת עיוד, סטרליזציה וכו'), להפעלה בחודשים 11/85 - 12/85.

השלב השלישי - הריסה ובנייה מחדש של אזור הנתוחים הקיים: העבודה באזור זה תחל רק לאחר התארגנות ביה"ח והתחלת נתוחים באגף החדש. אנו התחלנו בתכנון מחדש של האגף הקיים לאור דרישות פרוגרמטיות מעודכנות של שרתי הבריאות. התכנון יושלם עד 8/85. במקביל נשלם הכנת החומר למכרז עבודות ההריסה והבנייה מחדש של האגף הקיים, עד חודש 10/85. העבודות באגף הקיים יימשכו כ 6 חודשים, החל בחודש 12/85 ועד חודש 5/86.

הערה:

לוח הזמנים המפורט לשלבים השני והשלישי של הקמת אגף הנתוחים הם בהערכה גסה בלבד עקב ריבוי הגורמים שאינם בשליטתנו. נצליח להתקרב ללוח הזמנים הנ"ל במידה ולא יחולו עכובים בהערות הטכניות לתכנון ובמידה וביה"ח אכן יתארגן באגף החדש ויפנה את האגף הקיים במהירות.

6. פרוגרמות לנתי-חולים רמאללה, חברון ובית-ג'אלה

הפרוגרמות התאורטיות הושלמו למעשה, כולל הצגת הנושאים בפני ארגון הבריאות הבינלאומי בחודש 3/85. הפרוגרמות מתורגמות עתה הלכה למעשה במסגרת תכניות האב.

* תכניות אב - הסבר כללי

מטרת תכנית האב היא לבחון את ערכי ביה"ח לפי הפרוגרמה שגובשה ולהמליץ על שנויים, תוספות בניה ותשתית מערכות - וזאת בהתייחס לפתוח שהתבצע בעבר, מתבצע בהווה ולפתוח ביה"ח בעתיד. תכנית האב תאפשר התפתחות ביה"ח לפי הנחיות מוגדרות לכל מחלקה, נושא ומערכת אלקטרוטכנית. כל פרויקט בעתיד ימוקם לפי תכנון מראש ויקבל את השרותים הטכניים במסגרת תכנית האב. תכנית האב תדון במקום המחלקות והפונקציות השונות בביה"ח; בניה נוספת; בעיות קונסטרוקטיביות; דרכי גישה וכניסות לביה"ח; הנחיות לתשתית ולתכנון מפורט של מערכות אלקטרוטכניות; וכד'.

תכנית האב אינה כוללת תכנון מפורט של בינוי או של מערכות. תכנון כזה יבוצע בטסגרת תכנון ובצוע של כל שלב ופרויקט בפתוח ביה"ח.
צות תכנית האב כוללת את מנהל ביה"ח; אנשי שרותי הבריאות; אדריכלי ומהנדסי מע"צ; צות מתכננים ויועצים לאדריכלות ולמערכות השונות; וכך מנהל ומרכז הצות.

7. ביה"ח רמאללה - תכנית אב לבנוי ומערכות

תכנית האב בביה"ח רמאללה החלה בחודש 2/85.
השלב הפרוגרמטי/אדריכלי בעצמו והוא יגובש בעקרו תוך כ 3 חודשים.
נושא הבנוי, קונסטרוקציה ומערכות יגובש תוך כ 8 חודשים נוספים.
צפוי שעבודת הצות תמשך עד חודש 2/86, תוך מתן הדגשים במשך התקופה לפרויקטים הדחופים, המתוכננים ומבוצעים בהוה ובעתיד הקרוב.

8. ביה"ח חברון - תכנית אב לבנוי ומערכות

השלב הפרוגרמטי/אדריכלי יגובש בעקרו עד 7/85. נושא בנוי, קונסטרוקציה ומערכות יגובש תוך כ 8 חודשים נוספים.
צפוי שעבודת צות תכנית האב תמשך עד חודש 6/86, תוך מתן הדגשים במשך התקופה לפרויקטים דחופים, המתוכננים ומבוצעים בהוה ובעתיד הקרוב.

9. ביה"ח בית-ג'אלה - תכנית אב לבנוי ומערכות

לוח הזמנים דומה לזה של תכנית האב בחברון, אך יש לפתור את בעית צות המתכננים. המלצת מע"צ היא שהצות יהיה ישראלי והמתכנן המקומי יהיה יועץ בלבד (הנושא בטפולו של י.שכטר).

10. ביה"ח רפידיה - אגף רנטגן, מיון, מרפאות חוץ ובית מרקחת


הפרויקט כולל עבודות שנויים ותוספות בבנין קיים (שטחו כ 740 מ"ר); וכך תוספת בנין חדש (בשטח של כ 600 מ"ר).
הפרויקט נמצא בשלב של גבוש פרוגרמטי בשתוף שרותי הבריאות, מע"צ והמתכננים.
בהנחה שהפרוגרמה תגובש בתוך כחודש, תכנון הפרויקט המורכב תמשך כ 5 - 6 חודשים נוספים (מותנה בפרוגרמה ובדרישות).
הבצוע יהיה אפשרי גם בשלבים - מותנה בלו"ז הקצאת תקציבים.

בכרמל
שלמה קיסרי

בתי-חולים ביו"ש - לוחות זמנים

7/86	6/86	5/86	4/86	3/86	2/86	1/86	12/85	11/85	10/85	9/85	8/85	7/85	6/85	5/85	4/85	חודש	הפרויקט
																	רמאללה רנטגן בצוע
																	רמאללה חדרי נתוח מכרז בצוע
																	בית-ג'אלה רנטגן תכנון וחומר למכרז מכרז בצוע ●
																	חברון רנטגן תכנון וחומר למכרז מכרז בצוע
																	חברון, אגף נתוחים שלב א' בצוע האזור הממועש שלב ב' - מערכות מכרז בצוע ●
																	* התארגנות ביה"ח לנתוחים באזור החדש שלב ג' - שפוצים באגף הקיים תכנון שנויים באגף מכרז בצוע (לאחר התחלת נתוחים באגף החדש) בוצעו לפי לוח הזמנים
																	ביה"ח רמאללה - תכנית אב פרוגרמטי/אדריכלי שלב מערכות
																	ביה"ח חברון - תכנית אב פרוגרמטי/אדריכלי שלב מערכות
																	ביה"ח בית-ג'אלה - תכנית אב פרוגרמטי/אדריכלי שלב מערכות
																	ביה"ח רפידה, רנטגן, מיון, מרפאות, בית- מרקחת גבוש פרוגרמה תכנון ● בצוע
																	מותנה בהקצאת תקציבים ובדרישות הפרוגרמטיות

ג' ז"ל



REF.: 26/1/21

DATE: 14.4.85

לכבוד

ה"ה: תא"ל א. בקנשטיין (סגן מתאם הפעולות בשטחים)
ד. אפרתי, מ. אהרון, צ. סער (מינהל אזרחי, יו"ש)
י. סבר, י. שכטר, צ. האקר, ס. ביצ'ין (שרותי הבריאות, יו"ש)
א. גיל, ע. לוכסנבורג, א. ערמון, י. רוז'נסקי, א. גורביץ', **ש. גונן**, פ. רייס (מע"צ)

א. ג. נ. .

הנדון: בתי-חולים ביו"ש - עדכון לוחות הזמנים

Handwritten signature/initials on the left margin.

בהתייחס ללוח הזמנים מתאריך 18.1.85 (שצורף למסמך מס' 26/1/14 מתאריך 8.1.85 להלן דרוח על מצב הפרויקטים השונים ולוח זמנים הצפוי לקדומם - מעודכן לאור האירועים וההתפתחויות בחודשים האחרונים. במסמך ובלוח הזמנים המצורף מפורטים גם הפרויקטים החדשים שהועבר להם תקציב ראשון לאחר פרסום הדוח הקודם.

1. ביה"ח רמאללה, אגף הרנטגן

העבודה בשטח החלה כמתוכנן ונמצאת בעצומה. צפוי שהעבודה תושלם לפי לוח הזמנים, בחודש 8/85.

2. ביה"ח רמאללה, אגף חדרי נתוח

המכרז הופץ ונפתח לפי לוח הזמנים המקורי, ב 28.1.85. האגודה הערבית לרפואה ורווחה ברמאללה הזמינה את העבודה ב 28.2.85, אך עקב בעיות התקשרות עם הספק (ערבויות בנקאיות וכד') העבודה החלה רק בתחילת אפריל. לוח זמנים: צפוי שהעבודה תושלם עד חודש 11/85.

3. ביה"ח בית-ג'אלה, אגף הרנטגן

התכנון והכנת החומר למכרז הושלמו לפי לוח הזמנים. לאחר שהחומר הושלם (כולל הדפסה וכריכה!) נתבקשנו ע"י שרותי הבריאות לשנות פרטים טכניים אחדים (צנרת אינסטלציה מנחושת במקום מפלדה) והחומר יצא למכרז באחור. אנו צופים שתוצאות המכרז יודאו בחודש 5/85 ושהעבודה תושלם בתחילת חודש 11/85.

4. ביה"ח חברון, אגף הרנטגן

התכנון והכנת החומר למכרז הושלמו לפי לוח הזמנים. לאחר שהחומר הושלם (כולל הדפסה וכריכה!) נתבקשנו ע"י שרותי הבריאות לשנות פרטים טכניים אחדים (צנרת אינסטלציה מנחושת במקום מפלדה) והחומר יצא למכרז באחור. אנו צופים שתוצאות המכרז יוצאו בחודש 5/85 ושהעבודה תושלם בתחילת חודש 11/85.

5. ביה"ח חברון, אגף חדרי נתוח

השלב הראשון בהקמת האגף - הקמת האזור המתועש - בוצעה לפי לוח הזמנים, המסירה נערכה ב 3.4.85, ולמעט השלמת הערות אחדות - העבודה הסתיימה.

השלב השני - בעוד מערכות אלקטרוטכניות: החומר נמצא עתה במרכז. השלמת המערכות לאזור המתועש עפויה בחודש 11/85. במקביל יתארגן ביה"ח להפעלת האגף החדש (העברת ציוד, סטרליזציה וכו'), להפעלה בחודשים 11/85 - 12/85.

השלב השלישי - הריסה ובניה מחדש של אזור הנתוחים הקיים: העבודה באזור זה תחל רק לאחר התארגנות ביה"ח והתחלת נתוחים באגף החדש. אנו התחלנו בתכנון מחדש של האגף הקיים לאור דרישות פרוגרמטיות מעודכנות של שרותי הבריאות. התכנון יושלם עד 8/85. במקביל נשלים הכנת החומר למרכז עבודות ההריסה והבניה מחדש של האגף הקיים, עד חודש 10/85. העבודות באגף הקיים יימשכו כ 6 חודשים, החל בחודש 12/85 ועד חודש 5/86.

הערה:

לוח הזמנים המפורט לשלבים השני והשלישי של הקמת אגף הנתוחים הם בהערכה גסה בלבד עקב ריבוי הגורמים שאינם בשליטתנו. נצליח להתקרב ללוח הזמנים הנ"ל במידה ולא יחולו עכובים בהערות הטכניות לתכנון ובמידה וביה"ח אכן יתארגן באגף החדש ויפנה את האגף הקיים במהירות.

6. פרוגרמות לבתי-החולים רטאללה, חברון ובית-ג'אלה

הפרוגרמות התאורטיות הושלמו למעשה, כולל הצגת הנושאים בפני ארגון הבריאות הבינלאומי בחודש 3/85. הפרוגרמות מתורגמות עתה הלכה למעשה במסגרת תכניות האב.

* תכניות אב - הסבר כללי

מטרת תכנית האב היא לבחון את ערכי ביה"ח לפי הפרוגרמה שגובשה ולהמליץ על שנויים, תוספות בניה ותשתית מערכות - וזאת בהתייחס לפתוח שהתבצע בעבר, מתבצע בהווה ולפתוח ביה"ח בעתיד. תכנית האב תאפשר התפתחות ביה"ח לפי הנחיות מוגדרות לכל מחלקה, נושא ומערכת אלקטרוטכנית. כל פרויקט בעתיד ימוקם לפי תכנון מראש ויקבל את השרותים הטכניים במסגרת תכנית האב. תכנית האב תדון במקום המחלקות והפונקציות השונות בביה"ח; בניה נוספת; בעיות קונסטרוקטיביות; דרכי גישה וכניסות לביה"ח; הנחיות לתשתית ולתכנון מפורט של מערכות אלקטרוטכניות; וכד'.

תכנית האב אינה כוללת תכנון מפורט של בינוי או של מערכות. תכנון כזה יבוצע במסגרת תכנון וביצוע של כל שלב ופרויקט בפתוח ביה"ח. צות תכנית האב כוללת את מנהל ביה"ח; אנשי שרותי הבריאות; אדריכלי ומהנדסי מע"צ; צות מתכננים ויועצים לאדריכלות ולמערכות השונות; וכך מנהל ומרכז הצות.

7. ביה"ח רמאללה - תכנית אב לבנוי ומערכות

תכנית האב בביה"ח רמאללה החלה בחודש 2/85. השלב הפרוגרמטי/אדריכלי בעצמו והוא יגובש בעקרו תוך כ 3 חודשים. נושא הבנוי, קונסטרוקציה ומערכות יגובש תוך כ 8 חודשים נוספים. צפוי שעבודת הצות תמשך עד חודש 2/86, תוך מתן הדגשים במשך התקופה לפרויקטים הדחופים, המתוכננים ומבוצעים בהוה ובעתיד הקרוב.

8. ביה"ח חברון - תכנית אב לבנוי ומערכות

השלב הפרוגרמטי/אדריכלי יגובש בעקרו עד 7/85. נושא בנוי, קונסטרוקציה ומערכות יגובש תוך כ 8 חודשים נוספים. צפוי שעבודת צות תכנית האב תמשך עד חודש 6/86, תוך מתן הדגשים במשך התקופה לפרויקטים דחופים, המתוכננים ומבוצעים בהוה ובעתיד הקרוב.

9. ביה"ח בית-ג'אלה - תכנית אב לבנוי ומערכות

לוח הזמנים דומה לזה של תכנית האב בחברון, אך יש לפתור את בעית צות המתכננים. המלצת מע"צ היא שהצות יהיה ישראלי והמתכנן המקומי יהיה יועץ בלבד (הנושא בטפולו של י. שכטר).

10. ביה"ח רפידיה - אגף רנטגן, מיון, מרפאות חוץ ובית מרקחת

הפרויקט כולל עבודות שנויים ותוספות בבנין קיים (שטחו כ 740 מ"ר); וכן תוספת בנין חדש (בשטח של כ 600 מ"ר). הפרויקט נמצא בשלב של גבוש פרוגרמטי בשתוף שרותי הבריאות, מע"צ והמתכננים. בהנחה שהפרוגרמה תגובש בתוך כחודש, תכנון הפרויקט המורכב תמשך כ 5 - 6 חודשים נוספים (מותנה בפרוגרמה ובדרישות). הביצוע יהיה אפשרי גם בשלבים - מותנה בלו"ז הקצאת תקציבים.

בכרמל
שלמה קיסרי

בתי-חולים ביו"ש - לוחות זמנים

7/86	6/86	5/86	4/86	3/86	2/86	1/86	12/85	11/85	10/85	9/85	8/85	7/85	6/85	5/85	4/85	חודש	הפרויקט
																	רמאללה רנטגן בצוע
																	רמאללה חדרי נחוח מכרז בצוע
																	בית-ג'אלה רנטגן תכנון וחומר למכרז מכרז בצוע
																	חברון רנטגן תכנון וחומר למכרז מכרז בצוע
																	חברון, אגף נחוחים שלב א' בצוע האזור המחושש שלב ב' - מערכות מכרז בצוע
																	* התארגנות ביה"ח לנחוחים באזור החדש שלב ג' - שפוצים באגף הקיים תכנון שנויים באגף מכרז בצוע (לאחר התחלת נחוחים באגף החדש) פרוגרמות בוצעו לפי לוח הזמנים
																	ביה"ח רמאללה - תכנית אב פרוגרמטי/אדריכלי שלב מערכות
																	ביה"ח חברון - תכנית אב פרוגרמטי/אדריכלי שלב מערכות
																	ביה"ח בית-ג'אלה - תכנית אב פרוגרמטי/אדריכלי שלב מערכות
																	ביה"ח רפידיה, רנטגן, מיון, מרפאות, בית- מרקחת גבוש פרוגרמה תכנון בצוע
																	מותנה בהקצאת תקציבים וכדרישות הפרוגרמטיות



Handwritten signature and initials in the top left corner.

14.4.85

תאריך

175/85

משרד הבינוי והשיכון
מח' מכוונת פוריות ומשפוד וראשי
26-04-1985
5/11/7

לכבוד

גב' עדה לוכסטבורג
מע"צ מחוז ירושלים

מחלקת עבודות ציבוריות
המשפד הראשי
האגף לבניית מוסדות ציבוריים
לשכת ע"פ האגף
צבוס בוחם
26.4.85

הנדון: מכרז מערכת גזים רפואיים

ה
ת
ק
ג

1. מערכת גזים רפואיים עד היום בכל בתי החולים ללא יוצא מן הכלל היתבצעו ע"י חברת זילברטן ואנן. שבע רצון מהם, עד היום לא התעוררו בעיות עם החברה הנ"ל והחברה מגישה לנו טיפול ושירות בזמן, בטיב טוב וברמה מקצועית גבוהה.
2. המערכות של חברת זילברטן הן מערכות תוצרת הארץ ואין בעיות עם חלקי חילוף וכו'.
3. בעבר ניכשלנו עם כמה חברות שזכו במכרזים ולאחר הקמת המערכות פנינו לחברת זילברטן לצורך פירוק והכנסת המערכות של חברת זילברטן.
4. עלינו לצייד שבבית חולים חדרון (אגף ניתוחים) גם נישמרה העבודה לחברת זילברטן.
5. כל הציוד שנימצא אצלנו של גזים רפואיים מתאים לשקעים של חברת זילברטן ולא מתאים לחברות אחרות.
6. אבקש למצוא סידור ולמסור את העבודות הנ"ל אך ורק לחברת זילברטן ולהסתמך על המכרזים שהוצאו בעבר.

ביצ'י כניס רג
סלוטון ביצ'ין
מנהל שרותים טכניים
בשרותי הבריאות איו"ש

העתק: קמ"ט בריאות
אמרכל בריאות
רע"ן מו"ש
מר גיל אבימר - מע"צ ✓
מר שלמה קופילוב
גב' פנינה וייס - מע"צ

REF.: 26/1/20

DATE: 5.4.85



הפריקט: בתד-חוליס ביו"ש

סכום ישיבה

שוערבה בתאריך 5.4.85 בנושא מהכנתים לפרויקטים חדשים

מקום הישיבה: טש' ש. קופילוב

נוכחים: ה"ח: י. רוז' נסקי, ש. גרנץ (טע"צ); ט. קופילוב.

תפוצה: הנרכחים; ה"ח: א. גיל, א. ערמוך, א. גולדשלגר (טע"צ).

סובט ע"י: שלמה קופילוב

Handwritten notes:
קופילוב
התאריך
14-04-1985
Stult

סעיף	ה נו ש א	הטפול באחריות	עד תאריך
	כללי		
	הישיבה נערכה לעורך דיון בפרויקטים נוספים ביו"ש שהועבר למע"צ תקציב עבורם ויש להקים צוות יועצים, רשימת היועצים בפרויקטים הקיימים מופיעה במכתב מס' 26/1/6 מתאריך 10.7.84.		
	<u>גדרון וסוכס כלהלן:</u>		
1.	<u>3 הפרויקטים הנוספים:</u>		
1.1	ביה"ח חברון, תכנית אב (תכנון כולל).		
1.2	ביה"ח בית-ג' אלה, תכנית אב (תכנון כולל).		
1.3	ביה"ח רפידיה, תוספות ושינויים באגף רנטגן, מרפאות ומיון; תוספות בניה.		
	* תכניות האב (טע' 1.1 ו 1.2 לעיל) כולל גם פתרונות פרוגרמטיים/אדריכליים וכך תכנית אב למערכות.		
			2/..

Handwritten notes:
15/2

עד תאריך	הטיפול באחריות	ה נו ש א	טעין
19.4.85	רוז' נסקי	<p><i>בית"ח חכרון, תכנית אב</i></p> <p>* האדריכל יהיה: גרשון ציפור.</p> <p>* מתכנני ט/א, אינסטלציה וחשמל: מוטלץ שיהיו המתכננים המעורבים באגף הנתוחים ובאגף הרנטגן (דהיינו איסקוביץ-שפירא-האן, אלישע פרנקל וגלעד).</p> <p>* יועץ כבאות: אלכסנדר שפיר.</p> <p>* ניהול, תאום ופקוח: שלמה קופילוב.</p> <p>י.רוז' נסקי יגבש תשובה סופית תוך שבועיים.</p>	2
19.4.85	ש.קופילוב	<p><i>בית"ח בית-ג' אלה, תכנית אב</i></p> <p>3.1 בפריקט מעורב ג'. ארג' כמתכנן כללי. המלצנו בפני יוסי שכטר שיוקם צוות מתכננים ישראלי וג'. ארג' ישמש כיועץ. יוסי שכטר הבטיח תשובה.</p> <p>3.2 בהנחה שהמלצתנו תתקבל, להלן רשימת היועצים המומלצים (אך בשלב זה לא תהיה פניה ליועץ עד סכום הנושא עם י.שכטר).</p> <p>* אדריכל - י. גרשון</p> <p>* מערכות ט/א, אינסטלציה וחשמל - רוז' נסקי יגבש תשובה בתוך שבועיים.</p> <p>* יועץ כבאות: אלכסנדר שפיר.</p> <p>* ניהול, תאום ופקוח: שלמה קופילוב</p>	3
19.4.85	רוז' נסקי	<p>4 <u>רפידה, תוספות, שינויים ובניה חדשה של טח' רנטגן, שרפאות חוץ, מירון, אדמיניסטרציה.</u></p> <p>4.1 אדריכל: ישראל האן</p> <p>מערכות ט/א, אינסטלציה וחשמל: י.רוז' נסקי יגבש תשובה תוך שבועיים.</p> <p>יועץ כבאות: אלכסנדר שפיר</p> <p>ניהול, תאום ופקוח: שלמה קופילוב</p>	4
19.4.85	רוז' נסקי	<p>שלמה קופילוב</p>	

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

16 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64382, ISRAEL

טל. 2452961; 230870

טלפקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M.Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382

Handwritten notes: 3.5.85, 5.5.85, 10.5.85, and other illegible scribbles.

REF. 26/1/20

DATE: 5.4.85

Handwritten date: 3/3, 5.4.85

הפרויקט: בתי-חולים ביר"ש

משרד אביווי ואסיכון
1/4-04-1985
5/1/7

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 5.4.85 בנושא מתכננים לפרויקטים חדשים

מקום הישיבה: משר' ש. קופילוב
נוכחים: ה"ח: ד. רנד' נמקי, ש. גונד (מע"צ); ש. קופילוב.

תפוצה: הנדכחים; ה"ח: א. גיל, א. ערסון, א. גולדשלגר (מע"צ).

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

סעיף	ה נו ש א	הטפול באחריות	עד תאריך
	כללי		
	הישיבה נערכה לעורך דיון בפרויקטים נוספים ביר"ש שהועבר למע"צ הקציב עבורם ויש לחקים צות יועצים. רשימת היועצים בפרויקטים הקיימים שופיעה במכתב מס' 26/1/6 מזאריך 10.7.84.		
	נדרן וסוכם כלהלן:		
1.	3 הפרויקטים הנוספים:		
1.1	ביה"ח חברון, תכנית אב (תכנון כולל).		
1.2	ביה"ח בית-ג' אלה, תכנית אב (תכנון כולל).		
1.3	ביה"ח רפידיה, תוספות ושינויים באגף רנטגן, מרפאת ומיון; תוספות בניה.		
	* התכניות האב (סע' 1.1 ו 1.2 לעיל) כולל גם פתרונות פרוגרמטיים/אדריכליים וכך תכנית אב למערכות.		

עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		<p align="center"><u>ביה"ח חברון, תכנית אב</u></p> <p>* האדריכל יהיה: גרשון ציפור.</p> <p>* מתכנני ט/א, אינסטלציה וחשמל: מרטלץ שיחיו המתכננים המעורבים באגף הנתוחים ובאגף הרנטגן (דחיינו איסקוביץ-שפירא-האן, אלישע פרנקל וגלעד).</p> <p>* יועץ כבאות: אלכסנדר שפיר.</p> <p>* ניהול, תאום ופקוח: שלמה קופילוב.</p> <p>י.רוז'נסקי יגבש תשובה סופית תוך שבועיים.</p>	2
19.4.85	רוז'נסקי	<p align="center"><u>ביה"ח בית-ג'אלה, תכנית אב</u></p> <p>בפרויקט מעורב ג'.ארג' כמתכנן כללי.</p> <p>המלצנו בפני יוסי שכטר שיוקם צוות מתכננים ישראלי וג'.ארג' ישמש כיועץ. יוסי שכטר הבטיח תשובה.</p> <p>בהנחה שהמלצתנו תתקבל, להלן רשימת היועצים המומלצים (אך בשלב זה לא תחיה פניה לועדה עד סיום הנושא עם י.שכטר).</p>	3
19.4.85	ש.קופילוב	<p>* אדריכל - י.גרשון</p> <p>* מערכות ט/א, אינסטלציה וחשמל - רוז'נסקי יגבש תשובה בתוך שבועיים.</p> <p>* יועץ כבאות: אלכסנדר שפיר.</p> <p>* ניהול, תאום ופקוח: שלמה קופילוב</p>	3.1
19.4.85	רוז'נסקי	<p>רפידיה, תוספות, שינויים ובניה חדשה של מח' רנטגן, מרפאות חוץ, מיון, אדמיניסטרציה.</p> <p align="center">אדריכל: ישראל האן</p> <p>מערכות ט/א, אינסטלציה וחשמל: י.רוז'נסקי יגבש תשובה תוך שבועיים.</p> <p>יועץ כבאות: אלכסנדר שפיר</p> <p>ניהול, תאום ופקוח: שלמה קופילוב</p>	3.2
19.4.85	רוז'נסקי	<p align="center">ש.קופילוב</p> <p align="center">י.שכטר</p>	4
19.4.85	רוז'נסקי	<p align="center">ש.קופילוב</p>	4.1


 שלמה קופילוב

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
האגף לבניית מוסדות ממשלה
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך: ט' בשבט תשמ"ה
31 בינואר 1985

אל: סגן מהנדס מחוז ירושלים, מע"צ

מספר: 5/11/7

הנדון: בצוע עבודות באיזור יו"ש - טיפול אגף הבניה
והמחוז וחירוב עכור

באיזור יו"ש מבוצעות עבודות על ידכם שהמימון שלהן מקבל המחוז ישירות (בדרך כלל מתמשל האזורי ביו"ש) אולם לאגף הבניה יש גם כן טיפול מסוים בהן, כגון: בדיקת מכרזים, חריגים, אשורי הארכת, וזוה דעה מקצועית - הנדסית לפי הצורך, מגע עם קבלנים ומתכננים, טיפול מנהל האגף וכדומה. כמו כן עוסקים בפרויקטים גם עובדי המחוז בתפקידיהם השונים.
כידוע מימון הוצאות מע"צ כולה הוא מתקציב הפרויקטים עצמם.

אי לכך עליך לדאוג להשתתפות בכיסוי הוצאות וזה על ידי חיוב של 13 1/2% וזה בנוסף לחיוב הקבוע בהוצאות הכלליות של מע"צ (מינהל והוצאות), לפי הוראות מנהל מע"צ וחשב מע"צ.

הערה - מסוימים שטפולנו מוגבל ומועט יותר אפשר להקטין את 13 1/2% הנ"ל - אולם זה חייב להעשות תוך האוה מוקדם אחי ואשורי בכתב, ועל סמך זה לפעול חשב מע"צ וגזבר המחוז.

אוסף ואדגיש שאנו מצפים ממך לסייע לנו באופן מלא בהשגת המימון הדרוש לפעולת המחוז, האגף ומע"צ כולה בכיסוי ההוצאות - אחרת נאלץ לצמצם בהוצאות ובפעילות ולפטר עובדים.

בברכה,

סגן מנהל מע"צ
ומנהל האגף לבניה
מוסדות ממשלה

העתק: מנהל מע"צ
סגן מנהל מע"צ (מינהל ואפסנאות)
חשב מע"צ
תיק 5/4/1

SECRET
CONFIDENTIAL
TOP SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
TOP SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

א"ר : הו"ס/ק"ו

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.


16 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

TELEX: 35770-1 COIN IL טלפקס:

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ



Handwritten notes and signatures: 7.2.85, 8.2.85, 26/1/18, 10.2.85, 14.2.85

DATE 18.1.85

לכבוד

ה"ה: תא"ל א. בקנשטיין (סגן מתאם הפעולות בשטחים)
ד. אפרתי, מ. אהרון, א. אילוז (מנהל אזרחי, יו"ש)
י. סבר, י. שכטר, צ. האקר, ס. כיצ'ין (שרותי הבריאות, יו"ש)
א. גיל, ע. לוכסנבורג, א. ערמון, י. רוז'נסקי, א. גורביץ', ש. גונן (מע"ט)

א.נ.נ.

הנדון: בתי-חולים ביו"ש - עדכון לוח זמנים

בהתייחס ללוח הזמנים מתאריך 30.11.84 (שצורף לסכום ישיבה מס' 26/1/14 מתאריך 30.11.84) - להלן לוח זמנים הצפוי - מעודכן לאור האירועים וההתפתחויות בחודשים האחרונים (ראה נספח).

1. ביה"ח רטאללה, אגף הרנטגן

המכרז הופץ ונפתח לפי לוח הזמנים המקורי. העבודה עדיין לא החלה משום שלא הועבר תקציב משרותי הבריאות למע"ט. בהנחה שהתקציב יועבר עד 31.1.85, צפוי שהעבודה תושלם בחודש 8/85.

2. ביה"ח רטאללה, אגף חדרי נתוח

המכרז הופץ ונפתח לפי לוח הזמנים המקורי. גמר צפוי - לפי לוח הזמנים המקורי.

3. ביה"ח בית-ג'אלה, אגף הרנטגן

התכנון האלקטרוטכני התעכב עקב הויכוחים שהיו בנושא שיטת מזוג האויר (ראה הסתייגות בסכום מס' 26/1/14 מתאריך 30.11.84, סעיף 8.3), הנושא סוכס סופית בתאריך 23.12.84. התכנון הקונסטרוקטיבי התעכב עקב הבעיות הקונסטרוקטיביות במבנה שהיו צפויות (ראה הערה בסכום הנ"ל, סעי' 8.4). השלמת הפרויקט צפויה עתה לחודש 9/85, מותנה בהעברת תקציב מיידית לאחר קבלת תוצאות המכרז.

4. ביה"ח חברון, אגף הרנטגן


התכנון האלקטרוטכני התעכב עקב הדיונים שהיו בנושא שיטת מזוג האויר (ראה הסתייגות ללו"ז הקודם, בסכום מס' 26/1/14 מתאריך 30.11.84, סעיף 11.3). הנושא סוכם סופית בתאריך 23.12.84. השלמת הפרויקט צפויה עתה לחודש 9/85, מותנה בהעברת תקציב מידית לאחר קבלת תוצאות המכרז.

5. ביה"ח חברון, אגף חדרי נתוח

העבודה באתר מתקדמת לפי לוח הזמנים המקורי. השלמת הבניה המתועשת צפויה בחודש 3/85. כזכור, מדובר בשלב הראשון של העבודה בלבד. יש צורך בתוספת תקציבית להשלמת המערכות האלקטרוטכניות, מנורות נתוח וציוד; וכן בשלב שני יהיה צורך לבצע שנויים ושפוצים באגף חדרי הנתוח הקיים (ראה פרוט בסכום מס' 26/1/14 מתאריך 30.11.84, סעיף 12.3).

6. פרוגרמות לביה"ח רמאללה, חברון ובית-ג'אלה

התכניות הושלמו. פרטים ונתונים שונים, המפרטים את המצב הקיים בבתי-החולים והפרוגרמות להתפתחות בעתיד - יוכנו עד חודש 2/85.

בברכה,

שלמה ארנסלוב

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

כ"א בטבת תשמ"ה
14 בינואר 1985

מספר:

5/11/7

לכבוד
מר י. שכטר
אמרכ"ל שרותי הבריאות, יו"ע
א.נ.א.

הנדון: בתי חולים ביו"ש - הקציבים לתכנון.

להלן טרוט התקציבים הדרושים לתכנון, ניהול ולווי של הפרוייקטים השונים שמע"צ מתכננת ומבצעת ביו"ש.
התקציבים הם באומדנא בלבד, והם במחירי חודש 12/84 ואינם כוללים המייקרויות לעמיד, האומדנים להלן מביאים בחשבון את כל התקציבים שהעברתם למע"צ עד כה, לרבות ההעברות התקציביות שהועברו בשבוע שעבר.
התקציבים כוללים מע"ט בלבד. מע"צ אינה גובה כל הוצאות בשלב התכנון, אלא תגבה בעת הוצאת הפרוייקטים לבצוע אחוז מסויים שעליו נשוב ונודיעכם.
ברצוני לציין שבצוע התכנון והוצאת הסכומים המפורטים לפי לוח הזמנים הנקוב - מותגים בהעברת הסכומים למע"צ תוך שבועיים.

1. ביה"ח רמאללה, אגף הרנטגן

הקציב נוסף הדרוש עד 31.3.85: 7.3 מיליון שקלים
קציב יב נוסף לתקופה 1.4.85 - 31.3.86: " " 17.2

2. ביה"ח רמאללה, חכנון כולל

הקציב נוסף הדרוש עד 31.3.85: --
הקציב נוסף לתקופה 1.4.85 - 31.3.86: " " 130
הקציב נוסף לתקופה 1.6.85 - 31.3.87: " " 40

3. ביה"ח בית ג'אלה, אגף הרנטגן

הקציב נוסף הדרוש עד 31.3.85: " " 15.8
הקציב נוסף לתקופה 1.4.85 - 31.3.86: " " 11.5

2/..

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחלקת עבודות ציבוריות
המשרד הראשי
ירושלים

תאריך:

- 2 -

מספר:

		4. <u>ביה"ח בית ג'אלה, אגף חדרי נחוח</u>
		הקציב נוסף הדרוש עד 31.3.85:
12.5	מיליון שקלים	הקציב נוסף לחקומה 1.4.85 - 31.3.86:
	אחוז מסויים מתבצוע	הקציב נוסף " " " 1.4.86 - 31.3.87:
	שעליו נודיעכם	
		5. <u>ביה"ח בית ג'אלה, חכנון כולל</u>
		הקציב נוסף הדרוש עד 31.3.85:
12.0	מיליון שקלים	" " " לחקומה 1.4.85 - 31.3.86:
	" " 3.0	" " " " 1.4.86 - 31.3.87:
		6. <u>ביה"ח חברון, אגף הרנטגן</u>
		הקציב נוסף הדרוש עד 31.3.85:
" "	17.3	הקציב נוסף לחקומה 1.4.85 - 31.3.86:
" "	11.5	
		7. <u>ביה"ח חברון, חכנון כולל</u>
		הקציב דרוש עד 31.3.85:
" "	13.3	הקציב נוסף לחקומה 1.4.85 - 31.3.86:
" "	4.0	" " " " 1.4.86 - 31.3.87:
		8. <u>ביה"ח רמידיה, אגף הרנטגן</u>
		הקציב נוסף הדרוש עד 31.3.85:
" "	1.5	" " " לחקומה 1.4.85 - 31.3.86:
" "	40.3	
		9. <u>ביה"ח בית לחם, חכנון רהוט</u>
		הקציב נוסף הדרוש עד 31.3.85:
" "	2	" " " לחקומה 1.4.85 - 31.3.86:

ב ב ר כ ה,

א. גולדסלגר, אינג'
מהנדס ראשי לבצוע בטועל

העתק: א. גיל, סגן מנהל מע"צ
ע. לוכטנבורג
השב מע"צ
מחלקת בצוע
ש. קומילוב

ORDER NO. _____
DATE _____
QUANTITY _____

- 2 -

1. ORDER NO. 1001, NEW YORK

ORDER NO. 1001 - 1001.001

ORDER NO. 1001 - 1001.002

ORDER NO. 1001 - 1001.003

—

1001.001
1001.002
1001.003

2. ORDER NO. 1002, NEW YORK

ORDER NO. 1002 - 1002.001

ORDER NO. 1002 - 1002.002

ORDER NO. 1002 - 1002.003

—

1002.001
1002.002
1002.003

3. ORDER NO. 1003, NEW YORK

ORDER NO. 1003 - 1003.001

ORDER NO. 1003 - 1003.002

—

1003.001
1003.002

4. ORDER NO. 1004, NEW YORK

ORDER NO. 1004 - 1004.001

ORDER NO. 1004 - 1004.002

ORDER NO. 1004 - 1004.003

—

1004.001
1004.002
1004.003

5. ORDER NO. 1005, NEW YORK

ORDER NO. 1005 - 1005.001

ORDER NO. 1005 - 1005.002

—

1005.001
1005.002

6. ORDER NO. 1006, NEW YORK

ORDER NO. 1006 - 1006.001

ORDER NO. 1006 - 1006.002

—

1006.001
1006.002

ORDER NO. 1007

ORDER NO. 1008

ORDER NO. 1009

ORDER NO. 1010

ORDER NO. 1011

ORDER NO. 1012

ORDER NO. 1013
ORDER NO. 1014

א"י ה'תשנ"ה

SHLOMO KOPILOV M. Sc
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

TELEX: 38770-1 COIN IL טלקס:

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382

REF: 26/1/17

DATE 1.1.85



לכבוד
מר א. גולדשלאגר
מהנדס ראשי - בצוע
מע"צ משרד ראשי
ירושלים

..א.נ.

הנדון: פרויקטים בבתי-חולים ביו"ש -
תמונת מצב מס' 1

להלן פרוט הפרויקטים בבתי-החולים ביו"ש, לרבות תאור, לוח זמנים, ומצב התקציבים.

האומדנים הכספיים עבור בצוע הפרויקט ועבור שכר-טרחת היועצים, מוערכים לחודש 12/84.

האומדנים אינם כוללים התיקרויות, מע"מ והוצאות מע"צ.

בסעיף 14 להלן, מופיע רכוז הפרויקטים שעבורם חסר תקציב ויש לכתוב למר ו. שכטר בשרותי הבריאות ביו"ש.

1. ביה"ח רמאללה, אנף רנטגן

1.1 תאור

שנויים, תוספות ושפוצים באנף הרנטגן הקיים לרבות שנויים בחדרים; שפור מערכות; שפור בגטור; שלוב מכונות רנטגן חדשות.

1.2 לוח

תוצאות המכרז צפויות תוך יומיים.

גמר בצוע משוער: חודש 6/85.

1.3 תקציב

אומדן לבצוע הפרויקט: כ 90 מליון שקלים.

אומדן להשלמת שכר-טרחת היועצים עד תום הפרויקט: כ 30 מליון שקלים.

אומדן השלמת שכר טרחת היועצים עד 31.3.85: כ 15 מליון שקלים.

* התקציב לשכר-טרחת נגמר ויש לכתוב לשרותי הבריאות בקשה לתוספת תקציב.

Handwritten notes on the left side of the page, including dates like 20.1.85, 24.1.85, 25.1.85, and 27.1.85, and some illegible signatures and initials.

2. ביה"ח רמאללה, אגף חדרי נתוח

2.1 תאור

שפור, שנויים ותוספות ב 3 חדרי הנתוח, במסדרון הנקי ובאזור הרחצה, לרבות נושא בניה, מערכות, גמור וציוד.

2.2 לוח

המכרז הופץ ע"י הארגון לרפואה ורוחה ברמאללה. תוצאות המכרז צפויות תוך כחודש. גמר בצוע משוער: חודש 9/85.

2.3 תקציב

הפרויקט ממומן ע"י הארגון הנ"ל ולא באמצעות מע"צ. מע"צ קיבלה לפני כשנה סכום של 400,000 ש' עבור פקוח עליון.

3. ביה"ח רמאללה, תכנון כולל, תכנית אב

3.1 תאור

תכנון כולל של בניי מערכות בביה"ח רמאללה לפי פרוגרמה שהוכנה ע"י שרותי הבריאות ביו"ש בשתוף אתנו.

3.2 לוח

צות היועצים נבחר, אך עדיין לא עבר בועדת עבודות. טשן העבודה: כ 10 חדשים מקבלת תקציב.

3.3 תקציב

התקציב הדרוש לשכר טרחת היועצים - לפי אומדן של כ 1,600 שעות עבודה (ראה מכתבי אליך מס' 20/04/83 מתאריך 1.10.84) - כ 17 מ' ש'. במכתבך לשרותי הבריאות (מס' 5/11/7/1 מתאריך 2.11.84) ביקשת סכום גבוה יותר. הובטח שיועבר תקציב חלקי של 4 עליון שקלים בימים הקרובים.

4. ביה"ח רמאללה, מכבסה ומערכת חסקה

תאור

מערכת החסקה מבוצעת ע"י קבלן שחתם חוזה עם אגודת ידידי ביה"ח. מע"צ מבצעת פקוח בלבד, ע"י מחוז ירושלים.

לוח

גמר הפרויקט צפוי תוך שנה.

5. ביה"ח בית-ג'אלה, אגף רנטגן

5.1 תאור

שנויים, תוספות ושפוצים באגף הרנטגן הקייס לרבות שנויים בחדרים, שפור מערכות; שפור בגטור; שלוב מכונות רנטגן חדשות.

5.2 לר"ז

החומר למכרז יוכן עד סוף חודש 2/85. גטר בצוע משוער: חודש 9/85 (בטח ויפתרו הבעיות הקונסטרוקטיביות בבנין אגף הרנטגן).

5.3 תקציב:

אומדן לבצוע הפרויקט: כ 60 מליון שקלים. אומדן להשלמת שכ"ט היועצים: כ 27 מליון שקלים. אומדן להשלמת שכ"ט היועצים עד 31.3.85: כ 17 מליון שקלים. עד כה הועבר לטע"צ סכום של 2.25 מליון שקלים; הובטח שיועבר בימים הקרובים סכום נוסף של 3.75 מליון שקלים, בהתאם למכתבן מס' 5/11/7/8 מתאריך 10.9.84.

התקציב שהועבר עד כה נוצל לחוזים חלקיים עם משרד האן (האדריכל) ועם משרדי.

עם שאר המתכננים עדיין לא נחתמו חוזים כלל.

* יש לכתוב לשרותי הבריאות בקשה לתקציב.

6. ביה"ח בית-ג'אלה, אגף נרחים

6.1 תאור

הקמת אגף חדרי נתוח הכולל 2 חדרי נתוח וחדרי עזר, בשטח של 480 מ"ר ועוד כ 250 מ"ר עבור מערכות.

6.2 לר"ז

לוח זמנים צפוי לתכנון: עד חודש 12/85. לוח זמנים לבצוע עדיין לא נקבע.

6.3 תקציב

אומדן לבצוע הפרויקט: כ 460 מליון שקלים. מרבית או כל המטון לבצוע ותכנון הפרויקט מבוצע ע"י ארגונים מקומיים. טע"צ עוסקת בפקוח, נהול ותאום התכנון והפקוח בלבד.

אומדן שכ"ט עד 31.3.85: כ 3 מליון שקלים.

חובטה שיועבר בימים אלו סכום של 4 מליון שקלים, מתוך \$20,000 שנדרשו ע"י טע"צ במכתב מס' 5/11/7/8 מתאריך 3.10.84.

7. ביח"ח בית-ג'אלה, אגף הרנטגן

תכנון כולל של בניי מערכות נביח"ח בית-ג'אלה לפי פרוגרמה שהוכנה ע"י שרותי הבריאות ביו"ש בשתוף אתנו. יתכן שהעבודה בפרויקט זה תהיה פשוטה יותר עקב קיומם התכנון חלקי שבוצע ע"י מתכננים מקומיים.

לאחר קבלת דרישה לתכנון משרותי הבריאות, נבדוק את התכנון הקיים ומע"צ תגיש לשרותי הבריאות אומדן לבצוע בקורת התכנון, שנויים בתכנון במידת הצורך ותכנית אב להתפתחות בפתיד.

8. ביח"ח חברון, אגף הרנטגן

8.1 תאור

שנויים, תוספות ושפוצים באגף הרנטגן הקיים לרבות שנויים בחדרים, שפור מערכות; שפור בגמור; שלוב סכונות רנטגן חדשות.

8.2 לוח

חומר למכרז יוכן עד 2/85.
גמר בצוע משוער: חודש 8/85.

8.3 תקציב

אומדן לבצוע הפרויקט: כ 60 מליון שקלים.
אומדן לחשלמת שכ"ט היועצים: כ 25 מליון שקלים.
אומדן לחשלמת שכ"ט היועצים עד 31.3.85: כ 15 מליון שקלים.
* התקציב לשכר-הטרחה נגמר ויש לכתוב לשרותי הבריאות בקשה לתוספת תקציב.

9. ביח"ח-חברון, אגף נתוחים

9.1 תאור

הקמת אגף נתוחים הכולל 3 חדרי נתוח וחדרי עזר.

9.2 לוח

האגף מוקם בשלבים. שלב המעטפת החיצונית כמעט והושלם; גמר הבניה המתועשת יושלם עד חודש 3/85; שלב האספקות והמערכות יושלם (מותנה בתוספת תקציב) תוך 6 חודשים מקבלת תקציב נוסף; שפוצים ושפורים באגף הקיים וצרופו לאגף החדש (מותנה בתוספת תקציב) תוך 6 חודשים מחשלמת האגף החדש, ומקבלת תקציב נוסף.

9.3 תקציב

התקציב הדרוש לבצוע ולהשלמת השלבים השונים מפורט במכתב ע. לוכסנבורג לשרותי הבריאות מתאריך 15.11.84.

אומדן להשלמת שכר טרחת היועצים: כ 10 מליון שקלים.
תקציב זה הועבר ממחוז ירושלים למשרד הראשי לפני כשבוע.

10. ביה"ח חברון, תכנון כולל

10.1 תאור

תכנון כולל של בניי טערכות בביה"ח חברון לפי פרוגרמה שהוכנה ע"י שרותי הבריאות ביו"ש בשתוף אתנו.

10.2 לר"ז

צות היועצים יקבע סופית לאחר קבלת התקציב.
משך העבודה: כ 10 חדשים מקבלת התקציב.

10.3 תקציב

התקציב הדרוש לשכר טרחת היועצים יבחן ויקבע לאחר שמע"צ תקבל דרישה לתכנון כולל ששרותי הבריאות.

11. ביה"ח רפודיה, רנטגן

11.1 תאור

שנויים, תוספות ושפוצים באגף הרנטגן הקיים באזור מרפאות החוץ, לרבות שנויים בטכנה; שפור טערכות; שפור בגמור; שלוב מכונות רנטגן חדשות.

11.2 לר"ז

היועצים נבחרו אך עדיין לא עברו כודעת עבודות מחוסר תקציב.
משך התכנון וחצוע: כ 14 חדשים מקבלת התקציב.

11.3 תקציב

אומדן לבצוע הפרויקט: כ 115 מליון שקלים.
אומדן שכ"ט היועצים: כ 45 מליון שקלים.
אומדן שכ"ט היועצים עד 31.5.85 (בהנחה שחעבודה תחל מיד): כ 10 מליון שקלים.
בחתאס למכתב מע"צ מס' 5/11/7/3 מתאריך 9.7.84, הובטח שבימים אלו יועברו 10 מליון שקלים למע"צ.

12. ביה"ח לחולי-נפש, בית-לחם

12.1 תאור

תכנון והוט לביה"ח.

12.2 ל"ז

גמר תכנון משוער: כ 3 חדשים.

12.3 תקציב

התקציב הדרוש לתכנון: כ 3 מליון שקלים.

— הובטח ע"י י.שכטר שבימים אלו יועברו 1.5 מליון שקלים למע"צ.

13. פרוגרמות לבתי-החולים רמאללה, בית-ג'אלה וחברון

13.1 תאור

השלמת פרוגרמות לבתי-החולים בשותף עם שרותי הבריאות, כולל תכניות ותאור בכתב של המצב הקיים - לעומת המצב העתידי - בכל מחלקה ופונקציה בשלושת בתי-החולים.

13.2 ל"ז

3 הפרוגרמות תושלמנה עד חודש 3/85.

13.3 תקציב

התקציבים לתכנון ובצוע הפרוגרמות נכללים בפרויקטים השונים שפורטו לעיל. פרוגרמה לביה"ח רמאללה - כלולה בפרויקט רמאללה, רנטגן. פרוגרמה לביה"ח בית-ג'אלה - תכלל בפרויקט בית-ג'אלה, רנטגן. פרוגרמה לביה"ח חברון - כלולה בפרויקט חברון, נתוחים.

14. סכום

אנא שלח בקשות לתוספת תקציב עבור שכר-טרוח היועצים לפרויקטים הבאים:

14.1 ביה"ח רמאללה, רנטגן (סעיף 1.3 לעיל).

14.2 ביה"ח בית-ג'אלה, רנטגן (סעיף 5.3 לעיל).

14.3 ביה"ח חברון, רנטגן (סעיף 8.3 לעיל).


כמו-כן, יש לעקוב אחר קבלת תקציבים שהובטחו ע"י י.שכטר שיועברו למע"צ בימים הקרובים כמפורט להלן, ולבקש מיד תוספת תקציבית בעודה והתקציבים זמינים:

14.4 ביה"ח רמאללה, תכנון כולל (סעיף 3.3 לעיל).

14.5 ביה"ח בית-ג'אלה, נתוחים (סעיף 6.3 לעיל).

14.6 ביה"ח רפידיה, רנטגן (סעיף 11.3 לעיל).

14.7 ביה"ח בית-לחם, תכנון רחוט (סעיף 12.3 לעיל).

בברכה,

שלמה קופילוב

העתקים:

ח"ח: א.גיל, ע.לוקסנבורג, י.רוז'נסקי, א.ערטוך

(1) The first part of the document is a list of names.

(2) The second part of the document is a list of addresses.

(3) The third part of the document is a list of telephone numbers.

Handwritten signature and scribbles.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE CHICAGO SKIN MUSEUM

נר 208

SHLOMO KOPILOV M. Sc
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

TELEX: 35770-1 COIN IL טלקס

שלמה קופילוב M. Sc

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382

REF.: 26/1/17

DATE 1.1.85



לכבוד
מר א. גולדשלאגר
מהנדס ראשי - בצוע
מע"צ משרד ראשי
ירושלים

..ג.א

הגדון: פרויקטים בבתי-חולים ביו"ש -
תמונת מצב מס' 1

להלן פרוט הפרויקטים בבתי-החולים ביו"ש, לרבות תאור, לוח זמנים, ומצב התקציבי.

האומדנים הכספיים עבור בצוע הפרויקט ועבור שכר-טרחת היועצים, מוערכים לחודש 12/84.

האומדנים אינם כוללים התיקרויות, מע"מ והוצאות מע"צ.

בסעיף 14 להלן, מופיע רכוז הפרויקטים שעבורם חסר תקציב ויש לכתוב למר י. שכטר בשרותי הבריאות ביו"ש.

1. ביה"ח רמאללה, אגף רנטגן

1.1 תאור

שנויים, תוספות ושפוצים באגף הרנטגן הקיים לרבות שנויים בחדרים; שפור מערכות; שפור בגמור; שלוב מכונות רנטגן חדשות.

1.2 לוח

תוצאות המכרז צפויות תוך יומיים.

גמר בצוע משוער: חודש 6/85.

1.3 תקציב

אומדן לבצוע הפרויקט: כ 90 מליון שקלים.

אומדן להשלמת שכר-טרחת היועצים עד תום הפרויקט: כ 30 מליון שקלים.

אומדן השלמת שכר טרחת היועצים עד 31.3.85: כ 15 מליון שקלים.


* התקציב לשכר-טרחת נגמר ויש לכתוב לשרותי הבריאות בקשה לתוספת תקציב.

Handwritten notes in Hebrew on the left margin, including dates like 2.1.85 and 8/1/85, and various signatures and initials.

DATE 1.1.13

10/1/13

10/1/13



מסמך
מס' 10-01-13
משרד המבחן

5.1.8e

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

משרד המבחן - כלל המבחנים
מסמך מס' 10-01-13

2. ביה"ח רמאללה, אגף חדרי נתוח

2.1 תאור

שפור, שנויים ותוספות ב 3 חדרי הנתוח, במסדרון הנקי ובאזור הרחצה, לרבות נושא בניה, מערכות, גמור וציוד.

2.2 לו"ז

המכרז הופץ ע"י הארגון לרפואה ורוחה ברמאללה. תוצאות המכרז צפויות תוך כחודש. גמר בצוע משוער: חודש 9/85.

2.3 תקציב

הפרויקט טומן ע"י הארגון הנ"ל ולא באמצעות מע"צ. מע"צ קיבלה לפני כשנה סכום של 400,000 ש' עבור פקוח עליון.

3. ביה"ח רמאללה, תכנון כולל, תכנית אב

3.1 תאור

תכנון כולל של בניי מערכות בביה"ח רמאללה לפי פרוגרמה שהוכנה ע"י שרותי הבריאות ביו"ש כשתוף אתנו.

3.2 לו"ז

צות היועצים נבחר, אך עדיין לא עבר בוועדת עבודות. משך העבודה: כ 10 חדשים מקבלת תקציב.

3.3 תקציב

התקציב הדרוש לשכר טרחת היועצים - לפי אומדן של כ 1,600 שעות עבודה (ראה מכתבי אליך מס' 20/04/3 מתאריך 1.10.84) - כ 17 מ' ש'. במכתבך לשרותי הבריאות (מס' 5/11/7/1 מתאריך 2.11.84) ביקשת סכום גבוה יותר. הובטח שיועבר תקציב חלקי של 4 מליון שקלים בימים הקרובים.

4. ביה"ח רמאללה, מכבסה ומערכת הסקה

תאור

מערכת ההסקה מבוצעת ע"י קבלן שחתם חוזה עם אגודת ידידי ביה"ח. מע"צ מבצעת פקוח בלבד, ע"י מחוז ירושלים.

לו"ז

גמר הפרויקט צפוי תוך שנה.

5. ביה"ח בית-ג'אלה, אגף רנטגן

5.1 תאור

שנויים, תוספות ושפוצים באגף הרנטגן הקיים לרבות שנויים בחדרים; שפור מערכות; שפור בגמור; שלוב מכונות רנטגן חדשות.

5.2 לנ"ז

החומר למכרז יוכן עד סוף חודש 2/85.
גמר בצוע משוער: חודש 9/85 (במדה ויפתרו הבעיות הקונסטרוקטיביות בבנין אגף הרנטגן).

5.3 תקציב:

אומדן לבצוע הפרויקט: כ 60 מליון שקלים.
אומדן להשלמת שכ"ט היועצים: כ 27 מליון שקלים.
אומדן להשלמת שכ"ט היועצים עד 31.3.85: כ 17 מליון שקלים.
עד כה הועבר למע"צ סכום של 2.25 מליון שקלים; הובטח שיועבר בימים הקרובים סכום נוסף של 3.75 מליון שקלים, בהתאם לעכתבך מס' 5/11/7/8 מתאריך 10.9.84.

התקציב שהועבר עד כה נוצל לחוזים חלקיים עם משרד האן (האדריכל) ועם משרדי.

עם שאר המתכננים עדיין לא נחתמו חוזים כלל.

* יש לכתוב לשרותי הבריאות בקשה לתקציב.

6. ביה"ח בית-ג'אלה, אגף נתוחים

6.1 תאור

הקמת אגף חדרי נתוח הכולל 2 חדרי נתוח וחדרי עזר, בשטח של 480 מ"ר ועוד כ 250 מ"ר עבור מערכות.

6.2 לנ"ז

לוח זמנים צפוי לתכנון: עד חודש 12/85.
לוח זמנים לבצוע עדיין לא נקבע.

6.3 תקציב

אומדן לבצוע הפרויקט: כ 460 מליון שקלים.
מרבית או כל הממון לבצוע ותכנון הפרויקט מבוצע ע"י ארגונים מקומיים.
מע"צ עוסקת בפקוח, נהול ותאום התכנון והפקוח בלבד.

אומדן שכ"ט עד 31.3.85: כ 3 מליון שקלים.

הובטח שיועבר בימים אלו סכום של 4 מליון שקלים, מתוך \$20,000 שנדרשו ע"י מע"צ במכתב מט' 5/11/7/8 מתאריך 3.10.84.

7. ביה"ח בית-ג' אלה, אגף הרנטגן

תכנון כולל של בניי מערכות בביה"ח בית-ג' אלה לפי פרוגרמה שהוכנה ע"י שרותי הבריאות ביו"ש בשתוף אתנו. יתכן שהעבודה בפרויקט זה תהיה פשוטה יותר עקב קיום תכנון חלקי שבוצע ע"י מתכננים מקומיים.

לאחר קבלת דרישה לתכנון משרותי הבריאות, נבדוק את התכנון הקיים ומע"צ תגיש לשרותי הבריאות אומדן לבצוע בקורת התכנון, שנויים בתכנון במידת הצורך ותכנית אב להתפתחות הקתיד.

8. ביה"ח חברון, אגף הרנטגן

8.1 תאור

שנויים, תוספות ושפוצים באגף הרנטגן הקיים לרבות שנויים בחדרים; שפור מערכות; שפור בגמור; שלוב מכונות רנטגן חדשות.

8.2 לר"ז

החומר למכרז יוכן עד 2/85.
גמר בצוע משוער: חודש 8/85.

8.3 תקציב

אומדן לבצוע הפרויקט: כ 60 מליון שקלים.
אומדן להשלמת שכ"ט היועצים: כ 25 מליון שקלים.
אומדן להשלמת שכ"ט היועצים עד 31.3.85: כ 15 מליון שקלים.

* התקציב לשכר-הטרה נגמר ויש לכתוב לשרותי הבריאות בקשה לתוספת תקציב.

9. ביה"ח-חברון, אגף נתוחים

9.1 תאור

הקמת אגף נתוחים הכולל 3 חדרי נתוח וחדרי עזר.

9.2 לר"ז

האגף מוקם בשלבים. שלב המעטפת החיצונית כמעט והושלם; גמר הבניה המתועשת יושלם עד חודש 3/85; שלב האספקות והמערכות יושלם (מותנה בתוספת תקציב) תוך 6 חודשים מקבלת התקציב נוסף; שפוצים ושפורים באגף הקיים וצירופו לאגף החדש (מותנה בתוספת תקציב) תוך 6 חודשים מהשלמת האגף החדש, ומקבלת תקציב נוסף.

9.3 תקציב

התקציב הדרוש לבצוע ולהשלמת השלבים השונים מפורט במכתב ע. לוכסנבורג לשרותי הבריאות מתאריך 15.11.84. אומדן להשלמת שכר טרחת היועצים: כ 10 מליון שקלים. תקציב זה הועבר ממחוז ירושלים למשרד הראשי לפני כשבוע.

10. ביה"ח חברון, תכנון כולל

10.1 תאור

תכנון כולל של בניי מערכות בביה"ח חברון לפי פרוגרמה שהוכנה ע"י שרותי הבריאות ביו"ש בשתוף אתנו.

10.2 לוג

צות היועצים יקבע סופית לאחר קבלת תקציב. מסך העבודה: כ 10 חדשים מקבלת תקציב.

10.3 תקציב

התקציב הדרוש לשכר טרחת היועצים יבחן ויקבע לאחר שמע"צ תקבל דרישה לתכנון כולל משרותי הבריאות.

11. ביה"ח רפידה, רנטגן

11.1 תאור

שנויים, תוספות ושפוצים באגף הרנטגן הקיים באזור מרפאות החוץ, לרבות שנויים במבנה; שפור מערכות; שפור בגמור; שלוב מכונות רנטגן חדשות.

11.2 לוג

היועצים נבחרו אך עדיין לא עברו בודעת עבודות מחוסר תקציב. מסך התכנון והבצוע: כ 14 חדשים מקבלת תקציב.

11.3 תקציב

אומדן לבצוע הפרויקט: כ 115 מליון שקלים. אומדן שכ"ט היועצים: כ 45 מליון שקלים. אומדן שכ"ט היועצים עד 31.5.85 (בהנחה שהעבודה תחל מיד): כ 10 מליון שקלים. בהתאם למכתב מע"צ מס' 5/11/7/3 מתאריך 9.7.84, הובטח שבימים אלו יועברו 10 מליון שקלים למע"צ.

12. ביה"ח לחולי-נפש, בית-לחם

12.1 תאור

תכנון רחוט לביה"ח.

12.2 ל"ז

גמר תכנון משוער: כ 3 חדשים.

12.3 תקציב

התקציב הדרוש לתכנון: כ 3 מליון שקלים.

— הובטח ע"י ד.שכטר שבימים אלו יועברו 1.5 מליון שקלים למע"צ.

12. פרוגרמות לבתי-החולים רמאללה, בית-ג'אלה וחברון

13.1 תאור

השלמת פרוגרמות לבתי-החולים בשתוף עם שרותי הבריאות, כולל תכניות ותאור בכתב של המצב הקיים - לעומת המצב העתידי - בכל מחלקה ופונקציה בשלושת בתי-החולים.

13.2 ל"ז

3 הפרוגרמות תושלמנה עד חודש 3/85.

13.3 תקציב

התקציבים לתכנון ובצוע הפרוגרמות נכללים בפרויקטים השונים שפורטו לעיל: פרוגרמה לביה"ח רמאללה - כלולה בפרויקט רמאללה, רנטגן. פרוגרמה לביה"ח בית-ג'אלה - תכלול בפרויקט בית-ג'אלה, רנטגן. פרוגרמה לביה"ח חברון - כלולה בפרויקט חברון, נתוחים.

14. סכום

אנא שלח בקשות לתוספת תקציב עבור שכר-טרוחת היועצים לפרויקטים הבאים:

14.1 ביה"ח רמאללה, רנטגן (סעיף 1.3 לעיל).

14.2 ביה"ח בית-ג'אלה, רנטגן (סעיף 5.3 לעיל).

14.3 ביה"ח חברון, רנטגן (סעיף 8.3 לעיל).

כמו-כן, יש לעקוב אחר קבלת תקציבים שהובטחו ע"י ד.שכטר שיועברו למע"צ בימים הקרובים כמפורט להלן, ולבקש מיד תוספת תקציבית במידה והתקציבים הם חלקיים:

14.4 ביה"ח רמאללה, תכנון כולל (סעיף 3.3 לעיל).

14.5 ביה"ח בית-ג'אלה, נתוחים (סעיף 6.3 לעיל).

14.6 ביה"ח רפידיה, רנטגן (סעיף 11.3 לעיל).

14.7 ביה"ח בית-לחם, תכנון רחוט (סעיף 12.3 לעיל).

בברכה
ש-כ-פ
שלטת קופת לוד

העתקים:

ה"ה: א.ביל, ע. לוכסנבורג, י. רוז'נסקי, א. ערמוך

THE STATE OF CALIFORNIA (COUNTY OF ...)

BEFORE ME, the undersigned authority, on this ... day of ...

... known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

NOTARY PUBLIC

Handwritten signature and initials, possibly "S-C" and "M".

WITNESSED BY ME:

... my commission expires on ...

המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

Handwritten notes and a circled stamp at the top right.

Handwritten notes on the top left, including '139/84' and '2.1.85'.



4588/84 מספר
27.12.84 תאריך

אל: קמ"ט אוצר - איו"ש (3)

הגוף המבצע מעיץ ירושלים
הגוף הפונה ... בהקדמת קה"ש
... תשב, תע"מ, ישראל.




בקשה להקצבה

הנדנד: תבגו, ריהוט, לבית חוגלים לחנוכה. בית לחם
סימוכין: 5/11/77, 22.11.84

- 1. נא הקצב למכתב ב' סכום של 1,599,990 שקל, מזלזל, וחצו שקל.
- 2. למטרה: תחילת תכנון ריהוט.
- 3. הסעיף התקציבי 01, 200, 6003, 1752, שם הסעיף ...
- 4. הערות:

חתימת הגוף הפונה

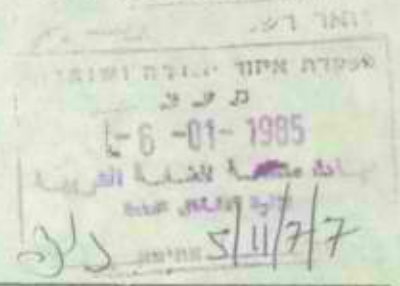

גזבר תפקיד
שם ושם משפחה

אישור קמ"ט אוצר

ניתן כזה אישור תקציבי כמבוקש
הסעיף לחיוב בהנהלת החשבונות 1752, 6003, 201, 00
הערות:

קמ"ט אוצר

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230870

טלפקס: 35770-1 COIN IL


שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64 382

REF.: 26/1/10

DATE 29.10.84



לכבוד
מר א. גיל
סגן מנהל טע"צ
מע"צ ראשי/ירושלים

..א.נ.

הנדון: פרויקטים ביו"ש (בתי-חולים) - תקציבים

בעטייה של האינפלציה הגבוהה נשחקים בטחירות התקציבים שהועברו לטע"צ עבור הפרויקטים השונים, ועלויות להגרס בתכיפות הפסקות בעבודת מתכננים ובעבודות בצוע - בגלל חוסר תקציב.

יש לבקש תוספות תקציביות מהרשויות המתאימות מוקדם ככל האפשר ולצורך זה לבנות מערכת שתאפשר לצפות מראש תקציבים דרושים תוך התייחסות לנתונים מסוערים שונים כגון הוצאות החודשיות של הפרויקט, קצב האינפלציה, התקציב הקיים ועוד.

בברכה,
שלמה קופילוב

העתקים:

מר א. גולדשלאגר, מהנדס ראשי לבעוע בניינים, מע"צ
הגב' ש. גונן, ס/אדריכל ראשי לבי"ח, מע"צ

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV, ISRAEL

RES.: 19 HAESHEL ST., RAMAT-GAN

טל. 230870

טלפקס: 35770 COIN IL

טל. 731180

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב

מקום: רח' האשל 19, רמת-גן

27.1.84

א.א.ג

הגותם להודיע לסדרת ה...
3 - בסכום של 50000 ש"ח
אגפי הרויסקט
בת-חולים בירוש
(ראה סל 50000 ש"ח)

REF.: 26/1/10

תאריך: 27-12-1984
מס' תיק: 51117

מחלקת עבודות צבאיות
המשרד הראשי
תאגף לכתיב מטרות ממשלתי
לשכת מודל זאנו
27.12.84

סכום ישיבה

שערכה בתאריך 27/12/84 בנושא מזוג אוויר לפרויקטים השונים

מקום הישיבה: משר' י. רונז' נסקי, מע"צ

נוכחים: ה"ה: א. אילוז (מינהל אזרחי, יו"ש); י. שכטר, ס. ביצ'ין, (שרותי הבריאות יו"ש); א. גיל, י. רונז' נסקי, י. לויז (מע"צ); ש. קופילוב.

תפוצה: הנוכחים; ה"ה: תא"ל א. בקנשטיין (סגן מתאם הפעולות בשטחים); ד"ר י. סבר, צ. האקר, (שרותי הבריאות, יו"ש); ע. לוכסנבורג, א. גולדשלאגר, א. הרשקוביץ (מע"צ); ד. שפירא; פרנקל; י. האן.

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

סעיף	הטפול באחריות	ח נושא	עד תאריך
1.	ד. שפירא	<p>כללי</p> <p>הישיבה נערכה לצורך סכום (סופיו) של שיטת מזוג האוויר במחלקות הרנטגן בבתי-החולים ברמאללה, בית-ג' אלה וחברון.</p> <p><u>סוכם כלהלן</u></p> <p>במחלקות הרנטגן המתוכננות בבתי-החולים רמאללה, בית-ג' אלה וחברון מזוג האוויר יהיה ע"י מזגנים מפועלים, כפי שהוחלט בעבר. משרד שפירא ישלים התכנון בהתאם, לפי לוח שנקבע לאחר הישיבה:</p> <p>בית"ח חברון: עד 5.1.85</p> <p>בית"ח בית-ג' אלה: עד 16.1.85</p>	5.1.85 16.1.85
2.	קופילוב	<p>עם חדוש עבודות התכנון, ייבדק לוח הזמנים שעודכן לתאריך 30.11.84 (ראה סכום מס' 26/1/14 מתאריך 30.11.84). ייעשה מאמץ לעמוד בלוח הזמנים המקורי על אף העכוב. לוח הזמנים יעודכן תוך שבועיים.</p>	5.1.85

דואר נכנס
6-01-1985
התאריך

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV, ISRAEL

RES.: 19 HAESHEL ST., RAMAT-GAN

שלמה קופילוב

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב

מען: רח' האשל 19, רמת-גן

טל. 230870
טלקס: 35770 COIN IL
טל. 731180

REF.: 26/1/16

DATE: 23.12.84



הפריקט: בתי-חולים ביו"ש

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 23.12.84 בנושא מזוג אויר לפרויקטים השונים

מקום הישיבה: מש' י. רוז'נסקי, מע"צ


נוכחים: ה"ה: א.אילוז (מינהל אזרחי, יו"ש); י.שכטר, ס.ביצ'ין, (שרותי הבריאות יו"ש); א.גיל, י.רוז'נסקי, י.לויז (מע"צ); ש.קופילוב.

תפוצה: הנוכחים; ה"ה: תא"ל א.בקנשטיין (סגן מתאם הפעולות בשטחים); ד"ר י.סבר, צ.האקר, (שרותי הבריאות, יו"ש); ע.לוכסנבורג, א.גולדשלאגר, א.הרשקוביץ (מע"צ); ד.שפירא; פרנקל; י.האן.

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

סעיף	ה נושא	הטפול באחריות	עד תאריך
.1	<p><u>כללי</u></p> <p>הישיבה נערכה לצורך סכום (סופי!) של שיטת מזוג האויר במחלקות הרנטגן בבתי-החולים ברמאללה, בית-ג'אלה וחברון.</p> <p><u>סוכם כלהלן</u></p> <p>במחלקות הרנטגן המתוכננות בבתי-החולים רמאללה, בית-ג'אלה וחברון מזוג האויר יהיה ע"י מזגנים מפועלים, כפי שהוחלט בעבר. משרד שפירא ישלים התכנון בהתאם, לפי לו"ז שנקבע לאחר הישיבה:</p> <p>ביה"ח חברון: עד 5.1.85</p> <p>ביה"ח בית-ג'אלה: עד 16.1.85</p>	ד.שפירא	5.1.85
	<p>ביה"ח בית-ג'אלה: עד 16.1.85</p>	ד.שפירא	16.1.85
.2	<p>עם חדוש עבודות התכנון, ייבדק לוח הזמנים שעודכן לתאריך 30.11.84 (ראה סכום מס' 26/1/14 מתאריך 30.11.84). ייעשה מאמץ לעמוד בלוח הזמנים המקורי על אף העכוב. לוח הזמנים יעודכן תוך שבועיים.</p>	קופילוב	5.1.85

עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
5.1.85	שפירא/פרנקל	<p>נקבע שבבתי-החולים בחברון וברטאללה, החמור בחורף יהיה ע"י מערכת ההסקה והמזגנים יוזמנו ללא חמור.</p> <p>לתשומת לב: בשיטה זו בחורף לא תהיה החלפת אויר, אלא אורור ע"י פתיחת חלונות.</p>	.3
	י.שכטר	<p>מומלץ שוב להתחיל בתכנית אב לשלושת בתי-החולים, על מנת לפתור הן בעיות מיידיות (כגון חשמל בבית"ח חברון וגזים בבית"ח ברטאללה); והן בעיות של תכנון ופתוח יעילים ונכונים של בניה בבתי-החולים.</p>	.4
	י.שכטר	<p>שרותי הבריאות יפנו למע"צ בבקשה לבדוק את התכנון האלקטרו-מכני שנעשה עבור בית"ח בית-ג'אלה ע"י מתכננים מקומיים - וזאת לקראת תכנון המערכות באגף הנתוחים.</p>	.5


שלמה זיסלרוב

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV, ISRAEL

RES.: 19 HAESHEL ST., RAMAT-GAN

תיק 101

M. Sc. שלמה קופילוב

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב

מס' רח' האשל 19, רמת-גן

טל. 230870

טלפקס: 35770 COIN IL

טל. 731180

REF.: 26/1/14

DATE: 30.11.84

משרד הבינוי והשיכון
 מנהל מחוז תל-אביב, משרד המבנה
 10-12-1984
 5/11/7

הפרויקט: בתי-חוללים ופרויקטים נוספים ביהודה ושומרון

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 28.11.84 בנושא קדום הפרויקטים ביו"ש

מקום הישיבה: משרד א.גיל, מע"צ

נוכחים: ה"ה: תא"ל א.בקנשטיין (סגן מתאם הפעולות בשטחים); ד.אפרתי, מ.אהרון,
 א.אילוז (מינהל אזרחי, יו"ש); ד"ר י.סבר, י.שכטר (שרותי הבריאות, יו"ש);
 א.גיל, ע.לוכסנבורג, ס.נחום (מע"צ); ש.קופילוב

הפוצה: הנוכחים; ה"ה א.גולדשלאגר, א.ערמון, י.רוז'נסקי, פ.מוטלו (מע"צ);
 י.לרום (קמ"ט דואר)

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

סעיף	ה נושא	הטפול באחריות	עד תאריך
1.	כללי		
	הישיבה נערכה לצורך התעדכנות במצב הפרויקטים השונים שמע"צ מבצעת ביהודה ושומרון.		
2.	הפרויקטים שנדונו		
	בית"ח רמאללה		
2.1	בית"ח רמאללה, אגף הרנטגן (ס' 4 להלן).		
2.2	בית"ח רמאללה, אגף חדרי נתוח (ס' 5).		
2.3	בית"ח רמאללה, תכנון כולל (ס' 6).		
2.4	בית"ח רמאללה, מכבסה ומערכת הסקה (ס' 7).		
	בית"ח בית-ג'אלה		
2.5	בית"ח בית-ג'אלה, אגף הרנטגן (ס' 8).		
2.6	בית"ח בית-ג'אלה, אגף חדרי נתוח (ס' 9).		
2.7	בית"ח בית-ג'אלה, תכנון כולל (ס' 10).		
	בית"ח חברון		
2.8	בית"ח חברון, אגף הרנטגן (ס' 11).		
2.9	בית"ח חברון, אגף חדרי נתוח (ס' 12).		
2.10	בית"ח חברון, תכנון כולל (ס' 13).		
	2/..		


עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		ב"ה"ח רפידיה (שכס)	
		ב"ה"ח רפידיה, אגף רנטגן (ס' 14).	2.11
		ב"ה"ח לחולי-נפש, בית-לחם	
		ב"ה"ח לחולי-נפש, בית-לחם, רהוט (ס' 15).	2.12
		ב"ה"ח הישן בשכס	
		ב"ה"ח בשכס, מערכת חשמל (ס' 16).	2.13
		פרוגרמות לבתי-חולים	
		פרוגרמות לבתי-החולים, רמאללה, חברון ובית-ג'אלה (ס' 17).	2.14
		בתי-דואר	
		דואר קלקיליה (ס' 18).	2.15
		דואר ג'נין (ס' 19).	2.16
		דואר סילת אל דהר (ס' 20).	2.17
		דואר דורה (ס' 21).	2.18
		דואר קבטיה (ס' 22).	2.19
		לוח זמנים	.3
		מצורף לסכום נספח המפרט לוחות זמנים לפרויקטים של בתי- החולים שאושרו לבצוע. לוחות הזמנים הוערכו לפי מצב התכנון ו/או הבעוע כפרויקטים השונים, והם מותנים בזרימת תקציבים לפי האומדנים והמכתבים שהועברו לשירותי הבריאות. לוח הזמנים מבוסס על הלוח מחודש 7/84.	
		ב"ה"ח רמאללה, אגף הרנטגן	.4
		החומר הוכן למכרז לפי לוח הזמנים שנקבע בזמנו. המכרז לא הופץ עד כה מכיוון שטרם נתקבלה הוראה מתאימה מהמזמין.	4.1
5.12	לוקסנבורג	המזמין בקש בישיבה להפיץ את המכרז.	4.2
		לוח הזמנים: גמר בצוע צפוי בחודש יוני 1985 (ר' נספח לו"ז).	4.3
25.12	האן	מושלם עתה תכנון הרהוט הנייד לפי פרוגרמה שניתנה ע"י	4.4
30.12	קופילוב	ע.האקר. התכנון יושלם עד 25.12.84 ואומדן יועבר לשירותי הבריאות עד 30.12.84.	
		3/..	

ע"ד תאריך	הטפול באחריות	ח נו ש א	סעיף
		<u>ביה"ח רמאללה, אגף חדרי נתוח</u>	.5
		החומר למכרז עבור מערכות אלקטרוטכניות, תוספות ושפורים לחדרי הנתוח - מוכן למכרז.	5.1
20.12	קופילוב	המכרז יוצא ע"י הארגון לרפואה ורוחה ברמאלה.	
		שפורים ותוספות לאזורים האחרים של האגף יתוכננו ויבוצעו בשלב שני, כשתתקבל דרישה מפורטת של שרותי הבריאות.	5.2
	י.שכטר		
		<u>ביה"ח רמאללה, תכנון כולל</u>	.6
		הכונה לתכנון כולל של בניה ומערכות בביה"ח, לפי הפרוגרמה שסוכמה.	
		הוקם כבר צוות היועצים ע"י מע"צ, אך טרם נתקבל במע"צ התקציב שנדרש במכתב מע"צ לשרותי הבריאות מס' 5/11/7/1 מתאריך 2.10.84.	
	י.שכטר		
		<u>ביה"ח רמאללה, מכנסה ומערכת הסקה</u>	.7
		<u>המכנסה:</u> מערכת הדוד והענרת שהיו במכרז בפקוח מע"צ מח' ירושלים - הושלמה והופעלה.	7.1
		על שרותי הבריאות להזמין את ספקי הציוד (מכונות כביסה, גהוץ וכו') המוזמנים ישירות על ידם להפעלה משותפת של המכנסה.	
	י.שכטר		
		<u>מערכת ההסקה:</u> החוזה נחתם עם אגודת ידידי ביה"ח. מע"צ מחוז ירושלים מבצעת פקוח בלבד.	7.2
		חל עכוב בבצוע עקב פעינת מנהל העבודה הראשי של הקבלן. גמר הפרויקט עפוי תוך כשנה, בהתאם לחוזה שנחתם עם האגודה.	
		<u>ביה"ח בית-ג' אלה, אגף הרנטגן</u>	.8
		עבודות התכנון התעכבו עקב הקפאת התקשרויות ע"י הממשלה.	8.1
		ההקפאה הופשרה ועבודות התכנון החלו.	
		התכנון האדריכלי הכללי אושר.	8.2
		התכניות האלקטרוטכניות הראשוניות נערכו, השלמתן מחכה לאשור נושא אספקות לאגף, לפי מכתב מש' קופילוב לשרותי הבריאות מס' 26/1/13 מתאריך 28.11.84.	8.3
3.12	שכטר		
		חכניות הקונסטרוקציה מתעכבות עקב ספקות לגבי עמידותו וחוזקו של המבנה הישן. התופעה היום היא שנראים סדקים רציניים במבנה הנושא נמצא עתה בבדיקה של מע"צ.	8.4
		4/..	

עד תאריך	הטפול באחריות	ה נושא	סעיף
		<p><u>לוח זמנים</u>: לוח הזמנים המפורט בנספח <u>אינר</u> לוקח בחשבון (מחוסר נתונים) את הבדיקות, התכנון ועבודות חזוק הבניין - אם וכאשר ידרשו.</p>	8.5
בהקדם	שכטר/מנשה	<p><u>תקציב לתכנון</u>: יש להעביר השלמת תקציב לפי מכתב מע"צ לשרותי הבריאות, מס' 5/11/7/8 מתאריך 10.9.84.</p>	8.6
		<p>שרותי הבריאות מאשרים להוציא את המכרז כשיוכז, ובמקביל להודיע להם מהו האומדן המוקדם, אומדן מפורט ומדויק יערך לאחר קבלת תוצאות המכרז.</p>	8.7
31.3.85	שכטר/ לוקסנבורג/ קופילוב	<p>יש לשאוף שחוזים עם קבלנים יחתמו עד סוף השנה התקציבית.</p>	8.8
		<p><u>ביה"ח בית-ג' אלה, אגף חדרי נהוח</u></p>	.9
		<p>התכנון מתבצע באחריות בית החולים ע"י מתכנן מקומי, ג'טל ארג'. תאום, ניהול ופקוח של התכנון, המכרז והבצוע - באחריות מע"צ.</p>	9.1
בהקדם	שכטר/מנשה	<p><u>תקציב</u>: עדיין לא הועבר תקציב לפי מכתב שנשלח ממע"צ לשרותי הבריאות, מס' 5/11/7/8 מתאריך 3.10.84.</p>	9.2
5.12	קופילוב	<p>מתקיימות ישיבות תכנון. אושרו עד כה (עם הערות) התכניות בק.מ. 1:100, ואנו מצפים לקבל עד 5.12.84 תכניות 1:50 מעודכנות.</p>	9.3
		<p><u>ביה"ח בית-ג' אלה, תכנון כולל</u></p>	.10
	י.שכטר	<p>הכונה לתכנון כולל של בניה ומערכות בביה"ח, לפי פרוגרמה שסוכמה. משרד הבריאות צריך להזמין ממע"צ את התכנון. מע"צ תשלח אומדן ולאחר העברת התקציב יחל התכנון.</p>	
		<p><u>ביה"ח חברון, אגף הרנטגן</u></p>	.11
		<p>עבודות התכנון התעכבו עקב הקפאת ההתקשרויות ע"י הממשלה. ההקפאה הופשרה ועבודות התכנון החלו.</p>	11.1
		<p>התכנון האדריכלי הכללי אושר.</p>	11.2
3.12	י.שכטר	<p>התכניות האלקטרומכניות הראשוניות נערכו. השלמתן מחכה לאשר נושא אספקות לאגף, לפי מכתב מס' קופילוב לשרותי הבריאות מס' 26/1/13 מתאריך 28.11.84.</p>	11.3
		5/..	

עד תאריך	הטיפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		לוח הזמנים הצפוי - ראה נספח.	11.4
		שרותי הבריאות מאשרים להוציא את המכרז כשיוכן, ובמקביל להודיע להם מהו האומדן המוקדם.	11.5
31.3.85	שכטר/ לוקסנבורג/ קופילוב	אומדן מפורט ומדויק יערך לאחר קבלת תוצאות המכרז.	
		יש לשאוף שחוזים עם קבלנים יחתמו עד סוף השנה התקציבית.	11.6
		<u>ביה"ח חברון, אגף חדרי נתוח</u>	.12
		בצוע הפרויקט מתקדם לפי לוח הזמנים, הקמת המבנה החצוני הושלמה ועבודות הבניה המתועשת שהחלו בחודש 11/84 מתקדמות לפי הלוח"ז.	12.1
		<u>תקציב</u> : התקציב שהועבר בזמנו למע"צ נוצל כולו, ויש להעביר תוספת תקציב על מנת שניתן יהיה להשלים את העבודה.	12.2
	שכטר/מנשה גולדשלאגר	בימים הקרובים תשלח מע"צ דרישה תקציבית נוספת.	
בהקדם		יש לציין שכפי שנקבע מראש - מבוצע עתה שלב אחד של העבודה, הכולל הקמת חדרי נתוח וחדרי עזר (לרבות בניה, מערכות פנימיות, צפויים, ציוד חלקי ורהוט).	12.3
		במקביל יש להשלים מערכות אלקטרומכניות על הגג וכן להשלים הזמנת מנורות נתוח - לפי אומדן מעודכן שנשלח ממע"צ מחוז ירושלים לשרותי הבריאות, מתאריך 15.11.84.	
	שכטר/מנשה	תקציב זה עדיין לא אושר.	
		כמו כן יהיה צורך בשלב שני לבצע שנויים ושפוצים באגף חדרי הנתוח הקיים, כך שישולב עם האזור החדש לאגף נתוחים אורגני. שלב זה יושלם תוך כששה חדשים מאשור תקציבי.	
		<u>ביה"ח חברון, תכנון כולל</u>	.13
		הכונה לתכנון כולל של בניה ומערכות בביה"ח, לפי פרוגרמה שסוכמה.	
		משרד הבריאות צריך להזמין ממע"צ את התכנון. מע"צ תשלח אומדן ולאחר העברת התקציב יחל התכנון.	
		<u>ביה"ח רפידה, אגף הרנטגן</u>	.14
		הועברה דרישה תקציבית ממע"צ לשרותי הבריאות (טכתב מס' 5/11/7/3 מתאריך 9.7.84), אך עדיין לא הועבר התקציב.	14.1
		שרותי הבריאות מבקשים ממע"צ לארגן את לוח המתכננים.	14.2
15.12	שכטר/מנשה רוז'נסקי/ גונן/ קופילוב		
		6/..	

סעיף	ח נושא	הטפול באחריות	עד תאריך
.15	<u>ביה"ח לחולי-נפש, בית-לחם - רהוט</u>		
15.1	נקבעה פגישה בין צ.האקר למתכנן הרהוט לצורך ברור הפרוגרמה לרהוט. לו"ז יקבע לאחר ברור הפרוגרמה.	קופילוב	15.12
15.2	<u>תקציב</u> : יש להעביר תקציב התכנון לפי מכתב מע"צ מס' 5/11/7/7 מתאריך 22.11.84.	שכטר/מנשה	בהקדם
.16	<u>ביה"ח שכס (הישן)</u> החלפת כל מערכת החשמל בביה"ח - הושלמה ונמסרה.		
.17	<u>פרוגרמות לביה"ח רמאללה, חברון, בית-ג'אלה</u> התכניות הושלמו. פרטים ונתונים שונים, המפרטים את מצב הקיים בבתי-החולים והפרוגרמה להתפתחות בעתיד - יוכנו עד חודש 2/85.	צ.האקר/ קופילוב	28.2.85
.18	<u>דואר קלקיליה</u> הזמנה רשמית משירות הדאר נתקבלה במע"צ באפריל 1983. העבודות בבנין בוצעו ע"י עיריית קלקיליה בתאריך 2.10.83. מע"צ העבירה תכניות ופרטי בנין למהנדס העיר קלקיליה לבצוע. עבודות רהוט בוצעו ע"י מהנדס מחוז מע"צ-יו"ש. לפני כשבוע נתקבלה הודעה שהעבודות גמורות. נציג מע"צ יבקר באתר.	מוטלו	10.12
.19	<u>דואר ג'נין</u> בתאריך 3.5.84 העבירה מע"צ הצעת תכנית לשרותי הדאר ביו"ש, עדיף לא נתקבלה תשובה.	קמ"ט דאר	
.20	<u>דואר סילת אל דהר</u> בתאריך 5.1.84 העבירה מע"צ הצעת תכנית לשרותי הדאר-יו"ש, עדיין לא נתקבלה תשובה.	קמ"ט דאר	
.21	<u>דאר דורה</u> בתאריך 20.5.84 העבירה מע"צ הצעת תכנית לשרותי הדאר-יו"ש, עדיין לא נתקבלה תשובה.	קמ"ט דאר	
	7/..		

עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
	קמ"ט דאר	<p style="text-align: right;"><u>דאר קבטיה</u></p> <p>בתאריך 30.5.84 העבירה מע"צ העעת מכנית לשיירותי הדאר-יו"ש, עדיין לא נתקבלה תשובה.</p> <p style="text-align: center;"> שלמה קמ"ט דאר</p>	.22

א.א. 11

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

TEL: 245296; 230870 טל.

TELEX: 35770-1 COIN IL טלסק:

M. Sc. **שלמה קופילוב**
הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382

REF: 26/1/8

DATE: 29.7.84

מחלקת עבודות צבאיות
המסדר הימני
האגף לנחית מטוסים למסלול
לשכת נהלי טיסה
מכנס ביום

1-8-84

לכבוד
ה"ה א. גיל, ע. לוכסנבורג, ש. גונן, א. גולדשגור (מע"צ)
א. אילרז (ענף רווחה, שירותי הבריאות)
י. שכטר (אמרכל, שירותי הבריאות, יו"ש)
י. האן, אדריכל

א.ג.נ.

הנדון: בתי חולים ביו"ש - לוח זמנים

רצ"ב לוח זמנים ראשוני עבור הפרויקטים השונים ביו"ש.

ברצוני לעיין שהעמידה בלוח הזמנים מותנית בהשלמת תקציבים,
כיום סופי על שטחים מוקצבים, אי הקפאת חוזים על-ידי הממשלה,
וכדומה.

1-88-1984
5/11/7

בברכה,

שלמה קופילוב

M. S. KOPLOV & CO
INCORPORATED
1000 BROADWAY, NEW YORK, N.Y.

SHLOMO KOPLOV & CO
ENGINEERING & MANAGEMENT
200 WEST 42ND STREET, NEW YORK, N.Y.

TELEPHONE: 2-6000
TELEX: 22222-COM-1000

DATE: 1-8-81

REF:

RE: [Illegible text]

1-8-81



[Illegible text]

[Illegible stamp]


[Handwritten signature]

27.11.84
צפון
צפון

שם הפרויקט	7.84	8	9	10	11	12	1.85	2	3	4	5	6	7	8	הערות
1. בית ג' אלה-רנטגן															
א. תכנון אדריכלי															
ב. אשרר תכנית															
ג. תכ' אלקטרומכ- ניות															
ד. השלמת חומר למכרז															
ה. <u>בצוע</u>															
2. חברון-רנטגן															
א. תכנון אדריכלי															
ב. אשרר תכניות															
ג. תכ' אלקטרומכ- ניות															
ד. השלמת חומר למכרז															
ה. <u>השלמת בניה</u>															
3. חברון-חדרי נתוח															
א. <u>בנית מעטפת</u>															
ב. תכנון פנימי ספורט															
ג. בניה מתועשת															
ד. <u>השלמות</u>															
רמאללה-רנטגן															
א. תכנון אדריכלי															
ב. השלמת תכנון וחומר למכרז															
ג. <u>השלמת בניה</u>															
5. רמאללה-חדרי נתוח															
א. השלמת תכנון ומכרז															
ב. <u>בצוע</u>															
6. פרוגרמות-השלמה															
א. בית-ג' אלה															
ב. <u>דפדפנות רמאללה</u>															
ג. חבילת															



פרויקט - WHO
1985



בנין

בנין

בנין

בנין

בנין

בנין

לכבוד מר. קופילוב

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
 ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.
 15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64382, ISRAEL

M. Sc. **שלמה קופילוב**
 הנדסה וניהול בע"מ
 רח' ישראלים 57, תל-אביב 64382

טל. 245296; 230870
 טלפקס: 35770-1 COIN IL

מס' תיק 5/11/7
 12-07-1984
 מס' התיק

REF.: 26/1/ 5

DATE: 6.7.84

הפרויקט: בתי חולים ביהודה ושומרון

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 4.6.84 בנושא קדום פרויקטים ביו"ש

מקום הישיבה: מש' שרה גונן, מע"צ
 נוכחים: ה"ה א. אילוז(עוזר רע"נ רוחה); ד. שכטר, צ. הקר(שרותי הבריאות, יו"ש);
 ד"ר ודר; קופילוב, ימין(מש' קופילוב)
 בחלק מהישיבה: ד"ר שכדה, ג'מל
 תפוצה: הנוכחים; ד"ר סבר, ס. ביצ'ין(שרותי הבריאות, יו"ש); א. גיל, י. רוז'נסקי,
 א. גולדשלגר, גורבץ, ש. גונן(מע"צ). האן.
 סוכם עיי: שלמה קופילוב

סעיף	ה נו ש א	הטפול באחריות	עד תאריך
1.	<p><u>כללי</u> הישיבה נערכה בהמשך לישיבה בנושא מתאריך 26.6.84 (ראה סכום מס' 26/1/4 מתאריך 26.6.84), על מנת להציג קדום בפרויקטים השונים המבוצעים באמצעות מע"צ; וכן לפתור בעיות טכניות וקדום תכנון.</p>		
2.	<p><u>הפרויקטים שנדונו</u></p>		
2.1	ביה"ח בית ג' אלה-אגף הרנטגן (ס' 3 להלן)		
2.2	ביה"ח בית ג' אלה-אגף חדרי נתוח (ס' 4)		
2.3	ביה"ח בית ג' אלה-תכנון כולל (ס' 5)		
2.4	ביה"ח חברון-אגף הרנטגן (ס' 6)		
2.5	ביה"ח חברון-אגף חדרי נתוח (ס' 7)		
2.6	ביה"ח חברון-תכנון כולל (ס' 8)		
2.7	ביה"ח רמאללה-אגף הרנטגן (ס' 9)		
2.8	ביה"ח רמאללה-אגף חדרי נתוח (ס' 10)		
2.9	ביה"ח רמאללה-תכנון כולל (ס' 11)		
2.10	ביה"ח רפידיה (שכס)-אגף הרנטגן (ס' 12)		
2.11	השלמת פרוגרמות (ס' 13)		

עד תאריך	הטיפול באחריות	ה נושא	סעיף
		<p><u>ג' ביה"ח בית-ג' אלה-אגף הרנטגן</u></p> <p>בהתייחס לתכנית ראשונית שהוכנה ע"י אדר' האן, סוכם כלהלן:</p>	3
		<p>מכונת הרנטגן החדשה (תוצרת סימנס) תהיה בחדר הקטום.</p>	3.1
		<p>בחדר זה תמוקם בעתיד מכונת פתוח יום. לא יבנה חדר פתוח בתוכו אך יתוכננו ויבוצעו אספקות חשמל, ביוב ומים למכונת הפתוח. ד"ר ודר יכין נתונים.</p>	3.2
15.7	ד"ר ודר	<p>בחדר התוכנן תחנת פקוד לפי נתוני מכונת הסימנס.</p>	
		<p>חדר רנטגן קים ישאר. קירו העפוני יוזז דרומה בכ 70 + 50 ס"מ (תלוי במקום מכונת הרנטגן הקימת) על מנת להגדיל את חדר הפתוח הקים.</p>	3.3
		<p>אזור השרותים בין חדר הסימנס לחדר הרנטגן הקים יוסב כלהלן:</p>	3.4
		<p>3.4.1 תא הפקוד ישאר במקומו</p>	
		<p>3.4.2 3 החדרים האחרים יוסבו לאזור משולב של שרותים והלבשה ל - 2 חדרי הרנטגן.</p>	
		<p>חדר הפתוח המוגדל יכלול 2 תאי העברת קסטות.</p>	3.5
		<p>2 החדרים מצפון לחדר הרנטגן הקים יאוחדו לחדר רנטגן נוסף בעתיד. יתוכננו ויבוצעו אספקות.</p>	3.6
		<p>יתוכננו חדרי שרותים והלבשה מצפון, מעבר לקיר.</p>	3.7
		<p>האזור מצפון לחדר הרנטגן יתוכנן לחדרי קבלה וטכנאים; לחדר ארכיב; מחסן; וחדר רופאים. חדר הגבס ימוקם באזור אחר של ביה"ח.</p>	3.8
		<p>אשר שהמסדרון המוביל לחדר מתיס יסגר. באזור ועל חשבון המסדרון יהיו חדרי אולטרהסאונד ומנהל.</p>	3.9
		<p><u>ל"ז משוער</u></p>	3.10
	קופילוב האן גונן/צילה מתכננים	<p>* תכנון אדריכלי ראשוני: עד 25.7.84</p> <p>* אשור התכנית: 5.8.84</p> <p>* תכניות אלקטרומכניות: 5.10.84</p> <p>* חומר מוכן למכרז: 20.1.84, וזאת במידה והתכניות תאושרנה ולא יצוצו בעיות ונושאים חדשים.</p> <p>* השלמת האגף צפויה בחודש מאי 1985.</p>	
מאי 1985	קופילוב		
		<p><u>ג' ביה"ח בית-ג' אלה-אגף חדרי נתוח</u></p>	4
		<p>תכנון הפרויקט נמסר בזמנו למתכנן המקומי ג'מל ע"י בית החולים לרווי הפרויקט יהיה ע"י מע"צ. פקוח, נהול ותאום יהיו ע"י מש' קופילוב.</p>	4.1
		<p>מע"צ תגיש לשרותי הבריאות אומדן לתכנון ובצוע הפרויקט.</p>	4.2
5.8.84	קופילוב	<p>עמית מרמז \$20,000</p>	
		<p>3/.....</p>	


עד תאריך	הטפול באחריות	ה נושא	סעיף
		<p><u>ביה"ח בית-ג' אלה-תכנון כולל</u></p> <p>עדיין לא נתקבלו דרישה ותקציב לתכנון כולל של ביה"ח לפי פרוגרמה שהוכנה ואושרה.</p>	<p>5.</p> <p>1983</p>
	שרותי הבריאות		
		<p><u>ביה"ח חברון-אגף הרנטגן</u></p> <p>נדונה תכנית ראשונית של אדר' האן וסוכס כלהלן:</p>	6.
		<p>6.1 הכניסה לאגף הרנטגן תהיה דרך מרפאות החוץ.</p>	
		<p>6.2 האזור מדרום למסדרון אגף הרנטגן יכלול חדר מנהל (צמוד לכניסה הראשית); ואזור טכנאים/קבלה/ארכיב.</p>	
		<p>דלפק הקבלה יהיה סמוך לאזור המרפאות, ממערב לדלת שתותקן במסדרון ותחצוץ בין המרפאות לאגף הרנטגן.</p>	
		<p>6.3 חדר הרנטגן המזרחי יכלול תאי הלבשה ושרותים, על חשבון השרותים הקיימים.</p>	
		<p>6.4 חדר הרנטגן המערבי יכלול פנת הלבשה עם מחיצה נגררת על מנת לחסוך במקום.</p>	
		<p>6.5 חדר הפתוח יוגדל, ויכלול תאי העברת קסטות.</p>	
	קופילוב האן	<p>6.6 <u>לו"ז משוער</u></p> <p>* תכנון אדריכלי ראשוני: עד 30.7.84</p>	
	גונן/צילה מתכננים	<p>* אשור התכנית: עד 10.8.84</p> <p>* תכניות אלקטרומכניות: 10.10.84</p> <p>* חומר מוכן למכרז: 30.12.84, וזאת במידה והתכניות תאושרנה ולא יצוצו בעיות ונושאים חדשים.</p>	
יוני 85	קופילוב	<p>* השלמת האגף צפויה עד חודש יוני 1985.</p>	
		<p><u>ביה"ח חברון-אגף חדרי נתוח</u></p>	7.
		<p>7.1 הפרויקט מתקדם לפי לוח הזמנים, לרבות הקמת המבנה החצוני ובמקביל השלמת תכנון ויצור של האזור המתועש.</p>	
		<p>7.2 שרותי הבריאות עדיין לא העבירו השלמת תקציבים ולא אשרו את התקציבים הנוספים שנדרשו (עבור מנורות הנתוח).</p>	
מרץ 1985	קופילוב	<p>7.3 השלמת הפרויקט צפויה לחודש מרץ 1985. (מותנה בהשלמות תקציביות).</p>	
		<p><u>ביה"ח חברון-תכנון כולל</u></p> <p>עדיין לא נתקבלו דרישה ותקציב בנושא משרותי הבריאות למע"צ, לפי פרוגרמה שהוכנה ואושרה.</p>	8.
	שרותי הבריאות		
		<p>4/.....</p>	

סעיף	ה נושא	הטפול באחריות	עד תאריך
9.	<u>ביה"ח רמאללה-אגף הרנטגן</u> ראה פרוט בנושא בסכום מס' 26/1/4 מתאריך 26.6.84. לוח זמנים משוער להשלמת האגף: חודש מרץ 1985.	קופילוב	מרץ 1985
10.	<u>ביה"ח רמאללה-אגף חדרי נתוח</u> מתבצעים עתה עבודות תכנון האגף, לפי פרוגרמה של מש' קופילוב שאושרה ע"י שרותי הבריאות וע"י ד"ר סלטי. לוח זמנים משוער	קופילוב	יולי 1985
10.1	* תכנון וחומר למכרז: עד חודש 10/84. * השלמת הפרויקט: עד חודש יוני 1985, וזאת במידה ולא יהיו עכובים בהשלמת תקציבים.	קופילוב	יולי 1985
11.	<u>ביה"ח רמאללה-תכנון כולל</u> הכונה לתכנון בניה ומערכות בבית החולים לפי פרוגרמה שתוכננה וסוכמה. תואם ישיבה מוקדמת בנושא לדיון כללי בהשתתפות ה"ה ש. גונן, צ. הקר, וש. קופילוב.	קופילוב	15.7.84
12.	<u>ביה"ח רפידיה-אגף הרנטגן</u> אומדן משוער לשנויים ותוספות בניה פנימית ומערכות באגף רנטגן (כולל מיון ומרפאות) - יוגש לשרותי הבריאות.	קופילוב	12.7.84
13.	<u>השלמת פרוגרמות</u> בקשה להשלמת נושא פרוגרמות בבתי החולים רמאללה, בית ג' אלה, ושכם - הועברה משרותי הבריאות למע"צ. השלמת הפרוגרמות כוללת תאור, פרוט והסברים למצב הקיים ופתוח בתי החולים בעתיד (חברות מודפסות באנגלית); וכך העתק נוסף של הפרוגרמות המשורטטות באנגלית עבור מנהלי בתי החולים. לוח זמנים משוער	קופילוב	30.8.84
13.1	* העתק משורטט נוסף לכל פרוגרמה: עד 30.8.84	קופילוב	30.8.84
13.2	* תאור, פרוט והסברים למצב קיים ופתוח בעתיד: עד 30.10.84.	קופילוב	30.10.84

שלמה קופילוב

שלמה קופילוב

א"ר



REF.: 16/12/4

DATE: 25.7.84

הפרויקט: רצועת עזה - תכנית אב לבתי חולים

סכום ישיבה וסיור

שנערכה בתאריך 24.7.84 בנושא פרוגרמה לתכנית האב


מקום הישיבה: מש' ד"ר לש, עזה; הסיור נערך בבתי חולים בחבל עזה
נוכחים: ה"ה לש, בן יצחק, ודר, חדר (שרותי הבריאות, עזה); גיל, קרפ, גרונ, תומא (מע"צ);
עורר; קופילוב

תפוצה: הנוכחים; ד"ר חירי, בן דוד (שרותי הבריאות)

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

סעיף	ה נושא	הטפול באחריות עד תאריך
1.	<u>כללי</u> נערך סיור בבתי החולים בחבל עזה, לצורך התרשמות ממצב בתי החולים, הדרישות השונות ואפשרויות בניה ופתוח בהוה ובעתיד.	
2.	<u>בישיבה המוקדמת נדון כלהלן</u>	
2.1	בגלל השטח המצומצם של ביה"ח שיפא, הוא יתוכנן ל-650 מיטות בלבד. יכללו בו מחלקה פסיכיאטרית אקוטית אופטלמולוגיה ומח' עיניים.	
2.2	בתכנון הפרוגרמה יש להביא בחשבון את מנהגי המקום מבחינת הימצאות בני משפחה ליד החולים לצורך לימוד הטפול בהם מחד, ומאידך הנוהג שהחולים עוזבים את בתי החולים מוקדם יחסית, גם במקרים אונקולוגיים.	
2.3	תכניות, תאור ופרוט המצב הקיים בבתי החולים ברצועת ימסר תוך שבוע. הפרוט יכלול את הנושאים הבאים: 2.3.1 תכנית ביה"ח ומספור בנינים 2.3.2 מספר מיטות בכל בנין בביה"ח וסוג המיטות 2.3.3 פרוט מכונים רפואיים ושרותים נוספים בכל ביה"ח.	ד"ר לש/חדר 31.7
	2/..	

עד תאריך	הטפול באחריות	ה נו ש א	סעיף
		<p><u>הסיוור נערך באתרים הבאים</u></p>	3.
		<p><u>ביה"ח' בחן יוניס</u></p>	3.1
		<p>3.1.1 זהו אחד משלושת בתי החולים האזוריים המתוכננים, בית החולים מתוכנן לאזור דרום החבל, ויכיל כ-500 מיטות לשנת המטרה (שנת 2000).</p>	
		<p>3.1.2 כיום ישנם בביה"ח 243 מיטות והוא משרת כ-35% מאוכלוסיית החבל.</p>	
		<p>3.1.3 שטח ביה"ח מצומצם, וישנם שטחים פנויים בסמוך לביה"ח ויש לבדוק אפשרות להגדיל את ביה"ח בהתאם.</p>	ד"ר לש
		<p><u>ביה"ח לחולי שחפת; באזור בורין'</u></p>	3.2
		<p>3.2.1 באזור ביה"ח יוקם ביה"ח האזורי השני, לאזור המרכז, ויהיה גם הוא בן 500 מיטות.</p>	
		<p>3.2.2 צמוד לבית החולים, ממזרח ומדרום ישנם שטחים פנויים. יש לבדוק אפשרות לספחם עבור ביה"ח.</p>	ד"ר לש
		<p><u>ביה"ח עיניים ופסיכיאטריה בעזה</u></p>	3.3
		<p>3.3.1 באזור מתוכנן בי"ח על אזורי, סה"כ כ-350 מיטות.</p>	
		<p>3.3.2 ביה"ח כולל היום 57 מיטות בביה"ח לעיניים, 20 מיטות לפסיכיאטריה וכן 135 מיטות לילדים בביה"ח הסמוך, שיש לפנותו.</p>	
		<p>3.3.3 יש שטח פנוי צמוד לביה"ח ויש לבדוק אפשרות לספחו עבור ביה"ח.</p>	ד"ר לש


 e. כ. ג.
 שלמה דופילוב

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST. TEL-AVIV 64382, ISRAEL

טל. 245296: 250870

טלפקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64382

REF.: 26/1/15

DATE 11.12.84



לכבוד

מר ישראל האן
מר דוד שפירא (משרד איסקוביץ-שפירא-האן)
מר פרנקל (משרד אלישע-פרנקל)
מר אורי ברנר (משרד בלעד)

א.נ.א.

הנדון: בתי-החולים ביר"ש - אספקות למערכות

בהתיחס למכתבנו מס' 26/1/13 מתאריך 28.11.84, ברצוני להודיעכם שבשיחה טלפונית עם מר ס. ביצ'ין בתאריך 9.12.84, אישר מר ביצ'ין את המלצותנו המפורטות במכתבנו הנ"ל, כלהלן:

1. מערכת מזוג אוויר

בהתיחס להמלצות והנחיות מר י. לויזן - סוכס שבאגפי הרנטגן בבתי- החולים חברון ובית-ג'אלה (וכמובן רמאללה), יהיה מזוג אוויר עצמאי, ע"י מזגנים ממוצלים, כפי שתוכנן. תבדק האפשרות להוסיף מערכת אספקת אוויר צח.

2. בית-ח בית-ג'אלה

2.1 בהמשך למכתבי הנ"ל, סוכס שמערכת מים חמים לצריכה תהיה עצמאית ע"י דודי חמים.

2.2 תתוכנן מערכת כריזה לאולם ההמתנה.

נא השלימו התכנון בהתאם.

בכבוד רב,

שלמה קופילוב

העתקים:

תא"ל א. בקנשטיין, סגן מנכ"ס פעולות בשטחים.
ד"ר י. סבר, י. שכטר, צ. האקר, ס. ביצ'ין - שרותי הבריאות, יו"ס.
א. גיל, ע. לוכסנבורג, א. גולדשלאגר, י. רוז'נסקי, א. ערטון, י. לויזן.
ג. הרשקוביץ, י. טל - מע"צ.

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64382, ISRAEL

טל, 245296; 230870

טלסקס: 35770-1 COIN IL

שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראל'ס 15, תל-אביב 64382

REF: 22/2/3

DATE: 12.12.84

לכבוד
מר יוסי שנטר
אמ"ל שרותי הבריאות
בית-אל

..J.A

הנדון: ביה"ח בית-ג'אלה - חוזק המבנה

1. לאור הממצאים בשטח והדו"ח של מהנדס מ.ויינטראוב שהערכתם אלינו - יש חשש רציני לחוזק המבנה גם בטצבו הנוכחי, על אחת כמה וכמה לאור תוספות הבניה והשנויים המתוכננים באגף הרנטגן ובאגף הגמורחים.
2. דרושה בדיקה יסודית של המבנה וכך תקונים והעמסות נסיון - המבוצעים עתה באחריותכם.
3. אנו נקדם את תכנון המערכות והפרטים האדריכליים באגף הרנטגן - אך לא נוכל להשלים את תכניות הקונסטרוקציה והחומר למכרז עד שלא נחיה בטוחים שהשנויים והתוספות באגף הרנטגן לא יסכנו את המבנה כולו.

בכבוד רב,
שלמה קופילוב

העתיקים:

- תא"ל א.בקנשטיין, סגן מתאם פעולות בשטחים.
א.אילוז, רע"ג רווחה, - יו"ט
ד"ר י.סבר, ס.ביצ'ין, ע.האקר - שרותי הבריאות, יו"ט
א.גיל, ע.לוכטנבורג, י.רוז'נסקי, א.ערמון, א.גורביץ, א.גולדשלאגר - מע"צ

ג' א. י. 84

SHLOMO KOPILOV M. Sc.
ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV 64 382, ISRAEL

טל. 245296; 230070

טלפקס: 35770-1 COIN IL


שלמה קופילוב M. Sc.

הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב 64382

REF.: 26/1/13

DATE: 28.11.84



לכבוד
מר יוסי שכטר
אמכל שרותי חבראות יו"ש

א.נ.

הנדון: בתי-חולים ביו"ש - אספקות לטערכות

בחת"ח לשיבה בנושא מתאריך 21.11.84 (ראה סכום מס' 26/1/12 מתאריך 23.11.84) ולשיחתנו בנושא, להלך ברורים שרכנו בנושאים משונים שהיו שנויים במחלוקת בישיבה, והטלצותינו:

1. ביה"ח חברון, אגף הרנטגן

טערכת מזוג אויר

נקבעה ישיבה בנושא ל- 6.12.84, אך על-מנת לזרז את הנושא נפגשו ח"ח י. לויז' וד. שפירא בתאריך 25.11.84 ולהלך ההטלצה:

טערכת מזוג אויר-לאגף הרנטגן הטבוססת על הגדלח של טערכת מזוג האויר של אגף הנתוחים, בתוספת עגרת לאגף הרנטגן - תעלה לטעלה מפי 2 מעלות טערכת מ/א ע"י מזגנים מפוצלים שתוכננה ע"י משרד איצקוביץ-שפירא-האן, ואם נוסיף לכך את העובדה שאין כלל בטחון שטערכת מ/א לאגף הנתוחים תבוצע בעתיד הקרוב - לדעתנו טערכת מזוג האויר לאגף הרנטגן צריכה להיות עצמאית, ע"י מזגנים מפוצלים, כפי שתוכנן.

נא תשובתכם בנדון.

2. ביה"ח בית-ג'אלה, אגף הרנטגן

סיורתי בביה"ח בתאריך 27.11.84 עם ג'. ארג' וקבלתי ממנו נתונים לגבי טערכות מזוג אויר, מיס חמים וכריזה.

טסתבר כלהלך:

2.1 מערכת מים חמים לעריכה

המקום הקרוב של אספקת מים חמים נמצא במרחק של כ 40 מ' מהכניסה לאגף.

אנו זקוקים ל 40 מ"א צינור אספקה "1 מבודד (לפי כ 30 \$ למ"א, כולל אביזרים) ועוד 40 מ"א צינור חוזר (לפי כ 20 \$ למ"א, כולל אביזרים), סה"כ עלות הצנרת תהיה כ 2,000 \$, לעומת כ 500 \$ עלות שלושת דודי החמום (60 ליטר כ"א) שתוכננו.

2.2 מערכת כריזה

מסתבר שלא תוכננה מערכת כריזה ו/או רמקולים לאולם ההמתנה.


2.3 מערכת מזוג אוויר

מסתבר שבקריבת האגף ישנה אספקה של מים חמים למזוג אוויר ולדברי ג'. ארג' ניתן להתחבר אליה. אך לדבריו, מערכת מזוג האוויר שתוכננה אינה יכולה לספק מים קרים, ותהיה דרושה הגדלה של המערכת ותוספת יחידות. כטדה ואתם מעונינים שחתכניות של מערכת מזוג האוויר שתוכננה יבדקו באופן יסודי ע"י מע"צ, אנא פנו בנושא.

לפי האינפורמציה שנמסרה לנו, מבחינה כספית זול בהרבה לבצע את מערכת מ/א באגף הרנטגן ע"י מזגנים מפוצלים, כפי שתוכננו ע"י משרד איצקוביץ-שפירא-האן.

לדברי ג'. ארג' חסר תקציב להשלמת המערכות בבית"ח, ונראה לנו שזו סיבה נוספת לבצע את האספקות לאגף הרנטגן באופן עצמאי.

נא תשובתכם בנדון.

בברכה

שלמה קופילוב

העתקים:

- ד"ר סבר, צ. האקר, ס. ביצ'ין (שרותי הבריאות, יו"ש)
- א. גיל, ע. לוכסנבורג, י. רוז'נסקי, א. גולדשלאגר, י. לויזן, א. הרשקוביץ (מע"צ)
- מר י. האן
- מר ד. שפירא
- מר טרנקל
- מר א. ברנר (מש' גלעד)

SHLOMO KOPILOV M. Sc.

ENGINEERING & MANAGEMENT LTD.

15 ISRAEL'S ST., TEL-AVIV, ISRAEL

RES.: 19 HAESHTEL ST., RAMAT-GAN

טל. 230870
טלפקס: 35770 COIN IL
טל. 731180

שלמה קופילוב M. Sc.


הנדסה וניהול בע"מ

רח' ישראלים 15, תל-אביב

מעון: רח' האשל 19, רמת-גן

REF.: 26/1/12

DATE: 23.11.84



28.11.84

הפרויקט: בתי-חולים ביר"ש

סכום ישיבה

שנערכה בתאריך 21.11.84 בנושא קדום תכנון

מקום הישיבה: מש' י. האך

נוכחים: ה"ה: ע. האקר, ס. ביצ'ין (שרותי הבריאות, יו"ש); ש. גונן, בלומרט (מע"צ);
י. האך; א. ברנר (מש' גלעד); פרנקל; ד. שפירא; אלי (מש' דיסקינד);
א. שפיר; ש. קופילוב;

תפוצה: הנוכחים; ה"ה ד"ר סבר, י. שכטר (שרותי הבריאות, יו"ש); א. אילוז
(ענף הרוחה, יו"ש); א. גיל, ע. לוכסנבורג, י. רוז'נסקי, א. גדלדשלאגר
(מע"צ);

סוכם ע"י: שלמה קופילוב

סעיף	ה נושא	הטפול באחריות	עד תאריך
	<u>כללי</u>		
1.	הישיבה נערכה לצורך קדום תכנון בפרויקטים השונים, וזאת בהמשך לסיור יועצים שהתקיים בבית-ג' אלה ובחברון ב- 15.11.84.		
2.	שרותי הבריאות מתבקשים לזרז העברת כספים לפרויקטים השונים, לרבות אשור תקציבי למרכז רמאללה-רנטגן. חוסר תקציבים עלול לעצור שוב את התכנון.	שכטר	בהקדם
3.	<u>ביה"ח בית-ג' אלה, אגף הרנטגן</u>		
	<u>אדריכלות</u>		
3.1	התכנית האדריכלית אושרה ע"י כל הגורמים, לרבות ד"ר ודר, ש. גונן, ד. האך וס. ביצ'ין.		
3.2	לגבי דלת הכניסה - ראה סעיף 3.13.		
3.3	יתוכנן קומפקטוס לארכיב.	האך	3.12

סעיף	ה נושא	הטפול באחריות	עד תאריך
	<u>אינסטלציה</u>		
3.4	הוצגה תכנית האינסטלציה. תבדק האפשרות שאספקת מים חמים תהיה מהמערכת המרכזית, ולא מ-3 דודי 60 ליטר כפי שתוכנן. דרושה אספקה "1 וצינור חוזר" ½".	סלומון/ קופילוב	3.12
3.5	יש להוסיף כיורי רחצת ידיים (מים חמים/קרים) בחדר מנהל ובחדר טכנאים.	פרנקל	3.12
3.6	יש להוסיף הכנות למכונת פתוח יום.	פרנקל	3.12
	<u>חשמל</u>		
3.7	לחדר רנטגן עתיד: תוכן הכנה של 120 אמפר בלוח, כולל שררול מעבר לחדר.	ברנר	3.12
3.8	יהיו עמעמי תאורה (דימרים) ב-3 חדרי הרנטגן ובחדר האולטר-סאונד. התאורה בחדרי הרנטגן תופעל גם מהכניסה וגם מהפקוד	ברנר	3.12
3.9	בחדרי רנטגן יהיה שקע כפול ליד כל שולחן בדיקה.	ברנר	3.12
3.10	בחדר האולטרסאונד, המכשיר נוגע בגוף החולה ודרושה הארקה מתאימה.	ברנר	3.12
	<u>תקשורת</u>		
3.11	כל חדר רנטגן יהיה קשור בקשר דבור למשרד הקבלה.	ברנר	3.12
3.12	חדר החושך יהיה קשור לכל אחד מחדרי הרנטגן בקשר דבור.	ברנר	3.12
3.13	חדרי הרנטגן לא יהיו קשורים ביניהם.		
3.14	תהיה מערכת כריזה מהקבלה לאזור ההמתנה. במידה ומתוכננת מערכת כריזה באזור ההמתנה, תחובר אליה מערכת הכריזה של הרנטגן.	קופילוב/ברנר	3.12
3.15	דלת הכניסה מאזור הקבלה תופעל ע"י לחצן חשמלי מאזור הקבלה. הדלת תפתח ידנית בכוון אחד, ועם החזרה אוטומטית.	האן/ברנר	4.12

סעיף	ה נושא	הטפול באחריות	עד תאריך
3.16	טלפונים יהיו בקבלה, בחדר מנהל ובחדר אולטרסאונד.	ברנר	3.12
3.17	תבוצע הכנה בלבד (תשתית צנרת) לכבלים למחשב, מהקבלה לחדר הושך ולחדר מנהל.	ברנר	3.12
3.18	דרושים סה"כ כ- 200 אטפר לאגף. יבדק מקום החבור.	סלומון/ קופילוב	3.12
3.19	תוכן צנרת בלבד למערכת גלוי אש ועשן. המערכת תשולב בעתיד עם מערכת הגלוי של בית-החולים.	ברנר	3.12
<u>בטיחות</u>			
3.20	בפנת כבוי האש המסומנת בתכנית האדריכל יהיה גלגילון ומטף כבוי 1 1/3 ק"ג BCF. יהיה מטף כבוי בכל חדר רנטגן וחדר האולטרסאונד.	האן/פרנקל	3.12
<u>מערכת מזוג אויר</u>			
3.21	תבדק האפשרות לקבל אויר ממוזג או גיס חמים/קרים למערכת מזוג אויר עבור האגף (כ- 5 טון קרור) במקום להשתמש במזגנים מפוצלים.	סלומון/ קופילוב	4.12
3.22	יש להוסיף מזוג גם לחדר טכנאים/קבלה.	שפירא	
<u>קונסטרוקציה</u>			
3.23	תכנון הקונסטרוקציה ימשך לאחר קבלת תוצאות הבדיקה של מהנדס וינטרופ, הבודק את הנושא בכל ביה"ח לפי הזמנת שרותי הבריאות ביו"ש.	בלומרט	
4	<u>ביה"ח חברון, אגף הרנטגן</u>		
<u>אדריכלות</u>			
4.1	התכנית האדריכלית אושרה למעט נושא אזור שרותים/הלבשה הצמוד לחדרי הרנטגן. סוכם גם הפתרון בנושא זה.	האן	3.12
<u>אינסטלציה</u>			
4.2	חמום מים (לכיוורי רחיצת ידיים) יהיה ע"י דוד חמום אחד, 60 ליטר.	פרנקל	3.12
4/..			

ע"ד תאריך	הטפול באחריות	ה נושא	סעיף
3.12	פרנקל	יש להוסיף כליור רחצה (מיס חמיס/ קריס) בחדרי טכנאים וחדר מנהל.	4.3
		<u>חשמל</u>	
3.12	ברנר	עמעמי האורה, שקעים והארקה - כמו בסעיפים 3.8, 3.9, 3.10 לעיל.	4.4
		<u>תקשורת</u>	
3.12	ברנר	תקשורת - כמו בסעיפים 3.11, 3.12, 3.13 לעיל.	4.5
3.12	ברנר	מערכת כריזה תהיה לאזור ההמתנה ליד המרפאות, כמו בסע' 3.14 לעיל.	4.6
3.12	ברנר/האן	דלת הכניסה מכוון המרפאות תופעל ע"י לחצן חשמלי מהקבלה.	4.7
3.12	ברנר/האן	דלת הכניסה מלובי ביה"ח תהיה מהקבלה, ע"י לחצן חשמלי וקש דבור. היציאה תהיה ידנית, עם שלט "יציאת חרום" שתמנע יציאת אנשים מהרנטגן בכרוך זה.	4.8
3.12	האן	יהיה כרוך פתיחה אחד לדלתות וסגירה אוטומטית.	4.9
3.12	ברנר	טלפונים - כמו סע' 3.16 לעיל.	4.10
3.12	ברנר	חשתית לכבלים למחשב - כמו סע' 3.17 לעיל.	4.11
3.12	ברנר	הכנה למערכת גלוי עשן ואש - כמו סע' 3.19 לעיל.	4.12
		<u>בטיחות</u>	
3.12	האן/פרנקל	כמו סע' 3.20 לעיל.	4.13
		<u>מזוג אויר</u>	
3.12	סלומון/ קופילוב	מזוג האויר תוכנן ע"י מזגנים מפוצלים. תבדק האפשרות שהמזוג יהיה מרכזי.	4.14
		<u>קונסטרוקציה</u>	
3.12	בלומרט	התכנית תושלם.	4.15

שלמה קופילוב

