

משרד הביטחון והשכונ
אגף בכיר לענייני הכפר



שם תיק: ישובי הקבע למפוני חבל עזה תכנון, פיתוח
שיווק ולוחות זמנים

מזהה פנימי:

7086 / 7086/13-פר

מזהה פרטי 000dwd

כתובת 3-315-12-7-4

תאריך הדפסה

25/01/2017

ישובי הקבע למפוני חבל עזה תכנון, פיתוח שיווק ולוחות זמנים

אוקטובר 2010

1/1



משרד הביטחון והשכונ
אגף בניד לערניי הכפר

ישובי הקבע - מפוני חבל עזה נתונים כלליים

שם הישוב	מס' יח' ד' בתב"ע	יח' ד' בשלב א'	שווק	בניה	הערות
ניצן	442	442	252	108	מאוקלס-64
ניצנים	690	400	418	2	
חזן	500	153	150		
חרוב	224	73	73		
מירשם	306	60	57		
שומריה	500	100	30		בבניה
אמציה	175	60			
שקף		20			
בוסתן הגליל	100	25	15		מאוקלס-8
נווה ים	280	24			מאוקלס
חלוצית 1	342	78	25	25	
בני נצרים					
חלוצית 4 נווה	300	66	20	20	



דגשים

פיתוח

- בכל האתררים בוצעו תשתיות ראשיות ותשתיות ציבוריות המאפשרות בניה עצמית ע"י המפונים.
- בחלק מן האתררים ק"יים אכלוס (ניצן, ביסתן הגליל, חלוציות)
- השלמת הפיתוח עם התקדמות בבניה

חסמים

- | | | |
|---------------------------|---|-----------|
| כיכר כביש הגישה | - | ניצנים |
| מט"ש וקווי הולכה | - | מזרח לכיש |
| תחנות טרנספורמציה בישובים | - | |
| הפקעות | - | |



מבני ציבור

- מזרח לכיש -
 - ניצן ○
 -
 -
 -
 - ניצנים ○
 -
 -
 - חלוצית 4,1 ○
 - תלמי יפה ○
- הועברו הרשאות למוא"ז לביצוע באמצעות משכ"ל
תכנון וביצוע באמצעות משב"ש (בשיתוף הקהילות)
מכרזים ראשונים ל- 2 מבנים (מעון יום, מקווה)
12/10
- גמר תכנון ופרסום מכרזים ליתרת המבנים 4/11
תכנון וביצוע באמצעות משב"ש (בשיתוף הקהילות)
מכרזים ראשונים ל- 3 מבנים (מעון יום, מקווה,
ביכנ"ס/מועדון) 12/10
- גמר תכנון ופרסום מכרזים ליתרת המבנים 4/11
מבני הציבור בביצוע מוא"ז (מצ"ב לו"ז)
העברת הרשאה תקציבית למוא"ז, עם אישור
ההגדלה התקציבית



ניצן


 משרד הבינוי והשיכון
 אגף בכיר לענייני הכפר



ניצן

הרחבה מ-300 ל-600 יח"ד

אלי עמית' - אדריכל ומתכנן ערים

100 שנות תכנון ופיתוח בארץ ישראל



ניצן

מתחם	442 יח"ד
שווקו	252 יח"ד
מאכלס	64 יח"ד
בבניה	108 יח"ד



ניצן


 משרד הבינוי והשיכון
 אגף בכיר לעירוני הכפר

לוחות זמנים לגמר הפרוייקט - טבלה מסכמת

לוח לביצוע			פירוט העבודה	נושא
2012	2011	2010		
	6/11		תכנון ואישור בקרה	שכונת ליברמן
	7/11		פרסום מכרז פיתוח	
	8/12		גמר פיתוח	
		10/10	תכנון ואישור בקרה	שכונה מערבית + צפון מזרחית
		11/10	פרסום מכרז פיתוח	
	10/11		גמר עבודה	
	6/11		תכנון ואישור בקרה	שכונה דרום מזרחית
	7/11		פרסום מכרז פיתוח	
6/12			גמר עבודה	



משרד הבינוי והשיכון
אגף בכיר לענייני הכפר

ניצן

לוח לביצוע			פירוט העבודה	נושא
2012	2011	2010		
	6/11		תכנון ואישור בקרה	כלל ישובי
	7/11		פרסום מכרז פיתוח	
	7/12		גמר עבודה	
		10/10	גמר תכנון ואישור בקרה	מוסדות ציבור מעון יום מקווה נשים
		11/10	פרסום מכרז	
	10/11		גמר עבודה	מוסדות ציבור 3 בתי כנסת אולם ארועים בית שמרית מקווה נשים מועדון
	1/11		גמר תכנון ואישור בקרה	
	2/11		פרסום מכרז	
2/12			גמר עבודה	

ניצן - לוח זמנים להשלמת הישוב

נושא	לוח זמנים			הערות
	2010	2012	2013	
הגדלת תיקוב פיתוח	תיקצוב עבודות הפיתוח - 20 מלש"ח נוספים אישור תוכניות למימוש ההגדלה ביצוע העבודות / סיום עבודות			על פי העבודות שאושרו להפעלה
שכונת ליברמן	תיקצוב עבודות הפיתוח גמר תכנון מפורט ליצוע אישור בקרה תאום תשתיות על הגשת בקשה להיתר בניה השלמת תנאים להיתר בניה פרסום מכרז אישור קבלן זוכה חתימת חוזה צו התחלת עבודה גמר עבודה חיבור לתשתיות מסירה למועצה			מותנה בהתקדמות הבניה למגורים מותנה בהתקדמות הבניה למגורים מותנה בהתקדמות הבניה למגורים מותנה בהתקדמות הבניה למגורים מותנה בהתקדמות הבניה למגורים השכונה מחוברת לתשתיות
השלמות פיתוח שצ"פ				

נוצנים

משרד הבינוי והשיכון
אגף בנייה לענייני הכפר

סכימת תכנית המתאר הארצית



הקמתו ליישוב מחדש במרחב ויזנים

משרד הבינוי והשיכון
אגף בנייה לענייני הכפר



משרד הביטחון והשירות
אגף בכיר לענייני הכפר

ניצנים

במתחם	690 יח"ד	
שווקו	418 יח"ד	
בבניה	2 יח"ד	90 משפחות נרשמו לבניה מרוכזת
חסמים	א. כיכר כביש גישה - מע"צ ב. קירוי מט"ש	





משרד הביטוי והשכלון
אגף בכיר לענייני הכפר

ניצנים

לוחות זמנים לגמר הפרויקט - טבלה מסכמת

לוח לביצוע			פירוט העבודה	נושא
2012	2011	2010		
11/11	11/11	10/10	קירוי מט"ש	תשתיות ראש
			אשקלון	שטח
			(אחריות עיריית אשקלון)	
			מעגל תנועה -	
			כניסה לישוב (אחריות מע"צ)	
11/11	11/10	11/10	גמר תכנון	השלמת פיתוח
			ואישור בקרה	שלב א'
			פרסום מכרז	הסדרת נחל
11/11	11/11	11/11	גמר עבודה	חממה
				סוללה אקוסטית





לוח לביצוע			פירוט העבודה	נושא
2012	2011	2010		
2/12	2/11		גמר תכנון ואישור בקרה	כבישים לאכלוס
	3/11		פרסום מכרז	שצ"פ+השלמות כביש 1
			גמר עבודה	
	4/11		גמר תכנון ואישור בקרה	השלמות פיתוח למסירה
4/12	5/11		פרסום מכרז	שצ"פים באשכולות
			גמר עבודה	
		10/10	גמר תכנון ואישור בקרה	מוסדות ציבור
		11/10	פרסום מכרז	מקווה נשים בית כנסת
1/11	1/11		גמר עבודה	מעון
			גמר תכנון ואישור בקרה	מוסדות ציבור
	2/11		פרסום מכרז	יתרה על פי פרוגרמה
			גמר עבודה	מאושרת
2/12				

באר גנים (ניצנים) - לוחות זמנים להשלמת הישוב

נושא	לוח"ר ביצוע				הערות	פירוט העבודה	פיתוח
	2010	2011	2012	2013			
<u>פיתוח</u>	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11	טרם תוקצב	היטל התחברות למכון טהור	כבישים לאילוס + שפ"ם ברמת ישוב השלמת + כביש 1
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11	תוקצב	תיקוצב עבודות הפיתוח	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		גמר תיכנון מפורט לביצוע	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		אישור בקרה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		תאום תשתיות על	
<u>פיתוח</u>	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		הגשת בקשה להיתר בניה	כבישים לאילוס + שפ"ם ברמת ישוב השלמת + כביש 1
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		השלמת תנאים להיתר בניה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		פרסום מכרז	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		אישור קבלן זוכה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		חתימת חוזה	
<u>פיתוח</u>	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		צו התחלת עבודה	שפ"ם ברמת ישוב השלמת + כביש 1
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		גמר עבודה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		חיבור לתשתיות	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		מסירה למועצה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		תיקוצב עבודות הפיתוח	
<u>פיתוח</u>	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		גמר תיכנון מפורט לביצוע	שפ"ם ברמת ישוב השלמת + כביש 1
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		אישור בקרה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		תאום תשתיות על	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		הגשת בקשה להיתר בניה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		השלמת תנאים להיתר בניה	
<u>פיתוח</u>	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		פרסום מכרז	שפ"ם ברמת ישוב השלמת + כביש 1
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		אישור קבלן זוכה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		חתימת חוזה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		צו התחלת עבודה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		גמר עבודה	
<u>פיתוח</u>	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		מסירה למועצה	שפ"ם ברמת ישוב השלמת + כביש 1
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		תיקוצב עבודות הפיתוח	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		גמר תיכנון מפורט לביצוע	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		אישור בקרה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		תאום תשתיות על	
<u>פיתוח</u>	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		הגשת בקשה להיתר בניה	שפ"ם ברמת ישוב השלמת + כביש 1
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		השלמת תנאים להיתר בניה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		פרסום מכרז	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		אישור קבלן זוכה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		חתימת חוזה	
<u>פיתוח</u>	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		צו התחלת עבודה	שפ"ם ברמת ישוב השלמת + כביש 1
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		גמר עבודה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		מסירה למועצה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		תיקוצב עבודות הפיתוח	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		גמר תיכנון מפורט לביצוע	
<u>פיתוח</u>	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		אישור בקרה	שפ"ם ברמת ישוב השלמת + כביש 1
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		תאום תשתיות על	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		הגשת בקשה להיתר בניה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		השלמת תנאים להיתר בניה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		פרסום מכרז	
<u>פיתוח</u>	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		אישור קבלן זוכה	שפ"ם ברמת ישוב השלמת + כביש 1
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		חתימת חוזה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		צו התחלת עבודה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		גמר עבודה	
	10/11/10	1/2/11	1/2/11	1/2/11		מסירה למועצה	

באר גנים (ניצנים) - לוחות זמנים להשלמת הישוב

שנה	לוח זמנים												הערות	פירוט העבודה	נושא
	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002			
מוסדות													מתקצב	תיקצוב עבודות הפיתוח	מקווה נשים
														גמר תכנון מפורט לביצוע	בית כנסת
														אישור בקרה	מעון
														תאום תשתיות על	
														הגשת בקשה להיתר בניה	
מוסדות														השלמת תנאים להיתר בניה	
														פרסום מכרז	
														אישור קבלן זוכה	
														חתימת חוזה	
														צו התחלת עבודה	
מוסדות														גמר עבודה	
														חיבור לתשתיות	
														מסירה למועצה	
														תיקצוב עבודות הפיתוח	
														גמר תכנון מפורט לביצוע	
מוסדות														אישור בקרה	
														תאום תשתיות על	
														הגשת בקשה להיתר בניה	
														השלמת תנאים להיתר בניה	
														פרסום מכרז	
מוסדות														אישור קבלן זוכה	
														חתימת חוזה	
														צו התחלת עבודה	
														גמר עבודה	
														חיבור לתשתיות	
מוסדות														מסירה למועצה	
														תיקצוב עבודות הפיתוח	
														גמר תכנון מפורט לביצוע	
														אישור בקרה	
														תאום תשתיות על	
מוסדות														הגשת בקשה להיתר בניה	
														השלמת תנאים להיתר בניה	
														פרסום מכרז	
														אישור קבלן זוכה	
														חתימת חוזה	
מוסדות														צו התחלת עבודה	
														גמר עבודה	
														חיבור לתשתיות	
														מסירה למועצה	
														תיקצוב עבודות הפיתוח	

חזן (בני דקלים)

משרד הבינוי והשיכון
אגף בנין לענייני הכפר





משרד הבינוי והשיכון
אגף בנין לענייני תכנון

חזן לוחות זמנים לגמר הפרויקט - טבלה מסכמת

לוח לביצוע			פירוט העבודה	נושא
2012	2011	2010		
	1/11		מט"ש - גמר תכנון	תשתיות על באחירות מוא"ז
3/12			גמר ביצוע	
	2/11		תחנת טרנספורמציה	
		בוצע	גמר תכנון	מכרז פיתוח ניקוז והסדרת מדרכות (3.3) מלש"ח
		בוצע	פרסום מכרז	
	7/11		גמר עבודה	
	3/11		גמר תכנון ואישור בקרה	השלמות פיתוח ושע"פ
	4/11		פרסום מכרז	
	4/12		גמר עבודה	
	2/11		גמר תכנון	מבני ציבור (על פי פרוגרמה מאושרת)
	3/11		פרסום מכרז	
	12/11		גמר עבודה	באחירות מוא"ז

בני דקלים (חזו) - לוחות זמנים להשלמת הישוב

תקצוב עבודות פיתוח	תקצוב 3.3 מלש"ח				
גמר תכנון מפורט לביצוע	בוצע				
אישור בקרה על תכנון	בוצע				
הגשת בקשה להיתר בניה	בוצע				
פרסום מכרז	בוצע				
אישור קבלן זוכה					
גמר חתימות חוזה (כולל ערבויות וביטוח)					
הוצאת צו תחילת עבודה					
גמר עבודות	15.7.11				
חיבור לתשתיות					
מסירה למועצה	1.9.11				
תקצוב עבודות פיתוח	18 מלש"ח - מותנה בהתקדמות הבניה למגורים				
גמר תכנון מפורט לביצוע					
אישור בקרה על תכנון					
הגשת בקשה להיתר בניה					
השלמת תנאים להיתר בניה					
פרסום מכרז	1.3.11				
אישור קבלן זוכה					
גמר חתימות חוזה (כולל ערבויות וביטוח)					
הוצאת צו תחילת עבודה					
גמר עבודות					
חיבור לתשתיות					
מסירה למועצה					
אישור הרשאה תקציבית למועצה	11.3 מלש"ח הועבר למועצה				
אישור תכנון לביצוע					
אישור הפעלת הפרויקט (מאישור קבלן ע"י ומכרזים של הרשות)					
סיום ביצוע					
מסירת מבנים למועצה					
סיום עבודות פיתוח שלב א' - ניקוז והסדרת מדרגות					
השלמות פיתוח ושצ"פ					
מבני ציבור					

חרוב (כרם עמי)


משרד הבינוי והשיכון
אגף בנין לעיטוי הכפר



חרוב לוחות זמנים לגמר הפרוייקט - טבלה מסכמת

לוח לביצוע			פירוט העבודה		נושא
2012	2011	2010			
	1/11		מט"ש - גמר תכנון	תשתיות על באחריות מוא"ז	
3/12			גמר ביצוע		
		בוצע	תכנון ואישור בקרה	מכרז פיתוח	מכרז פיתוח
		בוצע	פרסום מכרז	כביש גישה, ניקוז, מרכיבי בטחון, הסדרת מדרונות, ע"ע למוס"צ	מכרז פיתוח
	7/11		גמר ביצוע		
	2/11		תכנון ואישור בקרה	השלמות פיתוח	השלמות פיתוח
	3/11		פרסום מכרז	ושצ"פים	ושצ"פים
4/12			גמר עבודות		
	2/11		גמר תכנון	מבני ציבור	מבני ציבור
	3/11		פרסום מכרז	(על פי פרוגרמה מאושרת)	(על פי פרוגרמה מאושרת)
	12/11		גמר עבודה	באחריות מוא"ז	באחריות מוא"ז


חרוב - לוחות זמנים להשלמת הישוב

סיום עבודות פיתוח שלב א' - כביש גישה, ניקוז, מרכיבי ביטחון, ע"ע למוס"צ והסדרת מדרגות	תקצוב עבודות פיתוח גמר תכנון מפורט לביצוע אישור בקרה על תכנון הגשת בקשה להיתר בניה פרסום מכרז אישור קבלן זוכה גמר חתימות חוזה (כולל ערבויות וביטוח) הוצאת צו תחילת עבודה גמר עבודות חיבור לתשתיות מסירה למועצה	15.7.11 1.9.11	9 מלש"ח - מותנה בהקדמות הבניה למגורים	1.3.11	11.3 מלש"ח הועבר למועצה	
	תקצוב עבודות פיתוח גמר תכנון מפורט לביצוע אישור בקרה על תכנון הגשת בקשה להיתר בניה השלמת תנאים להיתר בניה פרסום מכרז אישור קבלן זוכה גמר חתימות חוזה (כולל ערבויות וביטוח) הוצאת צו תחילת עבודה גמר עבודות חיבור לתשתיות מסירה למועצה	15.7.11 1.9.11	9 מלש"ח - מותנה בהקדמות הבניה למגורים	1.3.11	11.3 מלש"ח הועבר למועצה	
	תקצוב עבודות פיתוח גמר תכנון מפורט לביצוע אישור בקרה על תכנון הגשת בקשה להיתר בניה השלמת תנאים להיתר בניה פרסום מכרז אישור קבלן זוכה גמר חתימות חוזה (כולל ערבויות וביטוח) הוצאת צו תחילת עבודה גמר עבודות חיבור לתשתיות מסירה למועצה	15.7.11 1.9.11	9 מלש"ח - מותנה בהקדמות הבניה למגורים	1.3.11	11.3 מלש"ח הועבר למועצה	
	תקצוב עבודות פיתוח גמר תכנון מפורט לביצוע אישור בקרה על תכנון הגשת בקשה להיתר בניה השלמת תנאים להיתר בניה פרסום מכרז אישור קבלן זוכה גמר חתימות חוזה (כולל ערבויות וביטוח) הוצאת צו תחילת עבודה גמר עבודות חיבור לתשתיות מסירה למועצה	15.7.11 1.9.11	9 מלש"ח - מותנה בהקדמות הבניה למגורים	1.3.11	11.3 מלש"ח הועבר למועצה	
	תקצוב עבודות פיתוח גמר תכנון מפורט לביצוע אישור בקרה על תכנון הגשת בקשה להיתר בניה השלמת תנאים להיתר בניה פרסום מכרז אישור קבלן זוכה גמר חתימות חוזה (כולל ערבויות וביטוח) הוצאת צו תחילת עבודה גמר עבודות חיבור לתשתיות מסירה למועצה	15.7.11 1.9.11	9 מלש"ח - מותנה בהקדמות הבניה למגורים	1.3.11	11.3 מלש"ח הועבר למועצה	
השלמות פיתוח ושצ"פ	אישור הרשאה תקציבית למועצה אישור תכנון לביצוע אישור הפעלת הפרויקט (מאישור קבלן ע"י ו.מכרזים של הרשות) סיום ביצוע מסירת מבנים למועצה					

נטע (מרשם)

משרד הבינוי והשיכון
אגף בנין לענייני הכפר

שטח 60,00 יח"ד

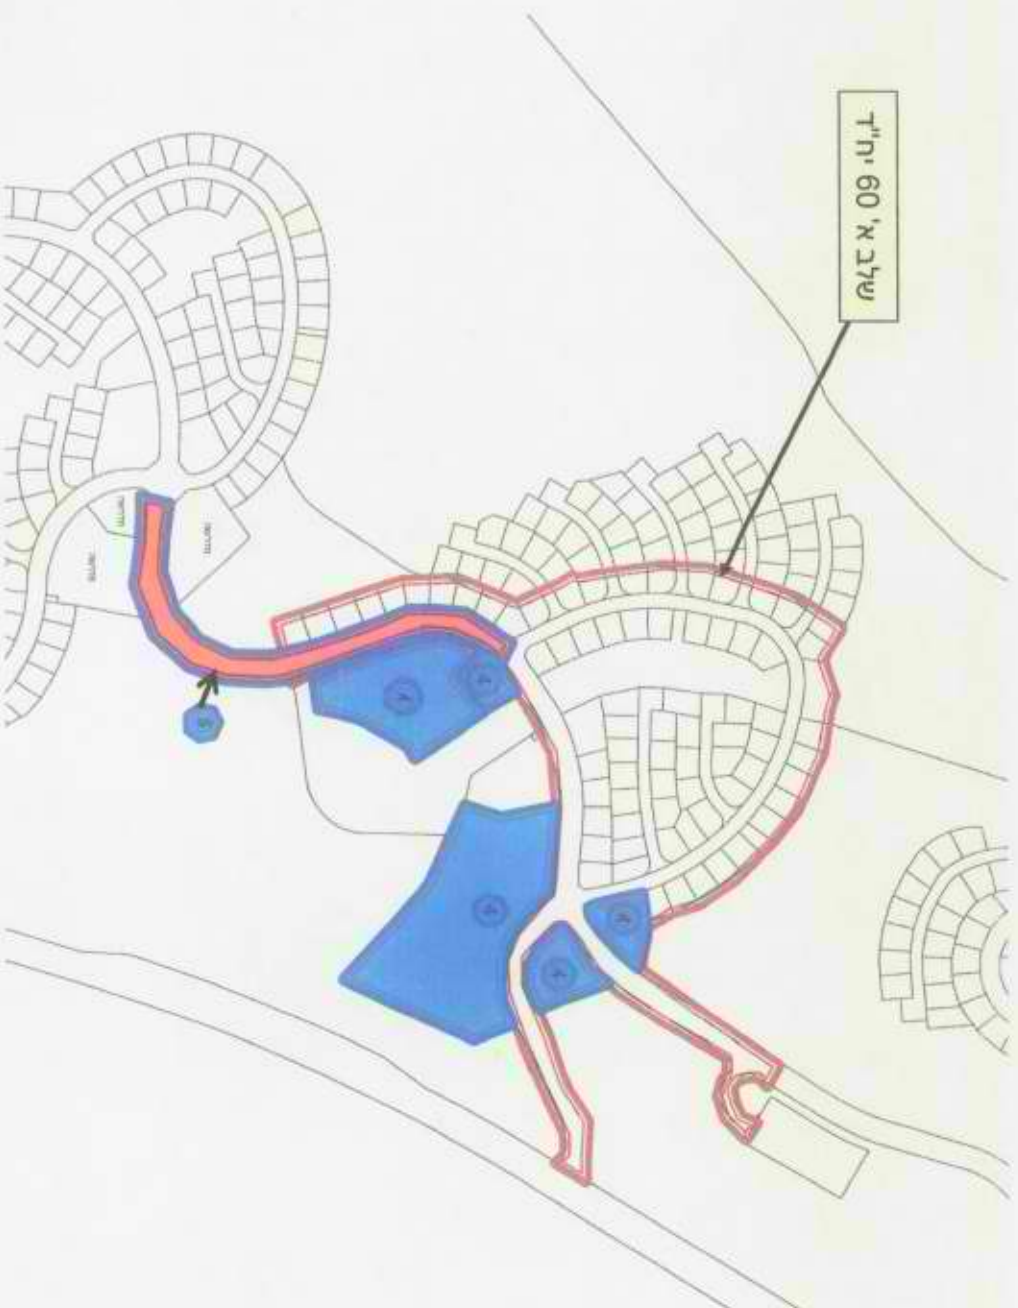

בטע **לוחות זמנים לגמר הפרוייקט – טבלה מסכמת**


 משרד הברי' וחיכון
 אגף בכיר לעניי' הכפר

ל"ז לביצוע			פירוט העבודה	נושא
2012	2011	2010		
	1/11		מט"ש – גמר תכנון	תשתיות על (באחריות מוא"ז)
3/12			גמר ביצוע	
		בוצע	גמר תכנון ואישור בקרה	מכרז פיתוח פיתוח אזור המדרשה שיקום נפי' הסדרת מדרונות ע"ע בשטחי' ציבור
	10/11	בוצע	פרסום מכרז גמר ביצוע	
	2/11		גמר תכנון ואישור בקרה	השלמות פיתוח ושע"פים
	3/11		פרסום מכרז גמר עבודה	
6/12			גמר עבודה	
	2/11		גמר תכנון	מבני ציבור (על פי פרוגרמה מאושרת)
	3/11		פרסום מכרז	
	12/11		גמר עבודה	באחריות מוא"ז

נטע - לוחות זמנים להשלמת הישוב

תקצוב עבודות פיתוח	תקצוב 7 מלש"ח				
סיום עבודות פיתוח שלב א' - מדרשה השלמת ע"ע, שטחי ציבור, שיקום נופי, הסדרת מדרגות	גמר תכנון מפורט לביצוע אישור בקרה על תכנון המשתתף בקשה להיתר בניה פרסום מכרז אישור קבלן זוכה גמר חתימות חוזה (כולל ערבויות וביטוח) הוצאת צו תחילת עבודה גמר עבודות חיבור לתשתיות מסירה למועצה תקצוב עבודות פיתוח	15.12.11 9 מלש"ח - מותנה בהקדמות הבניה למגורים			
השלמות פיתוח ושצ"פ	גמר תכנון מפורט לביצוע אישור בקרה על תכנון המשתתף בקשה להיתר בניה השלמת תנאים להיתר בניה פרסום מכרז אישור קבלן זוכה גמר חתימות חוזה (כולל ערבויות וביטוח) הוצאת צו תחילת עבודה גמר עבודות חיבור לתשתיות מסירה למועצה				
מבני ציבור	אישור הרשאה תקציבית למועצה אישור תכנון לביצוע אישור הפעלת הפרויקט (מאישור קבלן ע"י ומכרזים של הרשות) סיום ביצוע מסירת מבנים למועצה	7.3 מלש"ח הועבר למועצה			

אמציה (קטיף)


משרד הביטוי והשיכון
אגף בכיר לענייני הכפר



אמציה לוחות זמנים לגמר הפרוייקט – טבלה מסכמת


 משרד הביטחון והשכונ
 אגף בכיר לענייני הכפר

נושא	פירוט העבודה			תכנון
	ל"ז לביצוע	2011	2010	
תכנון		12/10	מפורט לביצוע	
סקרים	3/11		ארכיאולוגיה	
	2/11		סקר חללים – ראשוני	
	8/11		מעמיק	
פיתוח שלב א'	5/12			
פינוי מפסמטה, בנייה והעתקת עצים (אחריות חט"ל)	2/13		תכנון וביצוע	
מוסדות ציבור		11/10	הרשאה לתכנון	
על פי פרוגרמה מאושרת באחריות מוא"ז				
שיקום תשתיות ותיקנות (באחריות מוא"ז)	2/11			

שקף טלור




 משרד הבינוי והשיכון
 אגף בנין לענייני הכפר



משרד הבינוי והשיכון
אגף בנין לענייני הכפר

לוחות זמנים לגמר הפרוייקט - טבלה מסכמת שיקוף

לוח לביצוע			פירוט העבודה	נושא
2012	2011	2010		
8/11	6/11	3/11	תכנון מפורט	תכנון
			לביצוע	
			20 יח"ד	
6/11			שיקום כביש	תשתיות על
			גישה	
3/11			מגרש ספורט	מוס"צ




שקף - לוחות זמנים להשלמת הישוב

[illegible]

חלוציות



משרד הביטחון והשכונות
אגף בניה לענייני הכפר

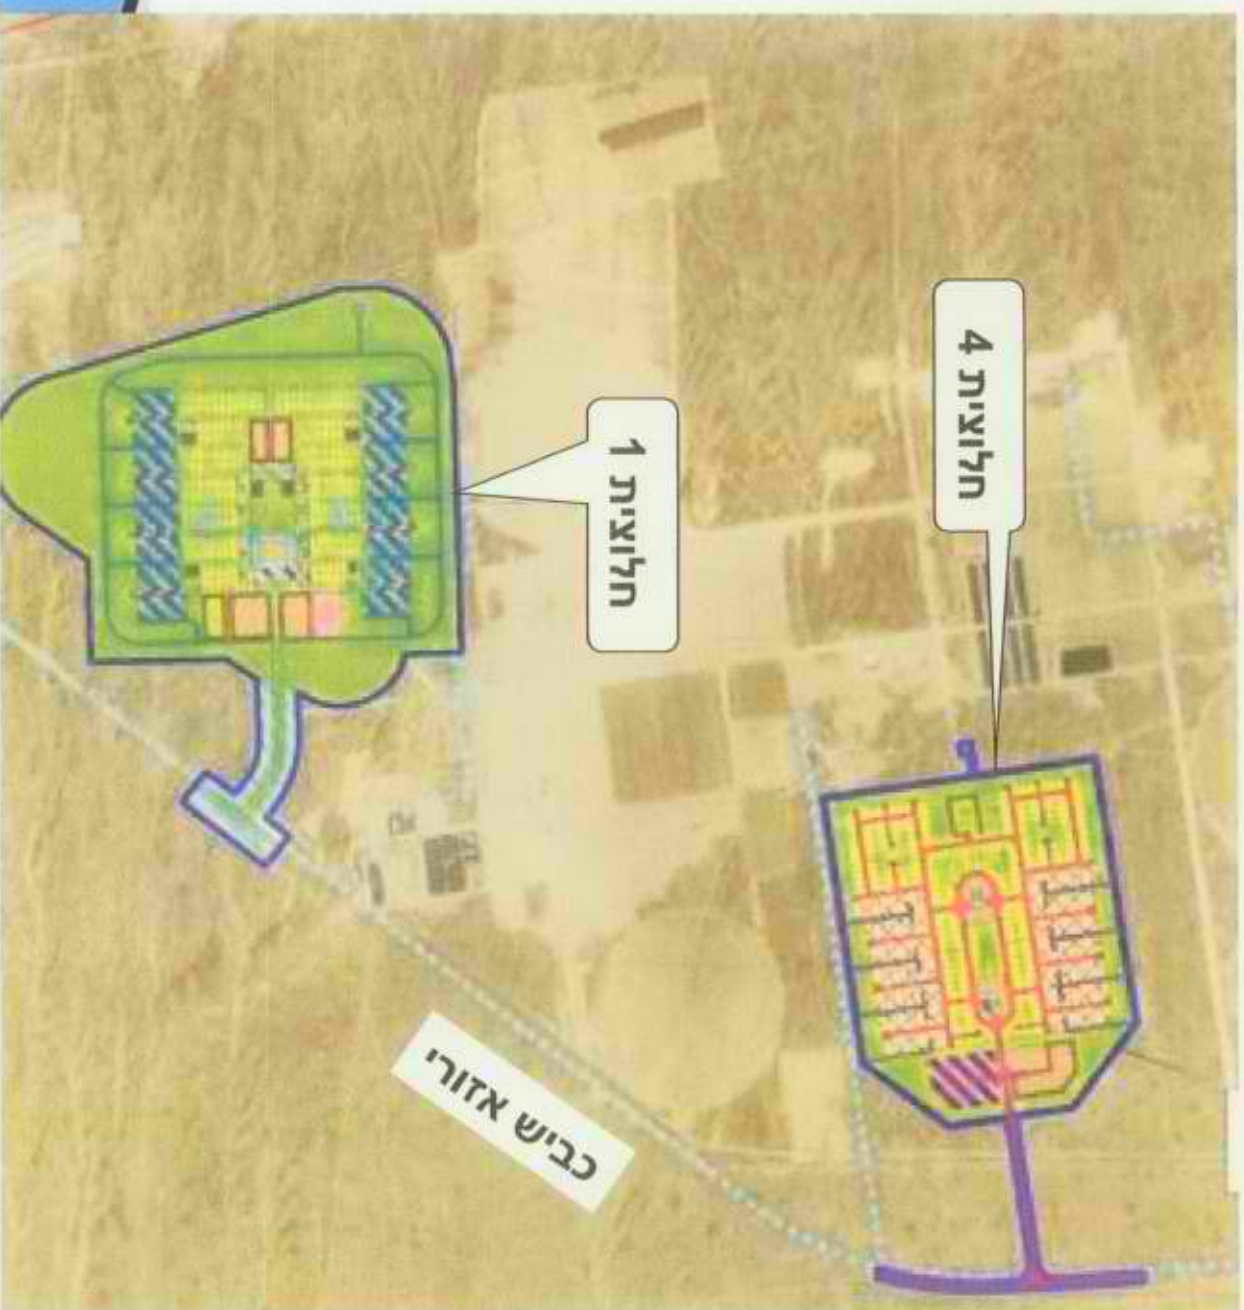

תלוצית 4 (כווה)


משרד הביטחון
אגף בנין לענייני הכפר

תלוצית 4 - 66 מ"ר
46 מ"ר - 1,000 מ"ר
20 מ"ר - 2,000 מ"ר



תלוצית 4 - 66 מ"ר



משרד הבינוי והשיכון
אגף בניין לענייני הכפר

חלוציות 4 לוחות זמנים לגמר הפרוייקט - טבלה מסכמת

לוח לביצוע			פירוט העבודה	נושא
2012	2011	2010		
			בוצע	עבודות פיתוח של ב' א'
	7/11		גמר עבודות	השלמות פיתוח ושע"פים
1/12			מקווה	מוסדות ציבור
	5/11		בית כנסת	על פי פרוגרמה מאושרת
	6/11		מועדון	באחריות מוא"ז
	6/11		מגרש ספורט	
	6/11		מעון	
	9/11		מזכירות + מרפאה	

חלוצית 1 (בני נצרים)



משרד הביטחון והשכונות
אגף בריאות לעיני הכפר



חלוצית 1 - 73 מטר

24 מ' - 250 מ' ר

24 מ' - 1,000 מ' ר

25 מ' - 1,800 מ' ר




משרד הבריאות והשיכון
אגף בניה לענייני תכנון

חלוציות 1 לוחות זמנים לגמר הפרוייקט - טבלה מסכמת

לוח לביצוע			פירוט העבודה	נושא
2012	2011	2010		
			בוצע	עבודות פיתוח שלב א'
8/11			גמר עבודות	השלמות פיתוח ושע"פים
		12/10	מקווה	מוסדות ציבור
3/11			בית כנסת	על פי פרוגרמה מאושרת
6/11			מועדון	(באחריות מוא"ז)
6/11			מגרש ספורט	
4/11			מעון יום	
9/11			מזכירות	
			מרפאה	

נווה ים


 משרד הביטחון והשכונות
 אגף בטיח לענייני תכנון

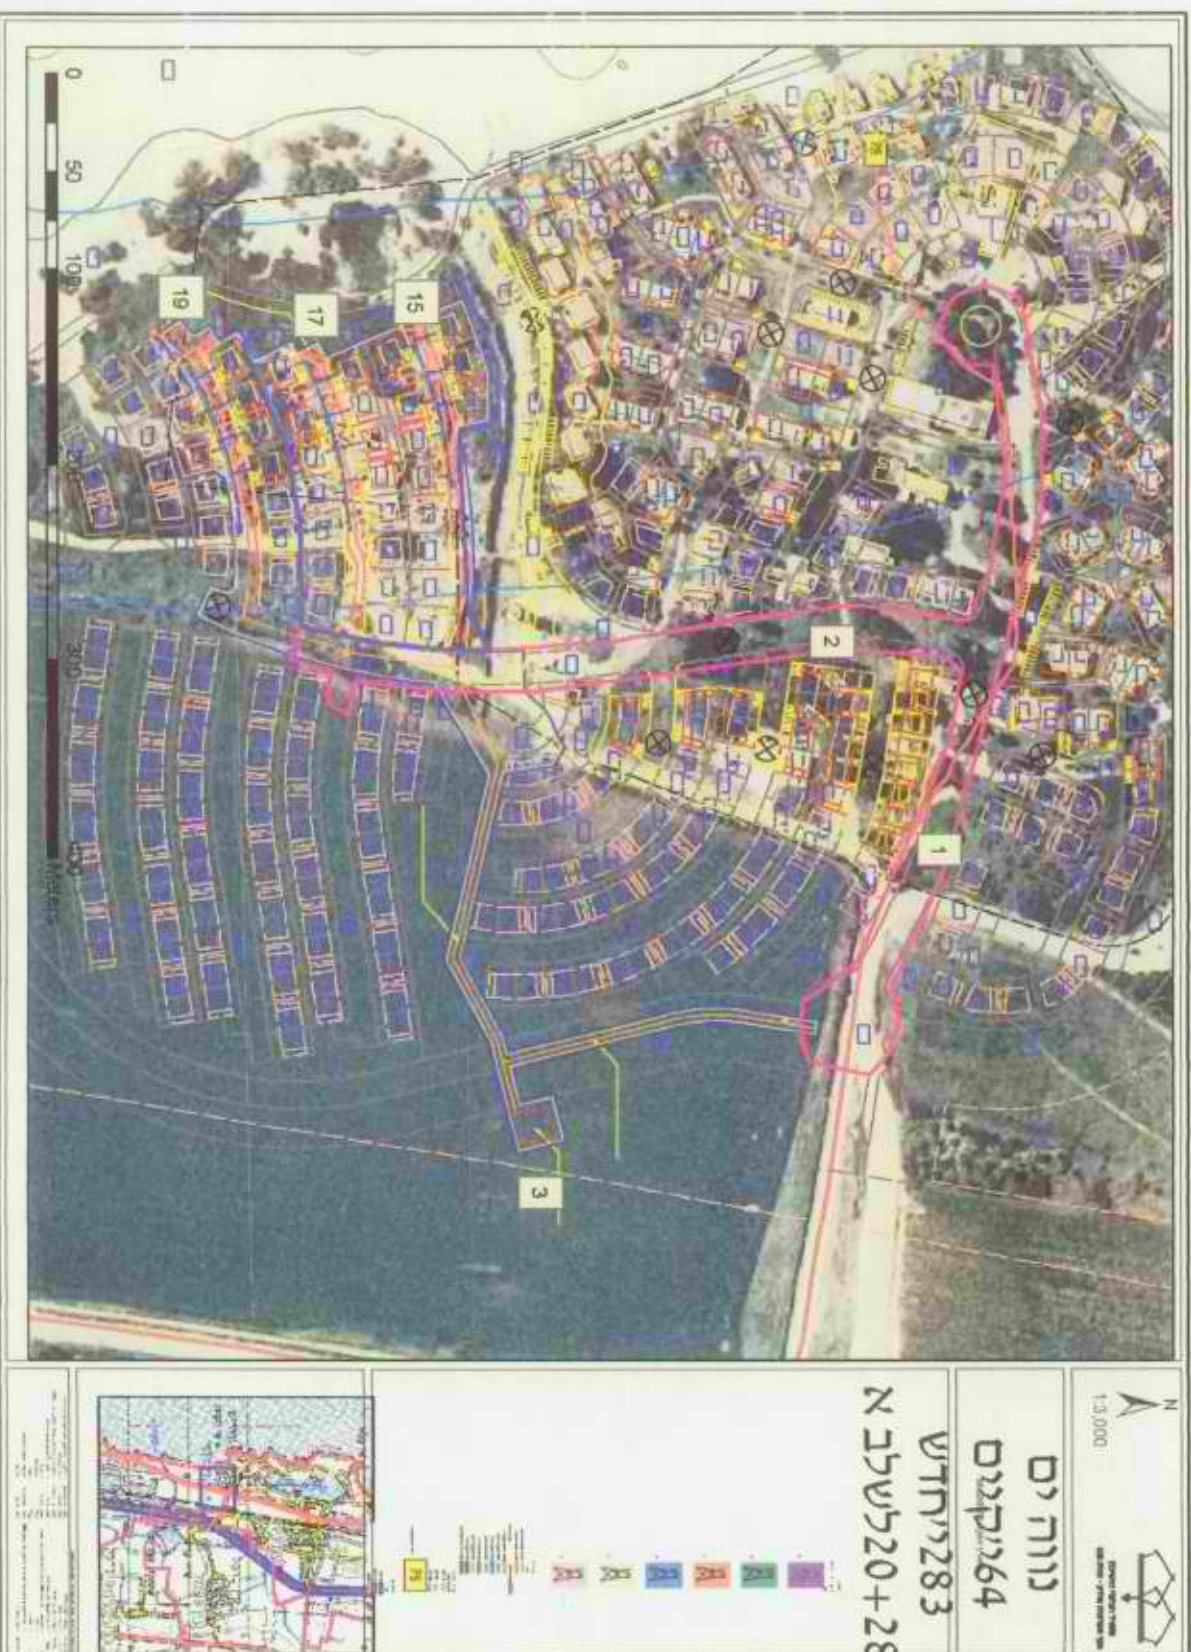



משרד הביטחון והשיון
אגף בכיר לענייני הכפר

נווה ים לוחות זמנים לפרוייקט - טבלה מסכמת

לוח לביצוע					פירוט	נושא
2014	2013	2012	2011	2010	העבודה	
				בוצע	תכנון תב"ע	תכנון
			8/11		תכנון מפורט	
					לביצוע-גמר	
			11/11		מכרז פיתוח	פיתוח
					שלב א'	
		12/12			גמר עבודות	
					שלב א'	
	2/13				מכרז פיתוח	
					שלב ב'	
5/14					גמר עבודות	
					פיתוח	



משדד הביטוח והשיכון
אגף בכיר לענייני הכפר



בוסתן הגליל

לוחות זמנים לגמר הפרוייקט - טבלה מסכמת

פרוייקט בביצוע מוא"ז

לוא"ז לביצוע			פירוט העבודה	נושא
2012	2011	2010		
			בוצע	פיתוח של א' + גמר פיתוח לוח"ד שגבנו
8/11			מותנה בבניית 80% מוח"ד פרסום מכרז מוא"ז	השלמות פיתוח
			מועדון - 1,500	מבני ציבור



שומריה - לוחות זמנים להשלמת הישוב

[illegible]

