

מדינת ישראל

משרד המשלה

מס' 13

משרד

מס' 13

14 בתים - פיתחת רפיח

מס' 39/43929/73

מס' 667,800 ; מס' 1000 ; מס' 1000

2/1973 - 5/1973

תיק מס'

מחלקה

7471/2-85



14 בתים - פיתחת רפיח

גל - 7471 / 2

1393327
27/08/2013

מס פריט:

109.18/1 - 855

02-106-01-07-05

מזהה פיוז
מזהה לוגי
כתובת

שם הישוב ביתחם ופ"ח סוג חשבנה 14 דמיים איוניים
 מס' החוזה 39/43929/72 הקבלן אסולת
 הסכום 800700 -

תאריך התחלת העבודה: 2772 תאריך גמר העבודה: _____

שינויים - הגדלה _____

הקטנה _____

תנועת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האישור	מסב העבודה		העבודה
		מסב העבודה %	מכוס	
8	30/72		733.812-	

הערות:

3098/

מדינת-ישראל

משרד השכון-האגף לבניה כפרית

2.2.73

באר-שבע.....

טנג' 2629/

מס' עב'.....

לכבוד

מב"א אשדוד

רח' צירלסון 4

תל-אביב

אדון נכבד,

הנדון: השלום עבור בדיקת חוזרות.

המקום פיתחת רמיה החוזה 39/43929/72 המבנה יה' דיוור

חומר לבדיקה קוביות בטון

היות והבדיקה לא עמדה בדרישות התקן לפי העודת מכון התקנים מס' ב"ש/57253

מיום 12.1.73 הננו להודיעכם שבחשבונית הסופית למבנה הנ"ל נחייב אוזחכם

בסכום 27.50 לטי השכון מכון התקנים מס' 166363 - 12.1.73

~~בכבוד רב~~

~~י. הוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב~~

הערות:

מר גלויברמן - ת"א

מר אלואיל - ת"א

מר בלף - ת"א

מהנדס איזור - הערבה וטיני

מר אורבך - ת"א

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS

STATE OF TEXAS
COUNTY OF _____
NO. _____

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of the State of Texas, this _____ day of _____, 19____.

Attorney General

WITNESSED my hand and the seal of the State of Texas, this _____ day of _____, 19____.

Notary Public

NOTARY PUBLIC
My Comm. Expires _____

זכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



נציבות מס הכנסה
 מס' מניבוי
 מס מסלומים
 בעד שירותים
 מס' 4502827

מעבדות בסניף סת"י-באר-שבע

האוצר
 מס חסי שולם
 מס' האשור 114/9

חשבון מס' № 166363

לכבוד

תאריך 12-01-1973

אגף לכבייה כפרית,
 משרד הסכר,
 באר שבע.

חזמנה מס' מיום

שם המזמין

הקבלון: אסטרום
 חוזה מס'

אב'	פרטים	תעודה	
		מיום	מס'
ליי		12-01-1973	57253/בא
143.10	<p>עבור בדיקת 27 קוביות בסרו, סכנורות בפיתחת דפיה לפי סעיף 1050/4 . . . 10 . . . 143</p> <p>(סאת ארבעים ושש ל" + 1 אב')</p>		
143.10	סך הכל		
ס' ל' ח'	<p>בעת החשלוס נא לציין את מספר החשבון</p>	שולם ע"ה סך ליי	תאריך קבלה מס'
		יתרה לתשלום ליי	

לשמוש משרדי

לזכות

לחובת

1 5 2 0 0 2

[Empty box for account details]

3098

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

18.1.73

מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 1315
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

Handwritten notes and calculations in the top right corner, including numbers like 2315, 1-1-73, 16, and 30/10/73.

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א- במ/57253

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון, באר שבע.
בנין : עבודות בפיתחת רפיה.
החומר לבדיקה : 27 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו ע"י מר משה ביום 11-01-1973 המספק:
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

39/43929/72

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר
				כדור (אינץ')					
	155	11.1.73	27.12.72		ב' 200	קורות יסוד	1 מרכז גוש		2
	138	"	"						
	200	"	28.12.72			קורות יסוד	3 מרכז גוש		5
	221	"	"						6
	130	"	1.1.73			קורות יסוד	1		9
	270	"	2.1.73			קורות יסוד	7		12
	231	"	"						13
	203	"	4.1.73		ב' 300	גג	16		16
	251	"	"						17
	184	"	"						18
	160	"	"						19
	199	מסרצע							
	189	12.1.73	5.1.73			גג	4		24
	225	"	"						25

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל-ת"א.
מר גלוברמן-ת"א.
חב' אשטרום-ת"א.
באר שבע 12-01-1973

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

223 - 3095

משרד השיכון
 האגף לבניה כפרית
 תל אביב 413151
 תל אביב 38367
 תל אביב 4841
 7.74
 8
 מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א-בש/67226

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון, באר שבע.
 בנין : בתי מגורים בפיתחת רפיה.
 החומר לבדיקה : 6 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י ב"כ המזמין ובמסדר ביום 27-06-1974
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: המסקח: הקבלן: אסטרום

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (קיב' לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				סיווי (אינץ') קונטס (ס"מ)					
	397	30.6.74	16.6.74		ב ²⁰⁰	רצפה	100		1
	396	"	"						2
	423	"	"						3
	405	ממוצע							

שלמה טרובל
 מנהל סניף באר שבע

העמק: מר גלורמן-ת"א.
 מר אלואיל-ת"א.
 חב' אסטרום.
 באר שבע 07-01 1974
 אר/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.
 חב/173568

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 2534, 4841



בעת החשלוט נא לציין
 את מספר החשבון

13568

חשבון מס'

העתק

לכבוד

האריך 1974-07-01

הזמנה מס' מיום

שם המזמין

המכלון אסטרוט
 תווה מס'

אגף לכנייה כפרית,
 משרד התכנון,
 באר-שבע.

ל"י	אג'	ס ר ט י מ	ת ל ו ד ה	
			מס'	מיום
			67226/בש	1974-07-01
		עבור בדיקת 6 קוביות בסדן מבחי סגורים במיחנה רפיה 2 לפי סעיף 1050/4		
	438.80			
		(ארבעים ותשלי ל"י + 80 אג')		
	43.80			
		20 02		

נציבות מס הכנסה
 סמך מיכיל
 מס התשלומים
 בעד שירותים
 מס' 45/2837

האוצר
 מס השלם
 מס' האשור 114/9

3095

מכון התקנים הישראלי
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 38367
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 4841, 2534
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534
 13. 6. 74

מכון התקנים הישראלי

Handwritten notes:
 1315
 מ. א. ד. - 10.05.74
 מ. א. ד. - 10.05.74
 מ. א. ד. - 10.05.74

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- 66293/בט

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע. כיום:
 בנין : מבנים בפיתחת רפיה. אסמכתא/תיק עזריה מס':
 החומר לבדיקה : 17 קוביות בטון. הקבלן: אשטרם
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו ביום: 1974-05-13. המספק:
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: נחותים.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה (כזר (אינץ') קוטם (ס"מ))	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הכנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
	312	14.5.74	2.5.74		200/ב	קורות	84		1
	312	"	"				85		2
	300	"	"				86		3
	308	ממוצע							
	338	30.5.74	"			"	84		4
	390	"	"				85		5
	390	"	"				86		6
	373	ממוצע							
	260	14.5.74	7.5.74			"	81		7
	240	"	"						8
	235	"	"						9
	245	ממוצע							
	378	4.6.74	"			"	"		10
	367	"	"						11
	314	"	"						12
	353	ממוצע							

2. / .

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

1. The first part of the document is a header section containing the title and the name of the organization.

2. The second part of the document is a section header, likely indicating the type of report or document.

3. The third part of the document is another section header, possibly detailing the scope or purpose of the report.

4. The fourth part of the document is a small text element, possibly a date or a reference number.

5. The fifth part of the document is a line of text, likely a paragraph or a section of the report.

6. The sixth part of the document is another line of text, continuing the report's content.

7. The seventh part of the document is a line of text, possibly a sub-section or a specific finding.

8. The eighth part of the document is a line of text, likely a paragraph or a section of the report.

9. The ninth part of the document is a line of text, possibly a conclusion or a summary statement.

10. The tenth part of the document is a section header, likely indicating the start of a new section or table.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	84	99999	2000	14.2.14	14.2.14	315					
2	85			"	"	315					
3	86			"	"	300					
4	87	"		"	30.2.14	328					
5	88			"	"	320					
6	89			"	"	320					
7	90			"	14.2.14	345					
8	91	"		"	"	340					
9	92			"	"	335					
10	93			"	14.2.14	345					
11	94			"	"	318					
12	95			"	"	301					
13	96			"	"	314					
14	97			"	"	322					

15. The final part of the document is a small text element, possibly a signature or a date.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

בש/2/66293
 מס א-

מזמין הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן: אשטרום
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם להקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: נחותים.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדינת מס'
				כדור (אינץ') קנטוס (ס"מ)					
	146 168	15.5.74 "	8.5.74 "		200/ב	קורות	80		13 14
	285 256 216 252	5.6.74 " " סמ"ר	" " "			"	"		15 16 17

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

אחשתיק: מר אלואיל.
 מר גלוברמן.
 חב' אשטרום.
 באר שבע, 06-06-1974
 רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב/171770

3095

מכון התקנים הישראלי

משרד השיכון
 413151 ס"ל 69977, תל-אביב 42, רח' האוניברסיטה
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, ס"ל 28367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, ס"ל 2434, 4841
 תמונת 23. 5. 74
 מחזור הנגב

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א- בש/66293

מוזמן הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון - באר שבע. ביום:
 בנין : מבנים בפיתחת רפצח. אסמכתא/תיק עזריה מס':
 החומר לבדיקה : 17 קוביות בטון. הקבלן: אשסרום
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המז מין ובמסרו ביום: 13.5.74 המפקח:
 מהות הבדיקה: חזוק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה: בחותמים

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	סקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס'
				סדור (אינץ') קונוס (ס"מ)					
	312	14.5.74	2.5.74		200'	קורות	84		1
	312	"	"				85		2
	300	"	"				86		3
	308	ממוצע							
	260	"	7.5.74			"	81		7
	240	"	"						8
	235	"	"						9
	245	ממוצע							
	146	15.5.74	8.5.74			"	80		13
	168	"	"						14

שלמה סוכרל
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.
 מר גלוברסון ת"א.
 חב' אשסרום
 באר שבע 16-05-1974
 שב/

חב/171770

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

... ..
... ..
... ..
... ..

1	193
2
3
4
5

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



נציבות מס הכנסה
 מס' סניף 4302827
 מס' תשלומים
 נדר' שירותים
 מס' האוצר
 מס' חש' שולם
 מס' האשור 114/א

העתק

חשבון מס' 141740

לכבוד

תאריך: 1974-05-16
 הזמנה מס' מיום
 שם המזמין
 תווה מס'

אגף לנבניה כפרית
 משרד הסכרן
 באר שבע

ל"י	אג'י	פ ר ט י מ	ת צ ו ד ה	
			מס'	מיום
			66293/בט	1974-05-16
124.10		עבור בדיקת 17 קוביות בסרן מסבנים במיתחת רפיה לטי עיף 1050 . . .		
		(מאה עשרים וארבע נ"ו + 10 אכ')		
1048.40		סך הכל		
בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון			שולם ע"ח סך	ל"י
			תאריך	קבלה מס'

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
הקרית, תל-אביב

תאריך:

מס': 39/43929/72/396

3095
משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
15. 5. 74
מחוז הנגב
39/43929/72

אל: נזכרות משרד השיכון
מאת: האגף לבנייה כפרית

הנדון:

השבון סופי של חוזה מס' 39/43929/72

העבודה: 14 יח"ד

המקום: מדות ב' (פיתחת רטיח ב')

812,700.24

ל"י

רצ"ב הרינו מעבירים ח-ן סופי של החוזה הנדון, בסך הסכום לתשלום הוא 286,424 ל"י לאחר ביכוי של 0,2% ע"ח בדיקות ו-3% ע"ח קרן במרח

נא לתקנון/להגדיל את החוזה שהיקפו עתה - 789,840 ל"י

בסך 22,860.24 ל"י

סה"כ 812,700.24 ל"י

החשבון כולל: -

התיקויות - 70,212 ל"י

• הודעה ע"ח בדיקות - 1,954.24 ל"י

• הודעה ע"ח קרן במרח - 24,322 ל"י

א. גלויכרמן
מנהל האגף לבנייה כפרית

גלויברמן

העתקים: מר ג. אביבי
מר י. רבינוביץ/מר י. מרגלית

מהנדס מחוז - הנגב

קבלן - אטרום בע"מ, דח' צירלסון 4, תל-אביב
אגף חוזים ובטחונות -
מחלקה לסטטיסטיקה -

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

רשימת כמויות ומחירים
השכרן סופי

חשוב
והערבה ע"י
נכדק ע"י

העבודה: שדה ב' (פיתוח רשימה ב') 14 יח"ד

מספר
המרכז/החוזת
39/43929/72

סכום 600

מספר
ההזמנה

9.4.74

תאריך

ס ה כ		ה ס כ ו ס		מחיר יחידה בל"י	כמות	יחידת המדה	ס ו ג ה ע ב ו ד ה	ס ו ג	מ.ס. ט.ד.
ל"י	א"י	ל"י	א"י						
							שדה ב' (פיתוח רשימה ב') - 14 יחיד סכום 600		
							סך רכרו		
		739,329.84					52,209.16		
		739,436.04					52,816.86		
		758,479.55					54,177.12	1.	סכום 600 - 14 יח"ד א
		3160.-						2.	עבודה שנותרה לכל המכונים
		5,592.-							
		768,071.55							
		772,576.07							
		743,489.34						3.	המיקודים
		87,733.-							
		70,212.-							
		869,776.68							
		872,760.26						4.	חודש דמי בדיקה 0.2%
		1,719.53		1,627.64				5.	הוצאות א"ב כנגד או רכ"ב (9 ל"ב)
		(-)		328.6					
		1,916.24							
		868,055.-							
		810,796.-							
		24,322.-							
		786,474.-					27,474		

להעברה / ס"ה

רוטיאונטי

החברה

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

רשימת כמויות ומחירים
השבוע סופי

העבודה: שדרה ב' (פיתוח רשימה ב') 14 יחיד

מספר ההזמנה: 686 מספר המרכז / החוזה: 59/43929/72

ס.ס.	ט.ט.	סוג	טווח העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בל"י	הסכום		סה"כ
							אג' לי	אג' לי	
							48,051.-		
1.			שדרה ב' (פיתוח רשימה ב') - 14 יח"ד						
							686 טקסט		
							(מיטוב לבית אחד)		
			מחיר לבית 686 טקסט חוזה (פרד פרץ 1973)						
2.			חודשה יסודות למדידה לפי החוזה			2130.-			
							1630.- א 1.10% א 1.15%		
3.			חודשה חומפת ליסודות לפי החוזה			712.-			
							1.10% א 547.35		
4.			חודשה חומפת לבנין היעוני לפי החוזה						
							1.10% א 531.40		
							45,209.-		
							44,209.-		
							712.-		
							679.75		
							39.-		
							17.25		
1.			הסידה למלטה יסוד - וקר לעומק 1,5 מ' ס"מ	30					
2.			הסידה למלטה יסוד ער עומק 2,0 מ' ס"מ	30					
3.			כניל אך לקורות יסוד	30					
4.			יציקה כסדרן רוח	30					
5.			יציקה מלטה יסוד	30					
6.			יציקה קבורי יסוד	30					
7.			ברזל עגול	טון					
8.			ברזל זימן סדומל	טון					
							514.90		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		
							0.016		
							29.20		
							1,900.-		
							0.271		
							29.20		
							1830.-		

דף - 4 -
אקססוריאט

רשימת כמויות ומחירים
המבין סופי

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

חשוב
והערכה ע"י
נבדק ע"י

העבודה: שדה ב' (סיימת רשימה ב') 14 יחיד

מספר
המרכז / החוזה
39/43929/72

מספר
ההזמנה
686

תאריך

ס.ס. ט.	סוג	טווח העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בלי	ח.ס.כ.ו.ס.		ס.ה.כ.	ס.ה.ל.
						אג' ל"י	אג' ל"י		
		<u>המשך גמר שדה ומסגרות</u>							
5.		סכוברים גומי לילוח, מדוברים לרשת (יומן 157701)	מ"ר	7	5.-	35.-			
6.		ספילת אלומיניום כולל פסי גומי כולוח חוץ נגד היצירה חול (יומן 30649)	קמ"ר	1	15.50	15.50	15.50		
7.		נבוכים לכניסולים בילוח חוץ (יומן 132706)	מ"ר	2	17.-	34.-			
8.		חוטפת גומי כולה שרזים כולל זכוכיה	מ"ר	2	55.-	70.-			
9.		סוגי מים לחלונות 80/80 (סוג ל"פ)	מ"ר	1	4.-	4.-			
10.		סככה למרזל לחלון סככה כפולה 80/80 מ"מ. לפי דרישת סמ"ט (יומן 139708)	מ"ר	1	70.-	70.-			
11.		רשת מלומיניום לחלון סככה כפול	מ"ר	1	30.-	30.-	30.-		
						666.-			696.50

להעברה / ס"ח

רשימת כסויות ומחירים
משנת 1966

5 99

העבודה:	שירות ב" (פחתה רשימה ב" 14 יח"ד
תאריך:	מספר החזמנה
מספר המרכז/החזרה	

ס.ס. סד.	סוג	העבודה			יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בליי		ס.ה.כ. אג'י	ס.ה.כ. אג'י
		מחיר	כמות	מחיר			כמות			
		<u>4. ה.ס.ל</u>								
		1.	נקודת למורה חוץ נוספת (2-3)	נק	1	60.-	60.-			
		2.	הקנתה פגול למורה המיקרה (4-5)	יח"	1	8.-	8.-			
		3.	נקודת לטלפון	נק	1	42.-	42.-			
		4.	הכנת נקודת לידור סמל כולל בנדרים סמל	נק	1	32.-	32.-			
		5.	הכנת נקודת לידור סמל	נק	1	32.-	32.-			
		6.	קמרון כולל לחנן ופרינסטורטור	נק	1	25.-	25.-			
		7.	הכנת חיבור סמל מקונטולה וקר לוח כולל גנור סמל	קופס	1	50.-	50.-			
		8.	לוח פרינסטורטור בקופס לוח קר	יח"	1	12.-	12.-			
		9.	הכנת חקלה בחלונות בסמל בין לוח פכטיהים וארון סמל	קופס	1	35.-	35.-			
		10.	פיקוני טיה למפר הכנת גנור סמל	קופס	1	15.-	15.-			
						229.-	311.-			

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

רשימת כמויות ומחירים
הצבון סופי

77

העבודה: שד"ר ב' (מתחם רמיה ב' 14 יח"ד)

תאריך: מספר ההזמנה: מספר החוזה/החזרה: 656

מס' סד.	סוג העבודה	המדה	כמות	מחיר יחידה בלי	הסכום		סה"כ
					ליי	אג'י	
13	מגוף לחלפת בזרים סטיבה	יח	1	77.-	77.-		
14	חוטמת מחיר לבזר רקב יצוק במקום, במקום פאלמנטיס טרוכמיים, לפי החוזה	קומה	1	125.-	125.-		
15	חיבור סיס למכונת כביסה (סיס ודלוחין)	"	1	75.- 89.10	75.- 89.10		
16	סוללות לקטרום סגורה ורחבה (יומן 30832)	יח	2	50.-	100.-		
17	גנור מגולבן 3/8" כולל בנק וריזמות למליה וילון	"	1	22.-	22.-		929.72 1,923.31
<u>6. מצא מידור ושונות</u>							
1	חוטמת מחיר חיזוקיים (לפי אישור סמ"ס) (240-367) לביה סיכום 794	קומה	1	110.-	110.-		
				$\frac{127 \times 756}{794} = 120.92$			
2	חוטמת המיקרום לריחוח ברזל פאלמנטיס	סוף	1.43	60.-	85.80		
3	חוטמת כמות ברזל לריחוח בקירות	ק"מ	3.5 1.42	1.42	49.70		
4	הגדלת אלמנט בטון בבנייתם ל-20 ס"מ במקום 12 ס"מ לטח חתקה ארון הטל בקיר במקום בניה קיר פבלוקים (3.95 מ"מ)	קומה	1	130.-	130.-		
5	חוטמת ליציקה קורות יסוד בטון ב-200 במקום ב-150, לפי המפרט	מ"מ	4.00	5.-	20.-		
6	חוטמת למחיר קירות חוץ קקב הגליל מחירי יסוד לאגרום 52,50 מ"מ/מ"מ במקום 30.-	מ"מ	20	0.76	15.20		
				81.85	62.31	457.71	

להעברה / סוף

רשימת כמויות ומחירים

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

מבצע סופי

העבודה: שרוב ב" (מחמת רטיה ב" 14 יח"ר

חשוב
והערבה ע"י
נבדק
ע"י

מספר
המרכז / החוזה

סיפור 686

מספר
ההזמנה

תאריך

ס.ה.כ. ל"י	א.ג. ל"י	ה.ס.כ.ו.ס. ל"י		מחיר יחידה בלי	כמות	יחידת המדה	סוג העבודה	סוג	מ.ס. סד.
		א.ג.	ל"י						
							נוספת למחיר לפי חוזה		
		53.65					202.97		
		62.85					(211.97-126.44-22.88)		
		246.00					666		
		273.50					(693.50 - 330)		
		219.00							
		311							
		979.32							
		1,824.71					(1923.81-89.10)		
		457.71							
		2062.81	1966.08						
		3,189.12	3,038.97				x 104.92% = 1.10% + 1.158% + 1.5681%		
		52,816.86							
		54,178.12					מ"כ מחיר לבית 686		
		<u>52,809.16</u>							

להעברה / ס"ה

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צידלסון 4
טלפון: 443181

רשימת כמויות ומחירים
המכון סומ"י

9	חשוב והערכת ע"י	נבדק ע"י	העבודה: סיום ב" (ממת רפיה ב" 14 יח"ד
מספר המרכז / החוזה	מספר ההזמנה	מספר המרכז / החוזה	תאריך

39/4329/72	מספר ההזמנה	מספר המרכז / החוזה	תאריך
------------	----------------	-----------------------	-------

ס.ס. סד.	סוג	סוג העבודה		יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בליי	הסכום		ס.ה.כ. ליי	ס.ה.א. ליי
		ליי	אג'							
סוגות לכל החמים										
1.		<p>כוננת לקב המכנה קנודיה במסר במודיעים יולי-דצמבר 1972 סטיגוס במחזוריות (ממת סמ"ט 6.8.72) פרוט חובאות לפי המחזור 11.2.73</p> <p>רמת פרוט לג"ל בחוזה 39/43212/71 קנוד 2 יח"ד נוספות קנוד 30 יח"ד שולם בחוזה סג"ל</p>								
		<p>א. שמירת משמח ב. חובתה סיווד ומודיעים ג. ברזל סקובר סמ"ט</p>								
		<p>א. בחלה קנודים 2 אג' 48 י"ט 30 3.2 י"ט</p>								
		<p>1. גילוי יסודות טכוסים במיל לאמר 5 חודשים יחוד 2</p>								
		<p>2. <u>יוסן 139708</u> (קנוד 30 יח"ד חוזה 39/43212/71) מבנה סגירול לחלון סמכה במדום 80/50 ס"מ לפי דרישת המ"ט</p>								
		<p>3. רשת אלומיניום נגד זכובים לחלון סמכה 80/50</p>								
		2,100.-	70.-	30	מח					
		900.-	30							
		<u>3,100.-</u>	<u>38.-</u>	30	מח					
		3,160.-								
		<u>3,592.-</u>								
		<p>סמ"ט סוגות (מקברה לרוך יכוד)</p>								
		<p>הוכנה זמין כקבלה מה מ"ט המ"ט - 286 - 26/3/73 42 - 25/2/73 1542/9 ס"מ לאויסני כ"כ נע"מ</p>								

להעברה / ס"ה

No.	Description	Quantity	Value
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2000
1000

23.4.74

טנג/3153

הנידון - חשבונות סופיים עבודה אשטרום			
חודים	45-39/44787/T2	10 במים	כפר מימון
	45-39/44515/T2	20 במים	גיר עקיבא
	45-39/44786/T2	29 במים	גיר טסה
	45-39/43929/T2	14 במים	פתח רטיח ב'
	45-39/44331/T2	15 במים	מרכז גוסי פתח רטיח
	45-39/44785/T2	24 במים	נמורה
	45-39/44788/T2	12 במים	מרכז מוחר

רמ"ג הננו מעבירים אליך חשבונות של עבודות "אשטרום" למי השרום, לא כולל המייקרויות.

1. 10 במים כפר מימון חוזה 45-39/44787/T2 סכום 493,914.10 י
 התחלה עבודה יולי 1972
 גמר עבודה מרץ 1973
2. 20 במים גיר עקיבא חוזה 45-39/44515/T2 סכום 956,832.25 י
 התחלה עבודה דצמבר 1972
 גמר עבודה ספטמבר 1973
 העקוב בגלל שינוי מיקום ודרכי גישה
3. 29 במים גיר טסה חוזה 45-39/44786/T2 סכום 1,511,486.03 י
 התחלה עבודה 20 במים לפולים אוגוסט 1972
 6 במים נוספים דצמבר 1972 (מס' ביה 27,24,3
 85,84,30)
 2 במים נוספים ינואר 1973 (מס. 23, 89)
 1 ביה מאי 1973 (מס' 92 עקוב בגלל
 חריטת הבית)
 גמר העבודה דצמבר 1973 (עקוב בגלל שנוי מיקום, חטר הספקת
 סיד, דרכי גישה וחוספת 14 חודים
 שהוזמנו ב-3.73)
4. 14 במים מנין (פתח רטיח ב') 39/43929/T2 סכום 742,596.04 י
 התחלה עבודה יוני 1972
 גמר עבודה מאי 1973 (עקוב בגלל דרכי גישה ועבודות
 ביוב נוספות)
5. 15 במים מרכז גוסי פתח רטיח 39/44331/T2 סכום 882,175.35 י
 התחלה עבודה דצמבר 1972
 גמר עבודה יולי 1973

6. 24 במים מרכז נהורה 39/44785/72 סכום 1,053,181.86 ל"י
 התחלת עבודה ינואר 1973 (עקוב בגלל דרכי גישה ושנוי
 גודל בית ל-69 מ² ע"י המועצה)
 גמר עבודה אוקטובר 1973 (עקוב בגלל הפרקוח אנשי המרכז
 שלא נתנו להקים את הבתים קרוב להלקות שלהם
 והיה צורך בשנוי מיקום של 5 מבנים)
7. 12 במים מרכז צוחר 39/44788/72 סכום 612,791.46 ל"י
 התחלת עבודה יוני 1972
 גמר עבודה יוני 1973 (עקוב בגלל סימון, ויטורי אשא,
 דרכים וכיוצא בזה מרכזי שונה)

ה ע ר ו ת

1. גיר משה 29 יח"ד החוזה נחתם על הקמת 34 בתים החשבון מסתכם על הקמת
 29 בתים, היות וטרם התחילו בהקמת 5 הבתים הנוספים, הוחלט להקטין את
 החוזה הקיים ולהוציא חוזה חדש ל-5 בתים האחרונים.
2. נהורה 24 יח"ד החוזה נחתם על הקמת 32 בתים החשבון מסתכם על הקמת 24
 בתים לקליטה. 8 בתים טרם התחילו בהקמתם עקב הפרי מקום. **כך** שיש להקטין
 את החוזה הנ"ל ולהוציא חוזה חדש על הקמת 7 בתים (2 לפי סכום 79 מ² ×
 5 סכום 64 מ²) הבית השמיני לא יבנה.

יש לציין שבמסמכים של החוזים הנ"ל ישנם מספר דברים שדורשים הבהרה.
 החוזים הנ"ל מבוססים על חוזה 39/43212/71 בחוסמת המייקרויות,
 כשהחוזה 39/43212/71 גם הוא מבוסס על חוזים קודמים בחוסמת המייקרויות.
 בהתאם לנ"ל נכללו בחשבונות הסופיים משלומים לעבודות שלא היו כלולים
 במסמכים של החוזים הקודמים עליהם מבוססים החוזים האלה, למרות שבמסמכים
 של החוזים האחרים הנ"ל עבודות אלה נכללו.

להלן פרט העבודות

- א. יסודות במפרט צוין שהיסודות הם כלונסאות 40x40 עומק 70 מ"מ
 שלפיהם בוצע העבודה. בחשבון הסופי נזכר טפחיראכחם
 ערך היסודות שהיו כלולים לפי מחירי החוזים הקודמים
 בחוסמת המייקרויות לחוזה שבניה. והיסודות הושבו
 לפי הבצור במחירי היסוד של החוזה החדש.
- ב. מדרגות ומקקה - המפרט החדש כולל 2 מחלבי מדרגות של 4 שלבים, ומקקה
 מצד אחד. בחשבון הסופי החשוב הוא לפי חוזים קודמים
 עליהם מבוסס החוזה החדש והם כוללים רק 3 מדרגות
 ללא מקקה.

ג. לוחות לדלת בחדר סגורים המפרט החדש כולל 4 לוחות לדלת הנ"ל. בחשבון הסופי החשוב הוא לפי מפרטים בחוזים הקודמים עליהם מבוסס החוזה החדש והכולל פק 2 לוחות.

ד. סוללות לקערות רחצה ומטבח וצנור לוילון במקלחת - המפרט החדש כולל סוללות למים חמים וקרים וצנור לוילון במקלחת. בחשבון הסופי החשוב הוא למפרטים הקודמים עליהם מבוסס החוזה החדש ובהם לא נכללו הסוללות והצנור לוילון.

אני תקווה כי בחוזים הבאים, המפרטים יעודכנו בהתאם לבצוע ויכללו את כל הסעיפים הנ"ל, שלא נכללו במחיר החוזים הקודמים, וכן עבודות הנוספות המבוצעות ולא נכללו במפרטים הקיימים.

על מנה לעדכן אתה ולתמיד את המפרטים יש לבצע את הדבר כשחוף עם אנשי המחוז, המודעים לבקורות בניה טרוםית ומכירים את החומר.

בכבוד רב,
י. רוטנאנטי

פ.מ. מהנדס מחוז הנגב

התקן:
מר א. גלויברטן
מר י. מרגלית
מר ג. צור
מהנדס אזור ב"ש
מהנדס אזור לכיש
מהנדס ערבה וסיני
חברת "אשרום"
מר א. סלע
מר ש. אורבך
תיק 3091
תיק 3223
תיק 3095 ✓
תיק 3094
תיק 3093
תיק 3092

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

The second part of the report deals with the results of the work done during the year and the progress of the various projects.

The third part of the report deals with the financial situation of the organization and the results of the various projects.

The fourth part of the report deals with the conclusions of the work done during the year and the progress of the various projects.




Fig. 1. Diagram of the mechanism.

The following table shows the results of the work done during the year and the progress of the various projects.

Project	Progress
Project A	Completed
Project B	In progress
Project C	Not started
Project D	Completed
Project E	In progress
Project F	Not started
Project G	Completed
Project H	In progress
Project I	Not started
Project J	Completed
Project K	In progress
Project L	Not started
Project M	Completed
Project N	In progress
Project O	Not started
Project P	Completed
Project Q	In progress
Project R	Not started
Project S	Completed
Project T	In progress
Project U	Not started
Project V	Completed
Project W	In progress
Project X	Not started
Project Y	Completed
Project Z	In progress

שטרומ
חברה להנדסה בע"מ



ASHTROM
ENGINEERING CO. LTD.

Date: 9.4.1974 תאריך:
Our Ref.: 568/74 מספרנו:

לידי מר י. רוטלאנסקי

לכבוד
משרד השכון
אגף לבניה כפרית - מחוז הנגב
בנין מרכז הנגב
ב א ר - ש ב ע

א.נ.א

הנדון: - שורה ב' (פיתחת רפיה ב') 14 יח"ד
חשבון סופי - חוזה מס' 39/43929/72

רצוף בזה חשבון סופי לעבודה הנ"ל ע"ס - 858,055 ל"י.
נודה לכם על בדיקת החשבון ואשורו.

בכבוד רב
elid

"אשטרומ" חברה להנדסה בע"מ

העמק : מר ש. אורכך רח' טגור 41 רמת-אביב.
לוטה : 5 העמקי ה-ן סופי והישובי כפויזה.



DATE: 10/10/20
PAGE: 1

PROBLEM 1
A beam of length L is supported at both ends. A uniformly distributed load of intensity w is applied over the entire length of the beam. Determine the reaction at the left support.

10/10/20

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_L - wL = 0 \Rightarrow R_L = wL$$

The reaction at the left support is wL .

PROBLEM 2

A beam of length L is supported at both ends. A point load of magnitude P is applied at a distance a from the left end. Determine the reaction at the right support.

PROBLEM 3
A beam of length L is supported at both ends. A point load of magnitude P is applied at a distance a from the left end. Determine the reaction at the left support.

א-122

- 1 -	רשימת כמויות ומחירים חסכון סופי	"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ תל-אביב, רחוב צירלסון 4 טלפון: 443181
-------	---	---

חשבוש והערכה ע"י	העבודה: שדות ב' (פיתוח רפיה ב') 14 יח"ר
---------------------	---

מספר המרכז / החוזה	מספר ההזמנה	תאריך	
39/43929/72	686	9.4.74	

ס.ה.כ. ליי	הסכום		מחיר יחידה בליי	כמות	יחידת המדה	סוג העבודה	סוג	סט. ס.
	ליי	אג'י						
						שדות ב' (פיתוח רפיה ב') - 14 יח"ר ספוס 686		
						דף רכוש		
		739436.04				52816.86		
		740904.92				52921.78		
		758,479.68				54,177.12 x 14 יח"ר	.1	
		3160.-					.2	
		3400.-				עבודות שונות לכל המבנים		
		3,592.-						
		762,071.68					.3	
		744064.92				החיקרויות		
		742376.04						
		-97,703.-						
		-859,774.68						
(-)		1,719.68				הורדה דפי בדיקה 0.2%	.4	
			328.68			נכנסו ספוס בצורה זו ונכנסו ספוס 9	.5	
		-858,055.-			סה"כ			
						93,424		

י. דוסיאני

להעברה / סיה

דף - 4 -
אגאאאאאאאאאא

רשימת כמויות ומחירים
חשבון סופי

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

חשוב
והערך ע"י

העבודה: **שדות ב' (פיתוח רפיה ב') 14 יח"ד**

מספר
המרכז / החוזה

מספר
ההזמנה

תאריך

ס.ה.כ. ליי	אג'.	ה ס כ ו ם		מחיר יחידה בליי	כמות	יחידת המדה	ס ו ג ה ע ב ו ד ה	סוג	ס.ס. סד.	
		ליי	אג'.							
המשך נגרות ומסגרות										
							סטופרים גומי לדלתות, סוברגים			
		35.-		5.-	7	יח'	(יומן 137701)			
							פסילה אלומיניום כולל פסי גומי			
		15 53 81.-		15.50	2	ק"מ	בדלתות חוץ נגד חדירה חול (יומן 30849)			
							גבובים למנעולים בדלתות חוץ			
		34.-		17.-	2	יח'	(יומן 132708)			
							חוספת צוקר בדלת שרוחים כולל			
		70.-		35.-	2	יח'				
							מחזיק חריץ לחלונות 50/50 (מבצ' לק)			
		4.-		4.-	1	יח'				
							סבכה לברזל לחלון מטבח במדורת			
		70.-		70.-	1	יח'	80/50 ס"מ, לפי דרישה משה"ש (יומן 139708)			
		666 - 678 - 898.50		30 38.-	1	יח'	רשת אלומיניום לחלון מטבח כג"ל			

לחברה / ס"ה

רשימת כמויות ומחירים
 חשבון טומי

דף 5

חשוב
 והערבה ע"י
 נכדק ע"י

העבודה: שדות ב' (פחת רפיה ב') 14 יח"ד

מספר
 המרכז / החוזה

מספר
 ההזמנה

תאריך

מ.ס. ט.	סוג	סוג העבודה			יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בליי	הסכום	
		אג'	ליי	אג'				ליי	
<u>4. חשמל</u>									
1.	נקודה לתאורה חוץ גוממה (3-2)			נק	1	60.-	60.-		
2.	התקנת פגול לתאורה התיקרה (5-4)			יח"	1	8.-	8.-		
3.	נקודה לטלפון			נק	1	42.-	42.-		
4.	הכנת נקודה לדוד שש כולל צנורות חשמל			נק	1	32.-	32.-		
5.	הכנת נקודה לדוד חשמל			נק	1	32.-	32.-		
6.	פעמון כולל לחצן וטרנספורמטור			נק	1	25.-	25.-		
7.	הכנת חיבור חשמל מחקונסולה ועד ללוח כולל צנור חשמל			קומט	1	50.-	50.-		
8.	לוח פרמינקס במקום לוח עץ			יח	1	12.-	12.-		
9.	הצבת מעלה באלמנט בטון בין לוח מבטיחים וארון חשמל			קומט	1	35.-	35.-		
10.	היקונים טיה לאתר הכנסת צנור חשמל			קומט	1	15.-	15.-		
								229.-	311.-

להעברה / סיה

רשימת כמויות ומחירים

דף 6

תשבון סופי

חשוב
 והערבה ע"י
 נבדק ע"י

שדות ב' (מתחת רפיח ב') 14 יח"ד

העבודה:

מספר
 המרכז/החזות

מספר
 ההזמנה
 סיפוט 686

תאריך

ס"ט	סוג	סוג העבודה		יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בל"י		ס"ה א"ב	ס"ה א"ג
		א"ג	א"ב						
<u>5. אינטלציה סניטרית וביוב</u>									
1.				קומט	1	30.-	30.-		
יציאה מצנור מבולבן 2" למי דלוחין נוסף (למי מכתב טה"ש מיום 10.2.73)									
2.				קומט	1.-	35.-	35.-		
הכנה לגז									
3.				"	1.-	35.-	35.-		
הכנה לקערה רחיצה בב"כ כולל אגרה מים									
4.				קומט	1	30.-	30.-		
צנורות מים לדוד שמש מעל הגג, הכנה									
5.				יח"	0.07	139.10	130.-	560	791
הא ביקורת נוסף 50 ובעומק מעל 0.75 מ' ועד 1.00 מ'									
6.				מ"א	-12.83	38.49	3.-	2400	38.49
הפירה נוספת לקוי ביוב בעומק 1.0-0.75 מ'									
7.				מ"א	15	63.-	6.50	4350	63.-
נוספת מחיר עבור צנורות אטמט 4" במקום מכסון למי מכתב טה"ש 10.2.73									
8.				מ"א	15.66	418.12	26.70	28462	418.12
צנורות אטמט נוספות 4" לקוי ביוב למי מכתב הנ"ל									
9.				יח"	2	50.-	25.-		
נוספת עבור אביזר ד" 4" אטמט במקום מכסון (יומן 139705)									
10.				יח"	1	150.-	50.-	50.-	150.-
צנורות כסון 50 וארך 0.40-0.50 (למי יומן 30839) להגבהה מעל הקרת בור רקב - בורות טסיגה וזא ביקורת									
11.				יח"	2	176.-	38.-	76	176.-
צנורות הגבהה 50 ובגובה 40 מ"מ מעל בורות טסיגה									
12.				מ"א	12.-	456.-	30.-		
קדוח לבור טסיגה נוסף כולל טבעות כסון או קדוח עד לעומק 12 מ' (יומן 30847)									

למעברה / ס"ה

רשימת כמויות ומחירים
 חשבון סופי

797

חשבונית מס' 686
 חשבונית מס' 686
 חשבונית מס' 686

תאריך: 14 יח"ד
 מספר החזמנה: 686
 מספר החזמנה: 686

ס"ט	סוג	העבודה		מחיר יחידה בל"י	כמות	יחידת המדה	חשבונית מס' 686		מחיר יחידה בל"י	ס"ט	סוג
		מחיר יחידה בל"י	כמות				מחיר יחידה בל"י	כמות			
13			מגנף לחלפת בורות סטיגה	75.-	1	יח	75.-	75.-			
14			חוספת מחיר לבור רקב יצוק במקום, במקום מאלמנטים טרומיים, למי החוזה	125.-	1	קומפ	125.-	125.-			
15			חיבור מיט למכונת כביסה (מיט ודלוחין)	89.10	1	"	89.10	89.10			
16			סוללות לקערוח סמכה ורחצה (יומן 30832)	50.-	2	יח	100.-	100.-			
17			צנור מגולבן 3/8" כולל צבע ורוזטות לחליה וילון	22.-	1	"	22.-	22.-			
<u>6. צבע, פידוד ושונות</u>											
1			חוספת מחיר איזוקריט (למי אישור טח"ש) (240-367) לבית סימון 794	120.92	1	קומפ	110.-	110.-			
				$127 \times 756 = 120.92$							
				794							
2			חוספת התיקרוח לרשתות ברזל מאלמנטים	60.-	1.43	טון	85.80	85.80			
3			חוספת כמות ברזל לרשתות בקירות	1.42	3.5	קג	49.70	49.70			
4			הגדלת אלמנט בטון בכניסה ל-20 מ"א במקום 12 מ"א לשם השקעה ארון השמל בקיר במקום בניה קיר כבלוקים (3.95 מ) מאושר ע"י טח"ש	130.-	1	קומפ	130.-	130.-			
5			חוספת ליציקה קורות יסוד בטון ב-200 במקום ב-150, למי המטרס	5.-	4.00	מ3	20.-	20.-			
6			חוספת למחיר קירות חוץ עקב הגדלת מחירי יסוד לאגרנט 52,50 מ/י 30 במקום 30.-	0.76	81.85	מ3	457.71	457.71			
				62.21							
				0.76							
				81.85							

להעברה / ס"ה

[Handwritten signature]

Date	Description	Debit	Credit
	Balance forward		100.00
10/1	100.00	100.00	
10/2	100.00		100.00
10/3	100.00		100.00
10/4	100.00		100.00
10/5	100.00		100.00
10/6	100.00		100.00
10/7	100.00		100.00
10/8	100.00		100.00
10/9	100.00		100.00
10/10	100.00		100.00
10/11	100.00		100.00
10/12	100.00		100.00
10/13	100.00		100.00
10/14	100.00		100.00
10/15	100.00		100.00
10/16	100.00		100.00
10/17	100.00		100.00
10/18	100.00		100.00
10/19	100.00		100.00
10/20	100.00		100.00
10/21	100.00		100.00
10/22	100.00		100.00
10/23	100.00		100.00
10/24	100.00		100.00
10/25	100.00		100.00
10/26	100.00		100.00
10/27	100.00		100.00
10/28	100.00		100.00
10/29	100.00		100.00
10/30	100.00		100.00
10/31	100.00		100.00
	Total	1000.00	1000.00

רשימת כסויות ומחירים

השבון סומי

8

חשוב
והערכה ע"י
נבדק ע"י

העבודה: שדות ב' (מחלקת רפ"ח ב') 14 יח"ד

מספר
המרכז / החוזה

מספר
ההזמנה

תאריך

ס ח * כ		ה ס כ ו ס		מחיר יחידה בל"י	כמות	יחידה המדה	ס ו ג ה ע ב ו ד ה	סוג	סט. ט.
ל"י	א"י	ל"י	א"י						
							הוספת למחיר לפי החוזה	.8	
		53.65					202.95		
		62.65					(211.97-126.44-22.88)	.2	
		276					666		
		374					(693.50 - 320)	.3	
		373.50							
		229							
		311						.4	חשמל
		917.72							
		1,834.71						.5	אינטסלגיה וביוג (1923.81-89.10)
		457.71						.6	צבע ושונות
2062	81								
2167	73	1966	08						
3,182	.12	3,039	.57				x 104.92% = 1.10% + 1.188% + 1.5681%		
52816	86								
52921	78								
<u>54,178</u>	<u>.12</u>						סה"כ מחיר לבית 686		

חשוב התייקרות

תאריך: 9.4.74

הכין: א. גולדברג

נרע משה"ש אגף לבניה כפרית.

עבודה: שרות ב' (פיחתת רפיה ב' סזה) 39/43929/71

מדרד כסיס: 14 ית"ד

הערות	סכום התייקרות	ח ש ב ו נ ו ת				התייקרות		מדרד הכניה	חודש
		סכום לתוספת יוקר	החסרות	סכום	מס'	% לאחר 3%	%		
				138.4	1972	מרץ		בסיס הנוזה	
				140.8	1972	יוני		החלת עבודה	
17.12.72	30833			153.6	1972	דצמבר		החלת עבודה	
					1973	יולי		במר עבודה	
								<u>1. התיקרות והחלתיח</u>	
	0.35	= 20% x 1.73%	= (140.8 - 138.4)	138.4				לייצור	א.
	8.78	= 80% x 10.98%	= (153.6 - 138.4)	138.4				ליחרה עבודה	ב.
	<u>9.13%</u>								
								<u>2. התיקרות שוטפת</u>	
			151.04	= 10913		x 138.4		לפי בסיס	
							151.04	בסיס	
					2			יולי 1972	
		143,100							
		66,800	16,200	83,000	4	-	0.1	151.8	נובמבר
		57,300	2,500	59,800	5	-	1.70	153.6	דצמבר
	1,786	55,800			6	3.20	6.20	160.4	ינואר 1973
	1/2 3,094	68,450				4.52	7.52	162.4	פברואר
	1/2 136,900	4,497	11,100	148,000	7	6.57	9.57	165.5	מרץ
	1/2 3,236	26,100				12.40	15.40	174.3	אפריל
	1/2 52,200	3,771	1,500	53,700	8	14.45	17.45	177.4	מאי
	1/2 2,812	14,532				19.35	22.35	184.8	יוני
	1/2 29,064	4,024	21,636	50,700	9	27.69	30.69	197.4	יולי
		23,220		541,164					
									אחוז התיקרות ממוצע
	4.29%	=	23,220	541,164					

STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

חשוב התייקרויות

הערות	סכום התיקרות	ח ש ב ו נ ו ת			התיקרות		מדר הבניה	חשב
		סכום לתוספת יוקר	החסרות	סכום	מס'	% לאחר החסר 3%		
								חשוב המכום להתיקרות
		762,071						סה"כ השבון טובי
	(-)	3,592						הורדת שונות
	(-)	9,618						הורדת רצוף 14 יח"ד x 687.- לי/יח"ד
		748,861						
		68,371						הוספת התיקרות התחלתית
		817,232						
	(-)	133,500						הורדת מקדמה 20% x 667,800.-
		683,732						סכום לחתיקרות
								רכוז התיקרויות
								1. התיקרות התחלתית
	68,371.-							9.13% x 748,861
								2. התיקרות שוטפת
	29,332.-							4.29% x 683,732
	97,703.-							סה"כ התיקרות
								(העברה לדף רכוז)

חישוב כסויות

תאריך 197 חכין

תכנית מס 156/ק/ - מתג

מס' העבודה 29/43929/72 ג'יג

שם העבודה כמות יסוד - זיגט 686

	<p>5 זיגט</p>			<p>1. זיגט 686</p>
<p>20/30</p>	<p>א זיגט 686 מס 1, 2, 3, 5, 6, 7 13, 14, 15 מס 1, 2, 3, 5, 8, 9 מס 12, 15</p>	<p>8/ 0.80/0.80 1.50</p>	<p>7.68</p>	<p>1. זיגט 686 מס 1, 2, 3, 5, 8, 9 מס 12, 15</p>
<p>9/ 0.20/0.30 0.72</p>	<p>ל = 1.50 - 0.25 - 0.25 = 0.99 מס 3</p>	<p>3/ 0.95/0.95 1.50</p>	<p>4.61</p>	<p>2. זיגט 686 מס 7, 14, 15</p>
<p>5/ 0.20/0.40 0.75</p>	<p>20/40 זיגט 686 מס 9, 10, 11, 8, 12 מס 3</p>	<p>3/ 1.05/1.05 1.50</p>	<p>4.96</p>	<p>3. זיגט 686 מס 6, 10, 11</p>
<p>0.72</p>	<p>זיגט 686</p>	<p>5.12</p>	<p>7</p>	<p>4. זיגט 686 מס 31, 101</p>
<p>0.016</p>	<p>זיגט 686</p>	<p>2.71</p>	<p>7</p>	<p>מס 8 x 0.80/0.80</p>
<p>0.271</p>	<p>זיגט 686</p>	<p>3.31</p>	<p>7</p>	<p>מס 3 x 0.95/0.95</p>
<p>11.14</p>	<p>זיגט 686</p>	<p>11.14</p>	<p>7</p>	<p>מס 3 x 1.05/1.05</p>

חישוב כסויות

2.97 הכין

197 תאריך

שם העבודה: כמות דמי זיהום 686

תכנית מס'

מס' העבודה








שם העבודה


מס' העבודה	מס' תכנית	מס' העבודה	שם העבודה	כמות	מחיר	סה"כ
2	97	6	5 סלופים מני לוליה מזכרים לזכרה	1	1.00	1.00
1	100	6	6 מעלה ארבעים כולל פס מני בלטה אף לפי גבירת אף	1	1.00	1.00
2	100	7	7 נזבים בלטה סגולות בלטה אף (100, 100)	2	2.40	4.80
1	100	8	8 מעלה בן ארץ ולפי כניסה	1	1.00	1.00
2	100	8	8 מלכה בלטה בלטה מני	1	5.70	5.70
2	100	4	4 מעלה	1	59.30	59.30
1	100	1	1 מעלה מעלה אף בלטה ארבעה (2-3)	1	71.51	71.51
1	100	2	2 מעלה סגולת ארבע מני (4-5)	1	1.00	1.00
1	100	3	3 מעלה מעלה	1	1.00	1.00
1	100	4	4 מעלה מעלה מעלה	1	1.00	1.00
1	100	5	5 מעלה מעלה מעלה	1	1.00	1.00
1	100	6	6 מעלה מעלה מעלה	1	1.00	1.00
1	100	9	9 מעלה מעלה מעלה	1	1.00	1.00
1	100	10	10 מעלה מעלה מעלה	1	1.00	1.00
1	100	7	7 מעלה מעלה מעלה	1	1.00	1.00
1	100	8	8 מעלה מעלה מעלה	1	1.00	1.00
1	100	9	9 מעלה מעלה מעלה	2	1.00	2.00

4th 6020K 1393

212.11.13931 - 6886 ruoz 14 - i'200 1100-1111

4th 6020K 1393 = 0





3098
 משרד השיכון
 האגף לבניה כפרית
 - ה'טבת תשכ"ד - 74. 2. 13
 מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 411151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38267
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4811

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א - כח/626

מוזין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון, באר שבע.
 בנן : אסטרוטק בפיתחת רפיה.
 החומר לבדיקה : 8 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסדרו צ'אסטא ביזנס 1974-02-08
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיצה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרם מס'
				סיוור (אינץ')					
	212	8.2.74	28.1.74		ב'	קורות יסוד	טורנדון		1
	152	"	1.2.74			קורות יסוד	צרכניה		5

שלמה טרובל
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוטיל-ת"א.
 מר גלוצרמן-ת"א.
 חב' אסטרוטק.
 באר שבע 10-02-1974

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר, למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אוור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



נציבות מס הכנסה
 מסר מניכור
 מס מחשבוני
 בעד שירותים
 מס' 4500827
 האוצר
 מס חסי שולים
 מס' האשור 114/9

העתק

170646

חשבון מס'

1974-02-10

לכבוד

תאריך

אנף לבגיה כספית,
 משרד השכון,
 באר שבע

מיום הומנה מס'

שם המסין מסטרס

חווה מס'

לי	אנ'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
			61626/בש	1974-02-10
		עבור בדיקה 8 קוביות בסון מעטות מס' 1050/4 בפיתוח רפיה 2 לפי טעיף 1050/4		
	58.40			
		(תמימים רמובה לי + 40 אנ')		

שולם ע"ה סך לי
 האריך קבלה מס'
 סך הכל 58.40
 בעת החשלוט נא לציין את מספר החשבון

31.7.1973

3095/

13/130

משרד הרווחה
 האגף לבניה כפרית
 י"ח תש"ג 3.8
 מחוז הנגב

לכבוד
 ממנה משרד הסוכן
 במרכז גוסי פחת רפיה.

א.נ.א.

הנדון: מסירת בתים במרכז גוסי פחת רפיה.

רצ"ב מנה המרכז בציון המספרים של הבתים.

נבקש למסור שני בתים כדלקמן:-

בית מס' 7 למר חיים ורסקיין

בית מס' 12 למר בוריס קודניץ ב"כ האגודה

הנ"ל חתמו אצלנו על בתים אלו.

ממנה רב,

מ. אכיר
 ממנה אגף הרווחה

הערות-

מר י. רומיאנסקי

מר י. שמון

מר י. רגב

חיק מס' 7

חיק מס' 12

מא/יק

12P
CMT. 11E

RECEIVED
COMMUNICATIONS SECTION
MAY 11 1964
UNIT 11E

12P
CMT. 11E
UNIT 11E

UNIT 11E

UNIT 11E
UNIT 11E
UNIT 11E
UNIT 11E
UNIT 11E

UNIT 11E

UNIT 11E
UNIT 11E

UNIT 11E
UNIT 11E
UNIT 11E
UNIT 11E
UNIT 11E

3093

משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

תאריך: 18.7.73

מספר: 39/43929/72 /812

ג. אביבי

אל: מר

מאת: א. בלף

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
נ ניסן תשל"ג 20.7.73
מחוז הנגב

39/43929/72

הנדון: הגדלה/הקטנת חוזה

14 בתים טרומיים

העבודה:

טרות ב/

המקום:

אשפרנס בע"מ

הקבלן:

מהוח השינוי:

27,000	בסך
762,840	-
<u>789,840</u>	ס"ה

להגדיל

נא אח החוזה הנדון,

ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך בצוע: -
התיקרות בוספת עקב גידול אחוז ההתיקרות לבצוע שלא היה אפשר

לשער בהגדלה הראשונה .

Ch

א. בלף

מסונה על חוזים ומכרזים

הנגב

העתק:

מהנדס מחוז -

אשפרנס בע"מ, רח' צירלסון 4, ת"א .

הקבלן -

1
11
1

Handwritten text on the right side, possibly a date or reference number.

Handwritten text on the right side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the right side, possibly a name or title.

Handwritten text on the right side, possibly a name or title.

Handwritten text on the right side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the right side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

20.7.73

לכבוד
משרד השבון
רחובתלל 23
ירושלים

...א

הגידון - שבון חלקי סס. § לחוזה סס. 39/43929/72
תקת 14 יח"ד בשדות ב'

סך החוזה - 762,840.-

		<u>עם התחלת הייצור</u>	.8
135,628.-		$20\% \times 678,140.-$	
		<u>לאחר גמר הייצור כולל קביעת אלמנטים של השמל ונגרות</u>	.2
203,442.-		$30\% \times 678,140.-$	
		<u>לאחר גמר היסודות</u>	.3
67,814.-		$10\% \times 678,140.-$	
		<u>לאחר גמר הרכבת קירות וגג</u>	.4
67,814.-		$10\% \times 678,140.-$	
		<u>לאחר גמר בידוד וריפוף</u>	.5
47,469.-		$7\% \times 678,140.-$	
		<u>לאחר גמר הרכבת אינסטלציה השמל ונגרות</u>	.6
67,814.-		$10\% \times 678,140.-$	
		<u>לאחר ספירת הקבורה ותקנת השבון סופי</u>	.7
33,907.-		$5\% \times 678,140.-$	
		<u>התייקרויות מיום - 20.10.72</u>	.8
31,234.-		$97\% \times 32,200.-$	
		<u>סדור דרכי גישה למקום הבניה</u>	.9
52,500.-			
		<u>התייקרויות מיום 18.7.73</u>	.10
26,190.-		$97\% \times 27,000.-$	
<u>733,812.-</u>	סה"כ		
<u>704,700.-</u>	סה"כ קבלנו		
<u>29,112.-</u>	סה"כ מביק		

בכבוד רב,
"אשטרוט" חברה להנדסה בק"מ



אל:	אלטליים	התאריך:	2/7/73
מאת:	אשכנזי (אשכנזי) גיור (אשכנזי)	חיק כוכ':	3098
הנדון:	הטלן חוקי 9-9 כימיה (אשכנזי)		

ד"ר א' אשכנזי
הטלן חוקי 9-9
כימיה (אשכנזי)

התאריך
אשכנזי


מזכר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

המסמך: 3095/	אל: אלכסיוס מה: רבי לוי נושא: התאמת
תאריך: 22/6/23	אל: אל מה: רבי לוי נושא: התאמת

תגובה:

על מנת להסדיר את ההגדרה
 המבחינה של ההיקף התוכני
 בתוך (30 סעיפים) של האג'נדה
 התקנונית החדשה.



50951

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
10.10.73
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

המחלקה לבנין

תעודה זמנית על בדיקת בטון

מס א-בש/59582

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון באר-שבע.
 בנין : מבנים בפיתחת רפיה
 החומר לבדיקה : 24 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסרו באתר העבודה ביום: 1973-04-20
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מס'
				סדור (אינץ')					
	365 359	26.4.73	11.4.73		ב-300	ג ג	5		1 2
	380 375	"	"			ג ג	6		5 6
	335 400	26.4.73	12.4.73			ג ג	4		9 10
	270	26.4.73	13.4.73			ג ג	2		13
	366 323	"	"			ג ג	3		15
	296 368	26.4.73	16.4.73			ג ג	1		19 20
	345	"	"			ג ג	2		23

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלוואיל
מר גלוברמן
באר שבע, 1973-04-29
רט/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

חב/167666



1940

Handwritten notes at the top of the page, including the word "TABLE" and some illegible text.

1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12
7	8	9	10	11	12	13
8	9	10	11	12	13	14
9	10	11	12	13	14	15
10	11	12	13	14	15	16
11	12	13	14	15	16	17
12	13	14	15	16	17	18
13	14	15	16	17	18	19
14	15	16	17	18	19	20
15	16	17	18	19	20	21
16	17	18	19	20	21	22
17	18	19	20	21	22	23
18	19	20	21	22	23	24
19	20	21	22	23	24	25
20	21	22	23	24	25	26
21	22	23	24	25	26	27
22	23	24	25	26	27	28
23	24	25	26	27	28	29
24	25	26	27	28	29	30
25	26	27	28	29	30	31
26	27	28	29	30	31	32
27	28	29	30	31	32	33
28	29	30	31	32	33	34
29	30	31	32	33	34	35
30	31	32	33	34	35	36
31	32	33	34	35	36	37
32	33	34	35	36	37	38
33	34	35	36	37	38	39
34	35	36	37	38	39	40
35	36	37	38	39	40	41
36	37	38	39	40	41	42
37	38	39	40	41	42	43
38	39	40	41	42	43	44
39	40	41	42	43	44	45
40	41	42	43	44	45	46
41	42	43	44	45	46	47
42	43	44	45	46	47	48
43	44	45	46	47	48	49
44	45	46	47	48	49	50
45	46	47	48	49	50	51
46	47	48	49	50	51	52
47	48	49	50	51	52	53
48	49	50	51	52	53	54
49	50	51	52	53	54	55
50	51	52	53	54	55	56
51	52	53	54	55	56	57
52	53	54	55	56	57	58
53	54	55	56	57	58	59
54	55	56	57	58	59	60
55	56	57	58	59	60	61
56	57	58	59	60	61	62
57	58	59	60	61	62	63
58	59	60	61	62	63	64
59	60	61	62	63	64	65
60	61	62	63	64	65	66
61	62	63	64	65	66	67
62	63	64	65	66	67	68
63	64	65	66	67	68	69
64	65	66	67	68	69	70
65	66	67	68	69	70	71
66	67	68	69	70	71	72
67	68	69	70	71	72	73
68	69	70	71	72	73	74
69	70	71	72	73	74	75
70	71	72	73	74	75	76
71	72	73	74	75	76	77
72	73	74	75	76	77	78
73	74	75	76	77	78	79
74	75	76	77	78	79	80
75	76	77	78	79	80	81
76	77	78	79	80	81	82
77	78	79	80	81	82	83
78	79	80	81	82	83	84
79	80	81	82	83	84	85
80	81	82	83	84	85	86
81	82	83	84	85	86	87
82	83	84	85	86	87	88
83	84	85	86	87	88	89
84	85	86	87	88	89	90
85	86	87	88	89	90	91
86	87	88	89	90	91	92
87	88	89	90	91	92	93
88	89	90	91	92	93	94
89	90	91	92	93	94	95
90	91	92	93	94	95	96
91	92	93	94	95	96	97
92	93	94	95	96	97	98
93	94	95	96	97	98	99
94	95	96	97	98	99	100

Handwritten notes at the bottom left of the page.

Handwritten notes at the bottom right of the page.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

21 יבנות עם הכנסת
סטרי מניכוי
הם מתשלמים
בנר שיהיה
מס' 4502827
האוצר
מס השלם
מס' האשור 114/9

העתק

חשבון מס' *K-7666*

לכבוד

תאריך 1973-04-29

אגף לבניה כפרית
משרד הסכרן
באר - שבע

הזמנה מס' _____
שם המזמין _____
חווה מס' _____

לי	אג'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
		עבור בדיקה 24 קוביות בסרן מבנית מבנים בפיתוח רפיה. לפי סעיף 1050/4 עבור תלקיחה	59582/בש	1973-04-29
144	-			
11	-			
		(מאה חמישים וחמס לי בלבד)		
155	-	סך הכל		

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון

שולם ע"ה סך _____ לי
תאריך _____ קבלה מס' _____

21.7.1973

לכבוד
משרד המבחן
רחוב חלל 23,
ירושלים.

החשבונית - חלקי מס' 8 לחוק מס. 59/43929/72
המס' 14 יח"ר בצורה ב'.

י.ל.ח

ערך החובה - 702,840.- ל"י

155,826.-	1. <u>מס המלואה הישיר</u> 30% x 519,132.-
203,659.-	2. <u>לחייב המלואה הישיר</u> מלואה על חשבון המלואה 30% x 519,132.-
67,815.-	3. <u>לחייב המלואה הישיר</u> 10% x 48,439.- x 14 יח"ר
67,815.-	4. <u>לחייב המלואה הישיר</u> 10% x 48,439.- x 14 יח"ר
47,469.-	5. <u>לחייב המלואה הישיר</u> 7% x 48,439.- x 14 יח"ר
67,815.-	6. <u>לחייב המלואה הישיר</u> 10% x 48,439.- x 14 יח"ר
4,845.-	7. <u>לחייב המלואה הישיר</u> 2% x 48,439.- x 14 יח"ר
26,190.-	8. <u>היטל</u> 5% x 21,000.-
50,500.-	9. <u>מס המלואה הישיר</u> 20.10.72 - 21,000.- 9% x 32,200.-
<u>704,740.-</u>	
<u>641,579.-</u>	
<u>63,161.-</u>	

מס' 14
מס' 14
מס' 14

החשבונית חברה לחובות בע"מ.

משרד המבחן
רחוב חלל 23
ירושלים

56571

56571

7

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines across the page.]

[Faint, illegible text at the bottom right of the page.]

3085

B
W

277

21.5.1973

לכבוד
סניף השכון
רחוב הלל 23,
ירושלים.

הגידון - חלקי מס' 2 לחודש מס. 59/43929/72
המס' 14 יח"ד כשורה ב'

א.ג.א.

ערך החוזה - 762,840.- ל"י

155,620.- ✓	1.	עם החלת הייצור 20% x 678,132.-
203,439.- ✓	2.	לאחר גמר הייצור כולל קביעת אלפנטים של השמל ונגרות 30% x 678,132.-
67,813.- ✓	3.	לאחר גמר היטודות 14 יח"ד x 48,438.- x 10%
67,813.-	4.	לאחר גמר הרכבת קירות ונג 14 יח"ד x 48,438.- x 10%
47,469.- ✓	5.	לאחר גמר פידוד וריצוף 14 יח"ד x 48,438.- x 7%
67,813.- ✓	6.	לאחר גמר הרכבת אינסטלציה השמל ונגרות 14 יח"ד x 48,438.- x 10%
4,843.- ✓	7.	לאחר מסירת העבודה והגשת השכון סופי 2 יח"ד x 48,478.- x 5%
26,180.- ✓		התיקונים 97% x 27,000.-
52,500.- ✓	8.	סניף ורכי גישה למקום הבניה
31,234.- ✓	9.	התיקונים פחות - 20,10.72 97% x 32,200.-
704,740.-		סה"כ
614,579.-		סה"כ קבלנו
623,200.-		סה"כ מגיע

56.971 ~~80/16~~

בכבוד רב,
"אשדודים" חברה להנדסה בע"מ.

החומר
המפורט שנתן
באישור מועד
2081

3095/

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38867
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 4841, 2534

מס' תעודת הבדיקה: 20.4.73

מחוז הנגב

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בש/58947

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית משרד השיכון - באר שבע. ביום:

בנין : מגורים בפיתחת רפיח.

החומר לבדיקה : 13 קוביות בטון.

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום: 22.3.73 המטבח:

מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' חזק
				כיוור (אינץ') קונסט (ס"מ)					
	350	25.3.73	15.3.73		ב' 300	גב	1		1
	352	"	"						2
	390	12.4.73	"			"	"		3
	424	"	"			"	"		4
	302	25.3.73	"			"	2		5
	415	12.4.73	"			"	"		6
	480	"	"			"	"		7
	414	25.3.73	16.3.73			"	2		8
	315	"	"			"	"		9
	472	13.4.73	"			"	"		10
	383	"	"			"	"		11
	384	25.3.73	"			"	3		12
	450	13.4.73	"			"	"		13

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - (-)

שלמה סרברל
סנהל סניף באר שבע.

באראשפצ
העתק: טר אלואיל ת"א.
מר גלוברטן ת"א
חב' אשטרם
באר שבע 13-04-1973

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה

חב/167275

העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

באר-שבע 12:4:75.....

מס' עב' 3095/מג.....

לכבוד

חב' אסטרוס

צירלסון 4

חל - א ב י ב

אדון נכבד,

הגרון: תשלום עבור בדיקות חוזרות.

המקום פיתחת רפ"ח הוודעה 39/43929.72 המבנה הגידות דיון

חומר לבדיקה קוביות בטון

היות וחבדיקה לא עמדה בדרישות התקן לפי תקודת מכון התקנים מס' 58946

מיום 26.3.73 הנכו להודיעכם שבחשבון הסופי למבנה הנ"ל נחייב אותכם

בטכום 286.20 לפי חשבון מכון התקנים מס' 167276 מ- 26.3.73

נכבוד רב

י. דוסיאנסקי
ס.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתק:

מר גלויברמן - ת"א

מר אלואיל - ת"א

מר בלף - ת"א

מהנדס איזוף ד. ג. קרבה ומנני

אגף לבניה כפרים

26.6.72

3095-טנג/1446

לכבוד

חב' אסטרום בע"מ

רח' בירלסון 4

ה ל - א ב י ב

א.ג.י.

הנדון: 14 בתים טרומיים - פיחחת רמיה ב'.

הרינו להודיעכם שנחתם הוצה שמסרו 39/43929/72
לביצוע הקמת 14 בתים טרומיים של 68.6 מ² בפיחחת רמיה ב',
זוה גוסף ל-30 יח"ד שהוכס בונים לפי הוצה 39/43212/71.

אבקשם להחקיר עם מהנדס אזור הערבה מו זיידה לטט תיאום
העבודה וקבלת פרטים נוספים.

במכוד רב,

י. רנטיאנסקי

ס.ט. מהנדס מחוז הנגב

מצתק:

מר גלויכרסן - ח"א

מר רבינוביץ - ח"א

מר אביבי - ח"א

מר בלף - ח"א

מהנדס אזור הערבה

חבל הנגב ולכיש

חב' אשרת - כאן

מר מוטסקי - כאן

מכון התקנים

3091



משרד השיכון
בנייה בהתישבות
חזה מספר 99039/43929/72

א.ל: מנהל האגף להנדסה

מאת: סגן המנהל הכללי

נא להפעיל חוזה בניה

הוראת בצוע

כמקום: פוזנאן רחוב ב'

ע"י: חב"א אשדוד בע"מ

ערך החוזה	סירוס הבנייה
667,800.-	14 בתים פרומיים

סך הקצבי: 70.11.091 - 1972 - עליות חריגות

ש. אבני
115 סמ"מ גלילי

לוח: (1) מכתב האגף לבנייה כסרית מס' 91/72/2896

מיום

24.5.72

(2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן

הצחק:

1. מר א. גלייכרמן, מנהל האגף לבנייה כסרית
2. מר י. רבינוביץ, הממונה על הפעלת הבנייה בהתישבות
3. מר א. בלום, הממונה על פיקוח הבנייה
4. חברות (2) בצורך לחוות הבנייה (יועצן באמצעות האגף להנדסה)
5. המחלקה לסטטיסטיקה
6. מהנדס מחוז לבנייה כסרית מחוז נ"ב
7. אגף חנויים ובטחנות, המחלקה להתישבות בהכנת תוכנית, תל אביב-יגבי
8. היחידה לתחום עבודות, בא למדול בדיח התקדמות הבניה, סימול
9. מ"ק

10. מר ג. אביבי, ממונה על עליות חריגות

11. מר מ. כרמי, הבחיים הם מחוך 250 בתים שנוגזמו אצל אשדוד.

תאריך:

סיון תשל"ב
1972

מס': 1000/1999
תאריך: 10.10.1999

בשם הדין

פסק דין

בנושא: פלילי

מס' תביעה: 1000/1999

שם הנאשם	מס' תביעה
מר. י. כהן	1000/1999

בשם הדין

התביעה: (1) פלילי

מס' תביעה

(2) פלילי

מ. כהן

תביעה

התביעה:

1. מ. כהן, נאשם, הורשע בהפרת אמונים.
2. מ. כהן, נאשם, הורשע בהפרת אמונים.
3. מ. כהן, נאשם, הורשע בהפרת אמונים.
4. מ. כהן, נאשם, הורשע בהפרת אמונים.
5. מ. כהן, נאשם, הורשע בהפרת אמונים.
6. מ. כהן, נאשם, הורשע בהפרת אמונים.
7. מ. כהן, נאשם, הורשע בהפרת אמונים.
8. מ. כהן, נאשם, הורשע בהפרת אמונים.
9. מ. כהן, נאשם, הורשע בהפרת אמונים.
10. מ. כהן, נאשם, הורשע בהפרת אמונים.

התביעה:

מ. כהן, נאשם, הורשע בהפרת אמונים.

מס' תביעה:

מדינת ישראל

30981

מסד השיכון
אגף בנייה כפרית
תל-אביב, הקרייה.

השיכון
אגף לבניה כפרית
י.ו.שרי תשלום = 6.72
מחוז הנגב

מיקוד 61070
תאריך: 24.5.72

אבכ/
97/72/2898

אל: מר ג.אביבי

מאת: מר א.בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

ה נ ד ו ן : ה פ ע ל ת ח ו ז ה

ה פ ק ו ם - ש ר ו ת ב' (פ י ת ח ת ר פ י ח ב')

ה ע כ ו ד ה - 14 ב ת י ם ט ר ו מ י י ם ש ל 268.6

ה ק ב ל ן - ח ב ר ת א ש ט ר ו ם ב ע" ם

א. נ א ל ע ר ו ן ח ו ז ה ע" ם - ח ב ר ת א ש ט ר ו ם ב ע" ם

כ ת ו ב ת - ר ח' צ י ר ל ן 4, ל פ י ת כ נ י ת -
ל ב צ ו ע ה ע ב ו ד ה ש ב נ י ד ו ן, ל פ י ת כ נ י ת -

כ ה ת א ם ל כ ת ב כ מ ו י ו ת ו מ ח י י ם ר ח" ב כ ט ך - 667,800 ל"י

ב. רצ"ב - 1. סדר שלומים.

2. טעיפים מיוחדים בדבר התיקרות,
הקופת הבצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה -

ל פ י ס ע י ף 1, כ מ כ ת ב מ ר ט. א ב ב י 3858/פר-25/1972 - מ ר צ 1972.

ה ב ת י ם ה ם מ ח ו ך 250 ב ת י ם ט ר ו מ י י ם ש י ם ל ה ז מ י ן א צ ל ח ב' א ש ט ר ו ם.

ב ב ר כ ה ,

א.בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתק:

מהנדס מחוז - הנגב
הקבלן חברה אשטרום

צה/כפ

אחוזים

20% עם החלת הייצור

30% גמר הייצור כולל קביעת אלמנטים של הסמל ונגרות

10% לאחר גמר היסודות

10% לאחר גמר הרכבת קירות ונג


7% לאחר גמר בידוד וריצוף

10% לאחר גמר הרכבת אינסטלציה, הסמל ונגרות

3% ע"ח קרן הבטוח

5% לאחר פסירת העבודה והגטת חשבון סופי

100%



1948

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 38367
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 4841
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534



העתק

גביבות מס הכנסה
 מסור מניכוד
 מס משלומים
 כניד שירותים
 מס' 4502827

הארץ
 מס חש' שלם
 מס' החשור 114/9

חשבון מס'

167246

1973-03-26

לכבוד
 הג'ר לבניה כנרית
 משרד המכרן ב"ם

תאריך

הזמנה מס'

שם המזמין

חווה מס'

הקב לן ואספרום

Handwritten notes:
 286.20
 90
 333.90
 342.90

לי	אג'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
			58946/בט	1973-03-26
333.90		עבור כדוקה 63 קוביות בטון מבנית מגורים כפיתתה רשוח לטי ע"י 1060 עבור לקיחה		
342.90		((שלוש טאות ארבעים ושתיים ו-90 אג'))		
		סך הכל	שולם ע"ה סך	תאריך
		בעת החשום נא לציין את מספר החשבון	קבלה מס'	

משרד השיכון

האגף לבניה כפרית

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151

סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367

סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534

10/10/73 - 5. 4. 73

מחוז הנגב

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א - כש/58946

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השיכון - באר שבע.
 בנין : מגורים בפיתחת רפיה.
 החומר לבדיקה : 63 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ובמסרו באתר העבודה ביום: 22.3.73

תנאי הבקרה:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקילה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	מס'י הבנין	דוגמא מס'	סדרם מס'
				כדור (אינץ')					
	361	25.3.73	12.2.73		300*	גב		44	1
	310	"	"			"			2
	337	"	"			"			3
	250	"	"			"			4
	314	ממרצע							
	138	"	"			"		41	5
	240	"	"			"			6
	284	"	13.2.73			"		41	7
	346	"	"			"			8
	294	"	"			"		43	9
	288	"	"			"			10
	343	"	"			"			11
	340	ממרצע							12
	316								
	389	"	14.2.73			"		40	13
	342	"	"			"			14
		2. / .							

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

זכרון התקנים הישראלי

המשד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- ב ש / 2 / 58946

מומין הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קוטם (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרסי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	370	25.3.73	14.2.73		ג. 300	ג.ג	42		15
	327	"	"						16
	331	"	"						17
	390	"	"						18
	354	ממרבץ							
	223	"	15.2.73			ג.ג	39		19
	417	"	"						20
	266	"	"						21
	302	ממרבץ							
	188	"	"			ג.ג	40		22
	308	"	"						23
	319	"	"						24
	272	ממרבץ							
	468	"	16.2.73			ג.ג	37		25
	244	"	"						26
	446	"	"						27
	376	ממרבץ							

3. / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בש/3/58946

מומין הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/חיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק בדיש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שיקפה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרים מס'
				כדור (אינץ')					
	239	25.3.73	16.2.73		ג' 300	גג	38		28
	222	"	"						29
	428	"	"						30
	296	ממוצע							
	428	"	18.2.73			גג	37		31
	243	"	"						32
	280	"	"						33
	317	ממוצע							
	331	"	"			גג	36		34
	432	"	"						35
	336	"	"						36
	366	ממוצע							
	206	"	19.2.73			גג	34		37
	350	"	"						38
	376	"	"						39
	380	"	"						40
	328	ממוצע							

4 . / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' אב"ש/4/58946

מומין הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ. בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חזק ברז	חזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ')					
	322	25.3.73	19.2.73		300'	גב	35		41
	437	"	"						42
	270	"	"						43
	340	"	"						44
	342	ממרצע							
	197	"	20.2.73			"	33		45
	296	"	"						46
	387	"	"						47
	293	ממרצע							
	322	"	21.2.73			"	31		48
	214	"	"						49
	290	"	"						50
	296	"	"						51
	280	ממרצע							
	303	"	"			"	32		52
	363	"	"						53
	269	"	"						54
	403	"	"						55
	334	ממרצע							

5 . / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א-בש/5/58946

מומין הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לחקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקעה	סוכ הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
				כדור (אינץ')					
	329	25.3.73	22.2.73		ב ⁴ 300	גב	30		56
	271	"	"						57
	320	"	"						58
	311	"	"						59
	308	ממוצע							
	327	"	23.2.73			"	29		60
	341	"	"						61
	279	"	"						62
	312	"	"						63
	315	ממוצע							

שלמה טרובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.
 מר גלוברמן ת"א.
 חב⁴ אשטרום.
 באר שבע 26-03-1973
 שב/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא כמלוואה.

חב/167276

יחידת המחקר והפיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח
מס' ת.ד. 12345
תל אביב, ישראל

תוצאות ניסויים

ניסויים לשינוי תכונות

תאריך: 15/10/2023

הניסויים נערכו במטרה לבדוק את השפעת שינוי תנאי הניסוי על התוצאות. הניסויים נערכו באמצעות שינוי תנאי הניסוי.

התוצאות מוצגות בטבלה להלן:

מס' ניסוי	תנאי ניסוי	תוצאה	הערות
1	תנאי א	25.5	תוצאה גבוהה
2	תנאי ב	21.5	תוצאה נמוכה
3	תנאי ג	23.5	תוצאה בינונית
4	תנאי ד	24.5	תוצאה גבוהה
5	תנאי ה	22.5	תוצאה נמוכה
6	תנאי ו	23.5	תוצאה בינונית
7	תנאי ז	24.5	תוצאה גבוהה
8	תנאי ח	22.5	תוצאה נמוכה
9	תנאי ט	23.5	תוצאה בינונית
10	תנאי י	24.5	תוצאה גבוהה

התוצאות מוצגות בטבלה להלן:
מס' ניסוי: 1
תנאי ניסוי: א
תוצאה: 25.5

תאריך: 15/10/2023
מחלקת המחקר והפיתוח

3098
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
(ל ארול תשלום=19.3.73)
מחוז הנגב

מדינת ישראל
 משרד השיכון
 טופס שינוי חוזה
9039/43929/72
 מספר החוזה

13.3.73
 מספר השינוי: 1

אל: הגזברות (2)
 מאת: המחלקה הארגונית להתייבות

א. פרטי זהוי: -

שם המחוז	שם המקום	פחת רפיה ב' (מניין)	חב' אסטרוט בע"מ
שם הקבלן			

ג. הרכב החוזה הקיים	הקיים בל"י	המתוקן בל"י	השינוי בל"י
14 בתיים טרומיים	752,500	762,840	10,340 (+)

ג. מהות השינוי:

עבודות נוספות בבתיים בסכום של 738.70 לכית 14 בתיים $\times 738.70 = 10,340.-$ ל"י

ד. סעיף תקציבי: 70.11.091 - 1972 - עליות חדשות

בברכה,

 ט. אכני
 סגן המנהל הכללי

ד. בן-יהודה
 חשב המשרד

העתיק:

ט א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
 ט א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
 ט ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
 מהנדס מחוזי לבנייה כפרית במחוז הנגב
 אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
 גזברות (2)

מס' 2537

21.3.73

3085

לכבוד
משרד המבחן
רחוב הלל 23
ירושלים

המידות - המבחן חלקי ס.ס. 6 לחוזה מס. 39/43929/72
תעמ"ד 14 יח"ד בעדות ב'

ערך החוזה 762,840.- ל"י

133,560.- ✓	עם החלת הייצור 20% x 667,800.- ✓	1.
200,340.- ✓	לאחר גמר הייצור כולל קביעת אלמנטים של הטל ונגרות 30% x 667,800.- ✓	2.
66,780.- ✓	לאחר גמר היסודות 14 יח"ד x 47,700.- x 10% ✓	3.
66,780.- ✓	לאחר גמר הרכבת קירות ונג 14 יח"ד x 47,700.- x 10% ✓	4.
46,746.- ✓	לאחר גמר בידוד וריבוי 14 יח"ד x 47,700.- x 7% ✓	5.
19,080 - 66,780.-	לאחר גמר הרכבת אינסטלציה הטל ונגרות 14 יח"ד x 47,700.- x 10% 190,800 ✓	6.
8,995.- ✓	הגדלת עבודות נוספות 78% x 10,340.- ✓	7.
52,500.- ✓	סדר ורבי גישה למקום חבנית ✓	8.
29,798 ✓ 29,994.-	תמיציות מיום 20.10.72 96% 97% x 32,200.- ✓	9.

624,578.- סה"כ
482,000.- סה"כ קבלנו
190,465.- סה"כ מביק

בכבוד רב,
"האשרות" חברה להנדסה בע"מ.

[Handwritten signature]

ה א ז פ ר
מס' התכנון 266172

3098

משרד השיכון
האגף לבנייה כפרית
מחוז הנגב

משרד השיכון / האגף לבנייה כפרית

תאריך: 20.2.73

מס'ר: 39/43929/72 / 1728

אל: מר ג. אביבי
מאת: א. בלף

הנדון: הגדלה/הקטנת חוזה 39/43929/72
העבודה: הקמת 14 בתים טרומיים
המקום: שדה (פיתחת דפיה ב')
הקבלן: חברת אטרום בע"מ
מהות הסינוי: עבודות נוספות

כסר 10,340
- 752,500
ס"ה 762,840

נאלהבדיילת החוזה הנדון,
ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך בצוע: -
הוספת קו ביוב "4 באורך 20 מ'
הפרט בין צנור ביוב בטון לאסבסט 15 מ'
יציאה מצנור דלוחין
בקודת חשמל נוספת בחוץ
ערך העבודה הנוספת 738.70 ל"י/לבית
14 בתים x 738.70 ל"י = 10,340 ל"י
~~30 בתים x 738.70 ל"י = 22,161 ל"י~~

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתק:
מהנדס מחוז - הנגב
הקבלן - חברת אטרום בע"מ

CONFIDENTIAL

SECRET

REF: 101

REF: 102

REF: 103

REF: 104

REF: 105

REF: 106

REF: 107

REF: 108

REF: 109

SECRET

SECRET

SECRET

REF: 110

REF: 111

REF: 112

REF: 113

REF: 114

REF: 115

REF: 116

REF: 117

REF: 118

REF: 119

REF: 120

SECRET

3095 |
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
14.2.73
מחוז הנגב

חברת אשדוד
רחוב צירלסון 4
תל - אביב

ד"ר אדר א השל"ב
9/2/73

כשר-מב
XXXXXX

תצוינת מים פיוחה רפיה ב"ש

א.ג.ג.

בחסות למכתב משרד השיכון אגף הבניה כפרית מיום 4/2/73
מספר 31/3193 בנידון.

רצ"ב התקן החשבון ששולם כבר על ידינו.
הנכם מתבקשים להמציא לנו את הסך בהקדם.

בכבוד רב,

פר"מ מל"ז
רכז תעוזים

התקין -

משרד השיכון אגף הבניה כפרית - כ"ש
בזכרות חבל הנגב
רמה הנגב
פ.י. רוזנבלט - סאן

סיכום יומים I

14 1/2 30 15 20

(1) הוצאת 15 שקלים 20 שקלים
 (2) הוצאת 30 שקלים 30 שקלים

(3) הוצאת 20 שקלים 20 שקלים

(4) הוצאת 15 שקלים 15 שקלים

(1) הוצאת 20 שקלים 20 שקלים
 הוצאת 15 שקלים 15 שקלים

534.- 26.70
~~544.- 27.20~~ 20

(2) הוצאת 15 שקלים 15 שקלים

92.50 6.50
 105.- 7.- 15

(3) הוצאת 20 שקלים 20 שקלים

30.-

(4) הוצאת 15 שקלים 15 שקלים

77.20

756.20 30 שקלים
 738.70
 x 14.-
 33.264.-

הוצאת 15 שקלים 15 שקלים
 הוצאת 15 שקלים 15 שקלים
 756.20 15 שקלים
 x 15
 11.3410

7385
14
29548
2387
103419

7387
3
22161

מ. 1. 91-2

מדינת ישראל
משרד השיכון

טופס שינוי חוזה/הזמנה

99039/43929/72

מספר החוזה/הזמנה

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית
19.1.73
מחוז הנגב

אל : הגזברות (2)

מאת : המחלקה הארגונית להתייבות.

א. פרטי זהוי: -

שם המחוז	נגב
שם המקום	פחת רפיח ב'
שם הקבלן	חב' אסטרום בע"מ

ב. הרכב החוזה/הזמנה הקיים:

14 בחיט טרומיים.

החובה הקיימת בל"י	700,000
החובה המתוקן בל"י	752,500
הטובי בל"י	52,500 (+)

ג. מהות השינוי:

סידור דרך גישה למקום הבנייה.

ד. טעיף תקציבי: -

70.11.091 - עליות חדשות.

ב ב ר כ ה,

ד. בן יהודה
חשב המשרד

ס. אבני
סגן המנהל הכללי

העמק:

מ. י. רבינוביץ, ממונה על הפעלת הבנייה בהתייבות (5)
מ. א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז הנגב
אגף חוזים ובמחוזות, הסוכנות היהודית, ת"א
גזברות (2)

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
 MEMPHIS, TENNESSEE
 JUNE 10, 1968

RECEIVED
 CIVIL RIGHTS DIVISION
 JUNE 10 1968

TO : DIRECTOR, FBI (100-441100)
 FROM : SAC, MEMPHIS (100-10000)

1. SUBJECT: [Illegible]

100-10000	100-10000	100-10000
100-10000	100-10000	100-10000

2. [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible]
 [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible] (+)

3. [Illegible]
 [Illegible] [Illegible] [Illegible]

4. [Illegible]
 [Illegible] [Illegible] [Illegible]

[Illegible] [Illegible]

[Illegible] [Illegible]

[Illegible]
 [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible]
 [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible]
 [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible]
 [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible] [Illegible]

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר דף מס' 1 מתוך דפים

א. פרטי זהווי:

מספר החוזה/הזמנה	שם המזרח	שם המקום	שם הקבלן	מס' מתוך מס' ישוב מס' אובייקט מס' בית
	ק"מ	פיתוח יפ"א 7	סל כולל	מס' 101

ב. פרטי העבודה:

כרך מלאש ווא"ב ג.ו. החגים
הכולל 2 דמ"ב וקטלן לפזמק + גישה למנהל גול

ג. התרשים והמדידות:


3.570 ✓
840 ✓
260 ✓
555.5 ✓
550.-
5.775.00
2.11

כ"ס
357 x 2 = 714.0
2/ 37 x 7.5 = 555.0
2 1/2 13 x 10 = 130.0

12.0 + 9.0 = 21.0
2 x 16.0 = 32.0
10.5 168.0
x 5.0 = 840.0

714.0 x 15.0 = 10710.0
x 3.570 = 38052.9

130.0 x 2 = 260.0

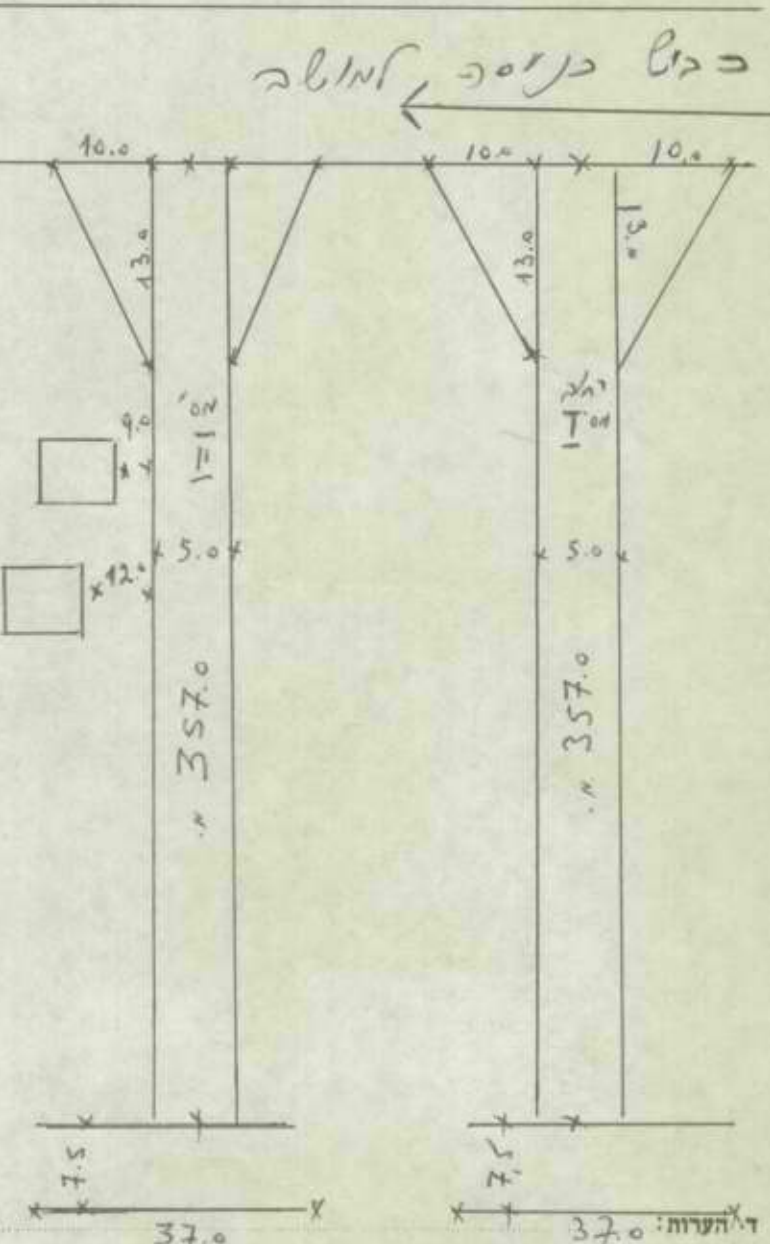

וא"ב, מ"ו, ר"ח לאלק החגים זה מנהל גול
מ"ו, ר"ח מ"ו, לאלק החגים בל"ו החגים
3 ו"ו ג"ב, טקטלן מ"ו, ג"ו 955

ה. אישורים ותחיתום:

שם החותם	שם החותם
חברת לעבודות כ"ס ופזמק בע"מ	חתימת בי"ב משרד השיכון
תפקיד	תפקיד
20/11/72	20/11/72
תאריך	תאריך

מדינת ישראל
משרד השיכון

תרשימים ומדידות באתר דף מס' 1 מתוך דפים

א. פרטי זרוע:

מס' החוזה/הוסנה	שם המזרח	שם המקום	שם הקבלן	מס' מחזור	מס' ישוב	מס' אובייקט	מס' בית
	קניון	שיכון י"ג	מלך נביא				
				מס' 100 זרוע			

ב. פרטי העבודה:

צוק עיבוד ולבנין כ"ו בנינים
הכוללת 2 יחידות לפאניק + גישה למעבד גולד

ג. התרשים והמדידות:

3570 ✓
840 ✓
260 ✓
555.00 ✓
555.00 ✓
2.0 5775.00 ✓

יג' 5'
357 × 2 = 714.0 ✓
37 × 25 = 555.0 ✓
2 1/2 × 13 × 10 = 130.0 ✓
12.0 + 9.0 = 10.5 168.0 ✓
2 × 16.0 = 32.0 ✓

714.0 ✓
× 5.0
3570 ✓


168.0
× 5.0
840.0 ✓

130.0 × 2 = 260.0

5775.0
900.0
212 6675.0 ✓

110.0
× 5.0
550.0

6675

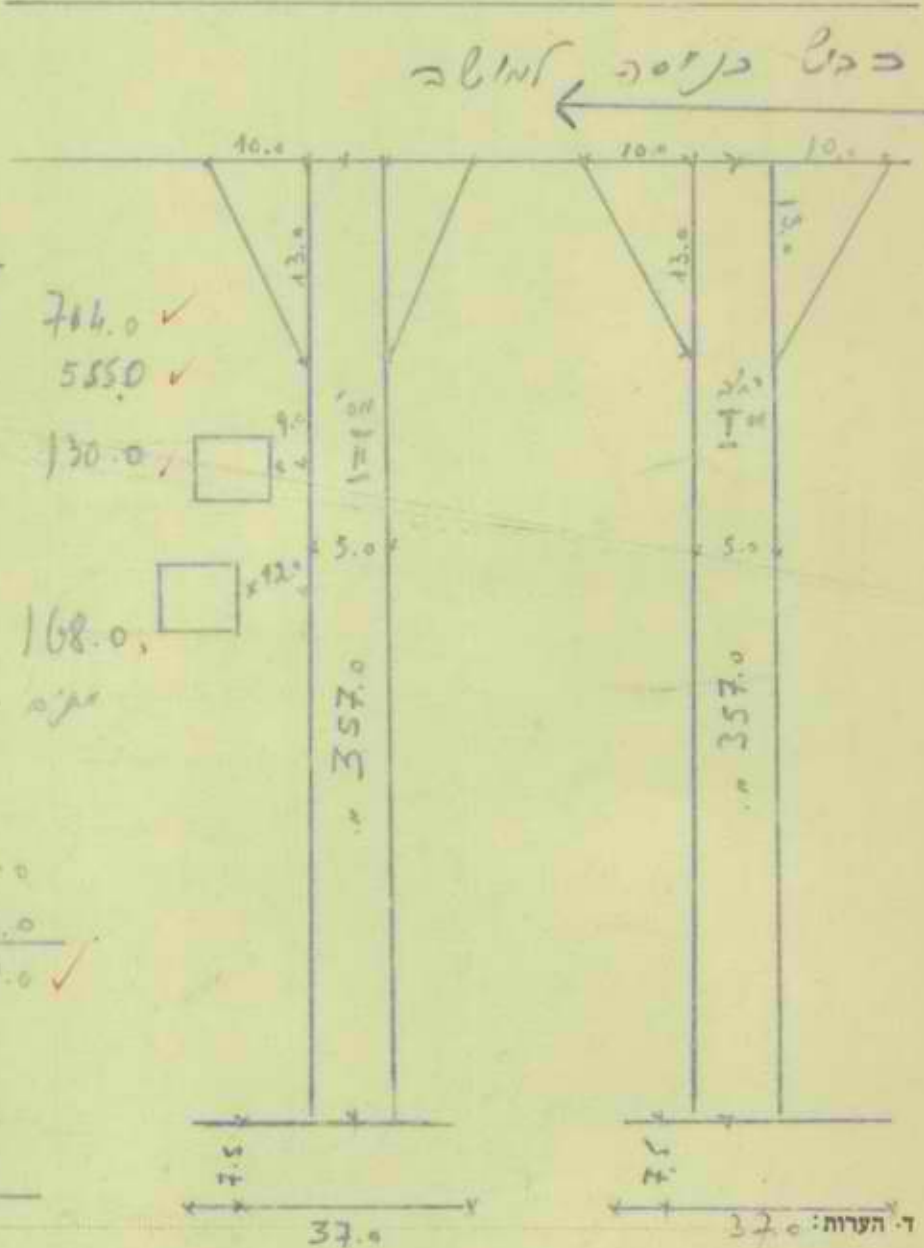



נולד, שגוי שלם לולק התנאים של מנין לאלול
י"ג של התנאים לולק התנאים בטני הכוללת
3 יחידות אובייקט טיפוס מס' 100 זרוע

ה. אישורים ותחיתום:

שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד
תחיתום ביכ הקבלן	תחיתום ביכ משרד השיכון
20/11/72	20/11/72
האריך	האריך

סיכום מבנים - פיתוח רפיה

ק"מ 1:500

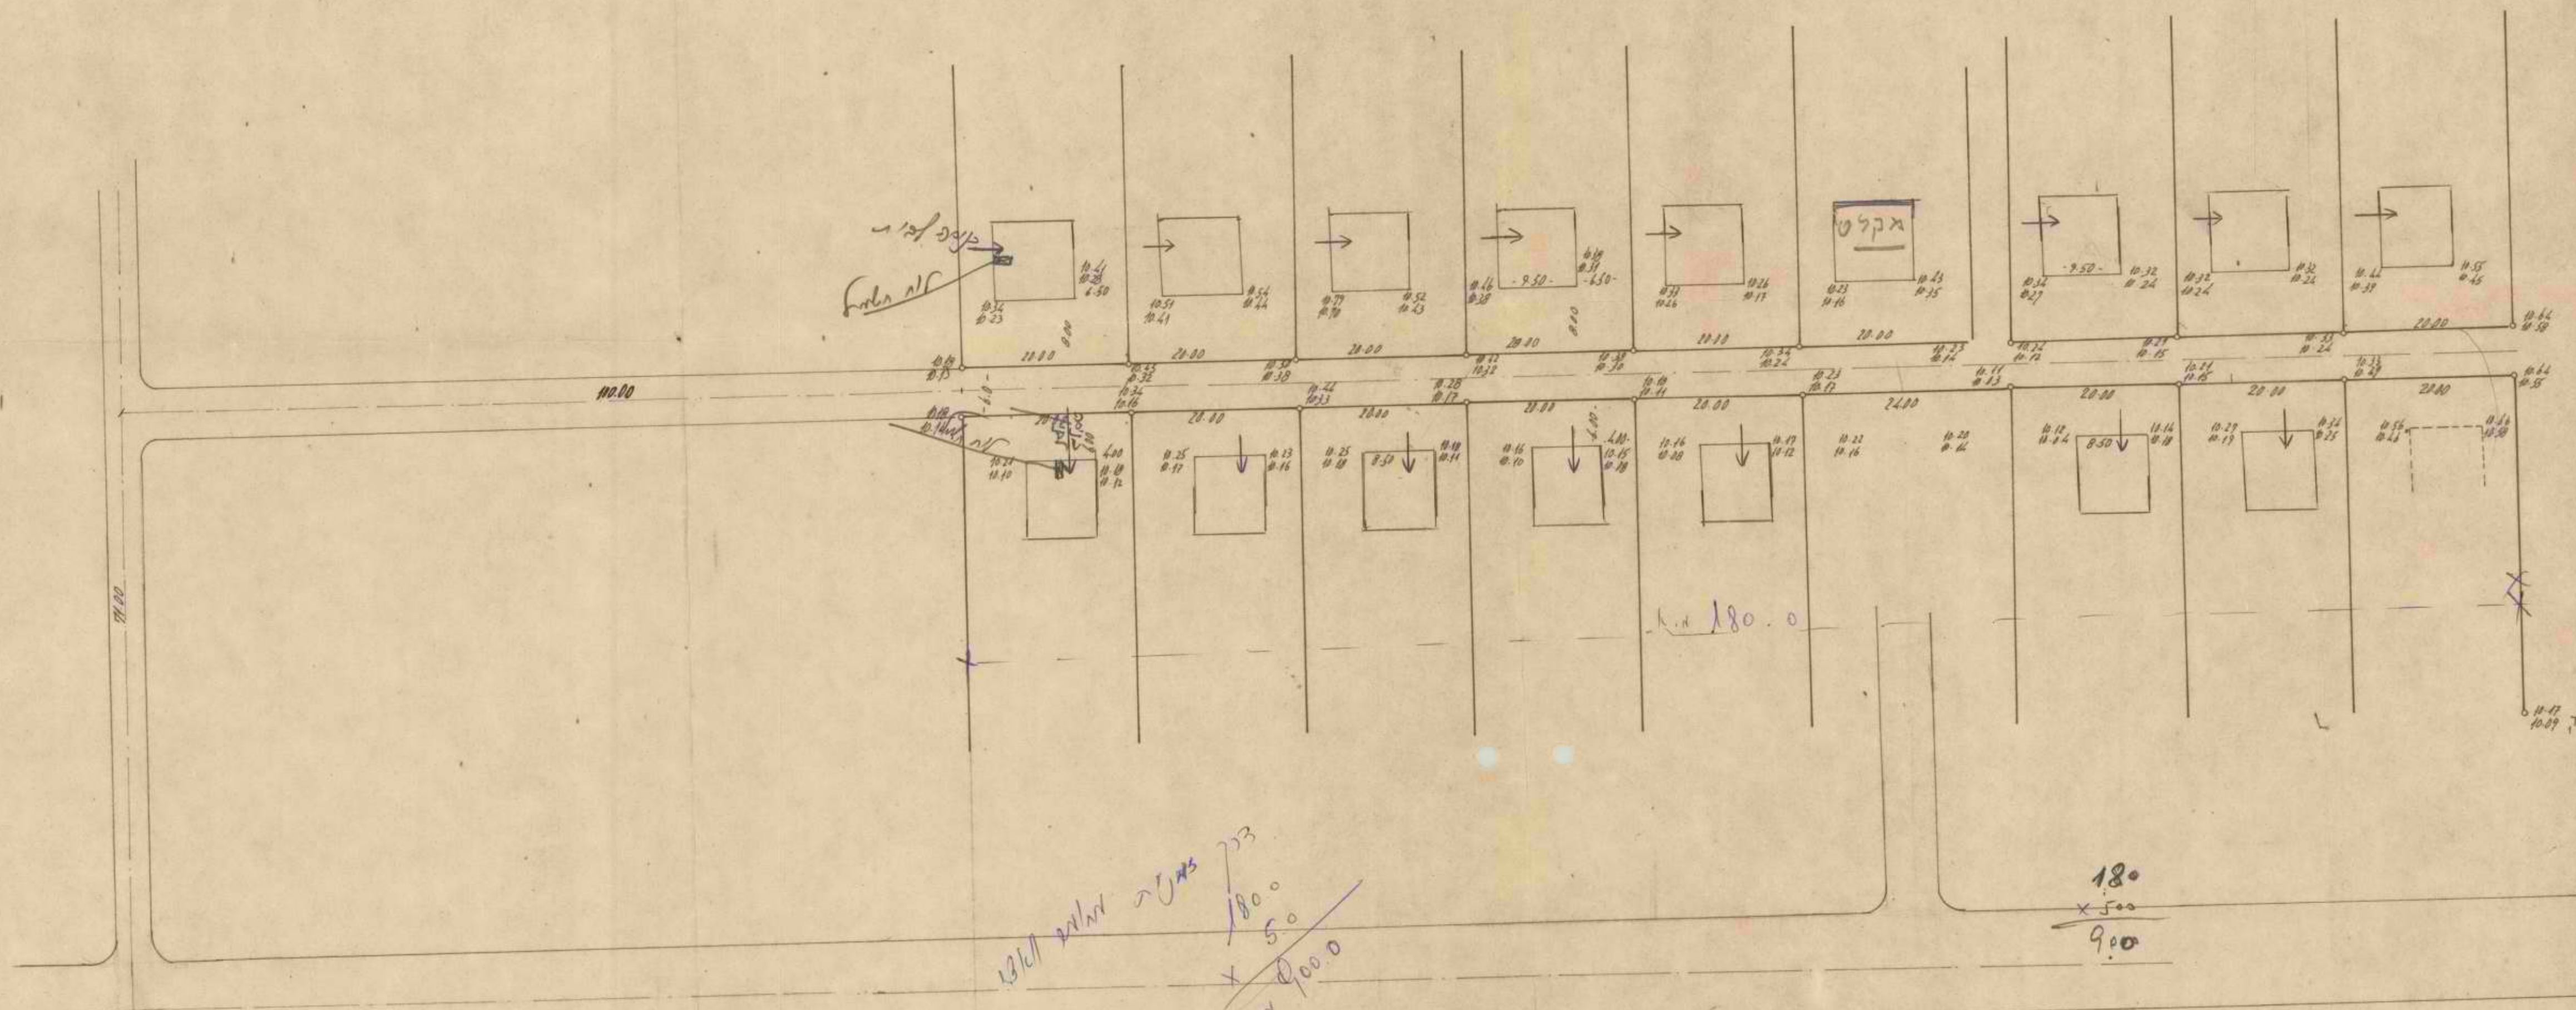

מס' 180.0
 x 5.0
 x 100.0

18.0
 x 5.0
 9.0

מס' שינויים	תאריך	חתימה
המזמין: קשרד גשיבון - אגף בנייה כפרית		
הנושא: פיתוח רפיה		
מס' תכנית:	סיכום מבנים	
5-173-2		
ק.מ.	1:500	
עוד:	"מהוד" מדידות והנדסה בע"מ.	
שוטט: קדיה	מרכז הנגב 22 באר-שבע	
אישר:	טל. 73358	
תאריך: 2.12.72		

3095

מס'ן למס'ר חשבוני / מס'ן חשבוני
 28-13
 ב"מ

21.1.73

לכבוד
 משרד המבחן,
 רחוב הלל 23,
 תל אביב.

א.נ.ג.

הנדון - חשבון חלקי מס, 9 לחודש מס, 39/43929/72
 חקקה 14 יח"ר בשדות ב"

ערך החודש 752,500.-

- | | | |
|-----------|---|----|
| 133,560.- | עם התחלת הייצור | 1. |
| | 20% x 667,800.- | |
| | לאחר גמר הייצור כולל קביעה אלמנטים של השטח ונגרות | 2. |
| 200,340.- | 30% x 667,800.- | |
| 66,780.- | לאחר גמר היסודות | 3. |
| | 10% x 47,700./ x 14 יח"ר | |
| 9,540.- | לאחר גמר הרכבת עירוב ונג | 4. |
| | 10% x 47,700.- x 2 יח"ר | |
| 52,500.- | סדור דרכי גישה למקום הבניה | 5. |
| 19,365.- | החיצונית פיוס 20,10x72 | 6. |
| | 62% x 97% x 32,200.- | |

482,085.- סה"כ
 419,400.- סה"כ קבלנו
 62,685.- סה"כ פגיע

במבור דב,

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ.

האוצר
 משרד השיכון
 מס' החשבוני 2661/9

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



נציבות מס הכנסה
 מספר מניבוי
 מס מתשלומים
 ניצ' שירותים
 מס' 4907697

מעברות בסניף מתי-באר-שבע

האוצר
 מס חסי שולם
 מס' האשור 114/9

חשבון מס' № 166195

1973-1-1

תאריך

לכבוד

אגף לבניה כשרים
 משרד השכון ב"ט

מיום

הזמנה מס'

שם המזמין

הקבלן: חב' אסטרום

חווה מס'

ל"י	אג'	פרטים	תעודה	
			מיום	מס'
			1973-1-1	56900/בש
עבור בדיקה 5 קדצפות רצפה מבנים סרוטיים פיתוח רפיה ב' לטי סניף 1182-84 (69)				
(שיטת רחש לי סלנד)				
69.00		סך הכל	שולם ע"ח סך	לי
		בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון	תאריך	קבלה מס'
			יתרה לתשלום	לי

לשמוש משרדי

לוכות

לחובת

1 5 2 0 0 2

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת מרצפות רצפה מבטון

מס' א-בש/56900

מוזמין הבדיקה: אבף לבניה כפרית, משרד השכון - באר שבע.

בנין: מבנים טרומיים בפיתחת רפיח ב'.

החומר לבדיקה: 5 מרצפות רצפה.

המדגם: במסר ע"י מר יחיאל בירום: 1972/12-25

מהות הבדיקה: התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשכ"ב-1962 למרצפות רצפה מבטון

תוצאות הבדיקה

שעור השחיקה (מ"מ)	הסבולת		שכבת המדרן		משקל (ק"ג)	מ ד ו ת		סימן היצרן	מספר סידורי
	בכניפה (ק"ג)	בהכאה (ס"מ)	עובי (מ"מ)	תיאור		עובי (מ"מ)	אורך הצלע (מ"מ)		
1.3	-	18	7	טרצו לבן	1.80	21	200x200		1
1.3		17	5		1.80	21	"		2
1.4		17	5		1.76	21	"		3
1.3		17	5		1.76	20	"		4
1.4		17	5		1.76	21	"		5
1.3	במוצע								

שלמה סוכרל
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל ת"א.
 מר גלוברמן ת"א.
 חב' אשטרום
 באר שבע 1973-1971
 ש/

מרצפות לבנין מגורים	כל דוגמא	מינ' 4	מינ' 20	200 ± 1	דרישות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשכ"ב-1962
ממוצע מכס' 2.5	מינ' 17	מינ' 5	מינ' 22	250 ± 1	
כל דוגמא מכס' 2.9	מינ' 200	מינ' 6	מינ' 25	300 ± 1	
לבנונים צבוריים	מינ' 250	מינ' 8	מינ' 30	400 ± 1	
ממוצע מכס' 2.2	מינ' 340				
כל דוגמא מכס' 2.6					

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

חב 166195/

3095

ג' סדר השיכון
אגף לבניה כפרית
אשרי תשלוב= 15.12.72
מחוז הנגב

מספר השיכון/האגף לכבייה כפרית

תאריך: 11.12.72

מספר: 39/43929/72/921

אליסר ג. אביבי
מאת: א. בליף

הנדון: הגדלה/הקטנת חוזה 39/43929/72

העבודה: הקמת בתים טרומיים

המקום: שדות - פיתחת רפיח ב'

הקבלן: חברת אסטרום בע"מ

מחוז השכונות: סדר דרכי גישה ל - 47 בתים

ב"הגדיל	את החוזה הבדולח,	בסך	52,500	ל"י
ערך החוזה עתה		-	700,000	ל"י
		ט"ה	752,500	ל"י

ההגדלה היא לצורך בצופי- דרכי גישה למקום ההקמה

ובישה לפנוף ועגלות לצורך הקמת הבתים דלהלן:

1. 14 בתים - חוזה 39/43929/72 פיתחת רפיח ב'
2. 18 בתים - חוזה 39/43212/72 פיתחת רפיח ב'
3. 15 בתים במרכז גוטי - חוזה טרם נחתם .

א. בליף

א. בליף
ממונה על חוזים ומכרזים

העמק:
מחזקס מחוז - הנגב
הקבלן - חברת אסטרום בע"מ
צה/בפ

100-100000
MAR 22 1955
U.S. DEPT. OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C.

TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, PHOENIX

RE: [Illegible]

DATE: 3/22/55

3085/16

משרד המיסים והכנסות
3104

20.12.72

לכבוד
משרד המכון
רחוב הלל 23
ירושלים

א.נ.נ.

חבירוני - חשבון חלקי מס. 4 לחוזה מס. 39/43929/72
תקנת 14 יח"ד בשדות ב'

ערך החוזה 700,000.-

1. עם תחילת הייצור 20% x 667,800.- = 133,560.- ✓

2. לאחר גמר הייצור כולל קביעת אלמנטים של השמל ונגרות 30% x 667,800.- = 200,340.- ✓

3. לאחר גמר יסודות 14 יח"ד x 47,700.- x 10% = 66,780.- ✓

4. התיקרויות סיום 20.10.72 60% x 97% x 32,200.- = 18,740.-

419,420.- סה"כ
339,600.- סה"כ קבלנו
59,820.- סה"כ מביע

בכבוד רב,
"אשש" חברה להנדסה בע"מ.

המוציא
מס הש"ש שולט
מס המכר 2861/72

30951

מדינת ישראל

משרד הטיכון

סופס טיכני חוזה

99039/43929/72

מספר החוזה

22.11.72

מספר הטיכני: 1

ג. שרד הטיכון
אגף לבנייה כפרדית
1 תשרי תשל"ב - 29.11.72
מאוז אנגב

אל: הגזברות (2)

מאח: המחלקה הארגונית להתייבות

א. פרטי זהוי: -

<u>נגב</u>	<u>פחת רפיח ב'</u>	<u>חברת אסטרוט בע"מ</u>
שט המחוז	שט המקום	שט הקבלן

ב. הרכב החוזה הקיים	הקיים בל"י	המתוקן בל"י	הטיכני בל"י
14 בחיט טרומיים	667,800	700,000	32,200

ג. מהות הטיכני: תשלום התיקרויות.

ד. סעיף תקציבי:

70.11.091 - 1972 - עליות חדשות

בברכה,

ה. בן-יהודה
חשב המשרד

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

העתיק:

- מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
- מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
- מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
- מהנדס מחוזי לבנייה כפרית במחוז תגב
- אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
- גזברות (2)

לפ/יר/

3085

מס' התיק 2611
מס' הסדרה 39/43929/72

20.11.72

לכבוד
משרד השכון
רח' הלל 23
יבנה

..2.8

הנידון - השכון חלקי מס. 4 לחוזה מס. 39/43929/72
תקנת 14 יח"ר בשדות ב'

ערך החוזה 700,000.-

133,560.- ✓	עם התחלת הייצור 20% x 667,800.-	.6
200,340.- ✓	לאחר גמר הייצור כולל קביעת המנטים של השל ונגרות 30% x 667,800.-	.2
9,540.- ✓	לאחר גמר יסודות 2 יח" x 47,700.- x 10%	.3
16,240.- ✓ -16,241.-	התיקויות פיות 20.10.72 97% x 52% x 32,200.-	.4
<u>369,681.-</u>	סה"כ	
<u>303,700.-</u>	סה"כ קבלנו	
<u>53,981.-</u>	סה"כ מביע	

בכבוד רב,
"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ.

(Handwritten signatures in black and red ink)

הרובר
מס' הסדרה 39/43929/72
מס' התיק 2611

1917

1917
1917
1917
1917

1917
1917

1917

1917
1917

1917
1917

1917
1917

1917
1917

1917
1917
1917

1917

1917

1917
1917
1917

אגף לבניה כמריח

28.11.72

3095/טנג-2662

אלו מר בלף & ה"א

הנדון: הגדלת חוזה 39/43929/72 - הקמת בתימחלמיחחח רטיח ב" בכצוע הב" אשטרום.

נה להגדיל את החוזה הנ"ל בסך - 52,500. ליעבוד סדור דרכי גישה לתקנה 32 בחים בחים במיתחת רטיח ב" ו-1 בחים במרכז גוטי בכצוע הב" אשטרום, כפי שסוכם עם סמנכ"ל מטרד השיכון מר אבני.

הדרכים הם על מנה לאמטר הסך בצוע הקמה הבחיס, גישה למקום הקמה וגישה למנוף ועגלות.

1. דרך גישה כוללת: סדור צורה הדרך ע"י חשירה, סלוק צורים י האדמה מהטטה ומיזור הרוק וסלוי בחטר ואדי 25 סמ" עובי לאחד הכביסה.

7000 מ² לפי 7.50 = 52,500.- ₪

הבחיס מוקמים לפי חוזים: 14 בחים חוזה 39/43929/72

18 בחים חוזה 39/43212/71

15 בחים במרכז גוטי - חוזה טרם נחתם.

ב ב ר כ ה,

י. דוסיאנסקי
פ.מ. מחלקת מחוד הנגב

הערות:

- מר גלויטרמן - ה"א
- מר אביבי - ה"א
- מהנדס אזור חמה הנגב
- הב" אשטרום - כאן
- מר אורבך - ה"א

פירמה יפית I 6 77

~~סכום~~ : סוף ~~הגיל~~

הוצא צ'ק גילב הכוללת : 3000 צ'ק צ'ק

ז' חתימה סליק אצ"ר האצ"ר מנהל או' צ'ק

הצ'ק, מילי מתחם וולקסי 25 ס"ה א"ב' לאחר הכבול

ה צ'ק מני' . הצ'ק הבלבץ אלסק 2 כחולות

~~הצ'ק~~ ^{צ'ק} 32 מני' אצ"ר מניכב הג'ל

15 מני' רחוב הצ'ק 5.0 מ.

58,500	מני'	7000 מני'
59,500	650	
2	750	

75
7

525

5745

100
700

30981

מסדר הטיכרון/האגף לבנייה כפרית



תאריך: 1.11.72
מספר: 39/43929/72/369

אלזמר ג. אביבי
סאח: א. בלף

הבדלון: הגדלה/הקטנת חוזה 39/43929/72

העבודה: תקנת 14 בחים טרומיים

המקום: פיהחת רפיה ג' (עדות)

הקבלן: אקטרום בע"מ

מחיר השכר:

ל"י	32,200	בסך	ביא להגדיל את החוזה הבדלון,
ל"י	667,800	-	ע"י החוזה עתה
ל"י	==700,000==	ס"ה	

ההגדלה היא לצורך בצופ:-

ע"ח 75% של התיקרות משוערה להחלת עבודה וחקופת הוצע.

א. בלף
ממנה על חוזים ומכרזים

העוקב: מהנדס מחוז - הנגב
הקבלן: אקטרום חברה להנדסה בע"מ, רח" צירלסון 4, חל-אביב
צה/בפ

3095

משרד השיכון

אגף לבניה רי

: נשד' חשלו = 25.8.72

מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151

סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 88367

סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א- בש/53471

מומין הבדיקה : אגף לבניה כפרית, משרד השכון באר שבע, כיום:

בנין : מבנים בפיתחת רפיה, אסמכתא/חיק עיריה מס':

החומר לבדיקה : 24 קוביות בטון, הקבלן: אסמרום,

הדוגמאות הוכנו ע"י: ב"כ המזמין ונמסרו כיום: 23.7.72, המפקח:

מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970, תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
				כדור (אינץ') קוטרו (ס"מ)					
	249	1.8.72	4.7.72				21		1
	221	"	"						2
	225	"	"						3
	206	"	"						4
	225	מסרצע							
	215	3.8.72	6.7.72				32		5
	212	"	"						6
	261	"	"						7
	237	"	"						8
	231	מסרצע							
	298	6.8.72	9.7.72				52		10
	268	"	"						11
	269	"	"						12
	254	"	"						
	272	מסרצע							

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - (-)

2 / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

מחזוריות סטטיסטית

מחזוריות סטטיסטית היא תופעה שבה נתונים מסוימים חוזרים על עצמם בצורה קבועה או כמעט קבועה לאורך זמן. תופעה זו נחקרת באמצעות שיטות מתמטיות וסטטיסטיות, ויש לה השפעה חשובה על תחומים רבים, כגון כלכלה, מדע, ויזמות.

מבוא

הגדרת מחזוריות

מחזוריות היא תופעה שבה נתונים מסוימים חוזרים על עצמם בצורה קבועה או כמעט קבועה לאורך זמן. תופעה זו נחקרת באמצעות שיטות מתמטיות וסטטיסטיות, ויש לה השפעה חשובה על תחומים רבים, כגון כלכלה, מדע, ויזמות.

ישנן מסלולים שונים לחיפוש מידע, ויש להבין את ההבדלים ביניהם. מסלול חיפוש מידע הוא תהליך שבו מנסים למצוא מידע רלוונטי עבורנו. ישנן מסלולים שונים לחיפוש מידע, ויש להבין את ההבדלים ביניהם.

ישנן מסלולים שונים לחיפוש מידע, ויש להבין את ההבדלים ביניהם. מסלול חיפוש מידע הוא תהליך שבו מנסים למצוא מידע רלוונטי עבורנו. ישנן מסלולים שונים לחיפוש מידע, ויש להבין את ההבדלים ביניהם.

שיטות חיפוש מידע

מסלול חיפוש מידע	מסלול חיפוש מידע	מסלול חיפוש מידע	מסלול חיפוש מידע	מסלול חיפוש מידע	מסלול חיפוש מידע	מסלול חיפוש מידע	מסלול חיפוש מידע	מסלול חיפוש מידע	מסלול חיפוש מידע										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
										41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
										51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70										
										71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
										81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100										
										101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
										111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

ישנן מסלולים שונים לחיפוש מידע, ויש להבין את ההבדלים ביניהם. מסלול חיפוש מידע הוא תהליך שבו מנסים למצוא מידע רלוונטי עבורנו. ישנן מסלולים שונים לחיפוש מידע, ויש להבין את ההבדלים ביניהם.

ישנן מסלולים שונים לחיפוש מידע, ויש להבין את ההבדלים ביניהם. מסלול חיפוש מידע הוא תהליך שבו מנסים למצוא מידע רלוונטי עבורנו. ישנן מסלולים שונים לחיפוש מידע, ויש להבין את ההבדלים ביניהם.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב/53471

מזמין הבדיקה : כיום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קי"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציאה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדידה מס'
				כדור (אינץ')					
	244	7.8.72	10.7.72				18		13
	263	"	"						14
	254	"	"						15
	261	"	"						16
	255	ממוצע							
	223	9.8.72	12.7.72				26		17
	205	"	"						18
	220	"	"						19
	228	"	"						20
	219	ממוצע							
	412	20.8.72	-				אין פרטים		
	352	"							
	284	"							23
	330	"							24
	344	ממוצע							

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - (+)

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק: מר אלואיל,
 מר גלברמן,
 חב' אשטרום,
 באר שבע, 21.8.72
 רס

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י הזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתיקים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

חב/154546

זכרון התקנים הישראלי - מעבדה:

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' נד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 4841, 2534



בעת התשלום נא לציין את מספר החשבון

חשבון מס' 134546

העתק

לכבוד

תאריך 21.8.72

הזמנה מס' מיום

אגף לבניה כפרית,
 משרד השכון,
 באר - שבע.

שם הזמין
 הקבלן: אמרם.
 חוזה מס'

ל"י	אג'	פרטים	תעודה	
			מס'	מיום
127.20		עבור בדיקת 24 קוביות בסוף סבביה סבבים כפיתחת רטיח. לטי טעיף 1050/4	53471/בט	21.8.72
		(מאה כפרים ושבע לי + 20 אג')		
1520				

[Handwritten signature]

לחובת

נציבות מס הכנסה
 מס' מילוי
 מס מסלולים
 כפר שירותים
 מס' 4502827

האזור
 מס חש' שולם
 מס' האזור 114/9

ט"ל ח'

נא לאשר קבלת החשבון.

מילי-ה-1/1000/5.72/ר

מדינת ישראל

משרד השיכון - האגף לבניה כפרית

באר-שבע 20.8.72

מס' עב' 3095/72

לכבוד

חב' אשורוס

תל-אביב

א.נ.,

הנדון : משלום עבור בדיקת חוזרות.

המקום פיתחת רפיה ב' החוזה 39/43929/72 המבנה הקמת

מבנים חומר לבדיקה קוביות

הזוה והבדיקה לא עמדה בדרישות התקן לפי תעודת מכון התקנים מס' 53467

מיום 23.7.72 הננו להודיעכם שבחשבוך הסופי למבנה הנ"ל נהייב אוחכם

בסכום 42.40 לפי חשבוך מכון התקנים מס' 154219 מ- 25.7.72

במכוד רב,

י. גומיאנסקי

מ.מ. מהנהל מווד הנגב.

העתיקים :-

מר גלויברמן-ת"א

מר אלואיל-ת"א

מר בלף - ת"א

מהנדס איזור סיני והערבה

מר מ. אורנך

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

זכרון התקנים הישראלי - סעברה:

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841



כפת התשלום נא לציין
 את מספר החשבון

154219

חשבון מס'

העתק

Handwritten notes:
 פתח
 25.7.72
 42.40
 150.80
 171.40

לכבוד

25.7.72

תאריך

אגף לזכיה כספית
 משרד המכרז ב"א

מיום

הזמנה מס'

שם המזמין

חווה מס'

המכרז: אטמור 4

ל"י	אנ'	פ ר ס י מ	ת ע ו ר ה	
			מס'	מיום
		מכרז בריקת 36 קטביות בסדרן מנגינת מנגינת במיתחת רפיה לצי טעני 10% / 4	53467/בס	25.7.72
190.80.				
		(טאת דמטפיים לי + 80 אג')		
				לחובת
			נציבות מס הכנסה משרד מניכוי מס משלומים בעד סירותים מס' 4902827	האוצר מס השי שולם מס' האשור 114/9

1520

ט"ל ח'

נא לאשר קבלת החשבון.

מתיי ח-1/ה/10000/5.72/ר

3095

מכון התקנים הישראלי

משרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל. 38367
 סניף נאר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל. 2534, 4841
 תשלום = 31.7.72
 מחזור הנגב

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס א - בש/53467

מומין הבדיקה : אגף לבנייה כפרית, משרד השכון - באר שבע. ביום :
 בנין : מבנים בפיתחת דפיה. 2
 החומר לבדיקה : 36 קוביות בטון. אסמכתא/תיק עיריה מס':
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ובמסדו ביום: 23.7.72 הקבלן: אשטרם
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. המפקח: תנאי הבקרה:

Handwritten notes:
 11/5/72
 12/5/72
 13/5/72
 14/5/72
 15/5/72
 16/5/72
 17/5/72
 18/5/72
 19/5/72
 20/5/72
 21/5/72
 22/5/72
 23/5/72
 24/5/72
 25/5/72
 26/5/72
 27/5/72
 28/5/72
 29/5/72
 30/5/72
 31/5/72

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרסי הבנין	דוגמא מס'	מדגם
				כדור (אינץ') קטנס (ס"מ)					
	302	24.7.72	12.5.72				35		1
	421	"	"						2
	220	"	"						3
	<u>334</u>	"	"						4
	319	ממצע							
	376	"	13.5.72				33		5
	237	"	"						6
	331	"	"						7
	<u>428</u>	"	"						8
	345	ממצע							
	406	"	8.6.72			קורות יסוד	33		9
	451	"	"						10
	478	"	"						11
	<u>490</u>	"	"						12
	456	ממצע							
	269	"	13.6.72				26		13
	222	"	"						14
	264	"	"						15
	<u>270</u>	"	"						16
	254	ממצע							

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' -

2. / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד, הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 חתומים: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69 977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' אב/53467

מוזמן הבדיקה : ביום:
 בנין : אסמכתא/תיק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפסח:
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק בדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג
				כדור (אינץ')					
	284	24.7.72	15.6.72						17
	227	"	"						18
	291	"	"						19
	312	"	"						20
	278	ממוצע							
	221	"	17.6.72				35		21
	344	"	"						22
	226	"	"						23
	234	"	"						24
	256	ממוצע							
	162	"	18.6.72				40		25
	179	"	"						26
	173	"	"						27
	165	"	"						28
	170	ממוצע							
	215	"	25.6.72				17		29
	236	"	"						30
	199	"	"						31
	212	"	"						32
	215	ממוצע							

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב'-

3 / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 חתום: למהנדס העיר; למהנדס הבנין.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: תל-אביב 69977, רח' האוניברסיטה 42, טל. 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-ב/3/53467

מוזמין הבדיקה : ביום :
 בנין : אסמכתא/היק עיריה מס':
 החומר לבדיקה : הקבלן:
 הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
 סהות הבדיקה: חזק בלחץ, כהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חזק בדרש	חזק בלחץ (קיב לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדרם
				כדור (אינץ') קוטם (ס"מ)					
	249	24.7.72	26.6.72				18		33
	361	"	"						34
	217	"	"						35
	349	"	"						36
	294	מערב							

מסקנה: בתנאי הבקרה הנ"ל ובהתחשב במספר המדגמים שניטלו מתאים הבטון, שממנו נלקחו המדגמים לבדיקה, לדרישות התקן ת"י 118 בשביל סוג בטון ב' - (-)

שלמה סדנול
 מנהל סניף באר שבע

הפתק: מר אלואיל ת"א.
 מר גלוברמן ת"א.
 חכ' אשטרם.
 באר שבע 25.7.72
 ש/ב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמין או בא-כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.
 העתיקים: למנהל העיר, למתנדס הבנין.

חב/154219

3095

ש.ל.ח	למסר הראשי ת"א /
3095	ביום

20.7.72

לכבוד
משרד הסיכון
רח"ה תלל 23
י ר ו ס ל י ת

..2.א

הנידון - חשבון הלקי סס. 2 לחוזה סס. 39/43929/72
תקפת 14 יום"ר בעדות ב"א.

ערך החוזה 667,800.-

- | | | |
|-------------|---|----|
| → 133,560.- | עם התחלת הייצור
20% x 667,800.- | 1. |
| 143,100.- | לאחר גמר הייצור כולל קביעת
אלמנטים של חשמל ונגרות
10 ית' x 47,700.- x 30% | 2. |
| 19,080.- | לאחר גמר יסודות
4 ית' x 47,700.- x 10% | 3. |

276.660	295,740.-	סה"כ
	133,500.-	סה"כ תשלום
<u>143.160</u>	<u>162,240.-</u>	סה"כ פביע





בכבוד רב, *חובל*
"אשרוס" חברה להנדסה בע"מ.

ה א ו צ ר
מס חשבונית שוטף
מס' האישור 2661/9

DATE OF DEPOSIT	1908
AMOUNT	100.00
BY	

1908

1908
 100.00
 100.00

DEPOSITED IN THE BANK OF AMERICA, N.Y. & C. CO., NEW YORK, N.Y.

100.00	100.00
100.00	100.00
100.00	100.00
100.00	100.00
100.00	100.00

100.00
 100.00
 100.00

DEPOSITED IN THE BANK OF AMERICA, N.Y. & C. CO., NEW YORK, N.Y.

100.00
 100.00
 100.00

3098



P

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

תאריך	מס' :
25.6.72	מל"ט מ"ט מ"ט מ"ט
חוק מס'	מסמך :
	א. ב. ג.
	הערות :

מ"ט מ"ט מ"ט מ"ט 39/43929/72
מ"ט מ"ט מ"ט מ"ט

מ"ט מ"ט מ"ט מ"ט
מ"ט מ"ט מ"ט מ"ט

מ"ט מ"ט מ"ט מ"ט

מ"ט מ"ט

מ"ט מ"ט מ"ט מ"ט
מ"ט מ"ט מ"ט מ"ט
מ"ט מ"ט מ"ט מ"ט
מ"ט מ"ט מ"ט מ"ט

100-50 2000 1000 1000

100-50 2000 1000 1000

100-50 2000 1000 1000

100-50 2000 1000 1000

100-50 2000 1000 1000

משרד הנגיד
 אגף לבנייה
 (שד"ר חשלת) 28. 6. 72
 מחוז הנגב

מדינת ישראל

חוזה ממ. 99039/43929/72

חוזה זה נערך ונחתם ביום 12 לחודש יוני שנה 1972

בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

לבין

חב"א אשטרום בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המכנה. היינו הקמה 14 במים טרומיים במחצית רפיה ב"

וקבלה אה הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המכנה, חמורת סך 667,800.- ל"י (במילים שש מאות ששים ושבע אלף שמונה מאות לירות

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לירי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
 - (א) הצעתו של הקבלן;
 - (ב) תנאי החוזה לביצוע מכנה ע"י הקבלן;
 - (ג) תנאים מיוחדים חוספת א'.
 - (ד) מפרט כללי לעבודות בסוף יצוק באחר.
 - (ה) מפרט כללי לסיח גבס.
 - (ו) תאור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)
 - (ז) תנאים כלליים עבור אספקה מוצרי אלומיניום של ביח"ר "קליל"
 - (ח) אופני מדידה.
 - (ט) התכניות;
 - (י) _____

2. חמורת חשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע אה המכנה בהתאם להוראות החוזה.

3. חמורת ביצוע המכנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן אה שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הקבלן: חב"א אשטרום בע"מ רח" צירלסון 4, תל - אביב

ולראיה באו הצדדים על החתום כחאריך דלעיל, כאן

ב _____ ביום 12 לחודש יוני שנה 1972

_____ חתימת הממשלה	_____ חתימת הקבלן
_____ עד לחתימה: חתימתו	_____ עד לחתימה: חתימתו
_____ שמו	_____ שמו
_____ כתובתו	_____ כתובתו
_____	_____

הנאים מיוחדים

1. סדר התשלומים עבור ביצוע העבודה יהיה נדלקמן:

20%	א. עם התחלת הייצור
30%	ב. לאחר גמר הייצור כולל קביעת אלמנטים של השמל ונגרות
10%	ג. לאחר גמר היסודות
10%	ד. לאחר גמר הרכבת קירות וגג
7%	ה. לאחר גמר בידוד וריצוף
10%	ו. לאחר גמר הרכבת אינסטלציה, השמל ונגרות
3%	ז. ע"ה קרן בטוח
5%	ח. לאחר מסירת העבודה והגשת חשבון סופי
5%	ט. לאחר אישור חשבון סופי
<hr/> <u>100%</u>	סה"כ

1. ...

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...
- g. ...
- h. ...
- i. ...
- j. ...
- k. ...
- l. ...
- m. ...
- n. ...
- o. ...
- p. ...
- q. ...
- r. ...
- s. ...
- t. ...
- u. ...
- v. ...
- w. ...
- x. ...
- y. ...
- z. ...

on"o

2. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 31.3.72 התיקרות לעבודה הנדונה, היולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאה (מדף 3'02) ובהתאם להנדסה מדד הבניה של הלשכה המרכזית לפטטיסטיקה, לפי בסיס מרץ 1972.
3. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על סיב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-חידרה רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, והצדדים לחוזה זה מחייבים בזה למלא את כל התחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי זה.
4. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחס יפה גם לגבי עבודות דומות.
5. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד היכון אומי שיחמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
6. מוסכם בין הצדדים כי מהנדס א. גלוברמן מנהל אגף לבניה כפרים יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
7. תאריך גמר העבודה הנ"ל 8 חודשים מיום מסירת הסימון בשטח
8. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה נילולים במחיר.
9. בניגוד לנאמר בפרק י"א (חלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון יצר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קמ"ד (2)".
10. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעי הקבלן לשלם למשלה בעד אזור לכל שבוע של מסירה כפיזוי ס קבוע כ מראש 30 ל"ד ליד"ך שהעבודות תשארנה בלתי גמורות.
11. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף 6 (6) של תנאי החוזה יהיה סיוח היומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדה 0,2% היקף החוזה, בינום זה נכללות בדיקות חוזרות תצורתם יחוייב הקבלן בלבד (נוסף על 0,2% המנוכה)
12. הרשות בידי משרד השכון לבצע עבודות בשלבים בהתאם להתקדמות הבניה במקום אך בכפיפות לתהליך פינני השטחים אשר בהו י צורך לבצע עבודות פינניות במסגרת חוזה זה.
13. מחירי היחידות ברשימה הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרו בטוח והיבנות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
14. הרשות בידי משרד השכון להעביר את האחריות הקבלן לסיב העבודה וביצוע התיקונים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה. המסירה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לידי _____.
15. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני יוצג לידיה החשבון.
16. הספקת מיס לבנייה כולל תשלום בעד מיס אלה, מד מיס לצורך זה והחקקה קנ מפס זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה לס מאגרה להספקת מיס קבועה) יהיה על חשבון הקבלן.
17. הכנה דרכים זמניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
18. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צהיף ייעומט כמשרד למפקח מיסם הממללה.
19. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את סיב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את היטח הנוי ואח כל יתר הגורמים העלוליי להשפיע על היצוע העבודה.
20. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימצא הקבלן למ ילה להביחח מילוי דרכי יצווח על פי החוזה ערבות כנקאיה או ערבות טל חכ ה במוח להנחת דעתה על המיילה ובנוסח שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בחוזה לאמור בפרק א' סעיף 8.

1. [Illegible text]
2. [Illegible text]
3. [Illegible text]
4. [Illegible text]
5. [Illegible text]
6. [Illegible text]
7. [Illegible text]
8. [Illegible text]
9. [Illegible text]
10. [Illegible text]
11. [Illegible text]
12. [Illegible text]
13. [Illegible text]
14. [Illegible text]
15. [Illegible text]
16. [Illegible text]
17. [Illegible text]
18. [Illegible text]
19. [Illegible text]
20. [Illegible text]
21. [Illegible text]
22. [Illegible text]
23. [Illegible text]
24. [Illegible text]
25. [Illegible text]
26. [Illegible text]
27. [Illegible text]
28. [Illegible text]
29. [Illegible text]
30. [Illegible text]

מוסכם בין הדרושים כי מטרת השיכון ישלם באו"ן ישיר את החלומים לקרן בטוח של הסדרות פועלי הבנין ע"ח הקבלן. הסכום שינוכה יועבר לרן בטוח של הסדרות פועלי הבנין והחשבון הסופי יסודר ישירות בין הקבלן לבין קרן בטוח של הסדרות פועלי הבנין.

הקבלן חייב לשלם את המיסים הדרושים ע"י מוסד לבטוח לאומי וכדומה.

החלומים ע"ח הסכום סוציאליות אחרות יסודרו על ידי הקבלן.

הקבלן חייב להגיש לקרן בטוח של פועלי הבנין בכל חודש רשימת שכר העבודה, בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית. תכלול את שם המנהל, מקום מגוריו ושירו, במקרה של עבודה יומית, או שם ראש הקבוצה מקום מגוריו והיקף העלום הכללי במקרה של עבודה קבלנית.

1960-1961
The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding
the acquisition of the land described herein.

The land described herein was acquired by the Department of the Interior
in the year 1960.

The land described herein was acquired by the Department of the Interior
in the year 1961.

The land described herein was acquired by the Department of the Interior
in the year 1962. The land described herein was acquired by the
Department of the Interior in the year 1963. The land described herein
was acquired by the Department of the Interior in the year 1964.

חוזה ממ 95039/43929/72

חוזה זה נערך ונחתם ביום 12 לחודש יוני שנה 1972

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

לבין

חב"א אשטרום בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה. היינו הקפת 14 בתים טרומיים בפחחת רפיה ב'

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, חמורת סך 667,800.- ל"י ש מאות ש"ים ושבע אלף שמונה מאות לירות (במילים)

כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

- המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
 - הצעתו של הקבלן;
 - תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;
 - תנאים מיוחדים תוספת א'.
 - מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באחר.
 - מפרט כללי לסיח גבס.
 - תאור מפורט של רשימת כמיוות מקוצרת (אפריל 1966)
 - תנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביח"ר "קליל"
 - אופני מדידה.
 - התכניות;
 -

2. חמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. חמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת הקבלן: חב"א אשטרום בע"מ רח"צירלטון 4, תל - אביב

ולראיה באו הצדדים על החתום בחאריך דלעיל, כאן

ב ביום 12 לחודש יוני שנה 1972

חתימת הממשלה חתימת הקבלן

עד לחתימה: חתימתו עד לחתימה: חתימתו

שמו שמו

כתובתו כתובתו

תנאים מיוחדים

1. סדר התשלומים עבור ביצוע העבודה יהיה נדלקמן:

20%	א. עם התחלה הייצור
30%	ב. לאחר גמר הייצור כולל קביעה אלמנטים של חשמל ונגרות
10%	ג. לאחר גמר היסודות
10%	ד. לאחר גמר הרכבת קירות וגג
7%	ה. לאחר גמר בידוד וריצוף
10%	ו. לאחר גמר הרכבת אינסטלציה, חשמל ונגרות
3%	ז. ע"ח קרן בטוח
5%	ח. לאחר מסירת העבודה והגשת חשבון סופי
5%	ט. לאחר אישור חשבון סופי
<u>100%</u>	סה"כ

THE SECRETARY OF DEFENSE

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE

DATE: 10/10/54

TO: THE SECRETARY OF DEFENSE

FROM: [Name]

SUBJECT: [Subject]

1. [Text]

2. [Text]

3. [Text]

4. [Text]

5. [Text]

6. [Text]

7. [Text]

8. [Text]

9. [Text]

10. [Text]

11. [Text]

12. [Text]

13. [Text]

14. [Text]

15. [Text]

SECRET

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

2. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 31.3.72 החיקוק לעבודה הנדונה, תיולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאה (מדף 3'02) ובהתאם להנודות מדד הבניה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס 1972.
3. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על סייב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-הדירה וטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה למלא את כל התחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי זה.
4. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
5. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד ה-כ"ח אומי שיחמנה על ידו למטרה זו ככתב, תהיינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
6. מוסכם בין הצדדים כי מהנזם א. גלזברמן מנהל אגף לבניה כפרים יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
7. תאריך גמר העבודה הנ"ל 8 חודשים מיום מסירת הסימון בשטח
8. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה נלווים במחיר.
9. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון כ"ר החוזה הור 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
10. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם למ. שלה בעד אחר לכל עבוע של מסירה כמיזוי מ קבוע מ מראש 30 ל" ליה"ד שהעבודות תשארנה בלתי גמורות.
11. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף 6) ול תנאי החוזה יהיה סיווג הייחוד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0,2% היקף החוזה, ביניה זה נכללות בדיקות חוזרות תצורתם יחוייב הקבלן בלבד (נוסף על 0,2% המנוכה)
12. הרשות בידי משרד השכון לבצע עבודות בשלבים בהתאם להקדמות הבניה כמקור אך בכפיפות לתהליך פינני המסחים אשר בהו י צורך לבצע עבודות מידות במסגרת חוזה זה.
13. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרו בטוח והיטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
14. הרשות בידי משרד השכון להעביר את האחריות הקבלן לסייב העבודה ובייזוי התיקונים הסנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה המסירה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לידי
15. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני יוגב לידיה החשבון.
16. הספקת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים זלים, מד מים לצורך זה והחקפת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה זלס מאגרו להספקת מים קבועה) יהיה על חשבון הקבלן.
17. הכנת דרכים זמניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
18. על הקבלן להעמיד במקום העבודה ציוף היימש כמאוד למסקה סעיף המס' לה.
19. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את סייב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את היטת הנוי ואת כל יתר הגורמים העלוליה להשפיע על היצוע העבודה.
20. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן למ. שלה להביתח טילוי החתי ויזוח על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חס' ח בטוח להנחת דעתה של כמ"ל לה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה כהיזם לאמור בפרק א' סעיף 8.

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...
- 21. ...
- 22. ...
- 23. ...
- 24. ...
- 25. ...
- 26. ...
- 27. ...
- 28. ...
- 29. ...
- 30. ...
- 31. ...
- 32. ...
- 33. ...
- 34. ...
- 35. ...
- 36. ...
- 37. ...
- 38. ...
- 39. ...
- 40. ...
- 41. ...
- 42. ...
- 43. ...
- 44. ...
- 45. ...
- 46. ...
- 47. ...
- 48. ...
- 49. ...
- 50. ...

מוסכם בין הצדדים כי מטרת השיכון יתלם באו"ן ישיר את התשלומים לקרן יסוה של הסתדרות פועלי הבנין ע"ח הקבלן. הסכום שינוכה יועבר לרן בטוח אל הסתדרות פועלי הבנין והחשבון הסופי יסודר ישירות בין הקבלן לבין קרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין.

הקבלן חייב לשלם את המיסים הנדרשים ע"י מוסד לבטוח לאומי וכדומה.

התשלומים ע"ח הטבות סוציאליות אחרות יסודרו על ידי הקבלן.

הקבלן חייב להגיש לקרן בטוח של פועלי הבנין בכל חודש רשימה יוכר העבודה, בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית. הכלול את שם המנהל, מקום מגוריו ושירו, במקרה של עבודה יומית, או שם ראש הקבוצה מקום מגוריו והיקף השלום הכללי במקרה של עבודה קבלנית.

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

חווה ממ 99039/43929/72

חווה זה נערך ונחתם ביום 12 לחודש יוני שנה 1972

כ י ן

ממשלה ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שתקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.

ל כ י ן

חב"א אשטרופ בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בביצועו של המבנה היינו הקמת 14 בתים סרנמיים בפחחתם רמת ר

וקבלה אח הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, תמורת סך 667,800.- ל"י
(במילים שש מאות ששים ושבע אלף שמונה מאות לירות)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חווה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחווה זה:
 - (א) הצעתו של הקבלן;
 - (ב) תנאי החווה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;
 - (ג) תנאים מיוחדים תוספת א"א.
 - (ד) מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באחר.
 - (ה) מפרט כללי לטיח גבס.
 - (ו) תאור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)
 - (ז) תנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביה"ר "קליל"
 - (ח) אופני מדידה.
 - (ט) התכניות;
 - (י) _____

2. תמורת תשלום שכר החווה כמוסכם בחווה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החווה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החווה כמוסכם בחווה.

4. לצורך חווה זה היו כחובות הצדדים כדלהלן:

כחובת הקבלן: חב"א אשטרופ בע"מ רח" צירלסון 4, חל - אביב

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב ביום 12 לחודש יוני שנה 1972

חתימת הממשלה _____ חתימת הקבלן _____

עד לחתימה: חתימתו _____ עד לחתימה: חתימתו _____

שמו _____ שמו _____

כתובתו _____ כתובתו _____

תנאים מיוחדים

1. סדר החשלומים עבור ביצוע העבודה יהיה נדלקמן:

20%	א.	עם החלה הייצור
30%	ב.	לאחר גמר הייצור כולל קביעה אלמנטים של חשמל ונגרות
10%	ג.	לאחר גמר היסודות
10%	ד.	לאחר גמר הרכבת קירות ונג
7%	ה.	לאחר גמר בידוד וריצוף
10%	ו.	לאחר גמר הרכבת אינסטלציה, חשמל ונגרות
3%	ז.	ע"ח קרן בטוח
5%	ח.	לאחר מסירת העבודה והגשת חיבון סופי
5%	ט.	לאחר אישור חשבון סופי
<u>100%</u>	סה"כ	

1. The first part of the document is a list of items.

- a. The first item is a list of items.
- b. The second item is a list of items.
- c. The third item is a list of items.
- d. The fourth item is a list of items.
- e. The fifth item is a list of items.
- f. The sixth item is a list of items.
- g. The seventh item is a list of items.
- h. The eighth item is a list of items.
- i. The ninth item is a list of items.
- j. The tenth item is a list of items.

Page 10

Page 10

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...

מוסכם בין הצדדים כי מטרה השוכן יולם באו-ן יסיר אה החטלומים לקרן יסוח של הסתדרות פועלי הבנין ע"ה הקבלן. הסכור שינוכה יועבר לרן בטוח ל הסתדרות פועלי הבנין והחשבון הסופי יסודר יסירות בין הקבלן לבין קרן בטוח של הסתדרות פועלי הבנין.

הקבלן חייב לשלם אה המיסים הדרושים ע"י מוסד לבטוח לאומי וכדומה.

החטלומים ע"ה הטבות סוציאליות אחרות יסודרו על ידי הקבלן.

הקבלן חייב להגיש לקרן בטוח של פועלי הבנין בכל חודש רשימת זכר העבודה, בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית תכלול אה גם המנהל, מקום מגוריו ושחרו, במקרה של עבודה יומית, או גם ראש הקבוצה מקום מגוריו והיקף היסלום הכללי במקרה של עבודה קבלנית.

3095

מדינת ישראל
אגף לבנייה
23. 6. 72
מחוז הנגב

משרד הטיכון
בנייה בהתישבות
חל-אביב, הקריה
חאריך 20. 6. 72

מס' חוזה 9039/43923/72

אל: מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז ב

מאת: ג. אביבי, מסונה על האחזיות ועליות חדשות

הנדון: שט היישוב שטח הבית ב

חוזה מס' 9039/43923/72

1/ שטח הבית סכ/אניס

לוטה בזה החוזה הנ"ל חתום על ידי הקבלן.

נא ספולך.

ב ב ר כ ה,

ג. אביבי

מסונה על האחזיות ועליות חדשות

לוטה: חוזה ()

העתיקים:

מ. א. בלף, מסונה על מכרזים/חוזהים - בצרוף לחוזה

ל/יר/

Office Memorandum

DATE: _____
TO: _____
FROM: _____
SUBJECT: _____

Reference is made to your memorandum dated _____
concerning _____

It is noted that _____

Very truly yours,

cc: _____

cc: _____
cc: _____

cc: _____

cc: _____

cc: _____

cc: _____

13.VI.72
 מספר חשבונית
 מדינת ישראל
 4112
 חוזה מס' 99039/43929/72
 2731 do
 כן אני מאשר כי המסמך המקורי
 נמצא בידי האוצר
 והמסמך הסדור המופיע לצד
 הבת הוא
 5533
 חתומה

002.00
 חוזה חוב
 מס' 99039/43929/72

חוזה זה נערך ונחתם ביום 12 לחודש יוני שנה 1972

בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון. (שחקרא להלן "הממשלה") מצד אחד.
 לבין

חב"א אשטרום בע"מ (שיקרא להלן "הקבלן" מצד שני).

הואיל והממשלה רואה בכיצועו של המבנה. היינו הקמת 14 בתים טרופיים בפחחתה רפיה ב"

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום לביצוע המבנה, תמורת סך 667,800.- ל"י
 שש מאות ששים ושבע אלף שמונה מאות לירות (כמילים)

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

האוצר		מספר זה הינו כמס' 654
מס' חשבונית	תאריך	כמות
2	19	
2		

- המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
 - הצעתו של הקבלן;
 - תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן;
 - תנאים מיוחדים חוספת א'.
 - מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באחר.
 - מפרט כללי לטיח גבס.
 - האור מפורט של רשימת כמויות מקוצרת (אפריל 1966)
 - תנאים כלליים עבור אספקת מוצרי אלומיניום של ביה"ר "קליל"
 - אופני מדידה.
 - התכניות;
 -

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה היו כחובות הצדדים כדלהלן:

כחובת הקבלן: חב"א אשטרום בע"מ רח"צירלטון 4, תל - אביב

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל, כאן

ב ביום 12 לחודש יוני שנה 1972


חתימת הממשלה	חתימת הקבלן
עד לחתימה: חתימתו	עד לחתימה: חתימתו
שמו	שמו
כתובתו	כתובתו

אשטרום
 מברה להגושה בע"מ

חנאים מיוחדים

1. סדר התשלומים עבור ביצוע העבודה יהיה נדלקסן:

20%	א. עם התחלת הייצור
30%	ב. לאחר גמר הייצור כולל קביעה אלמנטים של חשמל ונגרות
10%	ג. לאחר גמר היסודות
10%	ד. לאחר גמר הרכבת קירות וגג
7%	ה. לאחר גמר בידוד וריצוף
10%	ו. לאחר גמר הרכבת אינסטלציה, חשמל ונגרות
3%	ז. ע"ח קרן בטוח
5%	ח. לאחר מסירת העבודה והגשת חיבון סופי
5%	ט. לאחר אישור חיבון סופי
<u>100%</u>	סה"כ


אשפזים
חברה להנדסה בנייה

SECRET
CONFIDENTIAL

1. The following information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.

- 2. This information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.
- 3. This information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.
- 4. This information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.
- 5. This information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.
- 6. This information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.
- 7. This information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.
- 8. This information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.
- 9. This information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.
- 10. This information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET
CONFIDENTIAL

2. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 31.3.72. החיקרון לעבודה הנדונה, חיולם בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה המתוקן הוצאה (מדף 3'02) ובהתאם לחנודה מדד הבניה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס מרץ 1972.
3. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על טיב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-תדירה רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מהוזה זה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים בזה למלא את כל התחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי זה.
4. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
5. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד הכון אומי שיתמנה על ידו למטרה זו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
6. מוסכם בין הצדדים כי מהנדס א. גלוברמן מנהל אגף לבניה כפריה יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
7. תאריך גמר העבודה הנ"ל 8. חודשים מיום מסירת הסימון בשטח
8. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך ההימח החוזה נילולים במחיר.
9. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בחשלומי ביניים לחודש האמור על חשבון כר החוזה חור 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
10. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם למ שלה בעד אחר לכל שבוע של מסירה כפיזוי מ קבוע מ מראש 30. - ל ליה"ד שהעבודות תשארנה בלתי גמורות.
11. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) ל תנאי החוזה יהיה סרוך היומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדה 0,2% היקף החוזה, בי כוח זה נכללות בדיקות הוזרות תצורתם יהוייב הקבל בלבד (נוסך על 0,2% הסנוכה)
12. הרשות בידי משרד השכון לבצע עבודות בשלבים בהתאם להתקדמות הבניה המקוה אך בכפיפות לתהליך פינני השטחים אשר בהו י צורך לבצע עבודות פייות במסגרת חוזה זה.
13. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרו בטוח והחבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
14. הרשות בידי משרד השכון להעביר את האחריות הקבלן לטיב העבודה וביזוי התיקונים השנתיים לפי פרק ח' סעיף 53 של תנאי החוזה. המירה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לידי _____.
15. לפני מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי על העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני יוגו לידיה החשבון.
16. הספקה מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והחקוה קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להספקה מים קבועה) יהיה על חשבון הקבלן.
17. הכנה דרכים זמניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
18. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צאץ יומם משרד למפקח מומם הממלה.
19. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את השטח הנבוי ואח כל יתר הגורמים העלוליה להסריע על היצוע העבודה.
20. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימצא הקולנו למ מלה להביחה נילויי החיי חוזה על פי החוזה ערבות בנקאיה או ערבות על חוה ח בחוזה להנחה דעתה ל המימלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בחוזה לאמור בפרק א' סעיף 8.

מוסכם בין הצדדים כי משרד השיכון ישלם באופן ישיר את התשלומים לקרן בטוח של
הסתדרות פועלי הבניין ע"ה הקבלן. הסכום שינוכה יועבר לקרן בטוח של הסתדרות פועלי
הבניין והחשבון הסופי יסודר ישירות בין הקבלן לבין קרן בטוח של הסתדרות פועלי הבניין.

הקבלן חייב לשלם את המיסים הדרושים ע"י מוסד לבטוח לאומי וכדומה.

התשלומים ע"ה הטבות סוציאליות אחרות יסודרו על ידי הקבלן.

הקבלן חייב להגיש לקרן בטוח של פועלי הבניין בכל חודש דרישת שכר העבודה, בין בעבודה
יומית ובין בעבודה קבלנית. תכלול את שם המנהל, מקום מגוריו וטירו, במקרה של עבודה
יומית, או שם ראש הקבוצה מקום מגוריו והיקף הישולם הכללי במקרה של עבודה קבלנית.

