

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

1-10

מדינת ישראל
גנזך המדינה

יש להחזיר את התיקים לגנזך המדינה, לא יאוחר
מ-60 ימים מתאריך 18.7.13

יוני 10'13

כצוות לקניית אכילוס

1.82 - 6.82

מדינת ישראל
ארכיון המדינה

10

גל

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון



מחוז ירושלים - בניה עירונית צו

גל - 10 / 15425

מס פריט: 199686
מס פרט: 109.10/6 - 10
תאריך: 18/07/2013
מס מסמך: 02-113-01-09-06

מזהה פיזי:
מזהה לוגי:
כתובת:

מחלקה

מקום ירושלים
בניין קניית אכילוס

תיק מס'

1-10

משרד הכינוי והשיכון
צוות ההקמה מעלה - אדומים

תאריך _____

לכבוד _____

ג.א.נ.,

צוות הקמה מעלה אדומים מברך אותכם לרגל רכישת דירתכם בעיר הנבנית מעלה-אדומים.

לצורך התארגנות, לקראת איכלוס העיר, אנו מעוניינים במידע אודות משפחתכם. לפניכם שאלון, אותו אנו מבקשים שתמלאו וחשלתו בחוזר, באמצעות המעטפה המבוטלת הרצ"ב.

א. פרטים אודות ראש המשפחה

שם משפחה	שם פרטי	מס' ה.ז.
ארץ מוצא	שנה עליה	כתובת נוכחית
מס' טל'	השכלה	מס' שנות לימוד
מקצוע	עיסוק	תפקיד
שם וכתובת מקום העבודה		

ב. פרטים אודות בת הזוג

שם משפחה	שם פרטי	מס' ה.ז.
ארץ מוצא	שנה עליה	כתובת נוכחית
מס' טל'	השכלה	מס' שנות לימוד
מקצוע	עיסוק	תפקיד
שם וכתובת מקום העבודה		

ג. סה"כ ילדים (כולל נשואים): _____

מס' 152
תאריך 15/11/52

STATE OF TEXAS

COUNTY OF _____

THIS _____ DAY OF _____ 19____

_____ of the County of _____ State of Texas, do hereby certify that _____ is the true and correct copy of the _____ as the same appears from the _____

_____ of the County of _____ State of Texas, do hereby certify that _____ is the true and correct copy of the _____ as the same appears from the _____

_____ of the County of _____ State of Texas, do hereby certify that _____ is the true and correct copy of the _____ as the same appears from the _____

WITNESSED my hand and seal of office this _____ day of _____ 19____

NAME	ADDRESS	CITY
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

WITNESSED my hand and seal of office this _____ day of _____ 19____

NAME	ADDRESS	CITY
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

WITNESSED my hand and seal of office this _____ day of _____ 19____

7. פרטים אודות הנפשות הסמוכות על שולחן ראש המשפחה (ילדים, נלווים ואחרים העתידים לעבור לגור עם המשפחה במעלה-אדומים, כולל ילדים בפנימיות/מוסדות וכד').

מס' משפחה	שם המשפחה	שם פרטי	שנת לידה	קירבה לראש המשפחה	מס' שנות לימוד	פרטי העסוק, מקום עבודה, למודים וע
.1						
.2						
.3						
.4						
.5						
.6						
.7						
.8						

ה. סמן ב-X סוג זכאותך/כם במשרד הבינוי והשיכון

- זוג צעיר
- עולים חדשים
- השבת תנאי דיור
- חסרי דיור
- בודדים חסרי דיור
- זכאים בתכניה 3+
- חוסכים במפעל חסכון לבנין
- חוסכי תכניה בר-מצווה


ו. אם הזכאות נקבעה בגלל היותכם "זוג צעיר" ציין את גובה הניקוד שנקבע לכם _____.

ז. ציין האם בבעלותכם רכב פרטי _____.

ח. האם את/אתה חברים במשמר האזרחי. _____.

ט. סמן X במשבצת המתאימה - האם היית מעונין שילדיך ילמדו בבי"ס ממלכתי ממלכתי דתי

י. ה ע ר ו ח : _____

ב ב ר כ ה

 ג. איכפלד
 ראש צוות ההקמה

אמיץ
הכנה לקראת
אנליס

לחיוך



22.6.1982
מספרנו: 1830

דף 1
מחוק

זכרון דברים מיום 20.6.82 נרשם ע"י אביגדור לוי

הנושא: ישיבת איכלוס

מקום	מועצה מקומית מעלה אדומים	משרד הבינוי והשיכון	נוכחים:
משרדי צוות הקמה	מר עמוס טרטמן מר חנן מנדל מר צדוק אושני מר עוז נחמיה גב' אורנה הירשפלד מר אביגדור לוי	מר שמריהו כהן מר קוקוש מר גיל ✓ גב' צביה	

צוות הקמה
 מר לופו לזר
 מר בוריס

מר בנימין וייל
 מר ראובן

מר שמריהו כהן: משרד השיכון לוקח על עצמו לבדוק את נושאי תכנון וביצוע מערכת המים.

חנניות

מר שמריהו כהן: היום גיל יצור קשר בין אגף בכטיס וגזברות. משרד השיכון כל יום פועל בנושא. לגבי החתימה "אני יודע שהחברה לפיתוח צריכה לחתום עם שו"פ ואני אטפל בכך".

עמוס: בעיה של הפועלים - יש לדאוג שכולם פרט לשומרים יתרכזו בלילה באזור 04.

שמריהו: הדבר יבוצע.

עמוס: מפרצי חניה מאגד?

לופו: עד סוף החודש יבוצע.

עמוס: נושא חדר נשק - גדעון אמר שקיימת אפשרות שמשרד אלרם ימסר למועצה לחדר נשק.

שמריהו: העניין יבדק.

גני ילדים

חנן: ל-1 לספטמבר אנו זקוקים לפי בדיקה ל-7 גנים. המצב בפועל - קיימים 6 גנים, חסר גן אחד.

גדעון הציע את חדר הישיבות בבנין צוות הקמה, ההצעה לא ניראת מסיבות שונות של מבנה משרדים ומסחר, לכך בקשתינו שחדר הישיבות ימסר למח' מהנדס העיר ואז דירת מהנדס העיר תימסר לגן. מה שצריך זה שמשרד השיכון יגדר את חצר הדירה.



דף 2

מחור

זכרון דברים מיום נרשם ע"י

הנושא:

מקום

נוכחים:

גבי ילדים (המשך)

שמריהו: הפתרון נראה סביר ועקרונית העניין מקובל.
חנן: מבקש לקבוע מועד סופי להחלטה וביצוע.
שמריהו: אם הבעיה תהיה למסור את חדר הישיבות למהנדס העיר אזי נסתדר.

אגרות בניה

עמוס: ליובל-גד ואשטרום ב-02 צריכים להעביר.
שמריהו: גדעון מסר שמשד השיכון ישלם.
עמוס: ידאג לטפל בהעברת הכסף ממשד השיכון לפי החעריפים הארציים.
שמריהו: בנושא שינויים במבנה צוות הקמה, לטניף הדואר, למעון, למשרדי המועצה, קופ"ח, טיפת חלב.
לופו: העניין יצא למכרז.
שמריהו: החומר לשינויים נמצא.
עמוס: מצא של הדואר ושל קופ"ח צריך לברר איפה זה.
שמריהו: גיל ירכז את השינויים הדחופים ואחרי אישור של קוקוש הם יעברו למכרז - ובנוגע לדברים נוספים, כל פעם שהגיע דרישה נבצע.

אבילגדור לוי



המועצה המקומית

מעלה אדומים

6.6.1982

מספרנו: 1800

גלוי
מספר 1800
למיין

לכבוד
מר גדעון הוכפלד
ראש צוות הקמה מעלה אדומים
משרד הבינוי והשיכון
רח' בן יהודה 23
ירושלים

א.נ..

הנדון: נושאים לטיפול

- (1) מסירת המכולת למועצה לצרכי השכרה.
עבר זמן רב מאז המכרז וטרם קיבלנו לידנו את החנות. אבקש לקדם
הטיפול בנושא זה בדחיפות, אם לא נאלץ למשוך ידנו מהנושא.
- (2) מסירת מחסן נשק למחלקת הבטחון של המועצה.
- (3) התקנת מיתקני בטחון, סורגים ודלתות בטחון לה-4 וה-7.
- (4) הכנת תכנית סטנדרטית לסגירת מרפסות ב-ד-5' בהתאם להתחייבותכם.
יש בקשות מצד משפחות לסגירת המרפסות.

ב ב ר כ ה

עמוס טרטמן
ראש המועצה

החלטות
27.5.82

27.5.1982

מספרנו: 1772



זכרון דברים מיום 23.5.82 נרשם ע"י גולדשטיין

דף 1 מתוך

הנושא: דיון לקראת איכלוס מעלה אדומים

נוכחים: מועצה מקומית מעלה אדומים
עמוס טרסמן - ראש המועצה
ישראל גולדשטיין - מזכיר המועצה
חנן מנדל - מנהל המחלקה לחינוך ותרבות
משה אקנין - מהנדס המועצה
אביגדור לוי - גזבר

מקום
מעלה אדומים

אושני צדוק - קב"ט
אורנה הירשפלד - עובדת רווחה
נחמיה עוז
ובר אלי

משהבי"ש
הוכפלד גדעון-ראש צוות הקמה מעלה אדומים
עובדיה דוד
יוסי זרבי
לופו לזר

(1) להלן סיכום הישיבה

א. בסחון שוטף

- (1) המועצה סיכמה עם המערכת הבטחונית כי עם האיכלוס יוקצה כח מיוחד לחגבור השמירה והאבטחה במקום.
- (2) הוחלט כי משרד דוד עובדיה יורה את הקבלנים בשטח כי יוודאו כי הפועלים המקומיים הנשארים ללון באתר העיר ילונו בעקרון באתר 04 למעט השומרים.

ב. מים

הועלה נושא התחברות לא חוקית למערכת המים ע"י קבלני בניה ואחרים. המועצה תפעיל פיקוח יתר רציני בתקופה הקרובה למתן פתרון לבעים. כמו-כן נאמר ע"י מר הוכפלד בחשונה לשאלה כי משהבי"ש העביר למקורות את עלות המים שבבריכה עבור 2000 מ³.

2/...

זכרון דברים מיום נרשם ע"י
 דף 2
 מתוך

הנושא:

נוכחים: _____
 מקום: _____

ג. חשמל

- 1) גדעון מוטר כי החל בחודש מאי תהיה רשת החשמל מוכנה וכן תהיה אספקת חשמל. כן מטר גדעון כי המועצה תיפגש עם נציג חב' החשמל לחתימת חוזה עבור תאורת רחובות. יש לפנות למנהל מוטטאפה או למנסור.
- 2) משהבי"ש יעביר את תכניות החשמל למועצה המקומית (עדכון לאחר ביצוע) כולל מיקום עמודים, חיבורים, מעברים וכד'.

ד. פינוי אשפה

- 1) יוסי דרעי מוטר כי כל מכולות האשפה הוזמנו ע"י הקבלנים.
- 2) גדעון מוטר כי יש סיכום עקרוני עם ערית י-ם לגבי שימוש במזבלה של עיריית ירושלים.

ה. גני ילדים

דוד עובדיה מדווח כי גני הילדים במבנן ה-4 יומטרו למועצה ב-1.7.82.

ו. פינוי משחקים

חנן מנדל מעלה דרישה לשת פנות משחקים האחת במבנן ה-4 והשניה באזור מבנן רמ"ט. לדברי דוד עובדיה פינוי משחק אלה תהינה מוכנות עד סוף חודש יוני 1982.

ז. מעונות גיל רך

גדעון הוכפלד מבקש מהמועצה לעניין את ארגון נעמת וארגון ויצ"ו בחדרים המיועדים למעון במבנה הצהוב. כן מוטר גדעון כי משהבי"ש יתקין את האביזרים ויבצע השינויים על פי דרישות הארגון אשר יקח על עצמו את אחריות ההפעלה.

3/...



Page 2

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

STANDARD

STANDARD

STANDARD

1. SCOPE

1.1 This standard covers the nomenclature and classification of the various types of...

2. REFERENCES

2.1 The following standards of the American Society of Mechanical Engineers (ASME) are referred to in this standard...

3. DEFINITIONS

3.1 The following definitions apply to the terms used in this standard...

4. NOMENCLATURE

4.1 The following nomenclature is used in this standard...

5. CLASSIFICATION

5.1 The following classification is used in this standard...

...



זכרון דברים מיום..... נרשם ע"י.....
דף.....
מחוך.....

הנושא:

נוכחים: _____
מקום: _____

ה. מבנה בית ספר

מבנה בית הספר יועבר למועצה עד 1 ליולי 1982 לכל המאוחר.

ט. חוזי שכירות במבנה הצהוב

חדרים המיועדים להשכרה ע"י:-

קופ"ח כללית.

דאר ישראל.

מדי"א.

ארגון הנשים אשר יפעיל המעון.

יועברו לארגונים אלה לאחר חתימת חוזי שכירות עם שו"פ.

ישראל גולדשטיין

העתקים: נוכחים

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ
רח' בזל 6/17, באר-שבע 84288, טל. 78349, ת"ד 7001, באר-שבע 84241

אכסוס
מאגא
אפוס
היא

באר-שבע 9.5.82
דף מס'

הפרויקט מעלה אדומים

דיון מס' 516

הנושא: א י כ ל ו ס

התקיים ב: א ת ר בתאריך 4.5.82

נוכחים: ח"ה ע. טרעמן, ג. עוז, צדוק, מ. עקנין, חנון, אביגדור - מועצה מקומית
ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה
ד. עובדיה, ל. לופו, י. דראי - נהול פרויקט

בטחון

מר טרעמן מוסר כי עפ"י שיחות עם הצבא הובטח כי למבנות שיאוכלסו בשלב ראשון (מבנים ה-7, ה-4) חנתן אבטחה.

חשמל

המועצה חפנה לחברת החשמל להזמנה חשמל לאלמנטים ציבוריים (בעיקר תאורה).

תימור

חכ' תמורר חוכן ע"י משהב"ש. התכנית תאושר ע"י מר בצראי. נמטרה התראה למ.ע.צ. בקשר להצבת תימורר.

צרכניה

לאור הודעת שו"פ כי החלק של החנויות במרכז יושלם בקרוב, הוחלט ע"י משהב"ש לבטל הצרכניה שתוכננה במבנה צוות ההקמה ולהעבירה למרכז המסחרי.

דאר

מר טרעמן יטפל בפתיחת סוכנות דאר.

מכולות אשפה

מר ד. עובדיה יוסר כי כל מכולות האשפה הוזמנו (בהתאם לסיכום עם המועצה בנושא).

קופ"ח, מ.ד.א. מבנה צוות הקמה

מר טרעמן יבדוק עם הגופים הני"ל מועד הפעלה משוער, ויודיע על כך מר ג. הוכפלד.

אספקת חשמל זמנית למבנה צוות הקמה

מר טרעמן יבדוק אפשרות לספק חשמל למבנה, באמצעות גנרטור, עד לביצוע החיבור ע"י ח"ה.

מבנה טרום אטבסט

המועצה הזמינה שני מבני משרדים אשר יוצבו בסמוך למבנה צוות ההקמה. ההעמדה בעשתה בתאום עם אדריכל ט. לייטרטדורף.

משהב"ש יבצע הכשרת שטח וכן קוי מיט וביוב עבור המבנה הני"ל.

ר ש מ: י. דראי תמונה לנוכחים ו: ח"ה ש. כהן, ל. קוקוש, א. גדלביץ, ג. אנגל

אני קורא אילום

מזכר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

אל: גני בגור - מנהל יחידת המדע והטכנולוגיה

התאריך: 22.4.20

באות: ד"ר רובל


חוק מס'

הנדון:

ואשר למינוי בגור גמל

במסגרת פיתוחו של פרויקט 5.4.82 הניח להקצות
ביחידת המדע והטכנולוגיה מינוי בגור גמל
בגובה שכר של 160,000 ש"ח

מינוי בגור גמל ביום 18.4.82 כמפורט בטבלה
הצורפת מתבסס על הצירוף האזורי של
אזור ארץ מוזיקה לישראל החדש

היו"ד


אסאס מ כל

9.4.82

באר-שבע
דף מס'

הפרויקט מעלה אדומים

דיון מס' 495

הנרשאי: כ ל ל י

6.4.82 בתאריך

התקיים ב א ת ר

נוכחים: הי"ה ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה, משהבי"ש י-ם
דוד, לזר, יוסי - נהול הפרויקט

Handwritten notes in the left margin, including a large arrow pointing to the top left and some illegible text.

1. יש לבצע גידור זמני לחצר כחת גן הילדים וסגירה זמנית של ח"מ כולל דלת.

2. תזמן פגישה בהשתתפות המועצה, משהבי"ש, קופ"ח מחוז י-ם לאיתור מיקום קופ ח. 21.4.82

3. יש לחבר תאורת המעבר המקורה במבנן ה-4 לתאורת חוץ.

4. להעביר תכ' של תואי כביש הגישה באזור ירושלים למן ג. הוכפלד לצורך מניעת בניה בלתי חוקית בתואי.

5. בטיחות באתר - יבוצעו עם מ.ע.צ. בעיקר גידור ושלוט.

6. נטיעת עצים מבוגרים - מנהל הפרויקט יבדוק בהערכה הפרש העלויות לפי אזורים. מר ג. הוכפלד יביא הנושא לוועדת תאום.

7. שינויים במבנה צות הקמה - מנהל הפרויקט יתקשר עם מר שמואל בוכבלטר מאגודת הצרכניות לצורך תאום וביצוע השינויים הדרושים להתאמת המבנה לצרכניה. יש לקבל אישור של מר קוקוש לבצוע השינויים במבנה צות ההקמה.

8. יש לבדוק אפשרות טיפול בחלקות במערכות בעת האכלוס ולאחריו - (Handwritten note: ציוד להחזרת האוכלוסין)
9. הגדלת חצר מעון במרכז - יש להרחיק את גדר החצר כ-2 מטר לכוון הקרובית בתאום עם המתכנן.

10. יש לעקוב אחר הזמנת מכולות האפשה ע"י החברות.

11. יש להזמין הנחת קו מים לצורך השקית שטחי יעור מתחת לאתר 04.

12. יוזמנו מתקני משחקים נוספים לגן הילדים ליד מבנן ה-4.

13. תזמן פגישה בקשר לבצוע גן הילדים וביה"ס נוספים לקראת שנה"ל הבאה.

14. יש לתכנן תאורה למגרש כדורסל, אישור סופי לביצוע התאורה ינתן ע"י מר הוכפלד.

15. שילוט מואר מבוצע ע"י משהבי"ש באמצעות הקבלן המבצע את תאורת הרחובות. הצבת עמודי השלוט תבצע ישירות ע"י המועצה. (Handwritten note: על יד יוני)

16. תבדק אפשרות להכשיר דרכי השורות לקוי הביוב כדרך פטרוליסם.

17. עד לאיכלוס תבוצע גדר בטיחות סביב לאתר הארכיאולוגי. (Handwritten note: אסאס מ כל)

ר ש ם : יוסי דראי תפוצה לנוכחים ר' הי"ה ש. כהן, ל. קוקוש

Handwritten signature at the bottom of the page.

Call for
1936

מעלה אדומים - עבודות לביצוע לקראת אכלוס. אפריל - 82

ה-4 יובל גד - 152 יח"ד

מס.	תאור העבודה	בביצוע ע"י	תאריך גמר
1.	סיום עבודות הפיתוח הציבורי והפרטי למבנן.	משהב"ש(פנאני)	15.4.82
2.	סיום עבודות המים, חיבור כביש ג' והשלמת קווי המים מעל המעבר בכביש הגן.	מע"צ (חרות)	30.3.82
3.	בדיקות אטום קירות חוץ.	יובל גד	15.4.82
4.	בדיקות אינסטלציה פנימית.	יובל גד	15.4.82
5.	בדיקות חברת החשמל בתוך המבנים.	ח"ח, יובל גד	15.4.82
6.	בדיקות העבודות בתוך הדירות (קונסטרוקציה ואינסטלציה).	יהל, יובל גד	15.4.82
7.	תיקונים אחרי הבדיקות.	יהל, יובל גד	30.4.82
8.	השלמת העבודות לגז מרכזי.	סופרגז, יובל גד	30.3.82
9.	מסירת שתי חנויות להפעלה.	יובל גד	30.4.82

ה-7 יובל גד - 168 יח"ד

מס.	תאורה העבודה	בביצוע ע"י	תאריך גמר
1.	סיום עבודות הפיתוח הצמוד.	יובל גד	15.3.82
2.	סיום קירות תומכים לשתי החנויות בכביש א'.	יובל גד	30.3.82
3.	סיום החנויות	מ.ע.צ.	30.4.82
4.	סיום עבודות הפיתוח הציבורי	יובל גד	לפי לוח זמנים
5.	חיבור ובדיקת מערכת המים.	יובל גד	30.3.82
6.	בדיקות אטום תקרות וקירות חוץ.	יובל גד	15.4.82
7.	בדיקות חברת החשמל בתוך המבנים.	חברת החשמל	15.4.82
8.	בדיקת העבודות בדירות.	יהל, שיכון עובדים יובל גד	30.3.82
9.	תיקונים אחרי הבדיקות	יובל גד	30.4.82
10.	עבודות פיתוח באתר ארכיאולוגי	קמט ארכיאולוגיה	מ-1.4.82
11.	גמר עבודות עפר בשביל, בין מבנן ה-7 ומבנן ד-5-ב	אשטרום	25.3.82
12.	גמר עבודות עפר מאחורי בתים 701 - 703	מע"צ	25.3.82
13.	השלמת עבודות לגז מרכזי	אמישרגז, יובל גד	30.3.82
14.	השלמת קווי תקשורת במבנן	יובל גד	30.3.82

STATE ACCOUNTS - STATE DEPARTMENT OF REVENUE, 1917 - 1918

STATE DEPARTMENT OF REVENUE

NO.	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
1.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	100,000.00
2.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	200,000.00
3.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	300,000.00
4.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	400,000.00
5.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	500,000.00
6.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	600,000.00
7.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	700,000.00
8.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	800,000.00
9.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	900,000.00
10.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	1,000,000.00

STATE DEPARTMENT OF REVENUE

NO.	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
1.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	100,000.00
2.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	200,000.00
3.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	300,000.00
4.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	400,000.00
5.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	500,000.00
6.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	600,000.00
7.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	700,000.00
8.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	800,000.00
9.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	900,000.00
10.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	1,000,000.00
11.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	1,100,000.00
12.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	1,200,000.00
13.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	1,300,000.00
14.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	1,400,000.00
15.	STATE DEPARTMENT OF REVENUE	100,000.00	1,500,000.00

מבנה צוות הקמה

מס.	תאור העבודה	כביצוע ע"י	תאריך גמר
1.	מעון יום: חלוקת כיתות, השלמת שירותים	למכרז	
2.	צרכניה	הפעלה	30.4.82
3.	חיבור חשמל זמני	ח"ח	30.4.82
4.	דואר: התקנת תיבות דואר	משרד התקשורת	30.4.82
5.	משטרה	הפעלה	30.4.82
6.	מכבי אש	הפעלה	30.4.82
7.	משרדים: חלוקת חדרים	למכרז	
8.	קופת-חולים: חלוקת חדרים והכנסת ציוד	קופת-חולים	30.4.82
9.	חיבור טלפונים	משרד התקשורת	30.4.82

עבודות חשמל

מתח גבוה

1.	השלמת קו מ.ג. אל עזריה - מעלה אדומים	חברת חשמל	30.3.82
2.	השלמת הקו החת קרקעי בכביש א' עד טרפו מס' 1	ח"ח	5.4.82
3.	השלמת הקו בין טרפו מס' 1 לטרפו מס' 2	ח"ח	5.4.82
4.	השלמת העבודות בביתני טרפו מס' 1 ומס' 2	ח"ח	5.4.82

מתח נמוך

1.	השלמת עבודות החשמל החיצוני במבננים ה-4, ה-7, צוות הקמה, קרון תקשורת ומרכזית תאורה	ח"ח	5.4.82
2.	השלמת עבודות החשמל בתוך מבננים ה-4, ה-7	ח"ח	5.4.82
3.	חיבור חשמל לתאורת כבישים א' ו- ג'	ח"ח	20.4.82

קוי תקשורת ראשיים

1.	העמדת מרכזית טלפונים זמנית (קרון)	משרד התקשורת	30.3.82
2.	השלמת קו ראשי לחדרי מאגדים	משרד התקשורת-מע"צ	30.3.82
3.	השלמת העבודות בתוך המאגדים	משרד התקשורת	30.3.82
4.	השחלת חוטים למבננים	משרד התקשורת	30.3.82

STATE OF TEXAS

<u>NO.</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>QUANTITY</u>	<u>UNIT PRICE</u>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

STATE OF TEXAS

NO.

1.
2.
3.
4.

NO.

1.
2.
3.

STATE OF TEXAS

1.
2.
3.
4.

כביש ג': מצעים, אספלט, תאורה, תקשורת ומים

מס.	תאורה העבודה	בביצוע ע"י	תאריך גמר
1.	השלמת עבודות תאורה	מע"צ	30.3.82
2.	השלמת עבודות מים	מע"צ	30.3.82
3.	השלמת עבודות תקשורת	מע"צ	30.3.82
4.	עבודות להשלמת הכביש : מצעים, אבן שפה ואספלט	מע"צ	30.4.82
5.	קירות תומכים למבנן ד-5-ב	אשטרום	15.3.82
6.	פירוק מנוף גולדשטיין - מבנן ג-6	גולדשטיין	15.3.82
7.	פינוי פריקסטים וחומרי בנין בכביש	אשטרום, גולדשטיין	25.3.82
8.	השלמת קיר תומך בכביש ג'	גולדשטיין	30.3.82

עבודות ביוב ומים

1.	השלמת קוי ביוב לאורך כביש הקרונית במבנן ג-6	גולדשטיין	15.4.82
2.	השלמת קוי מים לאורך כביש הקרונית, ג-6	גולדשטיין	15.4.82
3.	השלמת קו ביוב מאסף כולל הקו הנוסף באורך 800 מטר	מקורות	30.3.82

עבודות מים היצוניים

1.	השלמת עבודות בקו מים אל-עזריה - מעלה אדומים (4 חיבורים באל עזריה)	חרות	30.3.82
2.	בדיקת לחץ לקו אל עזריה	חרות	30.3.82

עבודות כלליות:

1.	מסוף אוטובוסים ותחנות בכביש השבעת	שו"פ, מע"צ	30.4.82
2.	השלמת צומת כניסה	מע"צ	20.4.82
3.	תאורה בכביש השבעת	בן-דוד	30.4.82
4.	חניה וגישה זמנית לביה"ס	מע"צ	30.4.82
5.	פיתוח שטח משחקים באיזור האיבטדיון	מע"צ	30.4.82
6.	גידור אתר ארכיאולוגי	יובל גד	30.4.82

DATA 1: ...

...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DATA 2: ...

1.
2.
3.

DATA 3: ...

1.
2.

DATA 4: ...

1.
2.
3.
4.
5.
6.

פעלה ארומים - עבודות לביצוע לקראת אכלוס. אפריל - מאי

ה-4 יובל גד - 152 יח"ד

מס.	תאורה העבודה	בביצוע ע"י	תאריך גמר
1.	סיום עבודות הפיתוח והטריט למבנה.	משה"ש (מכאני)	15.4.82
2.	סיום עבודות המים, חיבור כביש ג' והשלמת קווי המים	מע"צ (חירות)	30.3.82
3.	פול המעבר בכביש הגן.	יובל גד	15.4.82
4.	בדיקות אטום קירות הוצ'.	יובל גד	15.4.82
5.	בדיקות אינסטלציה פנימית.	ח"ח, יובל גד	15.4.82
6.	בדיקות חברת החשמל בתוך המבנים.	יחל, יובל גד	15.4.82
7.	בדיקות העבודות בתוך הרירות (קונסטרוקציה ואינסטלציה).	יחל, יובל גד	30.4.82
8.	הקונטים אחרי הבדיקות.	סוטרנד, יובל גד	30.3.82
9.	השלמת העבודות לגז מרכזי.	יובל גד	30.4.82
9.	מטירת שתי הנזירות להפעלה.	יובל גד	30.4.82

לדעת אשתי
מאזנת
ומילדות

ה-7 יובל גד - 168 יח"ד

מס.	תאורה העבודה	בביצוע ע"י	תאריך גמר
1.	סיום עבודות הפיתוח המגוד.	יובל גד	15.3.82
2.	סיום קירות הנומטים לשתי הנזירות בכביש א'.	יובל גד	30.3.82
3.	סיום הנזירות	ס.פ.ג.	30.4.82
4.	סיום עבודות הפיתוח והחיבור	יובל גד	למי לוח זמנים
5.	חיבור ובדיקת מערכת המים.	יובל גד	30.3.82
6.	בדיקות אטום הקירות וקירות הוצ'.	יובל גד	15.4.82
7.	בדיקות חברת החשמל בתוך המבנים.	חברת החשמל	15.4.82
8.	בדיקת העבודות בזירות.	יחל, שיכון עובדים יובל גד	30.3.82
9.	הקונטים אחרי הבדיקות	יובל גד	30.4.82
10.	עבודות פיתוח באתר ארכיאולוגי	קסט ארכיאולוגיה	1.4.82-8
11.	גמר עבודות עפר כשביל, בין מבנה ה-7 ומבנה ד-5-2	אטרום	25.3.82
12.	גמר עבודות עפר מאחורי בתים 701 - 703	מע"צ	25.3.82
13.	השלמת עבודות לגז מרכזי	אסיטרנד, יובל גד	30.3.82
14.	השלמת קווי הקטורת במבנה	יובל גד	30.3.82

קצת אשתי
מאזנת
ומילדות

פנקח צוות הקמה

מס. תאריך העבודה	במיצוע ע"י	תאריך גמר
1. מעון יוטו חלוקה כיתה, השלמת פירוטים	לפכרז	
2. ארכיטקטורה	הפעלה	30.4.82
3. חיבור השטל זמני	ח"ח	30.4.82
4. דואריו הקנת היבוח דואר	מסדר התקטורה	30.4.82
5. משטרה	הפעלה	30.4.82
6. מכבי אש	הפעלה	30.4.82
7. ספדריסו חלוקה חדרים	לפכרז	
8. קופת-חולים: חלוקה חדרים והכנסת ציוד	קופת-חולים	30.4.82
9. חיבור טלפונים	מסדר התקטורה	30.4.82

אנדר
31
?

עבודות השטל

פנת גבוה

1. השלמת קו ס.ג. אל עזריה - מעלה אדומים	חברת השטל	30.3.82
2. השלמת הקו החוץ קרקעי בכביש א' עד טרמון סט" 1	ח"ח	5.4.82
3. השלמת הקו בין טרמון סט" 1 לטרמון סט" 2	ח"ח	5.4.82
4. השלמת העבודות בביהמני טרמון סט" 1 ומס" 2	ח"ח	5.4.82

פנת נמוך

1. השלמת עבודות השטל החיצוני במבנים ה-4, ה-7, צוות הקמה, קרון הקטורה ומרכיבית האורה	ח"ח	5.4.82
2. השלמת עבודות השטל בחוף הבנויים ה-4, ה-7	ח"ח	5.4.82
3. חיבור השטל לתאורה מביטים א' ו-ג'	ח"ח	20.4.82

קני תקטורה רישיים

1. הקמת מרכיבית טלפונים זמנית (קרון)	מסדר התקטורה	30.3.82
2. השלמת קו רישוי לחודי מאגרים	מסדר התקטורה-מע"ג	30.3.82
3. השלמת העבודות בחוף המאגרים	מסדר התקטורה	30.3.82
4. החזלת חוטים למבנים	מסדר התקטורה	30.3.82

9.4.82

באר-שבע

מעלה אדומים

הפרויקט

495

דיון מס'

דף מס'

הנושא: כ ל ל י

בתאריך 6.4.82

התקיים ב א ת ר

נוכחים: הי"ה ג. הוכפלד - ראש צוות הקמה, משהבי"ש י-ם
דוד, לזר, יוסי - נהול הפרויקט

- יש לבצע גידור זמני לחצר כחת גן הילדים וסגירה זמנית של ח"מ כולל דלת.
- תזומן פגישה בהשתתפות המועצה, משהבי"ש, קופ"ח מחוז י-ם לאיתור מיקום קופ ח.
- יש לחבר תאורת המעבר המקורה במבנן ה-4 לתאורת חוץ.
- להעביר תכ' של תואי כביש הגישה באזור ירושלים למר ג. הוכפלד לצורך מניעת בניה בלתי חוקית בתואי.
- בטיחות באתר - יבוצעו עם מ.ע.צ. בעיקר גידור ושלוט.
- נטעת עצים מבוגרים - מנהל הפרויקט יבדוק בהערכה הפרש העלויות לפי אזורים. מר ג. הוכפלד יביא הנושא לוועדת תאום.
- שינויים במבנה צות הקמה - מנהל הפרויקט יתקשר עם מר שמואל בוכבלטר מאגודת הצרכניות לצורך תאום וביצוע השינויים הדרושים להתאמת המבנה לצרכניה, יש לקבל אישור של מר קוקוש לבצוע השינויים במבנה צות הקמה.
- יש לבדוק אפשרות טיפול בחלקות במערכות בעת האזלוס ולאחריו
- הגדלת חצר מעון במרכז - יש להרחיק את גדר החצר כ-2 מטר לכוון הקרונית בתאום עם המתכנן.
- יש לעקוב אחר הזמנת מכולות האפשה ע"י החברות.
- יש להזמין הנחת קו מים לצורך השקית שטחי יעור מתחת לאתר 04.
- יוזמנו מתקני משחקים נוספים לגן הילדים ליד מבנן ה-4.
- תזומן פגישה בקשר לבצוע גן הילדים וביה"ס נוספים לקראת שנה"ל הבאה.
- יש לתכנן תאורה למגרש כדורסל, אישור סופי לביצוע התאורה ינתן ע"י מר הוכפלד.
- שילוט מואר מבוצע ע"י משהבי"ש באמצעות הקבלן המבצע את תאורת הרחובות. הצנת עמודי השלוט תתבצע ישירות ע"י המועצה.
- תבדק אפשרות להכשיר דרכי השורות לקוי הביוב כדרך פטרולים.
- עד לאיכלוס תבוצע גדר בטיחות סביב לאתר הארכיאולוגי.

הי"ה ש. כהן, ל. קוקוש

יוסי דראי

ר ש מ: תפוצה לנוכחים ר



המועצה המקומית

מעלה אדומים

2.4.1982

מספר: 1587

תכנית מעבר והתארגנות

לפי הצווי, האיכלוס של העיר יתחיל במאי 1982.

פונקציות הכרחיות מיד עם האיכלוס:

1. אספקת מיט.
2. אינטורמציה לתושב - עדכון איכלוס הדירות.
3. מחלקת חינוך - רישום, ארגון פעולות תרבות.
4. מחלקת רווחה - מעונות, איתור בעיות.
5. פונקציה של הנהלת הרישות.
6. בטחון.

עטיי התכנית לעדו לרישות המועצה המבניט הבאיט:

- | | |
|---------|--|
| 15.4.82 | 1. 2.5 אולמות במבנה צוות הקמה |
| 30.5.82 | 2. (א) מבנה טרומאטבסט |
| 30.5.82 | (ב) מבנה טרומאטבסט |
| 1.5.82 | 3. מבנה (קוטג'י) 4 חדרים (גולדשטיין 3-6) |

היחידות הדורשות איכלוס:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| א. ראש המועצה | 1. הנהלת הרישות |
| ב. מזכיר מועצה | |
| ג. מזכירות המועצה | |
| ד. קבלת קהל | |
| ה. קביט | |
| א. גזבר | 2. גזברות |
| ב. הנהלת חשבונות | |
| ג. גביה | |
| ד. קניין | |
| א. מנהל מחלקה | 3. חינוך |
| ב. רכז חינוך בלתי פורמלי | |
| ג. מזכירה / רכזת גנים | |
| ד. מזכירה | |

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 1/15/54

TO: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

On 1/14/54, [Illegible] advised that [Illegible]

[Illegible]

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]
- 4. [Illegible]
- 5. [Illegible]

[Illegible]

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]
- 4. [Illegible]

[Illegible]

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]
- 4. [Illegible]
- 5. [Illegible]

- 6. [Illegible]
- 7. [Illegible]
- 8. [Illegible]
- 9. [Illegible]

- 10. [Illegible]
- 11. [Illegible]
- 12. [Illegible]

END



המקומית




המועצה

מעלה אדומים

- 2 -

- 4. רווחה
 - א. מנהל לשכה
 - ב. פקידת זכאות
 - 5. שירותי הבדסה
 - א. מנהל מחלקה
 - ב. פקוח
 - ג. פונקציות שונות: מיט, הברואה, אחזקה וכדי
 - 6. ועדה מקומית
 - א. מזכיר הועדה
 - ב. פקח בנין
- מזכירה / שרספת

(1) מבנה ציור הקמה






3/...



MINISTRY OF EDUCATION
GENERAL EXAMINATIONS

- 5 -

1. Which of the following is not a part of the curriculum?
- Physical Education
 - Art
 - Music
 - Home Science
2. Which of the following is not a part of the curriculum?
- Physical Education
 - Art
 - Music
 - Home Science
3. Which of the following is not a part of the curriculum?
- Physical Education
 - Art
 - Music
 - Home Science






המועצה המקומית
מעלה אדומים

- 3 -

(2) מבנה סרוואטסט



מזלזל מזלזל	מזלזל מזלזל	מזלזל מזלזל
מזלזל מזלזל	מזלזל מזלזל	מזלזל מזלזל



(3) מבנה גולדסטין 4 חדרים
חינוך, רווחה, תחביבים
בשלב א' 15.4.82

עם קבלת המשרדים במבנה צורת הקמה יעלו וימוקמו הפונקציות הבאות:

לפי התרשים




א/...



INSTITUTION NAME
 ADDRESS

1) PART OF CIRCUIT


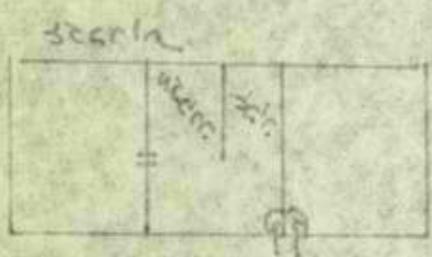


400V 100Ω	400V 200Ω	400V 100Ω
100Ω 200Ω	200Ω	100Ω 200Ω

2) WITH THE HELP OF A CIRCUIT
 ANALYZE THE CIRCUIT
 AND FIND THE CURRENT

OR WITH THE HELP OF A CIRCUIT ANALYZE THE CIRCUIT AND FIND THE CURRENT

3) ANALYZE



100V



המועצה המקומית

מעלה אדומים

- 4 -

אמצעים נדרשים:

- א. כח-אדם לאיוש התפקידים
- ב. קביעת שעות קבלה-קהל
- ג. טלפונים א 2
- ד. מרוסקס לחוטב, מיט, חשמל, גז, שרותי בריאות, שרותי חינוך, בטחון, הרבות וכד'

שלב ב'

עם קבלה יתרת המשרדים תתארגן המועצה לאספקת השרותים בעיר.

משרדים נוכחים

שרותים מטויימים יטארו בשלב זה במשרדים הנוכחים.

- א. משרדי הנהלת המועצה
- ב. רכז אחזקה 1. ירכז את האחזקה ביישוב וכן את נושאי הגיבון וכד'
2. ירכז את הטיפול באחזקה אזור התעסיה בשלב הראשון
- ג. יתכנה לתכנון ופיתוח מעלה אדומים.

משימות לביצוע:

1. הזמנה התקנות, טלפון, מיט, חשמל.
2. קביעת מיקום טופי של מחלקות.
3. הזמנה ריחוט מתאים.



DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

MEMORANDUM

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]
- 3. [Illegible]

RECOMMENDATION

[Illegible text]

CONCLUSION

[Illegible text]

[Illegible text]

- 1. [Illegible]
- 2. [Illegible]

[Illegible text]

DISPOSITION

- 1. [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

כנסון חשבונית

מדינת ישראל

התקן המסלולי לפיקוח ארבעה

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ט' בניסן תשמ"ב
2 אפריל 1982
מספר:

רשימת הנולדה מ - 2.4.82

בוכחים : שמריהו, דבורה, קוקוש, נר-נתן, הוכפלד, בני, גדלביץ,
אליבועד, רנה.

1. סיכום הפעלת הפרוגרמה 1981 :
3293 מחנך 5253 62.7% למעלה מ- 40% מכלל הפרוגרמה הארצית.
2. דיווח על ההכנות לאכלוס מ. אדומים, יערכו סיורים כל שבוע. גדעון אחראי
לאתור הנעיות ולהציע פתרונות זמניים. יש להקפיד במיוחד בנושא הכתיחות
חשוב שיהיה שילוט גם אם הוא זמני. הנושא התקציבי יטופל ישירות ע' שמריהו כהן
עם המנכ"ל.
3. מכירת דירות בגבעון :
פורסמו 96 יח"ד עד אמש ברשמו 115 מועמדים, ההגרלה תקיים ביום ג'.
4. הלואות משלימות למכירת דירות בעיר ירושלים.
5. איסור על מסירת מידע.
6. פרויקט בג'וינט בגילה - פרסום הדירות לאיכלוס.
7. תהליך התכנון - הנושא בבדיקה של איתן סורוקה, בינתים עובדים כמקובל. יש
לחאם (לא לאשר) החפלות הדירות עם אגף בכסים ודירור.
8. אחורים : יש להצדיק ולהסדיר עם הממונים.
9. בוחל אישור בסיעות לחו"ל.
10. ועדה לבדיקת עומס העבודה : אנגל, גדלביץ, סימן טוב,
חנדוק : מבנה ארגוני, חקנים ואיכויות.

רשומה : רנה זמיר



1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

24.8.22
מנהל
מנהל

הגדרת - 13

מיון - 1010 - 1010

מיון - 1010 - 1010
מיון - 1010 - 1010

מיון
מיון

מיון - 1010 - 1010
מיון - 1010 - 1010

מיון - 1010 - 1010
מיון - 1010 - 1010

מיון - 1010 - 1010
מיון - 1010 - 1010

מיון - 1010 - 1010
מיון - 1010 - 1010

מיון - 1010 - 1010
מיון - 1010 - 1010

~~Handwritten text, possibly a title or introductory sentence~~

~~Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script~~

~~Second section of handwritten text, appearing as a separate paragraph~~

~~Third section of handwritten text, continuing the narrative or list~~

~~Fourth section of handwritten text, possibly a concluding paragraph~~

2/1/19

From 2.1.19
to 2.1.19

✓



29.3.82

מס' 100

מס' 100

ע' ב' א' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י'

מס' 100

1. ג' ב' א'


2. י' ז' ח' ט'

3. א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י'

ה' א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י'

21.3.82 א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י'

מס' 100
מס' 100
מס' 100



Handwritten notes and signatures in the top left corner.

הפרויקט

מעלה אדומים

דיון מס' 447

27.1.82 בארשבע

דף מס' 1

הנושא : הכנות לאכלוס

התקיים ב : משרדי צוות הקמה - מעלה אדומים

בתיאריך 24.1.82

נוכחים :	
ג"ב ר. זמיר	- משהבי"ש י-ם
ה"ה ש. כהן	- מנהל משהבי"ש י-ם
ל. קוקוש	- מנהל מח' טכנית
א. גדלביץ	- ס/מנהל המח' הטכנית
א. זילבר	- מהנדס כבישים
ג. אנגל	- מהנדס חשמל,
א. דוג'ה	- מהנדס מים וביוב
ב. דביר	- מנהל יח' פרוגרמות
ה"ה ג. הוכפלד	- ר' צוות הקמה, משהבי"ש י-ם
סימן טוב	- ממונה על אכלוס במחוז
שחם, דשא	- שו"פ ירושלים
י. דסקל	- אשטרום
שמעון, מיכה, חנן	- יובל גד
ד. עובדיה, לזר	- נהול פרויקט

1. הפגישה זומנה כדי לברר ההכנות והבעיות הקימות לקראת תחילת האכלוס ב 30.4.82.

2. ה"ה שמריהו כהן ודוד עובדיה סקרו מצב עבודות הפתוח באתר ותשתיות החיצוניות;

א. חשמל
בפגישה עם חב' החשמל המזרחית הוסכם כי הנחת הקו מאל עזריה למעלה אדומים תחל עם קבלת היתרים מהממשל ותמשך כחודשים, מהממשל נמסר כי ההיתרים קיימים והם יועברו לחברת החשמל בתוך ימים אחדים.
במקביל לעבודות הנחת הקו יבוצעו עבודות ברשת והעבודות בבנינים במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו.
במקביל נערך המשרד לאספקת חשמל ע"י גנרטורים.

ב. כביש גישה
3 האלטרנטיבות לבצוע הכביש אושרו בוועדה המקומית והועברו לוועדה המחוזית להפקדה.

ג. מי מים
המערכת מושלמת וכיום מתבצעות שטיפות ובדיקות לחץ. תוך שבוע עד שבועים נתן לחבר הבנינים למערכת המים העירונית.

ד. עבודות פתוח באתר;

ב-ה-4 יובל גד הוחל בבצוע מערכת החשמל, עפ"י הבטחת חברת החשמל. העבודות יושלמו עד 31.1.82. עם גמר עבודות החשמל ניתן להשלים הפתוח. עבודות חב' חשמל בתוך הבנינים גמורות ב-90%.

ב-ד-5 שו"פ אשטרום; עבודות הנחת הרשת גמורות וניתן להשלים עבודות הפתוח. טרם הוחל בבצוע עבודות חשמל בתוך הבנינים.

ב-ה-7 יובל גד; טרם הוחל בעבודות רשת חשמל, העבודות שם יחלו מיד לאחר גמר רשת ב-ה-4 בראשית חודש פברואר.

ה. כביש ג'
כביש ג' משמש כחניה לכל היחידות שיאוכלסו בשלב א', הכביש נמצא בבצוע מ.ע.צ. נותרו לבצוע עבודות תאורה, תקשורת וצפויים. שתי מערכות אלה יוכנסו לבצוע בימים אלה ומיד לאחר מכן יבוצעו הצפויים.

ו. בכביש הטבעת יש לבצע עדין את התאורה, המכרז יחזור ב-29.1.82 ומיד יוכנס הקבלן לעבודה.

- ז. תחבורה צבורית - הוסכם עם אג"ד על מקום מסוף ותחנות לאוטובוסים לאורך כביש הטבעת. עבודות התשתית לני"ל יבוצעו מיד.
- ח. בי"ס + גן ילדים-תוך חודשיים ניתן לסיים העבודות ולמוסרו למועצה.
3. מועדי אכלוס יהיו כדלקמן:
 - א. יובל גד בניה ישירה 152 יח"ד + 168 יח"ד - התחלת אכלוס ב-30.4.83.
 - ב. שו"פ - 190 יח"ד - התחלת אכלוס ב-1.6.82.
4. נציגי החברות המאכלסות העירו כי פרק הזמן שיעמוד לרשותם לבצוע בדיקות החשמל הוא קצר מאוד. הוחלט כי נושא הבדיקות יתואם ע"י מהנדס החשמל המחוזי ומנהל הפרויקט מבחינת השיטה, בדיקות מוקדמות בעזרת גנרטורים והכנת לוחות זמנים לבצוע הבדיקות ע"י חברת החשמל. כל ההכנות לבצוע הבדיקות יהיו באחריות החברות.
5. בדיקות אחרות כגון שטיפות קוי מים, בדיקת מערכת אנרגיה סולרית, הצפות גגות וכו' יבוצעו מיד עם חבור הבנינים למערכת המים.
6. מוסדות צבור;
 - א. המכרז לרכישה ותפעול 2 החנויות ביובל גד יפורסם בעוד כשבועים.
 - ב. כמו כן תהיה גם צרכניה בבנין צוות הקמה.
 - ג. בי"ס וגן ילדים יובל גד יוכנו לתפעול החל ב-1.9.82. עד אז תהיה הסעה מאורגנת באחריות המועצה המקומית.
7. כל הנוכחים ערכו סיור בשטח, להלן סכום הסיור;
 - א. ההזמנות לבצוע עבודות בשטחים צבוריים בגבולות עבודה חברות טרם נחתמו אך קימית הוראות בצוע חתומות ע"י חשב המשרד. מנהל המחוז הורה להתחיל בעבודה ובמקביל יעשה לזרוז הכנת ההזמנות.
 - ב. על חב' יובל גד לזרז את עבודות הבניה והפתוח בה-7.

100

מס' 100, תש"ח

מס' 100, תש"ח

Handwritten notes in the top right corner, including "100" and "100" written vertically.

מס' 100, תש"ח

מס' 100, תש"ח

מס' 100, תש"ח

מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח
מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח
מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח
מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח
מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח
מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח
מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח
מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח
מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח
מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח	מס' 100, תש"ח

מס' 100, תש"ח

מס' 100, תש"ח
