

4011/1104

24.2.76

מס' 101

מס' 101

מדינת ישראל

משרד המשפטים

2120

כביש גוש - 20 בתים - 38/39

החוק - 39/60086/45

המקום - אנטוניוס

המספר - 7467/11

9/1977 - 4/1975

7467/11-5

מחלקה

תיק מס'



כביש גוש ל- 20 בתים - שדות

גל - 11 / 7467

1384054 מס פריט: 27/08/2013
109.18/1 - 776
02-106-01-07-04

מזהה פיוז
מזהה לוגי
כתובת

סוג המכונה

שם היטוב

הקבלן

מס' החוזה

הסכום

תאריך התחלת העבודה: - תאריך גמר העבודה: ✓

שינויים - הגדלה

הקטנה

חלוקת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האישור	מזב העבודה %	סכום	העבודה
1	21.8		8175	בטל
2	58	-	91545	
3	25.14	-	114450	
	24.464	5/0	114258.88	ק"ק בג'קרו

הערות:-

מסדד השיכון
 המינהל לבנייה כפורה
 ויישובים חדשים
 הקריה, תל-אביב
 ת.ד. 7021 מיקוד 51070
 תאריך: 29.3.77

ישראל

4111

מדינת	ישראל
מחוז	ירושלים
מספר	9039/60262/76
תאריך	1977-02-02
לטיפול של	א. פריי
לעיתון של	א. פריי

טופס שינוי חוזה

מספר החוזה 9039/60262/76

אל: הגזברות (2)
 מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.
 א. פריי זיהוי:

שם המקור	שם הישוב	שם הקבלן
222	פרדס סניר	חב' חריש בע"מ רחוב לבונטין 30 ת"א

ב. הרכב החוזה הקיים:

הקיים בלי	המחוקן בלי	השינוי בלי
2,100,000	4,209,000	2,109,000

ג. מהות השינוי:

1. חמירה נוספת	1,325,000
2. חובלה	184,000
3. חובלה מחוץ לשטח	600,000
והעמסה	2,109,000

ד. שיעור הקצביות: 90.60.510/66
 608/03

חתימת הקבלן

ה. בן יהודה
 חשב המסדד

ראש המינהל לבנייה כפורה
 ויישובים חדשים

חתימה

תאריך

העתיקים:

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
 מר ג. אביב, מסדד על עליות חדשות
 מר א. בלף, מסדד על חוזים ומכרזים
 מהנדס מחוזי לבנייה כפורה, מחוז 222
 אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
 גזברות (2)

18333 - 11 - פבר 1977

39 8350 2 72

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה בפרית
הקריה, תל-אביב

תאריך 20.4.75

50/75 /אבכ/ 1213

רישום חדשים
תל-אביב, הקריה, יבנה
האגף לבניה בפרית
ד טבת חשבה 5. 75 7
ש ארז חגב
מאת: מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

ג. אביבי

אל: מר

מאת: מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים

הנדרש: הפעלת חרזה

המקום - מושב שדות

העבודה - התקנת דרכי גישה לחקמת 20 בתים

הקבלן - חב' אשפרום בע"מ

א. נא לערוך חרזה עם - חב' אשפרום בע"מ

כתובת -

לבצוע העבודה שבנדון, לפי חכנית -

בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך -

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים.

2. סעיפים מיוחדים בדבר התיקרות, תקופת הבצוע ובדיקת החמרים.

ג. אסמכתא לבצוע העבודה - מכתב מר ש. אביבי מיום 30.1.75, פר-7/1975 לחקמת

20 בתי מגורים.

בכדי לאפשר גישה לעגלות ומגוף לצורך הקמת 20 הבתים יש להגיש דרכי גישה מתמדי ואדי.

אומדן עלות העבודה 3000 מ"ל לפי 20 ל"י = 60,000 ל"י.

הערה: החרזה לחקמת 20 הבתים טרם בערך.

אין להתחיל בבצוע לפני אשור החרזה

ב כ ר כ ה,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז - חגב

הקבלן - חב' אשפרום בע"מ

אין להתחיל בבצוע לפני אשור החרזה



1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

1945-1946

מדינת ישראל

משרד-הטיכון

מינהל לבנייה כפרית

ניסויים חדשים

האגף לבנייה כפרית

סדר גשלומים

75 %	1. לפי התקדמות העבודה
12 %	2. גמר ומסירת העבודה
3 %	3. ע"ח קרן בטוח
10 %	4. אסור חסכון סופי
100 %	

תאריך המכירים:

חוקת הבצוע _____ חדשים מיום מתן הוראת בצוע.

הורדה ע"ח בדיקות 0.2 %

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED

APRIL 10, 1954

TO THE DIRECTOR

FROM THE DEPARTMENT

OF CHEMISTRY

CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.

1954

CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.

4011

מדינת ישראל
משרד השיכון
17.3.76
מחוז תל אביב

מדינת ישראל

משרד השיכון

המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

תאריך: 1/3/76

מספר: 39/60050/75

5378

אל : בזכרון משרד השיכון

מאת: האגף לבנייה כפרית

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס. 39/60050/75

העבודה: דרכי גישה ומבילים.

המקום: שדות

הקבלן:

אשרות בע"מ.

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון, בסך 127.178.88 ₪
הסכום לתשלום הוא 123.117 ₪ לאחר נכוי של 0.2% ע"ח בדיקות ו- 3% ע"ח קצן בטוח.

נא להקטין / להוסיף	לחידוש החוזה, שהיקפו עתה -	135.000	₪
	בסך -	7.821.12	₪
	סה"כ -	127.178.88	₪

החשבון כולל:

החיקויות 9.920 ₪
חודש ע"ח בדיקות 254.88 ₪
חודש ע"ח קצן בטוח 3.807 ₪

ב ב ר כ ה ,

אינג' א. שטרן
סגן ראש המינהל
ומנהל האגף לתכנון ובנייה

העתקים:

מר ~~אשרות בע"מ~~ / ג. אביבי
מהנדס מחוז ~~הנגב~~
הקבלן ~~אשרות בע"מ~~
אגף חוזים ובטחונות
המחלקה לסטטיסטיקה

רשימת כמויות ומחירים חשבון סופי		"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ תל-אביב, רחוב צירלסון 4 טלפון: 443181	
חשוב נבדק וערכה ע"י	חשבו נבדק וערכה ע"י	העבודה: התקנת דרכי גישה ופצילים - מושב שדות	
מספר המרכז / החוזה	מספר ההזמנה	תאריך: 15.2.76	
ס ה * כ ל"י	ס כ ו ס ל"י	מחיר יחידה ב"י	כמות
רכוש עבודות - דרכי גישה ופצילים - מושב שדות			
א. התקנת דרכי גישה			
	56,020.-	20.-	2801
דרכי גישה לעגלות ומנוף ע"י חומר וא"י 20			
ב. פצילים לבחים			
	35,881.93	94.30	380.50
יישור צורת דרך פולל הספק והנחה פריצתה בטון 45/45 כולל חברה סמית מבטון			
	18,917.50	57.50	329
הספק והנחה אבן שפה מבטון סיום על בסיס בטון			
	3,026.80	9.20	329
השלמת תקנים בין אבן שפה וכביש ע"י בטון			
	172.50	172.50	1
מנביר סיום פגזור אבטט 4"			
	3,240.93	120.75	26.84
פגזרי מנבירים מבטון בקו"י 10 ס"מ כולל ברזל 6 ודחמים מחומר וא"י			
	117,258.88		
	120,706.88		
	9.92		
	11,225.-		
	131,934.88		
	127,178.88		
	254.88		
	126,924		
	3807		
	123,117		
להעברה / ס"ה			

אשטרום חברה להנדסה בע"מ

15.2.76 תאריך:

הכין: ג. גרשון

חשוב התיקרויות

39/60058/75 : תחלה

דרכי גישה לסדוה : עבודה:

מדד בסיס: אפריל 75 - 100 נק'

[illegible]

מינהל לבניה כפריה וישובים חדשים

12/2/76

אל : מר אביבי שכון ת"א

4011 - טנ" 2892

הנדון : דרכי גישה ושבילים במושב
ש ד ו ה

לביצוע העבודה הנ"ל הוצאה הזמנה שמספרה 39/60056/75,
החומר הטכני הועבר אליך על ידי מר בלף כיום 19.12.75
מכתב מס. 4277 - 39/60058/75.

אבקש לברר מדוע עד היום לא ^{נמצא} החוזה.

ב ב ו ה,

י. רוסיאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר שרון מנהל האגף.

מר בלף שכון ת"א.

מהנדס איזור הערבה וטיני.

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

סנ' / 11

מס':

16/10/75

בא-שכ:

אל: 17, 18, 19

מא: 10/10/75

הנדון: תיק 9, כפר סבא

10/10/75

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם השבון חלקי/סומי מס'

כרטיס

לעבודה

במשק / מושב

10/10/75

הקבלן

לפי חוזה

10/10/75

על סך

10/10/75

הערות:

הקבלן חתום על חוזה

10/10/75

10/10/75

10/10/75

לוטה:

10/10/75

העתק:

מהנדס אזור

10/10/75

הקבלן

10/10/75

מהנדס המחוז

שטרומ

חברה להנדסה בע"מ



ASHTROM

ENGINEERING CO. LTD.

Date : 16.2.1976 תאריך :

Our Ref. : 189/76 מספרנו :

לכבוד

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית / מחוז הנגב

בנין מרכז הנגב

ב א ר - ש ב ע .

א.נ.,

לידי מר י. רוסיאנסקי

הנדון: חשבון סופי - דרכי גישה ושכילים

מושב שדות - חווה מס' 39/60058/75

1. רצוף בזה חשבון סופי הנ"ל ע"ס 131,934.88 ל"י

2. נודה לכם על בדיקת החשבון ואשורו.

בכבוד רב,

אשטרם חברה להנדסה בע"מ.

מצורף

5 העתקי חשבון סופי

חשוב כמויות ואשורים.



1. The first part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. This is followed by a summary of the results obtained and a discussion of the factors which may have influenced the results. The final part of the report is a conclusion, in which the author states his opinion as to the value of the work done and the results obtained.

2. The second part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. This is followed by a summary of the results obtained and a discussion of the factors which may have influenced the results. The final part of the report is a conclusion, in which the author states his opinion as to the value of the work done and the results obtained.

3. The third part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. This is followed by a summary of the results obtained and a discussion of the factors which may have influenced the results. The final part of the report is a conclusion, in which the author states his opinion as to the value of the work done and the results obtained.

4. The fourth part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. This is followed by a summary of the results obtained and a discussion of the factors which may have influenced the results. The final part of the report is a conclusion, in which the author states his opinion as to the value of the work done and the results obtained.

5. The fifth part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. This is followed by a summary of the results obtained and a discussion of the factors which may have influenced the results. The final part of the report is a conclusion, in which the author states his opinion as to the value of the work done and the results obtained.

6. The sixth part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. This is followed by a summary of the results obtained and a discussion of the factors which may have influenced the results. The final part of the report is a conclusion, in which the author states his opinion as to the value of the work done and the results obtained.

7. The seventh part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. This is followed by a summary of the results obtained and a discussion of the factors which may have influenced the results. The final part of the report is a conclusion, in which the author states his opinion as to the value of the work done and the results obtained.

1		רשימת כמויות ומחירים חשבון סופי		"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ תל-אביב, רחוב צירלסון 4 טלפון: 443181	
חשבוש נבדק ע"י וערכה ע"י		העבודה: דרכי גישה ושבילים - מושב שדות			
מספר המרכז / החוזה 39/60058/75		מספר ההזמנה		תאריך 15.2.76	
ס	ה	ס	ה	מחיר יחידה בליי	כמות
ליי	אג'י	ליי	אג'י	יחידה המדה	סוג העבודה
רכוש עבודות - דרכי גישה ושבילים - מושב שדות					
א. התקנת דרכי גישה					
		56,020.-	20.-	2801	דרכי גישה לעגלות ומנוף ע"י חומרי וארי 20
ב. שבילים לבתים					
		35,881.55	94.30	380.50	1 ייסוד בורח דרך פולל הספקה והנחת ממצפות בסוף 45/45 כולל הנדסה סמית מבטון
		18,917.50	57.50	329	2 הספקה והנחת אבן שטח מבטון סיום על בסיס בטון
		3,026.80	9.20	329	3 השלמת חקונים כיץ אבן שטח וכביש ע"י בטון
		172.50	172.50	1	4 מעביר מים סגור אסמט 4"
		3,240.93	120.75	26.84	5 סמית מעבירים מבטון בעובי 10 ס"מ כולל ברזל 6 וחתכים סופרי וארי
114,258.88		120,708.88	3,450.-	3450	6 מיגון חלקת השבילים בהתאם לתכנון ההנדסה המוצג
ג. חתיכות - לפי חישוב מצורף					
24,226					
11,226.-					
131,934.88					
להעברה / ס"ה					

תאריך: 15.2.76

הכין: ג. גרשון

חשוב התייקרויות

חומר: 39/60058/75

דרכי גישה לסדות

נרע

מדר בסיס: אפריל 75 - 100 נק'

חודש	מדר הבניה	התיקרות		חשובות				הערות
		%	% לאחר החסר 3%	מס'	סכום	החסרות	סכום לתוספת יוקר	
		אבטיס החודש:			אפריל 75	100 נק'		
		החללה עבודה:			אוגוסט 75	109.3 נק'	(מכתב 21.9.75)	
		1. התיקרות החללית						
			100.0 - 109.3					
			= 100.0		9.3%			
		2. חישוב התיקרות						
			= 9.3% x 120,709.-				11,226.-	

אשור גמר בצוע / ~~בצוע-חלקי~~ לחודש: ספטמבר

מרוקט: 13/10 20 מ' ס

שם הקבלן: סילב'ל סקצו:

הנני מאשר שהעבודות המפורטות בזה בוצעו ב:

בזמן מלאות מלא' מלא' ס
מציבה בולק' מציבה מ' 321.00
ל/ סל'ה (נ/ צ' ס' (מציבה (נ/ צ' ס')

2801 ז 17.40 48.43440

48 437

34800

13,937

הערות:

חיוכים:

חתימה:

תאריך: 21.9.44

מ ז כ ר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

אל:

התאריך

12.6.75

אלטמיר
ליצי מע אלמיר


מאת:

תיק מס'

הנדון:

חשבון סוף: ביצוי מוצע ומאג
כצעמ: לפי - מוכר אל נמיה קאלסה

ידה חשבון סוף ומלוא' כחלילה
אביצוי קבוצה בוש'קים חת'
חשבון חת' יש אכ'סית סוף אה'ז'
קמלן דאל בוגמאם לעצמ' דח'ז'
לפי ישוב



ר כ ו ז

39/60058/מ	300/מ	53,251.00	מדרכה במושב שדות	1.
39/60073/מ	500/מ	110,752.40	מגרש כדור סל ומשטחים במ. גושי	2.
39/60073/מ	500/מ	46,484.00	מדרכה בנתיב העשרה	3.
			39/43947/מ	
		210,487.40	סך הכל	ל"י

ליבוזיק - וויס

פנימי כתובת עניין בע"מ

רח' ההסתדרות 170 - באר שבע

טל. 057-76557




ש. ליבוביץ - וויס

עבודות פיתוח ובנין בע"מ

באר-שבע, רח' ההסתדרות 110

טל. 057-76557

יום..... לחודש.....

לפי חוזה מס'

תכנית מס'

עבודה..... מושב שדות

מדרכה מרצוף 35/45

חשבון לתשלום מס. 045 №

לכבוד.....

מס'	סוגי העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר יחידה		הסכום		ס"ה	
				אנ'	ל"י	אנ'	ל"י	אנ'	ל"י
1	יישור צורה דרך כולל אספקה והנחת מרצפות 45/45 על השתיים חול מהודק כולל הגורם בטון	מ	380.50	82.00		31,201.00			
2	אספקה והנחת אבן שפה מבטון טרום על בסיס בטון	מ	329.00	50.00		16,450.00			
3	השלמת הקונים בין אבן שפה והכביש מבטון	"	329.00	8.00		2,632.00			
4	מעביר מיט ע"י הבניה דרך המדרכה מצנור אזבסט 4"	יח	1			150.00			
5	מטחי מעברים מבטון בעובי 10 ס"מ כולל ברזל 6 כל 20 ס"מ כולל השתיים מחומר וואדי מהודק	מ	26.84	105.00		2,818.20			
							53,251.20		

הערות:

ליבוביץ - וויס

עבודות פיתוח ובנין בע"מ

רח' ההסתדרות 110 באר-שבע

טל. 057-76557

המפקח:

המהנדס הראשי:

הישוב כמזיות

מ'ל 138

המקום

תאריך

מ'צאנו מ'צאנו מ'צאנו

העבודה

מס' העב'.

תכנית מס'

ישראל אברהם יצחק בן אברהם אברהם

329.00	329.60	115.50	345.24
47.40	38.70	30.00	137.00
137.00	15.00	383.60	0.90
329.00	329.60	115.50	345.24
47.40	38.70	30.00	137.00
137.00	15.00	383.60	0.90

ח'שוב כמזיות

המקום

העבודה

תאריך

תכנית מס'

מס' העב'.

מס' חצי' מס' חצי'

3) גשמת חקלאי עם גאון מן אבן גלעם ופגוע ב"ק"ס	א"פ אבן גלעם	מ"א 329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60
4) קיבוצי גשמת ב"ק"ס אבן אבן גלעם ב"ק"ס	א"פ אבן גלעם	מ"א 329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60
5) גשמת חקלאי עם גאון מן אבן גלעם ופגוע ב"ק"ס	א"פ אבן גלעם	מ"א 329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60
6) גשמת חקלאי עם גאון מן אבן גלעם ופגוע ב"ק"ס	א"פ אבן גלעם	מ"א 329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60
7) גשמת חקלאי עם גאון מן אבן גלעם ופגוע ב"ק"ס	א"פ אבן גלעם	מ"א 329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60
8) גשמת חקלאי עם גאון מן אבן גלעם ופגוע ב"ק"ס	א"פ אבן גלעם	מ"א 329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60
9) גשמת חקלאי עם גאון מן אבן גלעם ופגוע ב"ק"ס	א"פ אבן גלעם	מ"א 329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60
10) גשמת חקלאי עם גאון מן אבן גלעם ופגוע ב"ק"ס	א"פ אבן גלעם	מ"א 329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60
11) גשמת חקלאי עם גאון מן אבן גלעם ופגוע ב"ק"ס	א"פ אבן גלעם	מ"א 329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60	329.60

אשטרום" חברה להנדסה בע"מ

תל-אביב, רחוב צירלסון 4

טלפון: 44 31 81

אשור גמר בצוע / בצוע חלקי לחודש: 10/10/77

פרויקט: 13/7 20 מ"מ

יום הקבלן: מילרדל מקצוע:

הנני מאשר שהעבודות המפורטות בזה כוצעו ב:

בכך מתחמק מלשלם מכלול א"כ
מדידת המטרים מצוין א"כ 321.00
לן שליש הנכסה (מדידת נצוג)

2801 ז 17.40 48.73440

הערות:

חיוכים:

חתימה:

האריך:

1. לקבלן לצרף לחשבון

"סולכביש"

ה לעמדות כבישים ומתוח בע"מ
מג, רח' הרא"ה 7, טל. 731436, 724235
טלפון פרטי: 739647

מספרנו 118/75

תאריך 1.10.75

ח ש ב ו ן ס ו פ י

אשרום בע"מ לידי סר אוסיה ת"א

דרך בשדות - 20 מבנים

הסכום	מחיר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	זעוף למי ופרט
	א"י	א"י				
48737.40		17.40	2801	20	דרך מחמר ואדי מחורק	
48737.40					סה"כ	
ארבעים ושמונה אלף שבע מאות שלושים ושבע לירות + 40 אג'. בכל הכבוד, "סולכביש" בע"מ הערה: ע"ה עבודה זו קבלנו סך של <u>34800.-</u> ₪						

צ'ק מאגזין וואלף 20 זקנים
 נקבלן. אשכנזים. קהלן משנה. סלובים.

צ'ק מאגזין וואלף
 מנואל סלובים
 כע"ג 25 ס"ה
 כולל צע"ה צ'ק

יציב מאגזין
 סמ"ל ומצ"ה
 אורך הצ'ק
 ע"י שליח הנדסה
 מאגזין מס'
 321.00

רומה נדון
 5.00

ע' פרוטה הנדסה
 29.90
 406.35
 4.00
 צ'ק נכב"ס
 ע' סל' כרזה

ע' אהרנהיים
 120.00
 אב"ס היצוא
 א"י צ'ק מאגזין
 600.00

1036.25
 555.90
 5.00

2479.50

4/R. 5.00

R. 5.00 =


4/5.38

21.50

$$5.00^2 - \left(\frac{5.00 \sqrt{4}}{4} \right) = 5.38$$

2801.00

ס"ה



סולרזיט - 130

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)


מזכר

אל:	מלכיים	התאריך	19.2.75
מאת:	ד"ר מי אליה	חוק מס'	10/10
הנדון:	הניכ נכסיה ה"ש		

דיכ' גולד מילאס וואס' מילק
המלכ' לפר'ג

א ליניק חיצ' אה סולרזיט
אג' ביניא' דיכ' גולד מילאס מילאס'
מילק גולד' לגול' כ"א 15 ס"ה
ס"ה 30.30 - א"ח. (נצח' הע'ג' 5.00 מטר)

3000 מ"ל א"ח מילאס - 15.75 - 45.000
3000 מ"ל צופ' צינ
המילאס לגולד'
אגול'י הפול' א"ח
המילאס ג. - 2.75 - 6000
51.000 -



משרד השיכון

בנייה בהתישבות
עליות חדשות

9039/60058/75

חוזת מספר

תאריך

משרד השיכון
האגף לבנייה כפרית

19.2.76

מחוז הנגב

הוראת בצוע

אל: מנהל האגף להנדסה (2)

מאת: סגן המנהל הכללי

נא להפעיל חוזה בנייה

במקום: **שטח שדות**

ע"י: **חב' השדרים בע"מ**

ערך החוזה	פירוט
135,000	החקנה דרבי גיטה ושכילים ל-20 בתים לעבודה הנ"ל הוצאה הזמנה פט. 9039/60058/75 בסכום של 135,000 ל"י שיש לראותה כמבוטלת במקומה הוצא חוזה
135,000	סך-הכל סעיף הקציבי: <u>אין לרשום חוזות ביצוע</u>

לוטת: 1) מכתב האגף לבנייה כפרית מס'

מיום:

2) הנמקה למסירת העבודה לקבלן.

ש. אבני
סגן המנהל הכללי

העתק: 1. מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית

2. מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות

3. מר א. בלף, ממונה על מכרזים וחוזים

4. גזברות (2)

5. המחלקה לסטטיסטיקה

6. מהנדס מחוז לבנייה כפרית, מחוז נגב

7. אגף חוזים וכטחונות, המחלקה להתישבות, הסוכנות היהודית, ת"א-

לגבי חוזים בסימול 39 בלבד

8. היחידה לניתוח מערכות-נא לכלול בדו"ח התקדמות הבנייה, סימול: _____

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-

10/2/76

מס:

כפר-סבא,

אל:

מאת:

הנדון:

3

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/מומי מס'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוט:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מנהל הסיוע

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

מס' _____

כפר-שכר, _____

אל: _____

מאת: _____

הנדון: _____

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/פומי פס' _____

לעבודה _____

במשק / מושב _____

למי חרזה _____ הקבלן _____

על סך _____

הערות: _____

לוטת: _____

מהנדס תכנון

העתק: _____

מהנדס אזור _____

הקבלן _____

20.1.1976

לכבוד
משרד המבחן
רחוב הלל 23,
ירושלים.

א.ב.ג.

הנדון: משכון חלקי מס' 3 לחוצה מס. 39/60058/75.
דרכי גישה למדור.

היקף החוצה - 135,000 ל"י

1. במסגרת העבודה - דרכי גישה ופבילים

117,450.-

87% x 135,000.-

117,450.-

מח"כ

91,200.-

מח"כ קבלנו

26,250.-

מח"כ מבצע

מכבוד רב,

"אממיום" חברה להנדסה בע"מ.



STATE OF TEXAS

COUNTY OF DALLAS
 STATE OF TEXAS
 1900.

BEFORE ME, the undersigned authority, on this day personally appeared _____, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

My commission expires _____

WITNESSED my hand and seal of office this _____ day of _____, 1900.

 Notary Public in and for the State of Texas

 Notary Public in and for the State of Texas

and

 Notary Public in and for the State of Texas

and

 Notary Public in and for the State of Texas

and

 Notary Public in and for the State of Texas

NOTARY PUBLIC

My commission expires _____

מר 3"5

מדינת ישראל

משרד השיכון

מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים

4011

0

תאריך 12.1.1976

מספר 39/60058/75

גושוד השיכון האגף לבניה כפרית 16.1.76 מחוז הנגב
--

אל: מר ג. אביבי, בזכרות המינהל

מאת: א. בלף, ממנה על חוזים ומכרזים

הנדון: הזמנה 39/60058/75

העבודה גרבי אשה / שביל

המקום מ/ש 1/31

הקבלן מ' אשליס ב"ר

סכום ההזמנה 135.000 "א"

שינוי אחוזי התשלומים בחשבונית ביניים

הריני להודיע בזה כי קיים כתב כמיות ומחירים מאושר, להמרת ההזמנה הנ"ל בחוזה

במבנה. כחתאם לסיכום של הדיון מיום 12.12.1975, לגבי הזמנות כנ"ל

יש לאשר בחשבונית הביניים תשלום עד 90% מערך ההזמנה, במקום 70% הנחוגים בהזמנה

הקיסח.

כתב הכמיות להמרת ההזמנה בחוזה נמצא/הועבר אל מ' צליל מ/ש

במבנה מ' 4277 מ/ש 19.12.75

7

א. בלף

ממנה על חוזים ומכרזים

העתקים:

פנסה

מהנדס מחוז

מ' צליל מ/ש

הקבלן מ' אשליס ב"ר

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית
הקריה, תל-אביב

תאריך 19.12.75

אבכ 39/60058/75

4277

סינחל לבניה כפרית וישובים חדשים
משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

28.12.75

מחוז הנגב

אל: מר גואביבי

מאת: מר א. בלף, ממנה על חוזים ומכרזים

הזמנה

39/60058/75

אסמכ

הפעלת

הנדון:

אין להתחיל בצוע
לפני אשור החוזה

המקום - מושב שדות

העבירה - החקנה דרכי גישה ושבלים ל-20 בחים

הקבלן - חב" אשורמט בע"מ

א. נא לערוך חוזה עם - חב" אשורמט בע"מ

כתובה -

לצוע העבודה שבנדון, לפי חכניה -

בחתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך -

ל"י 135,000.-

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים,

2. טעימים מיוחדים בדבר החיקרות, חקופת הצוע ובדיקה החמרים.

ג. אסמכתא לצוע העבודה - לעבודה שבנדון חוצאה הזמנה מס' 39/60058/75

שחיקמה עתה 135,000 ל"י.

נא להמיר את ההזמנה בחוזה לפי כונת הכמויות הרצ"ב.

אין להתחיל בצוע
לפני אשור החוזה

ב ב א כ ה,

א. בלף

ממנה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן - אשורמט בע"מ

מדינת ישראל
מסד-השיכון

מינהל לבנייה כפרית

וישובים חדשים
והאגף לבנייה כפרית

סדר השלומים

75 %

1. לפי התקדמות העבודה

12 %

2. גמר ומסירת העבודה

3 %

3. ע"ח קרן בטוח

10 %

4. אסור חשבון סומי

100 %

תאריך המחירים:

תקופת הבצוע _____ חזטים מיום מתן הוראת בצוע.

הורדה ע"ח בדיקות 0.2 %

דרכי גישה ושבילים ל-20 בתים במושב שדות

כאב כמויות ומחירים

א. והקמת דרכי גישה לעגלות ומנוף

מחומר ואדי 20 x 20 3,000 = 60,000.-

ב. שבילים לבתים

1. יישור צורת דרך של השבילים כולל אספקת והנחת

מרכמות בסוף 45/45 על תשתית חול מחודק לגבי

הגבהים הדרושים כולל הגדרה סמויה מבטון מצד

אחד של השביל הכל בהחלט לתכנית. 20 500 94.30 47,150.-

2. אספקת והנחת אבן שפה מבטון סיום על בסיס

בסוף לפי הגבהים הדרושים 400 57.50 2,300.-

3. הטלת תקונים בין אבן שפה והכביש ע"י

בסוף 850 9.20 4,140.-

74,290.-

710.-

75,000.-

ע"ח שונות

ס"ח כללי

א. דרכי גישה ₪ 60,000.-

ב. שבילים לבתים ₪ 75,000.-

₪ 135,000.-

IN SENATE

REPORT

OF THE

COMMISSIONER

OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR

1897

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE PRINTING OFFICE, 1897.

THE STATE OF NEW YORK.

THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE.

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE PRINTING OFFICE, 1897.

THE STATE OF NEW YORK.

THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE.

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE PRINTING OFFICE, 1897.

THE

COMMISSIONER

OF THE

LAND OFFICE

FOR THE

YEAR

1897

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE PRINTING OFFICE, 1897.

THE STATE OF NEW YORK.

THE COMMISSIONER

OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR

דרכי גישה ושכילים ל-20 בתים במחנה שדות

כח כמורות ומתירים

א. חקנת דרכי גישה לעגלות ומנוף

מחיר דמי 3,000 ₪ × 20 = 60,000.-

מ/כנה גל

ב. שכילים לבתים

1. ייסוד אורח דרך של השכילים כולל אספקה וחננת

מראות בטון 45/45 על תחית חול מהודק לפי

הנחיות הדרושים כולל חגורה סמויה מבטון פז

אחד של השכיל הכל בהתאם לתכנית. 20 500 94.30 47,150.-

2. אספקה וחננת אבן שפה מבטון טרום על בטיס

בטון לפי הנחיות הדרושים 400 57.50 2,300.-

3. השלמת תקנים בין אבן שפה וחבטיש ע"י

בטון 450 9.20 4,140.-

74,290.-

710.-

75,000.-

ע"ח שונות

ס"ח כללי

א. דרכי גישה 60,000.- ₪

ב. שכילים לבתים 75,000.- ₪

135,000.- ₪

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-

מס' 44/2

באר-שבע

אל' 12/1

מאת: 12/1

הנדון: חן חוקי 12/1 כב"ש
12/1

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון חלקי/פנאי מס' 2

לעבודה כב"ש 12/1

במשק / מושב 12/1

לפי חוזה 30/60058/15

על סך 12/1

הערות:

לוטה: 12/1

העתק:

מהנדס אורב 12/1

הקבלן 12/1

מנהל המחוז



מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

מ"י

באר-שבע,

אלי:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סומי פט'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה הקבלן

על סך

הערות:

לוטת:

מהנדס המחוז

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

מוסד השיכון
האגף לבניה כפרית

1. 10. 75

מחוז הנגב

28.9.75

לכבוד
משרד השיכון
רחוב הלל 23
ירושלים.

ה.א.3.

הנדון: - חשבון חלקי פס. 2 לחוזה פס. 39/60058/75
דרכי גישה לשדות

היקף החוזה ₪ 135,000.-

בסך ומטירת העבודה דרכי גישה

1.

52,200.-

$87\% \times 60,000.-$

ביצוע שבילים

2.

39,375.-

$75\% \times 75,000.-$


₪ 91,575.-

סה"כ

בכבוד רב,

"אשרום" חברה להנדסה בע"מ.

3534



4011 / 40

למחלקת
28814

20.8.1975

לכבוד
משרד השכון
רחוב הלל 23,
ירושלים.

א.נ.2.

הנדון: חשבון חלקי מט" 1 לחוזה מס' 39/60058/75
- דרכי גישה לשירות.

חיקף החוזה - 135,000.-

1. במס' ופטרית העבודה דרכי גישה
 $87\% \times 60,000.-$
52,200.-

2. ביצוע שבילים
 $75\% \times 70\% \times 75,000.-$
39,375.-

סה"כ 91,575.- ל"י

בכבוד רב,

"אשרות" תברזו להנדסה בע"מ.

האוצר
מס' חשבונית פולח
2451/75

2/7/75

4011/טנג/1730

לכבוד
חב' אשדוד
רח' צירלסון 4,
תל - אביב

א.ב.

הנדון: התקנת דרכי ביטח - מושב שדות
הזמנה מס' - 39/60056/75

בא הרינו להודיעכם כי נחתמה הזמנה שמספרה 39/60056/75 לביצוע התקנת דרכי
ביטח לבתים החדשים במושב שדות.

עד להחלפת החוזה נשלם 70% מהון החלומים כולקמן:-

75%	1) לפי התקדמות העבודות -
12%	2) גמר ופתיחת העבודות -
3%	3) ע"ח קרן ביטוח -
10%	4) אשור חשבון סופי -
100%	

אבקשכם להחקיר עד מהנדס איזור הערבה וסיני לקבלת פרטים וחילאום העבודה.

בכבוד רב,

י. רומיאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

מר גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אביבי - ממונה על עליות חדשות
מר בלך - ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס איזור הערבה וסיני
מר ש. אורבך - מקוה חוץ

רי/רב

1812
 2305 2N
 1788

4011
 18.5.75

מנהל לבניית כפרים וישובים חדשים

1075
 257/75

לכבוד
 מ"מ משרד הפנים
 מל אכיה

מ.ד.מ.

מסמך מס' 9039/60056/75
 תאריך: 18.5.75

מסמך מס' 9039/60056/75
 תאריך: 18.5.75

מסמך מס' 9039/60056/75
 תאריך: 18.5.75

מסמך מס' 9039/60056/75
 תאריך: 18.5.75

75%	(1) ליווי התקדמות פקודות
10%	(2) מסר ומסירה פקודות
3%	(3) פיקוח פקודות
10%	(4) אגודת המבוקש
100%	

מסמך מס' 9039/60056/75
 תאריך: 18.5.75

מסמך

מסמך מס' 9039/60056/75
 תאריך: 18.5.75

מסמך מס' 9039/60056/75
 תאריך: 18.5.75


מסמך מס' 9039/60056/75
 תאריך: 18.5.75

57/18-5-25

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

חאריך: 21.5.75
מספר: 50/75/אבכ/1607



אל: מר ג. אביבי
מאת: מר א. בלף

הנדון: הגדלת/הקטנת חוזה 39/460058/75 (אבכ/75/50)

העבודה - התקנת דרכי גישה ל- 20 בתים

המקום - מושב שדות

הקבלן - חב' אשטרום בע"מ

מהות השנוי - שבילי גישה לבתים

נא להגדיל את החוזה הנדון, בסך - 75,000 ל"י

ערך החוזה עתה לפי מכתבנו לעריכת החוזה מיום 23/4/75 - 60,000 ל"י

ס"ה 135,000 ל"י

ההגדלה היא לצורך בצוע: -

במכתבנו מיום 20.4.75 (מס' 1213 אבכ/75/50) בקשנו לערוך חוזה עם חב' אשטרום לביצוע דרכי גישה לעגלות ומנוף לאחרי הבניה של 20 בתים ובסך 60,000 ל"י בהתאם להוראת מר ט. אביבי יש לבצע שבילים לבתים פלות העבודה

75,000 ל"י

135,000 ל"י ס"ה

הערה: 20 הבתים מוקמים במושב הנדון לפי חוזה 39/46658/74

(50 בתים טרומיים לעליות).

בחוזה ישנו עדין עוד 25 בתים שטרם בוצעו.

60

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:
מהנדס מחוז - הבג


הקבלן - חב' אשטרום בע"מ

תוכנית

מספר תוכנית

מספר תוכנית

מספר תוכנית

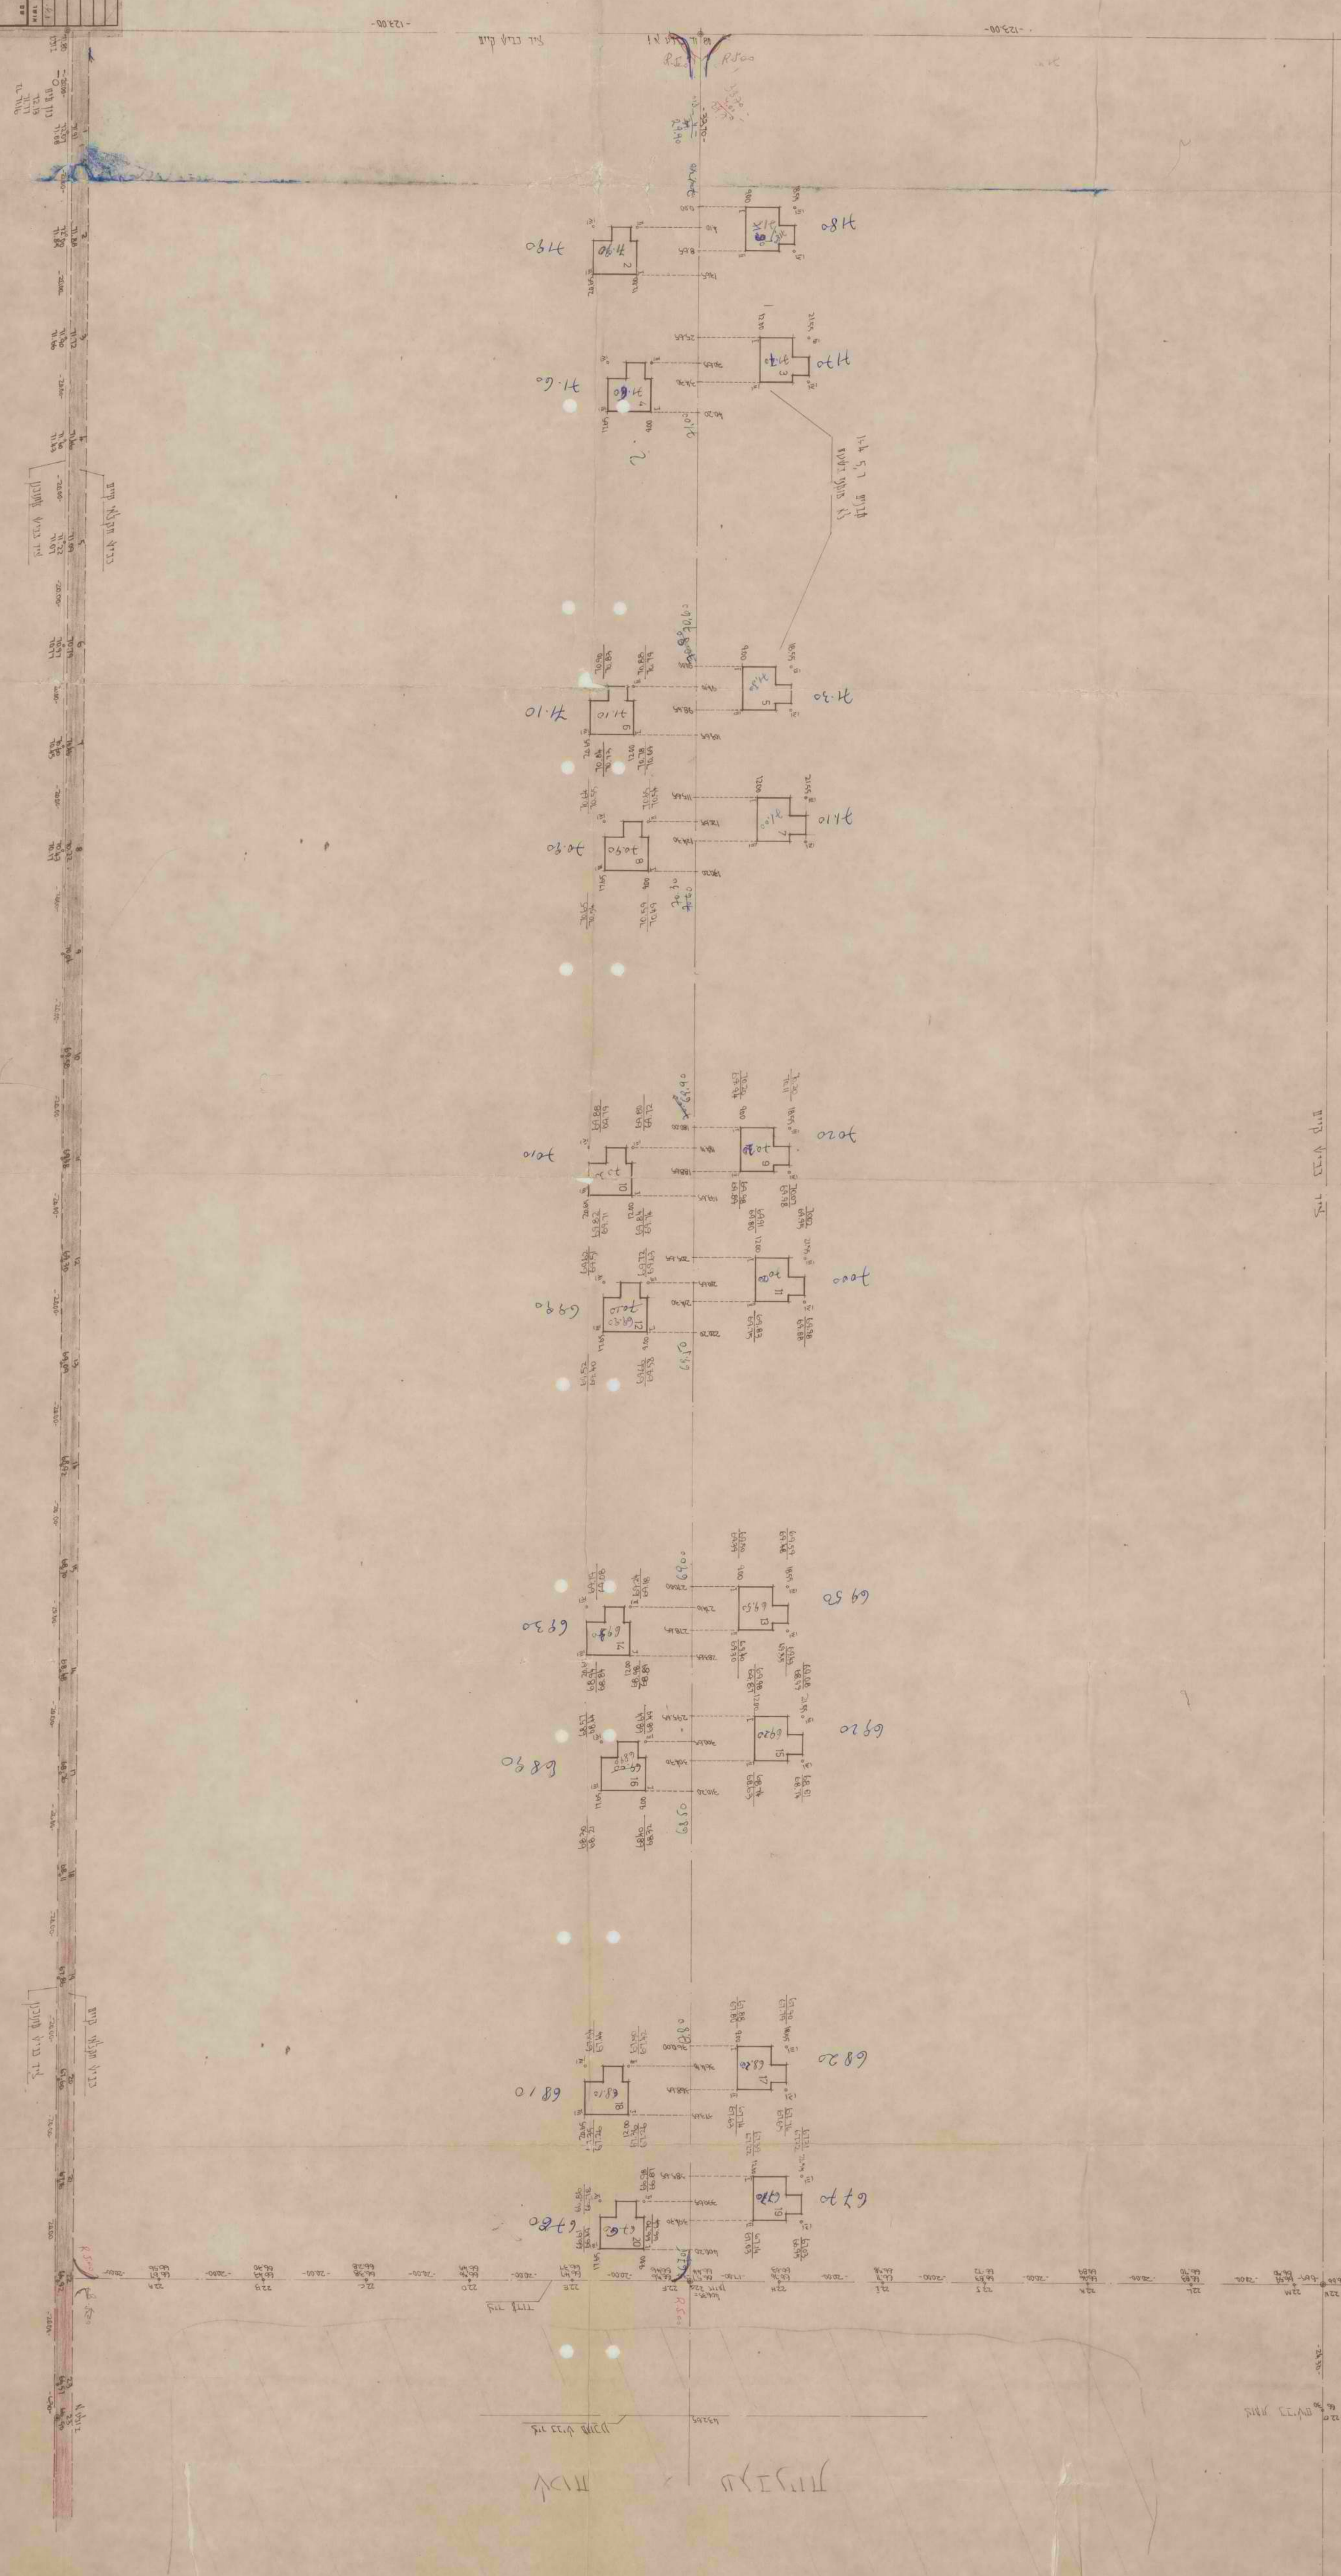

מספר תוכנית

מספר תוכנית

מספר תוכנית

מספר תוכנית

תכנית

מס' העב

שם העבודה

3 בק מחשב וואל 20 מקום
 קבלן אשלים קבלן חלקי האשלים

3 בק מחשב וואל
 מחשב האשלים
 כע"ה 25
 מל"ל צעה 3 בק

רצ"ה האשלים
 סמ"ן ואח"כ
 אורך הצו
 ד"ל של"ה בקצ"ה
 האשלים ח"ה
 321.00

כח"ה הצוק
 5.00

ח"ה האשלים האשלים
 29.40 האשלים 4.00
 406.35 צו האשלים
 ח"ה האשלים

ח"ה האשלים
 120.00 האשלים האשלים
~~600.00~~ ח"ה האשלים

~~1036.25~~ 555.90
 5.00

2479.50

4/R.5.00

R.5.00 =

4/5.38

21.50

$5.00^2 - \left(\frac{5.00 \sqrt{11}}{4} \right) = 5.38$

2801.00

ס"ה

38

מינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים

אל: מר בלך - ממונה על חוזים ומכרזים, 14.3.75

3912-טנג/1057

הנדון: הגדלת חוזה - הקמת 20 בתים מושב שדות
בבצוע חב' אששורם

על מנה לאפשר הקמת 20 בתים נוספים במושב שדות יש צורך
בבצוע דרכי גישה לעגלות ומנוף, כך שיש צורך בהגדלת החוזה
לפי מרוט:

3000 מ' דרכי גישה מחמרי ואדי - 20 מ' / 200,000.- ₪
נא טפולך (דרך אגב טרם קבלנו את החוזה).

ב ב ר כ ה,

י. רוסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

העתק:

מר בלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אביבי - ממונה על עליות הדשות
מהנדס אזור הערבה וסיני
חב' אששורם בע"מ
ש.ה.ל - ת"א
מר סלע - שכון ת"א

יר/דב

23.4.75

אל: מר א. בלף - ממונה על חוזים ומכרזים - ת"א

3912/-1259

הנדון: הגדלת חוזה 39/46618/74 הקמה 200 בחים מושב שדות
בביצוע חב' אשטרום

בהתאם להוראת מר אבני יש לבצע שביל לבחים במושב זה והדבר צריך לעלות לפי מרום
מצורף ולפי כך יש להגדיל את החוזה הנ"ל.

1. יישור צורת דרך של השבילים כולל אספקת והנחת מרצפות בטון 45/45 על השתיים
חול מהודק לפי הגבהים הדרושים כולל חבורה סמויה מבטון מצד אחד של השביל
הכל בהתאם להכניה

47150.00

94.30

500

2m

2. אספקת והנחת אבן שפה מבטון טרום על בסיס
בטון לפי הגבהים הדרושים

2300.00

57.50

400

מא

4140.00

9.20

450

3. השלמת תקונים בין אבן שפה והכביש ע"י בטון

ע"ח שונות

74.290.00

710.00

75.000.00

כ"כ יש לציון שב- 14.3.75 הועבר חסר להגדלת חוזה הנ"ל על סך - 60,000.00 ל"עבור
בצוע דרכי גישה לבחים והחזרה טרם הוגדל כך שיש להגדיל את החוזה על סך - 135,000.00 ל"ע

ב ב ר כ ה,

י. רוסיאנסקי

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערה:

מר א. גלויברמן - מנהל א.ב.כ.

מר אביבי - ממונה על עליות חדשות

מהנדס אשור הערבה וסיני

חב' אשטרום

ש.ה. ל - מקום חוץ

IN SENATE,

January 1, 1914.

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE, MAY 1, 1913.

ALBANY:

1914.

100,000

100,000

THE STATE OF NEW YORK

1914.

100,000

ALBANY:

100,000

100,000

100,000

THE STATE OF NEW YORK

ALBANY:

1914.

THE STATE OF NEW YORK

1914.

ALBANY:

1914.

THE STATE OF NEW YORK
