

כ"א

180

מדינת ישראל

משרד הממשלה

אשרד השכלה
13 הקומה זמית

~~משרד הממשלה~~

משרד

השכלה

למען, מוט

דף פורמ - 12 דפים - אולפנה

המחיר: 78/75398/78

הקדשה: סלעבוס הסכום: 600.000

החשבונית

מס' חשבונית מקורי

4606

שם

עבודות פיתוח ל- 12 בתים - אוגד

גל - 17 / 7476

מחאה פיזי:
מחאה לוגי:
כתובת:

מס פריט: 109.18/1 - 960
02-106-01-07-06

25/ 1398735
27/08/2013

מחלקה

_____ ל"ס הישוב
 _____ מס' החוזה
 _____ מס' הסכום
 _____ סוג המבנה
 _____ הקבלן

תאריך התחלת עבודה: 22.1.79 תאריך גמר העבודה: _____

שינויים - הגדלה
 הקטנה

חלוקת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האיטור	מצב העבודה %	סכום	העבודה
1	2.2.79	-	61200	
2	4.3.79	-	240312	
3	30.3.79	-	559909	
4	4.5.79	-	663849	
5	24.8.79	100%	7418832	

הערות:

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

חל-אביב

4606

אל: גזברות משרד הבינוי והשיכון

מאת: המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים.

א.כ.ה.

הנדון: שחרור ירבות;
 חוזה מס': 78 | 75398 | 78
 העבודה: והעבוד כ"מ
 המקום: א"י
 הקבלן: סוף נקיע

בזה הריני לאשר כי אפשר לחרר את הערבות להבטחת טיב העבודה של העבודה הנ"ל.

החשבון הסופי של העבודה הנ"ל הועבר אליכם ביום

הערות:

ב ב ר כ ה,

א.כ.ה.

מסונה על חוזים ומכרזים

תאריך: 2/3/80

חתימת מהנדס המכרז

חתימת המכרז:

חתימת ראש צוות

סולכביש

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת-גן, רחוב הסולם 12

טל. 701954, 705892

המס"ד: נתיבות שלפון 057-92320

תאריך 11.3.80

46061

ה'שנ"ח 264-79-128/11

מינהל לבנייה כנרת ווישונים חדשים
מחוז הנגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך

14-03-1980

לטיפול של

הנדון: עבודות פתוח ואבן

חוזת מס' 78/75598/78

א.נ.א.

מאחר ושנת אחריות לעבודות לפי החוזה הנ"ל
פגה החודש, נבקשכם כזה לשחרר לנו ערבות שנתי
ולהודיע על שחרורה לגזברות משרדכם.

בכל המכוד,

"סולכביש" מע"מ

העמק: למר יחיאל קוזלובסקי
מפקח במקום

08.5.11

10000
10000 10000 10000
10000 10000 10000
10000-10000

10000

10000 10000 10000
10000-10000

10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000 10000 10000
10000 10000

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

4606/

תאריך: 9/9/1979

מספר: 78/75398/78

אל: גזברות משרד הבינוי והשיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל ב- 14-09-1979
לשם: הקבלה
מס': 78/75398/78

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס. 78/75398/78

העבודה: עבודות ביטוח

המקום: אגודה

הקבלן: חב" סול כביש בע"מ

רצ"כ תרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון בסך
מכוס לתשלום לקבלן הוא 733,825.- לטוהר נכוי 0.2% ע"ח בדיקות ו-2% ע"ח קרן בטוח

נא להקטין/להגדיל את החוזה, שהיקפו עתה - 725,000.-

בסך - 25,332,90

סה"כ 750,332,90

החשבון כולל:

1,500.90

15.007

הורדת ע"ח בדיקות

ע"ח קרן בטוח

בכ"ה,

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון ובצוע

העתקים:

מר י. רבינוביץ / ד. תור / ר. לשם - נא להודיע לגזברות את מקור המימון לשינויים.

מהנדס מחוז הנגב

הקבלן חב" סול כביש בע"מ

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

נספח לחשבון מס'

78/75398/78

מס' החוזה

סוללכביש בע"מ

שם הקבלן

מס' שורה	סעיף החוזה	תאור העבודה	הכמות לפי חוזה	הכמות למעשה	יחידה	מחיר	הערכה
1.	יטוריים + 50 ס"מ		18000	209.66	2031	4.-	124818.64
3.	רצוף מרצפות		1600	1189.75	20	280.-	333016.-
4.	רצוף צבעוני לפי חוזה תלמי יוסף						132534.20
		78/75425/78		434.54	20	320.-	139529.60
5.	משטח חלוקי נחל- לפי חוזה תלמי יוסף		7.01		20	320.-	2245.20
6.	חפירת חעלה לקו חשמל לפי חוזה תלמי יוסף סעיף 1 חשמל (בסיס 8/78)			297.75	ס'	100.-	21775.-
7.	הספקה וסדרור בחעלה חשמל לבני סבלקס 10 יח' למ'			21907.5	יח'	9.-	17707.50
2	מנין ז 30			1112	מ'	3.-	51381.-
ע"ח ערכון התחלתי (צ' התחלה 22.1.79)							
מ- 8.78 - 1.79							
346.8 - 25.47%							
276.4							
598017.90							
635983.94 x 25.47%							
152775.16							
61985.10							
250332.90							
797909.40							
1500.90							
748832.-							
15007							
733825.-							
27.879							

מס' חש"כ


ס' חש"כ

אשר הודעת בתי דין
העבודה בוצע

2.9.79

מחיר

בדקתי את הכמות



מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-

4606/ג'נ

מס'

24.8.79

באר-שבע

אלי: מר ב"ר ת"א

מאמ: מוסד הנגב

הגדרון: מ'ן סופ' עפרות 24-8

כ"א באוגוסט

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון אלקי/זומי מס'

כ"א

לעבודה

אוגוסט

במשק / מושב

סופ' כ"א

הקבלן

78/75392/78

לפי חזוה

742832

על סך

הערות: 7131 חסוב כחולית נתוח אח"כ"ס

סופ' קב"ה

לומה: 1/4 דעתק מ'ן



מהנדס המחו

העתק:

מהנדס אזור: דבורה וסון

הקבלן: אסקוב"ת

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס':

מס' שכת:

אל:

מא:

הנדון:

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כח חשכון אלקי/פומי מס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות:

הקבלן

מנהל המזון

העתק:

מנהל מזון

הקבלן

נספח לחשבון מס' 106 חלקי []

78/75398/78

מס' החוזה

סולכביש בע"ס

שם הקבולן

מס' עמוד	סעיף חחוח	תאור העבודה	הכמות לפי חוזה	הכמות למעשה	יחידה	מחיר	הערות
1.		יסוריים + 50 ס"מ	18000	18000	20	4.-	56968
3.		רצוף מרצפות	1600	1189,78	20	280.-	124818,64
4.		רצוף צבעוני למי חוזה תלמי יוסף					533416.-
5.		78/75425/78		434,54	20	305.-	132584,7
5.		בטח חלוקי נהל- למי חוזה תלמי יוסף		7.01	20	320.-	139529,60
6.		חפירת תעלה לקו חסמל למי חוזה תלמי יוסף					21775
7.		סעיף 1 חסמל 5/8 (8/78)		2197,75		100.-	49075.-
7.		חפירה וסדור בתעלה					
10		חפירת לבני סילק					
2		חפירת לבני סילק					
		ע"ה ערכון החחוחי (צו החחוחה 22.1.79)					
		1.79 - 8.78 - ס					
		346.8					
		276.4					
		598017.6					
		655983.94 x 25.47					
		152315.16					
		161985.10					
		250332.9					
		297959.10					
		1500.7					
		748832.2					
		סח"ב					
		0.2%					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					
		מחיר כולל					

ש"ח

בדעתי את הכמויות

חתימה

שם ותפקיד

תאריך

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רסט"ג, רחוב הרא"ה 7

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

טלפון פרטי: 73 96 47

3.5.79

תאריך

חלק במל"ת

1 סול

קאלקולציה - סול

מס' סדר	חשוב גובה	גובה ממוצע	חשוב שטח	שטח מ"י	נפח מ"י
	ה' צל' סול	ה' צל' סול	ה' צל' סול		
	42.20 x 1.35 =	57.65 מ"ר	28 x 0.45 x 0.45 =	5.67	
	15.0 x 1.35 =	20.25 מ"ר	8 x 0.45 x 0.45 =	1.62	
	12.25 x 1.35 =	17.21 מ"ר	12 x 0.45 x 0.45 =	2.43	
	15.0 x 1.35 =	20.25 מ"ר	8 x 0.45 x 0.45 =	1.62	
	46.95 x 1.35 =	62.57 מ"ר	32 x 0.45 x 0.45 =	6.48	
	16.95 x 1.35 =	22.07 מ"ר	12 x 0.45 x 0.45 =	2.43	
	11.80 x 1.35 =	15.93 מ"ר	8 x 0.45 x 0.45 =	1.62	
	15.45 x 1.35 =	20.86 מ"ר	8 x 0.45 x 0.45 =	1.62	
	46.80 x 1.35 =	63.18 מ"ר	32 x 0.45 x 0.45 =	6.48	
	15.45 x 1.35 =	20.86 מ"ר	12 x 0.45 x 0.45 =	2.43	
	12.20 x 1.35 =	17.15 מ"ר	8 x 0.45 x 0.45 =	1.62	
	15.0 x 1.35 =	20.25 מ"ר	12 x 0.45 x 0.45 =	2.43	
	57.25 x 1.35 =	77.29 מ"ר	36 x 0.45 x 0.45 =	7.29	
	15.0 x 1.35 =	20.25 מ"ר	12 x 0.45 x 0.45 =	2.43	
	12.25 x 1.35 =	16.54 מ"ר	8 x 0.45 x 0.45 =	1.62	
	15.45 x 1.35 =	20.86 מ"ר	12 x 0.45 x 0.45 =	2.43	
	47.90 x 1.35 =	63.86 מ"ר	32 x 0.45 x 0.45 =	6.48	
	15.45 x 1.35 =	20.86 מ"ר	8 x 0.45 x 0.45 =	1.62	
	11.80 x 1.35 =	15.93 מ"ר	8 x 0.45 x 0.45 =	1.62	
	15.90 x 1.35 =	21.47 מ"ר	12 x 0.45 x 0.45 =	2.43	
	46.80 x 1.35 =	63.18 מ"ר	32 x 0.45 x 0.45 =	6.48	
	15.45 x 1.35 =	20.86 מ"ר	8 x 0.45 x 0.45 =	1.62	
	11.80 x 1.35 =	15.93 מ"ר	8 x 0.45 x 0.45 =	1.62	
	15.45 x 1.35 =	20.86 מ"ר	12 x 0.45 x 0.45 =	2.43	
	28.20 x 1.35 =	38.07 מ"ר	20 x 0.45 x 0.45 =	4.05	
	ה' צל' סול	77.19 מ"ר	ה' צל' סול	28.57 מ"ר	
	ה' צל' סול	78.57 מ"ר			
	ה' צל' סול	695.62 מ"ר			

כ"ב

חשבונית

Al'no efen

על ידי - ח'לל בנפשו ח'לל

2' on 10

[illegible]

35.29

תאריך

חש"ב כח"ל

4 מ"ר 3

כא"צ - ח"ל כח"ל א"צ

מס' סדר	חשוב גובה	גובה ממוצע	חשוב שטח	שטח מ"ר	נפח מ"ר
	ק"א מ"ר 64		ק"א מ"ר 60		
	$20.25 \times 0.90 =$ 18.23 מ"ר		$23.20 \times 0.90 =$ 20.88 מ"ר		
	$3.65 \times 1.35 =$ 4.93 מ"ר		$3.65 \times 1.35 =$ 4.93 מ"ר		
	25.16 מ"ר		25.81 מ"ר		
	50% ח"ל א"צ 12.71 מ"ר		50% ח"ל א"צ 12.91 מ"ר		
	ח"ל א"צ 12.71 מ"ר		ח"ל א"צ 12.91 מ"ר		
	ק"א מ"ר 63		ק"א מ"ר 59		
	$20.80 \times 0.90 =$ 18.72 מ"ר		$19.80 \times 0.90 =$ 17.82 מ"ר		
	$3.90 \times 1.50 =$ 5.85 מ"ר		$3.40 \times 1.35 =$ 4.59 מ"ר		
	24.57 מ"ר		22.41 מ"ר		
	50% ח"ל א"צ 12.02 מ"ר		50% ח"ל א"צ 12.21 מ"ר		
	ח"ל א"צ 12.02 מ"ר		ח"ל א"צ 12.21 מ"ר		
	ק"א מ"ר 62		ק"א מ"ר 58		
	$19.60 \times 0.90 =$ 17.64 מ"ר		$20.05 \times 0.90 =$ 18.05 מ"ר		
	$3.65 \times 1.55 =$ 5.66 מ"ר		$3.40 \times 1.45 =$ 4.93 מ"ר		
	23.30 מ"ר		22.98 מ"ר		
	50% ח"ל א"צ 11.65 מ"ר		50% ח"ל א"צ 11.49 מ"ר		
	ח"ל א"צ 11.65 מ"ר		ח"ל א"צ 11.49 מ"ר		
	ק"א מ"ר 61		ק"א מ"ר 57		
	$20.65 \times 0.90 =$ 18.59 מ"ר		$22.50 \times 0.90 =$ 20.25 מ"ר		
	$3.40 \times 1.35 =$ 4.59 מ"ר		$3.40 \times 1.50 =$ 5.10 מ"ר		
	23.18 מ"ר		25.35 מ"ר		
	50% ח"ל א"צ 12.49 מ"ר		50% ח"ל א"צ 12.68 מ"ר		
	ח"ל א"צ 12.49 מ"ר		ח"ל א"צ 12.68 מ"ר		

סדר רישית בנין בע"מ

חש"ב כח"ל

מפקח

3.5.79

תאריך

חלק כח"א

5' 3"

3.5' - 3.5' בניסוח לביטוי

מס' סדר	חשוב גובה	גובה ממוצע	חשוב שטח	שטח מ"ר	נפח מ"ר
	ק"ג מ"ס 56		ק"ג מ"ס 52		
	$23.40 \times 0.90 =$	21.06 מ"ר	$23.20 \times 0.90 =$	20.88 מ"ר	
	$3.60 \times 1.00 =$	5.76 מ"ר	$3.40 \times 1.35 =$	4.59 מ"ר	
		26.82 מ"ר		25.47 מ"ר	
	50% חישוב אבזוק	13.41 מ"ר	50% חישוב אבזוק	12.74 מ"ר	
	50% חישוב אבזוק	13.41 מ"ר	50% חישוב אבזוק	12.74 מ"ר	
	ק"ג מ"ס 55		ק"ג מ"ס 51		
	$19.30 \times 0.90 =$	17.37 מ"ר	$19.60 \times 0.90 =$	17.64 מ"ר	
	$3.65 \times 1.00 =$	5.84 מ"ר	$3.40 \times 1.45 =$	4.93 מ"ר	
		23.21 מ"ר		22.57 מ"ר	
	50% חישוב אבזוק	11.61 מ"ר	50% חישוב אבזוק	11.29 מ"ר	
	50% חישוב אבזוק	11.61 מ"ר	50% חישוב אבזוק	11.29 מ"ר	
	ק"ג מ"ס 54		ק"ג מ"ס 50		
	$20.45 \times 0.90 =$	18.41 מ"ר	$20.45 \times 0.90 =$	18.41 מ"ר	
	$3.85 \times 1.00 =$	6.16 מ"ר	$3.65 \times 1.35 =$	4.93 מ"ר	
		24.57 מ"ר		23.34 מ"ר	
	50% חישוב אבזוק	12.29 מ"ר	50% חישוב אבזוק	11.67 מ"ר	
	50% חישוב אבזוק	12.29 מ"ר	50% חישוב אבזוק	11.67 מ"ר	
	ק"ג מ"ס 53		ק"ג מ"ס 49		
	$22.50 \times 0.90 =$	20.25 מ"ר	$22.50 \times 0.90 =$	20.25 מ"ר	
	$3.95 \times 1.30 =$	6.21 מ"ר	$3.45 \times 1.50 =$	5.18 מ"ר	
		26.46 מ"ר		25.43 מ"ר	
	50% חישוב אבזוק	13.48 מ"ר	50% חישוב אבזוק	12.72 מ"ר	
	50% חישוב אבזוק	13.48 מ"ר	50% חישוב אבזוק	12.72 מ"ר	

שדה חידת בנין בע"מ

המסודר בוצע

מס' 73

3.5.78

תאריך

חשק כח'ול

6 סמ' 1/3

אמצע

מס' סדר	חשוב גובה	גובה ממוצע	חשוב שטח	שטח מ"ר	נפח מ"ר
	כניסות למקלבים		חברת גליל לקו חשק		
	1.60 x 0.90 = 1.44 מ"ר		מקלבים מס' 1		
	1.60 x 0.90 = 1.44 מ"ר				
	1.65 x 0.90 = 1.49 מ"ר		6.15 + 6.70 + 13.50 = 26.35 מ"ר ✓		
	2.0 x 0.90 = 1.80 מ"ר		מקלבים מס' 2		
	2.20 x 0.90 = 1.98 מ"ר				
	2.20 x 0.90 = 1.98 מ"ר		6.10 + 7.10 + 15.60 = 28.80 מ"ר ✓		
	מקלבים מס' 3				
	חברת דן גליל מינע' גליל כנס		מקלבים מס' 3		
	כניסות לחולות 2 מינע' סליליות		6.10 + 6.65 + 16.30 = 29.05 מ"ר ✓		
	2.70 x 1.35 = 3.645 מ"ר		מקלבים מס' 4		
	24 x 3.645 = 87.48 מ"ר				
	חשק קליל בברזל		מקלבים מס' 5		
	8.75 x 0.45 x 0.45 = 1.82 מ"ר		6.0 + 7.65 + 16.20 = 30.35 מ"ר ✓		
	1.772 x 42.53 = 75.36 מ"ר		מקלבים מס' 6		
	24 x 75.36 = 1808.64 מ"ר		6.0 + 8.0 + 12.75 = 26.75 מ"ר ✓		
	סליל כניסות 2-חולות		26.35 + 28.80 + 29.05 + 25.10 + 30.35 + 26.75 = 166.40 מ"ר ✓		
	87.60 מ"ר סליל		סליל חכום לקו חשק		
	43.53 מ"ר סליל				
	43.72 מ"ר סליל				
	41.07 מ"ר				
			שטח חנוכת בנין בע"מ		
			הקניסה בוצע		

35. 29

תאריך

11/12 21/11

7 on 13

ପ୍ରାଣୀ - ଚିତ୍ରାଳୟ

מס' סדר	חשוב גובה	חשוב שטח	שטח מ'	נפח מ'
	מחיר של יארד			
1	$\frac{1}{6}(36.50 + 31.50) \times 573.45 = 18273.30$ מ"ר	$31.40 \times 25.20 = 56.60$		
2	$\frac{1}{2}(28.0 + 25.20) \times 573.45 = 15253.77$ מ"ר	$36.50 + 28.00 = 64.50$		
	33527.07 מ"ר	$121.1 : 2 = 60.55$		
	$553.75 \times 60.55 = 33529. -$			
	הכרחי			
	24 x 64.5 = 1548.0 מ"ר של ק"מ 6 x 25.0 = 150.0 מ"ר של מ'ק"מ 31.30 x 12.20 = 397.51 מ"ר של חקל 23.60 x 7.20 = 181.72 מ"ר של חקל 6.0 x 4.50 = 27.0 מ"ר חסכת מים 3 x 4 x 5 = 60.0 מ"ר חסכת מים 3 x 5.5 x 5.10 = 84.15 מ"ר של ק"מ 12.40 x 34.0 = 421.60 מ"ר של ק"מ 22.0 x 30.3 = 666.60 מ"ר של ק"מ 2869.98 מ"ר של ק"מ 3536.58 מ"ר של ק"מ 358.11 מ"ר של ק"מ 3228.09 מ"ר של ק"מ 33527.07 מ"ר של ק"מ 3536.58 מ"ר של ק"מ 29993.49 מ"ר של ק"מ	573.45 1.10 1.20 575.75 22.00 553.75	לפי חקל מ'ק"מ	
	3 x 5.5 x 5.10 = 84.15 מ"ר של ק"מ 12.40 x 34.0 = 421.60 מ"ר של ק"מ 22.0 x 30.3 = 666.60 מ"ר של ק"מ 2869.98 מ"ר של ק"מ 3536.58 מ"ר של ק"מ 358.11 מ"ר של ק"מ 3228.09 מ"ר של ק"מ 33527.07 מ"ר של ק"מ 3536.58 מ"ר של ק"מ 29993.49 מ"ר של ק"מ	1053.73 695.62 358.11	לפי חקל מ'ק"מ	
	33529. - מ"ר של ק"מ 3228.09 מ"ר של ק"מ 30301. - מ"ר של ק"מ 1068. - מ"ר של ק"מ 31369. - מ"ר של ק"מ	30301. - מ"ר של ק"מ 1068. - מ"ר של ק"מ 31369. - מ"ר של ק"מ	לפי חקל מ'ק"מ	
	חלקי נחל			
	1.40 x 1.60 = 2.24 מ"ר 1.20 x 1.50 = 1.80 מ"ר לפי חקל מ"ר 1.04			

2195 1111

ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେ - ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

8 ON 13

[illegible]

סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת-גן, רחוב הרא"ה 7

טלפון: 72 42 35, 73 34 36

טלפון פרטי: 73 96 47

3.5.79

תאריך

כ"א' אלול

9' 13' 9

מ/א 24 ית' צ"ור

מס' סדר	חשוב גובה	גובה מסומע	חשוב שטה	שטח מ'	נפח מ'
	ר' צ"ל אפ"ר		ר' צ"ל צדקני		
	696.62 מ"ר	סל' מרכז	78.57 מ"ר	סל' מרכז	
	11.59 מ"ר	ק"מ אס' 71	11.59 מ"ר	מ"ר	
	15.31 מ"ר	ק"מ אס' 72	15.31 מ"ר	מ"ר	
	14.79 מ"ר	ק"מ אס' 70	14.79 מ"ר	מ"ר	
	12.54 מ"ר	ק"מ אס' 69	12.54 מ"ר	מ"ר	
	13.17 מ"ר	ק"מ אס' 68	13.17 מ"ר	מ"ר	
	13.58 מ"ר	ק"מ אס' 67	13.58 מ"ר	מ"ר	
	11.56 מ"ר	ק"מ אס' 66	11.56 מ"ר	מ"ר	
	13.00 מ"ר	ק"מ אס' 65	13.00 מ"ר	מ"ר	
	12.71 מ"ר	ק"מ אס' 64	12.71 מ"ר	מ"ר	
	12.02 מ"ר	ק"מ אס' 63	12.02 מ"ר	מ"ר	
	11.65 מ"ר	ק"מ אס' 62	11.65 מ"ר	מ"ר	
	12.49 מ"ר	ק"מ אס' 61	12.49 מ"ר	מ"ר	
	12.91 מ"ר	ק"מ אס' 60	12.91 מ"ר	מ"ר	
	12.21 מ"ר	ק"מ אס' 59	12.21 מ"ר	מ"ר	
	11.49 מ"ר	ק"מ אס' 58	11.49 מ"ר	מ"ר	
	12.68 מ"ר	ק"מ אס' 57	12.68 מ"ר	מ"ר	
	13.41 מ"ר	ק"מ אס' 56	13.41 מ"ר	מ"ר	
	11.61 מ"ר	ק"מ אס' 55	11.61 מ"ר	מ"ר	
	12.29 מ"ר	ק"מ אס' 54	12.29 מ"ר	מ"ר	
	13.48 מ"ר	ק"מ אס' 53	13.48 מ"ר	מ"ר	
	12.72 מ"ר	ק"מ אס' 52	12.72 מ"ר	מ"ר	
	11.29 מ"ר	ק"מ אס' 51	11.29 מ"ר	מ"ר	
	11.67 מ"ר	ק"מ אס' 50	11.67 מ"ר	מ"ר	
	12.72 מ"ר	ק"מ אס' 49	12.72 מ"ר	מ"ר	
	10.13 מ"ר	ק"מ אס' 48	10.13 מ"ר	מ"ר	
	43.07 מ"ר	ק"מ אס' 47	43.07 מ"ר	מ"ר	
	1053.73 מ"ר	סכ"מ ר' צ"ל אפ"ר	424.01 מ"ר	סכ"מ ר' צ"ל צדקני	
	135.48 מ"ר	סכ"מ אפ"ר	10.63 מ"ר	סכ"מ אפ"ר	
	1185.75 מ"ר	סכ"מ ר' צ"ל אפ"ר	434.64 מ"ר	סכ"מ ר' צ"ל צדקני	
	1189.71 מ"ר		434.55 מ"ר		
				סדר ד	
				בע"פ	
				ה	
				הספק	

3.5.99

תאריך

ר"ב בנ"ל

אלבנה 24 י"ב ב"ר

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת-גן, רחוב הרא"ח 7

טלפון: 73 34 36, 72 42 35


טלפקס: 73 96 47

מס' סדר	חשוב גובה	גובה ממוצע	חשוב שטח	שטח מ'	נפח מ'
	חברת אלבנה ל קו חש				
	106.40 מ"א				
	51.31 מ"א	אסקוויג			
	217.75 מ"א	סה"כ חברה אלבנה			
	חלק נחל				
	4.04 מ"ר				
	2.92 מ"ר	שטח אסקוויג			
	7.01 מ"ר	סה"כ שטח חלק נחל			
	יארק' מ"ר 30 מ"ר				
	29990.49 מ"ר				
	1216.14 מ"ר	שטח אסקוויג			
	31204.66 מ"ר	סה"כ שטח יארק'			
	מסלול וסביב אגן סביב				
	הגובה חש				
	10 י"א -				
	1967.5 מ"ר	10 x 1967.5 מ"ר			
	1967.5 מ"ר				

ח/בנין בע"מ
החשבונית
החשבונית


1:260 א.ל.
אדמה


גבול - שורים -

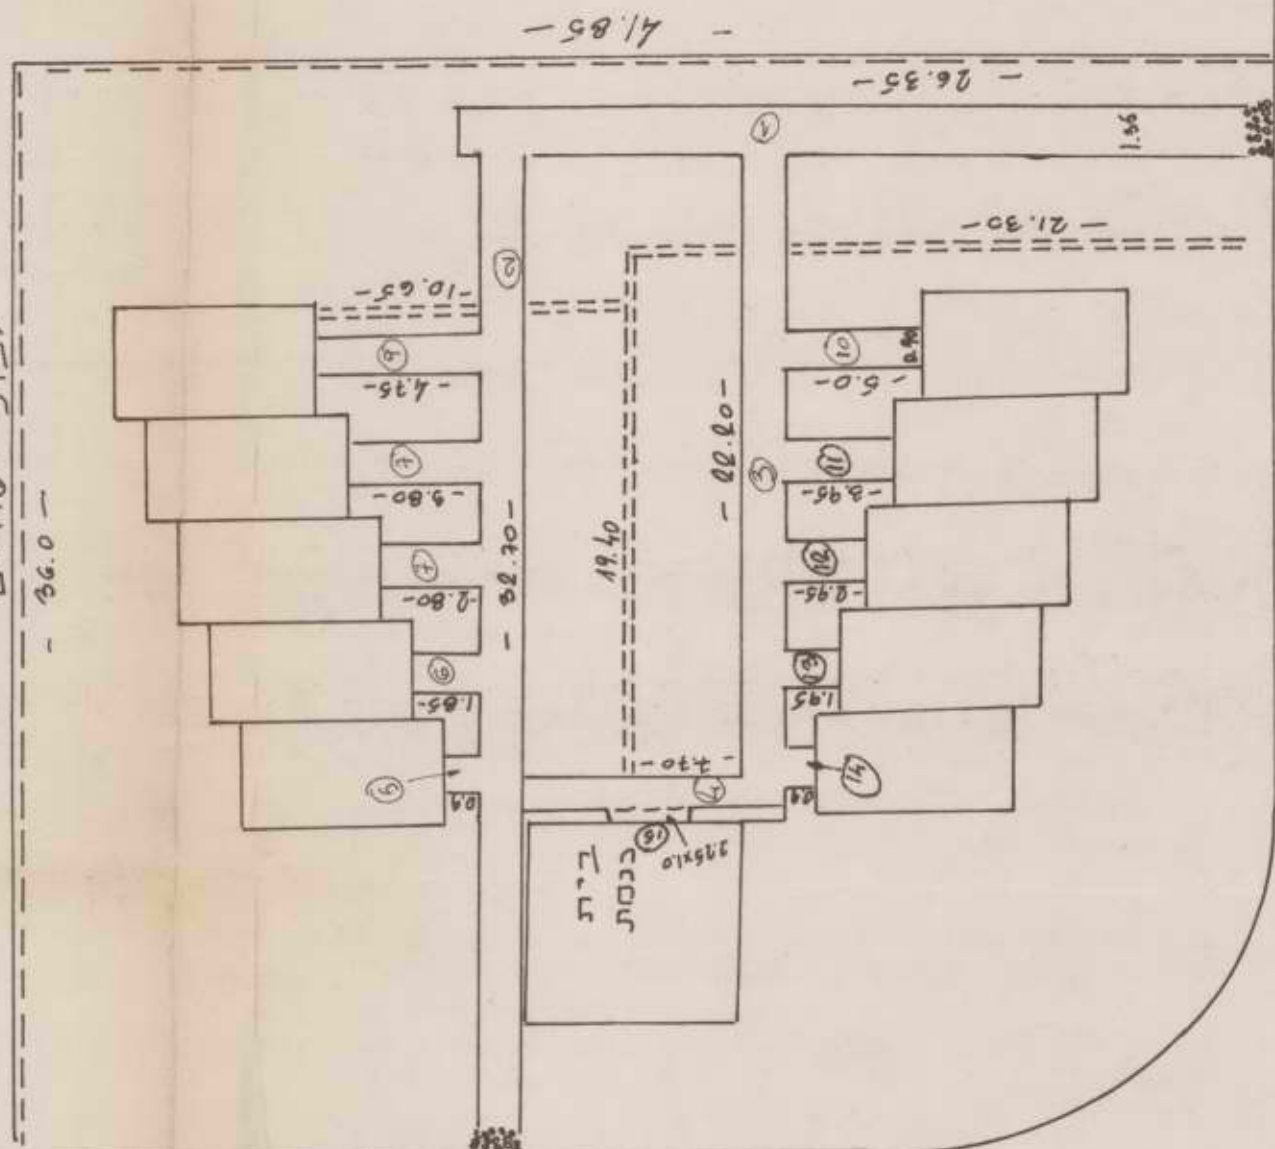


גובה
1:250

גובה - שורים

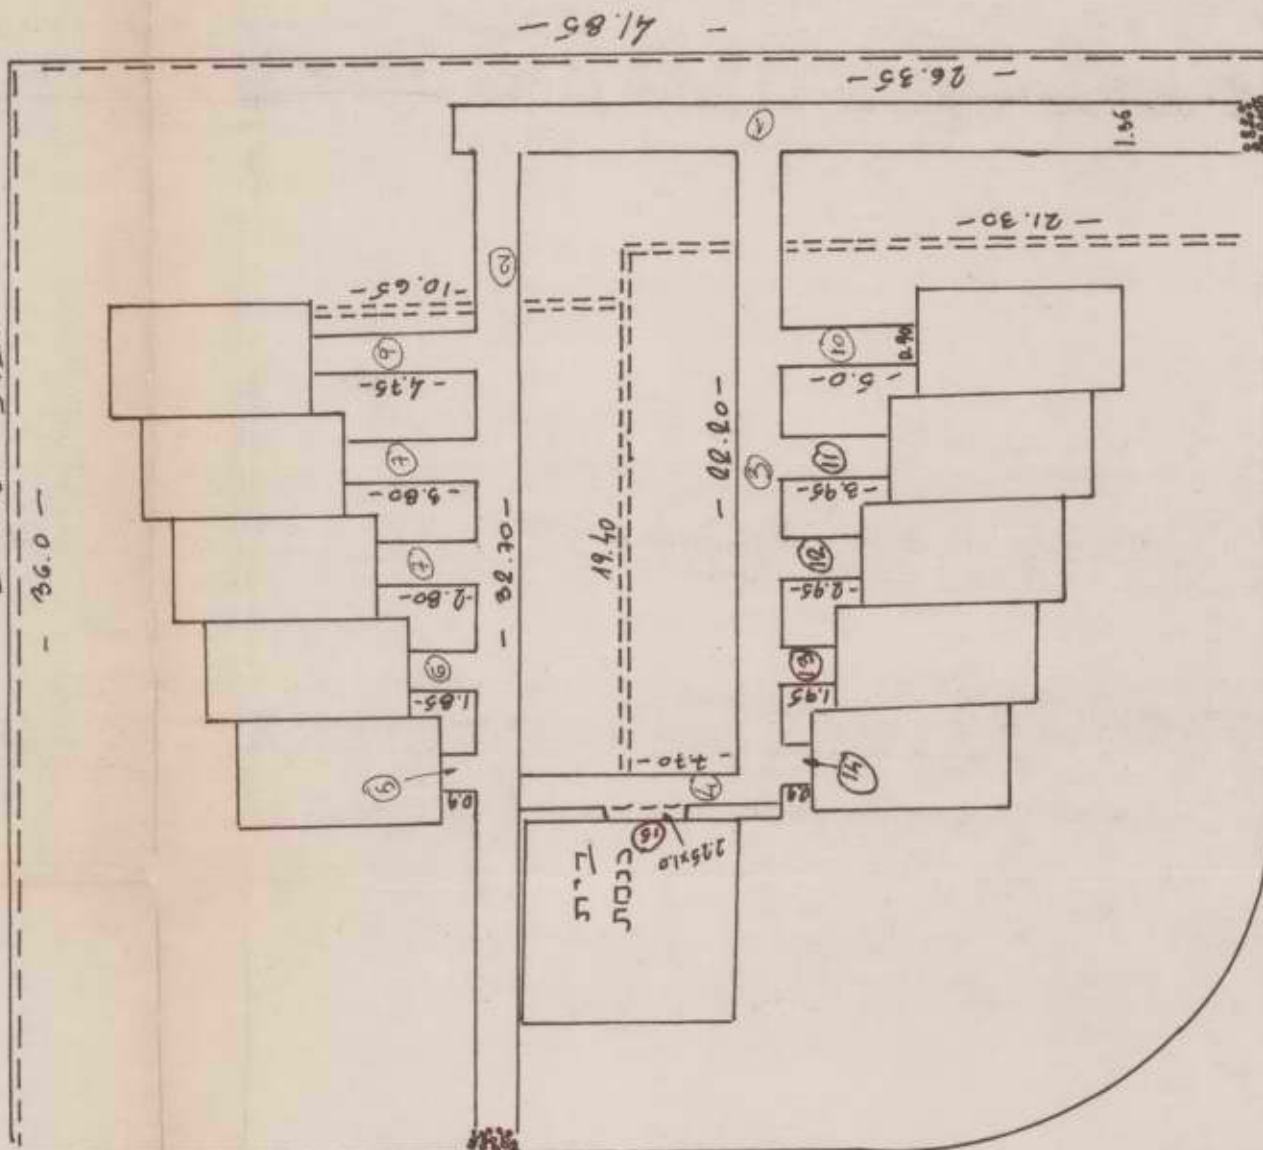

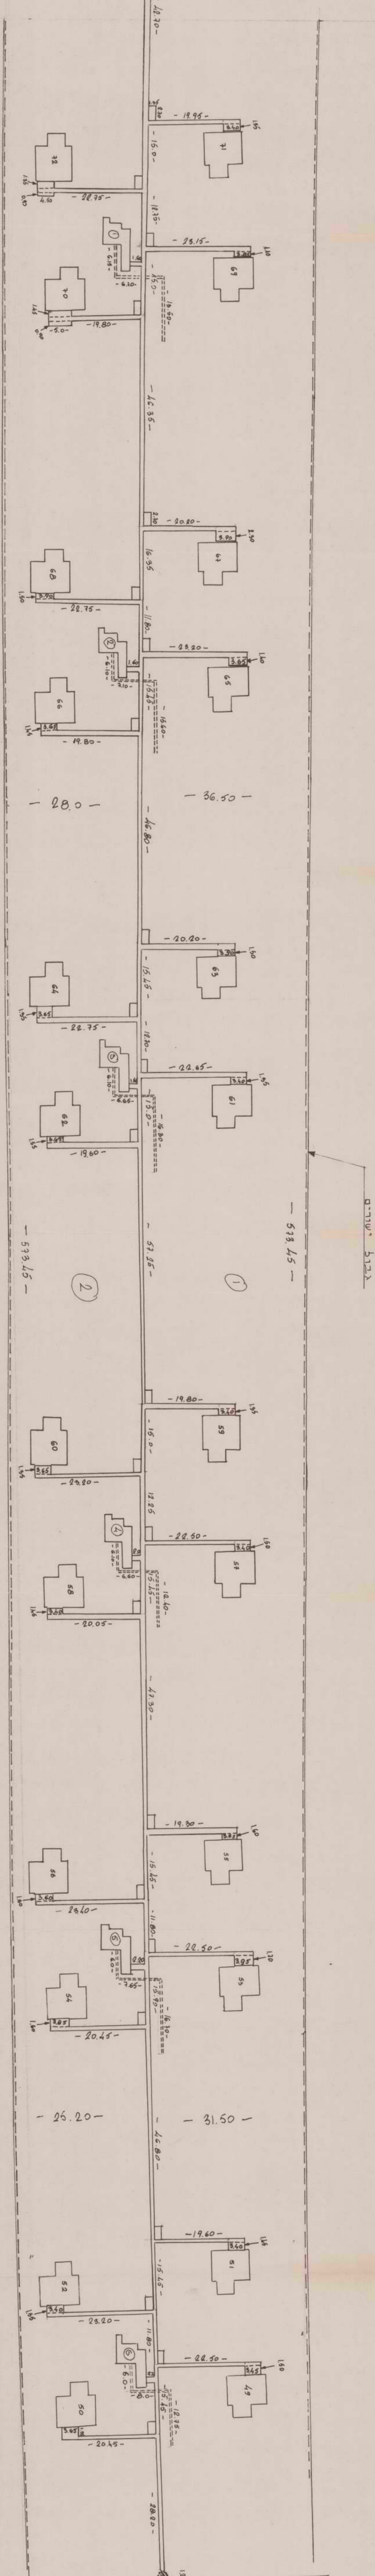

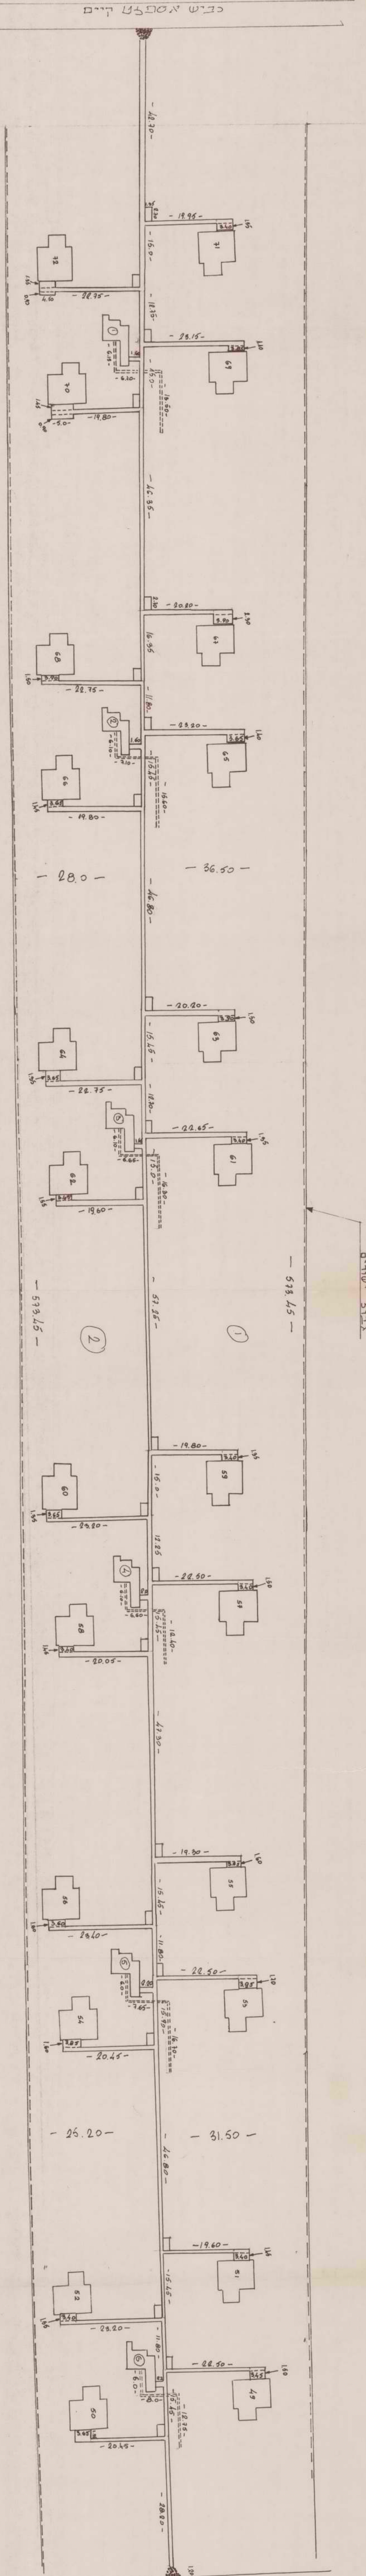

77X18
150007

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הקריה, חל אביב
ת.ד. 7021

לה (3) אחוז (א) כ

4606

תאריך:

טופס שינוי חוזה

מספר:

מספר החוזה 9078/75398/78

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך

18-05-1979

לטיפולו של

לעיונו של

אל : הגזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתישבות, עליות חדשות.

א. פרטי הזיהוי:-

שם המחוז

נגב

שם הישוב

אוגדה

שם הקבלן

חב" סול כביש בע"מ

ב. הרכב החוזה הקיים:- עבודות תשתית

הקיים בל"י

600,000

ג. מהות השינוי:-

המתקן בל"י

725,000

השינוי בל"י

125,000

תשלום התיקונים

924 32

9039 - 50.60

ג ב ר כ ה

ד. בן יהודה

חשב המשרד

מר גלית

ראש המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

חתימת הקבלן

חתימת רשות מקומית

חתימה

תאריך

העתיקים:

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ובצוע

מר ר. לשת, ממנה על יישובים חדשים

מר א. בלח, ממנה על חוזים ומכרזים

מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז

אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית, ת"א

גזברות (2)

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

מס': 4600/1
באר-שבע, 4.5.47

אל: ד. אליהו
מא: ד. חנוך

הנדון: ח.א. חק' 4.5.47
דג' 210

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבוני אלקי/מוציא פס'
לעבודה
במשק/ מושב
לפי חוזה
על סך
הערות:

לוטת: 1/1

העתק:

מהגדס אזור

הקבלן

מחזרם המחוז

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

מס' _____

באר-שבע, _____

אל: _____

מאת: _____

הנדון: _____

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשכון חלקי/סומי מס' _____

לעבודה _____

במשק / מושב _____

לפי חוזה _____ הקבלן _____

על סך _____

הערות: _____

לוטת: _____

העתק: _____

מהנדס אזור _____

הקבלן _____


סגנים המחוז

724233	רח' מרואת 7 ר"ג		סולכניס בע"מ
סלסון	מען (כולל מיקוד)	חריז	שם החברה/הקבלן

שם הישוב	שם המחוז
סרוייקס	אוביקס

חשבון חלקי מס' 4 לחוזה מס':
7 8 / 7 5 3 9 8 / 7 8
מאות העבורה

היקפים	חוזה מקורי	הגדלות מצטברות ללא התייקרות	התייקרויות מצטברות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן	600,000.-	125,000.-		725,000.-
לשמוש הגזברות				

חותמת קבלה
גזברות

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר: -

העברה מנספח לח-מס'	הערות לדף	סה"כ לדף	אחוז מצטבר לפי חוזה	סה"כ מצטבר לתשלום	לשמוש הגזברות
1	עבורות ממנה	770197.88	93	663,879.-	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

תאריך: 29.4.79	התיקרות מצטברת עד תאריך:
----------------	--------------------------

חותמת	סה"כ
סולכניס	מאות חשבונות קודמים
חברה רעיונית/תכנית	סה"כ לתשלום
חותמת הקבלן	

(כולל מעבר לדף)

סה"כ לזכות _____ ל-
קרן בשוח _____ ל-
סעיף תקציבי _____
סקי יומן _____

תפוצה:

- גזברות (2)
- מחוז/מחלקה טכנית
- אגף תכנון והנדסה, יחידת חוזים
- הקבלן

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתימה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	ז"ר		4.5.79
מנהל מח' טכנית	ביצוע			
מנהל חשבונות	תשלום	מר"ל		
ראש מדור	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונות	תשלום			

נספח לחשבון מס' 4 חלקי סופי

78/75398/78

מס' החוזה

סולכביש בע"מ

שם הקבלן

מס' סודר	סעיף החוזה	תאור העבודה	הכמות לפי חוזה	הכמות למעשה	יחידה	מחיר	הסכום
		1. יטוריים 50 מ"מ	18000	15000	מ2	4.-	72000.- 60000.-
		2. יטוריים 30 מ"מ	18000	15000	מ2	3.-	54000.- 45000.-
		3. רצוף כרצפות	1600	1600	מ2	280.-	448000.-
		ק"מ עבודות חשמל					20000.- 62000.-
		ק"מ ערכון החמלמי (צו החמלה 22.1.79)					513000.-
		מ- 1.79 - 8.78					140849
		574990.- x 25.47% = 146.8					146197.80
		276.4					413849.-
		סה"כ					770197.80
		93% ~ 4.1					663849.-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and stamp]

ס"ה

בדקתי את הכמויות

חתימה

שם ותפקיד

תאריך

השרד השיכון
 מינהל לבנייה נכרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 תאריך: 30-03-1979
 נחלקל בתאריך
 לעיון של
 לעיון של
 אל

4606
 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

הקריה, תל אביב
 תאריך: 26.3.79
 מספר 78/75398/78/8359

ד. לשם, מסמך על קליטת חרשות
 מאח : א. בלף

הנדון : הגדלת / הקטנת חוזה 78/75398/78
 העבודה - עבודות מיחור
 המקום - מושב אוגדה
 הקבלן - חב" סולכביש בע"מ
 מהות השינוי - החיקרויות

נא לתגדיל את החוזה הנדון
 ערך החוזה עתה
 בסך 125,000 ל"י
 600,000 ל"י
 ס"ה 725,000 ל"י

ההגדלה היא לצורך כצו:

1. ע"ח החיקרות להתחלת העבודה (1/79 = 25.5%) = 120,400 ל"י
 2. ע"ח שבות 4,600 ל"י
 סה"כ הגדלה 125,000 ל"י

בברכה,
 א. בלף
 מסמך על חוזים ומכרזים

העתקים:
 מהנדס מחוז - הנגב
 הקבלן - חב" סולכביש בע"מ
 גזברות המינהל

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

כס"ב/446

30.3.79

כס"ב

באר-שבע

מ. אברהם ג"א

מלך המלך

אלי

מאת :

הנדרון: חן הוז 3.04 עה"צ
אברהם

3

רצ"ב הננו מעבירים אליהם חשבון חלקי/כופי פס'

לעבודה

אברהם

מלך המלך

45398/45

במשק / מושב

הקבלן

מס' 550900

למי חוזה

על סך

הערות :

מ. אברהם ג"א

לוטסה :

מחנכים הסמיו

העתק : מסיבה זו

מהגדר אזור

הקבלן

28.3.79

תאריך

המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

משרד השיכון

אל: מחוז הדרום

724235 28x3x78	רח' הרואה 7 ר"ג	חורז	מולבביש בע"מ
טלפון	מען (כולל מיקוד)		שם החברה/הקבלן

שם הישוב	שם המחוז
אוגדה	הנגב
פרויקט	אוביקט

חשבון חלקי מס' 3 לחוזה מס':

8 / 7 8 / 9 0 87 / 7 5 3 9 8 / 7 8 /

מהות העבודה עבודות פתוח במושב אוגדה

חותמת קבלה
מברות

היקפים	חוזה מקורי	הגדלות מצטברות ללא התייקרות	התיקרויות מצטברות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן	600,000.-			600,000.-
לשמוש הגזברות				

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר: -

העברה מנספח לח-ן מס'	הערות לרף	סה"כ לרף	אחוז מצטבר לפי חוזה	סה"כ מצטבר לתשלום	לשמוש הגזברות
1	עבודות פתוח	658414 720197.80	85%	559909 612168.-	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

--	--

--	--

(ביול מעבר לרף)

התיקרות מצטברת עד תאריך

סה"כ
פחות חשבונות קודמים
סה"כ לתשלום

תאריך 28.3.79

חותמת

מולבביש בע"מ
חברה לעבודות בניה ופיתוח במים
חותמת הקבלן

לשימוש משרד השיכון

- סה"כ לזכות ל-1
- קרן בטוח ל-1
- סעיף תקציבי
- סקי יומן
- תפוצה:
- (1) גזברות (2)
- (2) מחוז/מחלקה טכנית
- (3) אגף תכנון והנדסה יחידת חוזים
- (4) הקבלן

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתומה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	צ'צ'		30.3.79
מנהל מח' טכנית	ביצוע			
מנהל חשבונות	תשלום	דנו"		
ראש מדור	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונות	תשלום			

חלקי
סופי

3 נספח לחשבון מס'

9078/75398/78

מס' החוזה

סולכביש בע"מ

שם הקבלו

מס' סדר	סעיף החוזה	תאור העבודה	הכמות לפי חוזה	הכמות למעשה	יחידה	מחיר	הסכום
1.		ישורים בגולות + 50 ס"מ	18000	18000	מ	4.-	60000 72000.-
2.		ישורים בגולות + 30 ס"מ	18000	18000	מ	3.-	45000 54000.-
3.		רצוף מרצפות אפור חלק	1500	1500			42000.-
		45/5	1600	1600	מ	280.-	448000.-
			1600				574000.-
							525000.-
ע"ח ערכון התחלתי (צו התחלת העבודה ב-22.1.79)							
		מ-1.79 - 8.78					
		325000					133414
		574000.-					146197.80
		25.47 = 346.8					
		276.4					
							720197.80
							658414

בדקתי את הבמויות

ס"ה

חתימה

שם ותפקיד

תאריך

המנוסד: נתיבות סלפון 057-92320

תאריך

5381

$\{n \in \mathbb{N} \mid \exists p \in \mathbb{P} \text{ such that } p \mid n\}$

(344)
 $\cdot \pi \cdot 3$
 $\overline{13.50}$
 1
 9
 1
 6.15
 2

$$\begin{array}{r} 344 \\ \pi \cdot 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15.60 \\ \pi \cdot 3 \\ \hline \end{array}$$

21. (a) 1100000
 (403)
 - 16.8 - 0.2
 1098320
 3
 1098320
 4
 1098320

$$\begin{array}{r} 111000 \\ (903) \\ \underline{111000} \\ 000000 \end{array}$$

11
 12.40
 (345)
 11

קריטריונים להבחנה
הראשונה


חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת-גן, רחוב הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

חמוסד: נתיבות טלפון 057-923320

תאריך

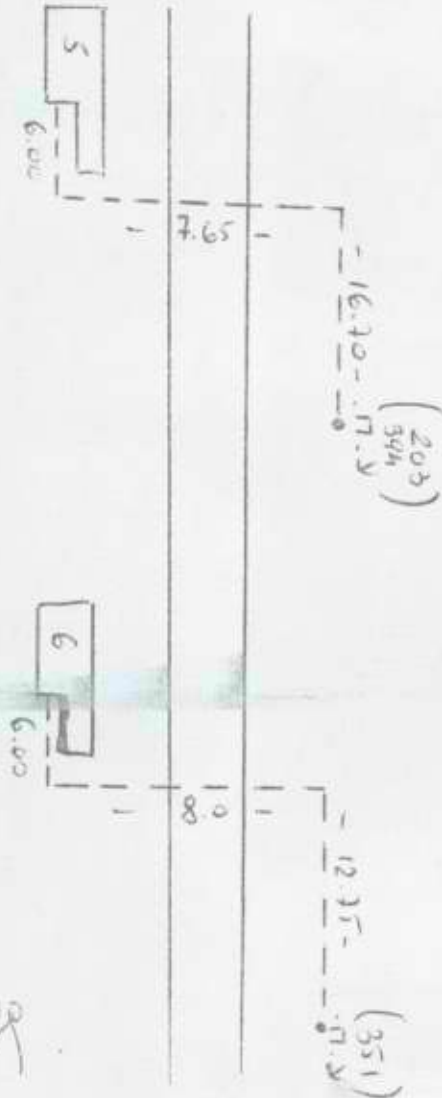


למדינה

16.2.79

תלפון : 057-92310

תאריך

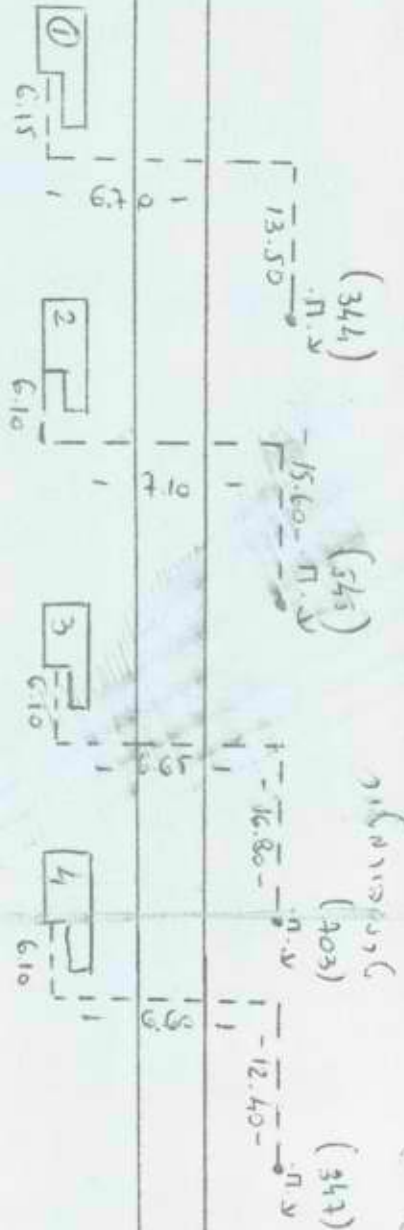

[Handwritten notes:]

11-12.40 - 7.5
203)
347)

[Faint handwritten text:] Help near Club to ...
[Signature] 16/2


חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת-גן, רחוב הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

המסד: גתיבות טלסון 057-92320

האריך

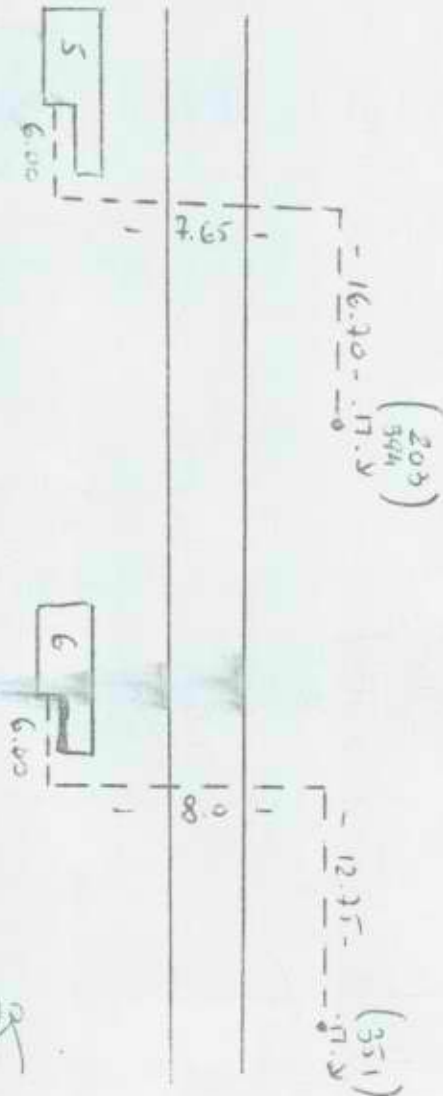

לדפוס

16.2.40

אגף לבניה כפרית -

הקבלן

אגף לבניה כפרית -

כאשר נחשב

2-10 1/2 : 882

הנדון:

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/מאמי מס'

לעבודה

במשק / מושב

למי חוזה

על סך

הערות :

לוח :

העתק :

פרנסה וזיווג

הקבלן

תאריך 26.2.79

אל: מחוז הדרום

724235	רח' הרואה 7 ר"ג	חז"ז	סולכביש כע"מ
סלפון	מען (כולל מיקוד)		שם החברה/הקבלן

שם המכון	שם הישוב
הנגב	אוגדה
אוביקט	פרוייקט

חשבון חלקי מס' 2 לחוזה מס':

/ 9 0 7 8 / 7 5 3 9 8 / 7 8

מהות העבודה: עבודות פחוח במושב אוגדה

חותמת קבלה
גזברות

היקפים	חוזה מקורי	הגדלות מצטברות ללא התייקרות	התיקרויות מצטברות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן	600,000.-			600,000.-
לשמוש הגזברות				

לחלן פירוט החשבון החלקי המצטבר: -

העברה מנספח לח-1 מס'	הערות לדרך	סה"כ לדרך	אחוז מצטבר לפי חוזה	סה"כ מצטבר לתשלום	לשמוש הגזברות
1	עבודות פחוח	242,420	87%	240,312	
2		201,104.-		239,006.40	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

תאריך 26.2.79

התיקרות מצטברת עד תאריך

חותמת

"סולכביש"

חברה לעבודות בנייה ופחוח כע"מ

חותמת הקבלן

סה"כ

שקל הנדסת בנין בע"מ

העבודה ביצע פחות חשבונות קודמים

סה"כ לתשלום

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

(ביול מעבר לדרך)

סה"כ לזכות _____ ל-
 קרן בשח _____ ל-
 טעף תקציבי _____
 סק יומן _____

ת פ ו צ ה :

(1) גזברות (4)

(2) מחוז

(3) אגף תכנון והנדסה, יחידת תוזים

(4) הקבלן

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתומה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	ר"ג		13.79
מהנדס המכון	ביצוע			
חשב כסויות	תשלום	ל"ו"		
מנהל חשבונות	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונות	תשלום			

חלקי
סופי

נספח לחשבון מס' 2

סולכביש בע"מ

שם הקבלן

מס' החוזה 9078/75398/78

[illegible]

בדקתי את הכמויות

ס"ה

תאריך

שם ותפקיד

חתימה

19.2.79

אל:מר אצלך-ממנה על הוצים ומכרזים

4606/-2231

הביוז: הגדלת הוצה מס' 78/75398/78 עבודות פתוח באוגדה.

אבקשך להגדיל את החזרה הקיים לפי הפירוט הבא:

574000

עלות העבודה

בסיס מחירים 8.78 בלי פ.ק. מדד 276.4

התוחלת עבודה 22.1.79 מדד 346.8

התיקורת התחלתית 25.5%

$= 25.5\% \times 574000$

146370

720370

סה"כ

574000

פחות סכום החזרה הקיים

146370

סה"כ להגדלה

בברכה,

ר. קנטרובסקי

ס/מחזרס מחוז הנגב בפועל

העתקים:

מר א. שטרן-ס/ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון ולביצוע

מר ר. לשם-ממנה על ישרבים חרשים

מר י. זיידה-ראש צוות ערבה וסיג

U.S. 91

WATER RESOURCES DIVISION OF THE ARMY CORPS OF ENGINEERS

WASH., D.C.

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

ON THE LANDS OF THE UNITED STATES

IN THE

STATE OF

NEW YORK

FOR THE YEAR 1891

AND FOR THE YEAR 1892

AND FOR THE YEAR 1893

1891

1892

1892

1893

1893

1894

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ
רמתגן, רח' הוא"ה 7, ת.ד. 2741
טלפון פרטי: 73 96 47
טלפון: 72 42 35, 73 14 36

29.1.79

4606

תשרד השיכון
מינהל לגגיות ודירות ויישורים חדשים
אחידות ת.נ.ב.
נחקבל בתאריך
דאר נכנס
31-01-1979
לטיפול של
לעיונו של

לכבוד
מינהל לבניה בפריח
לידי מר קנטרובסקי
באר-שבע.

א.נ.א.

הנדון: עבודות פתוח באוגדה
חוזה 78/75398/78

בבקשתם בזה לערך הגדלה לחוזה הנ"ל בקשר לעדכון
המחירים התחלתי - לפי הפרוט הבא:

התחלת העבודה - לפי צו התחלה - 22.1.79

בסיס המחירים 8.78 - ב.ש.ק - מדד הבניה

עדכון התחלתי הקופה מ-8.78 - 12.78

$$17.16\% = \frac{325.6}{277.9}$$

נודה לכם על טפול מידי בענין.

בפל הכבוד,

"סולכביש" בע"מ

העתק: למר י. זיידה - מהנדס האזוכ
למשרד ש.ה.ל

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון פרטי: 73 96 47

טלפון: 73 14 36, 73 42 35

משרד השיכון

מינהל לבניית כפרות ויישובים חדשים

פ.ח.ז. ת.ג.ג.

נתקבל בתאריך
תאריך

דא"ר

2-01-1979

29.1.79

לכבוד

מינהל לבניה כפרית

לידי מר קנטרובסקי

באר-שבע.

לטיפולו של

לעזרנו של

א.ג.

הנדון: עבודות פתוח באוגדה

חוזת 78/75398/78

נבקשכם בזה לערך הגדלה לחוזת הנ"ל בקשר לעדכון המחירים התחלתי - לפי הפרוט הבא:

התחלת העבודה - לפי צו התחלה - 22.1.79

בסיס המחירים 8.78 - ב.ש.ק - מדר הבניה

עדכון התחלתי חקופה מ-8.78 - 12.78

$$17.16\% = \frac{325.6}{277.9}$$

נודה לכם על טפול מידי בענין.

בכל הכבוד,

"סולכביש" בע"מ

העתק: למר י. זיידה - מהנדס האזוכ
למשרד ש.ה.ל

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון פרטי: 73 96 47

טלפון: 73 14 36, 72 42 35

26.2.79

תאריך

כבוד

ינהל לבניה כפריח

ירי מר קנטרובסקי

אר-שבץ.

ג. 2. 1

הנדון: חוזה 78/75398/78

עב' פתוח באובדה

מכתבנו מ-29.1.79

בתאריך הנ"ל פנינו אליכם בבקשה לערך הגדלה
חוזה שבנדון בקשר לעדכון סחירות התחלתי.

מאחר וההגדלה טרם נערכה ומאחר ובינתיים פורסם
דד של חדש ינואר 1979 - נבקשכם לערכה בהתאם לנתונים
כונים - כדלקמן:

. התחלת העבודה בהתאם לצו - 22.1.79.

. בסיס המחירים 8.78 ב.ש.ק - מדד הבניה.

. עדכון התחלתי מ-8.78 - 1.79

$$24.79\% = \frac{346.8}{277.9}$$

נודה לכם על טפול מידי בעניין.

בכבוד רב,

"סולכביש" בע"מ

עחק: למר י. זיידה - מהנדס אזור
למשרד ש.ה.ל - ב"ש.

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

4606/500

122

738-739

מל' 14. אב' 15. אב' 16.

अनुपम शर्मा : अध्यक्ष

הגדרות: $f: A \rightarrow B$ $f(a) = b$

 $\approx 321/c$

0153

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/חולות פס'

לעבודה

במשק / מושב

32574

הקבלן

לפי חרזה

861200

על סך

הערות :

לוטת :

העתק :

מהנדס אזור

הקבלן

מדינת ישראל

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

פס:

באר שבע:

אלי:

מאמ:

הנדון:

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כס חשבון אלקי/בומי פס'

לעבודה

במשק / מושב

הקבלן

לפי חוזה

על סך

הערות:

לוטת:

העתק:

מהגוס אזור

הקבלן

מהגוס הסחון

תאריך 29.1.79

אל: מחוז הנגב

724235	רח' הרואה 7 ר"ג		סולכביש בע"מ
סלסון	מען (כולל מיקוד)	חריז	שם החברה/הקבלן

שם המחוז	שם הישוב
הנגב	אוגדה
אוביקט	פרוייקט

חשבון חלקי מס' 1 לחוזה מס':

/ 9 0 7 8 / 7 5 3 9 8 / 7 8

מאות העבודה עבודות פיתוח במושב אוגדה

חותמת קבלה
גזברות

היקפים	חוזה מקורי	הגדלות מצטברות ללא התייקרות	התייקרויות מצטברות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן	600,000.-			600,000.-
לשמוש הגזברות				

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר:—

העברה מנספח לח-ן מס'	הערות לדרך	סה"כ לדרך	אחוז מצטבר לפי חוזה	סה"כ מצטבר לתשלום	לשמוש הגזברות
1	עבודות פתוח	72000.-	85%	61200.-	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

החל והנדסה בנין בע"מ

העבודה בוצע

החשבה

תאריך 29.1.79

התיקרות מצטברת עד תאריך

סה"כ

פחות חשבונות קודמים

סה"כ לתשלום

חותמת

סולכביש

חברה לעבודות כבישים ופיתוח בע"מ

החיתמת הקבלן

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתימה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	03115		4.2.79
מהנדס המחוז	ביצוע			
חשב כסויות	תשלום	2001		
פנהל חשבונות	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונות	תשלום			

(ביול סעבר לדרך)

סה"כ לזכות ל---

קרן בטוח ל---

טעין תקציבי

פקי יומן

תפוצה:

(1) גזברות (4)

(2) מחוז

(3) אגף תכנון והנדסה, יחידת חוזים

(4) הקבלן

נספח לחשבון מס'

חלקי
סופי

1

78/75398/78

מס' החוזה

סולכביש בע"מ

שם הקבלן

[illegible]

העבודה בוצע

ה"ס

בדקתי את הכמויות

1.2.79
תאריך

שם ותפקיד

מדינת ישראל 16196 1978

חוזה מס 9078/75398/78

תחילתו של הערך תחילת כיום 26 לחודש 33 שנה 1978

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי משרד השיכון שהקצא לחלו "הממשלה" מצד אחד -

חב" פול כביש בע"מ חתימה שיקרא לחלו "הקבלו" מצד שני.

הואיל והממשלה רוצה בכיצועו של המכנה חיינו עבודות פיתוח במושב אונגה

וקבלה את הצעתו של הקבלן סיום לכיצוע המכנה, הסורה שר 600,000 (בסיליס שש מאות אלף לירות)

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
17-01-1979
לטיפול של
לעיון של

או כל שכום אחר שייקבע בהתאם לחוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לירי הסכם כרלחלו:

1. המסמכים רלחלו יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

א) הצעתו של הקבלן.

ב) תנאי החוזה לכיצוע מכנה ע"י הקבלן.

ג) תנאים מיוחדים.

ד) מפרט כללי לעבודות בניין של הוערה הבינמשרדית

ה) חוספות ושנויים למפרט הכללי לעבודות בניין. ילאופני המדידה והתשלום.

ו) הצהרות הקבלן על טיב ועל אי חריית רטיבות ופונרנסציה.

ז) תכנית.

ח) כתב חכמויות והמחירים ו או החיאותים הסכניים למכנים.

ט)

2. הסורה השלום שכר החוזה כמסמכם בחוזה, סחחיוב הקבלן לבצע את המכנה בהתאם לחוראות החוזה.

3. הסורה כיצוע המכנה ע"י הקבלן כאסור לעיל מחחיובת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמסמכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תחיה כתובת הקבלן: -

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך ילעיל, כאן

כיום 26 לחודש 33 שנה 1978

חתימת הקבלן	חתימת הממשלה
ע"י לחתימתו: חתימתו	ע"י לחתימתו: חתימתו
שמו	שמו
כתובתו	כתובתו

אוגדה - עבודות פיתוח ל-24 יחידות

חזוה מס. 9078/75398/78

סדר התשלומים

85%	1. לפי התקדמות העבודה וכפיות מאשרות
8%	2. גמר ומסירת העבודה
2%	3. ע"ח קרן ביטוח
5%	4. אישור חשבון סופי
100%	סה"כ

מולד כהן
חברה לעבודות בביטוח ופיתוח בע"מ

מסמך מס' 54-5 - תשס"ה

מסמך מס' 87/80327/8700

מסמך מס' 87/80327/8700

- | | |
|--------------------------------|------|
| 1. דבר המסמך המסמך המסמך המסמך | 8700 |
| 2. דבר המסמך המסמך | 8700 |
| 3. דבר המסמך המסמך | 8700 |
| 4. דבר המסמך המסמך | 8700 |

מסמך

8700

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון

חוטפת א' לחוזה בנייה מס' _____/_____/_____

תנאים מיוחדים

1. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על סיב החומרים וההאזנה על אחריות הקבלן לאי ודריית רטיבות מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה הזה, והצדדים לחוזה זה מתחייבים למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
2. מחירי היחידות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
3. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיתמנה על ידו לפטור דו בכתב, תהיינה לו הסמכויות הנתינות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
4. מוסכם בין הצדדים כי המהנדס א. שטרן, מנהל האגף לבנייה כפרית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
5. תאריך גמר העבודה הנ"ל 2 חודשים מתאריך מסירת השטח.
6. כל ההיטלים והמסכים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
7. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על הטבון סכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור הטבון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2) ".
8. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחור לכל _____ של מסירת כפיצויים קבועים מראש _____ לִי _____ להעבודות שתואנה בלתי גמורות.
9. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך 7/8 אמ"ל ההחיקה לעבודה הנדונה, תשלום בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה הנתון הוצאה (מדף 3402) ובהתאם לתנודות מדוי בבנייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס _____ . אולם בהתאם לחישוב המקובל באגף לבנייה כפרית במשרד השיכון.
10. הרישום בידי משרד השיכון לבצע עבודות בסלבים בהתאם להתקדמות הבנייה במקום או בכפיפות לתוליד פינוי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה

מנהל מדיניות

חברה לעבודות בבישים ופיתוח בעים

חוספת א' לחוזה בנייה

מס' _____

11. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
12. הרכות בידי מסד השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע החישובים הסנתיים לפי פרק ה' בסעיף 53 של תנאי החוזה לפי שיקבע בנפרד. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לפי קביעה בנפרד.
13. לפי מטרת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון טופי של העבודה טביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני סיוגס החשבון לידיה.
14. הטפסת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והחקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להטפסת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
15. הכנת דרכים חכניות הדרושות מבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
16. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שיטמש למפקח מטעם הממשלה.
17. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את טיב הקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואת יתר הגופרים העלולים להטפיע על ביצוע העבודה.
18. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מלוי ההתחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברת בטוח להנחת דעתה של הממשלה ובנוסף טבקע על ידה, טכום הערבות יהיה בהתאם לפרק א' סעיף 8.
19. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הטכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0.2% מהיקף החוזה, בטכום זה נכללות בדיקות ווזורות טחמורתם יתחייב הקבלן (נוסף על 0.2% המנוכה).

סולקביש"

חברה לעבודות בנייה ומתחם בעים

פאנל אקציע
עס פאגל אפ 24 יאר

יאר	הפאל	אגד יאר	י"ד
72.000,-	4,-	18.000	י"ד
54.000,-	8,-	18.000	י"ד
448.000,-	290,-	1600	י"ד
574.000,-			
26.000,-			
600.000,-			

אספיקט פרינציפאל אגד'ס פאנל אקציע
אקציע פאנל, פרינציפאל 10.10.40

1. יסודות פאנל אקציע ± 50 יאר
פאנל אקציע אגד ופרינציפאל
עס אקציע ± 5 יאר אגד ופרינציפאל
העט אקציע אגד ופרינציפאל 10.10.40

2. יסודות פאנל אקציע ± 30 יאר
פאנל אקציע אגד ופרינציפאל 10.10.40
פאנל אקציע אגד ופרינציפאל 10.10.40
פאנל אקציע אגד ופרינציפאל 10.10.40

עס פאנל אקציע - יסודות

עס פאנל אקציע - יסודות

העט פאנל אקציע - יסודות 1940 - 10.10.40

1940 - 10.10.40

סולכביש
הכרה רעכענען עס פאנל אקציע

אגודה - עבודות פיהוח ל-24 יחידות

חוזר מס' 9078/75398/78

סדר התשלומים

85%	1. לפי התקדמות העבודה וכמויות באופרות
8%	2. גמר ופסירת העבודה
2%	3. ע"ח קרן ביטוח
5%	4. אישור חשבון סופי
<u>100%</u>	סה"כ

סגור
חברה לעבודות פיהוח ופיתוח בע"מ

14.1.79

4606/-2125

לכבוד
המנהל הכלכלי
המנהל הכלכלי
רמ"ח חשבונות
12-10

המנהל הכלכלי

המנהל הכלכלי

בא לצאת לפי צו המנהל הכלכלי
מס' 12-10
מס' 12-10

מס' 12-10

מס' 12-10

מס' 12-10

מס' 12-10
מס' 12-10
מס' 12-10
מס' 12-10
מס' 12-10
מס' 12-10
מס' 12-10
מס' 12-10

4633 10 JAN 79
27480
1978
התאחדות

סיונת ש"ס 16196
חוזה מ"מ 9078/75398/78

היום זה נערך תחת כיום 26 לחודש 33 שנה 1978

ב י י

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל הסיוע ע"י משרד השיכון שחקרה לחלו "המסלול" (מסלול) -

חב" סול כביש בע"מ שיקרא לחלו "הקבלו" סני.

הואיל והממשלה רוצה בכיפועו של הסכנה. חיינו עבודות פיתוח במושב אנגדה

קבלה זה העתה של הקבלן סיום לכיפוע הסכנה, הסורה סך 600,000 ל"י (בסיליס) שש מאות אלף לפרוט

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

כאן שני הצדדים לירי הסכם כדלהלן:

1. המסכים רחלו ירו חלק כללי: סדר החוזה זה:

א. הצעה של הקבלן.

ב. הנאי החוזר לכפוע הבנה ע"י הקבלו.

ג. הנאים מיוחדים.

ד. מסרם כללי לעבודות בנין של הועדה הכינסטרדיה

ה. חוספות ושנויים למסרם הכללי לעבודות בנין. ילאופני הסריחה והחשלות:

ו. העתרה הקבלו על טיב ועל אי חריחה רסיכוה ופונרנסציה.

ז. ח כ נ י ר ח.

ח. כתב הכסויות והמחירים י או החיבורים הסכניים לסכנים.

21.88 - 2/1
60 - 2/11

2748

2. הסורה השלום שכר החוזה כמסכס בחוזה, סחחיכ הקבלו לכפוע את הסכנה בהתאם להוראות החוזה.

3. הסורה כיפוע הסכנה ע"י הקבלן כאסור לעיל מהחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמסכס בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תחיה כתובת הקבלן: -

ולראיה כאן הצדדים על החתום בתאריך העיל, כאן

כיום 26 לחודש 33 שנה 1978

סולכביש

החיסה הממשלה החיסה הקבלן

עד לחיסה: החיסה עד לחיסה: החיסה

שמו שמו

כתובתו כתובתו

שבו שבו

(1.9.69) 16-2.06

1000 f

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

46061

המשרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל ב- **13-11-1978**
 לטיפול של *[Signature]*
 לעיונו של *[Signature]*

הקריה, תל-אביב
 תאריך: **2.11.78**
 מ.ב.כ. / **279/78**

אל: מר **ר. לשם**, ממונה על עליות חדשות
 מאח: מר **א. בלף**, הממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: ה פ ע ל ת ח ו ז ה

המקום - **אוגדה**
 העבודה - **עבודות פיתוח ל- 24 יחידות דיור**
 הקבלן - **חב' "סולכביש" בע"מ**

א. נא לערוך חוזה עם - **חב' "סולכביש" בע"מ**
 כתובת - **רח' החוצה 7, רמת-גן**

לבצוע העבודה שבנדון, לפי תכנית -
 בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב בסך
 רצ"ב - **1. סדר תשלומים**

600,000 ל"י

2. סעיפים מיוחדים בדבר התייקרות, תקופת הביצוע ובדיקת החמרים
 ג. אסמכתא לבצוע העבודה - **הקבלן "סולכביש" בע"מ לא הסכים לתמוך על החוזה**

של עבודות פתוח ל- **12 יחידות באוגדה**, כי המחירים היו פנוסטים על מיד **6/77**
 והחוזה הגיע לחתימה ב- **10/78**. לכן, הוסכם למסור את העבודה לפי מחירי מכרז
60/78, עבודות פיתוח בעריאל, מבוסס על אוגוסט 1978. ב.ש.פ.

כמו כן הוגדלו כמויות העבודה עבור עבודות פיתוח ל- **12 יחידות נוספות**
 (ס"ה 24 יחידות).

נא לשלם בעריכת החוזה בעדיפות.

ב ב ר כ ה ,

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העחק:

מהנדס המחוז -

הנגב

הקבלן -

מחלקת אג"מ
 ע"פ פקודת המל"ג

מספרים המיוחסים למחלקת אג"מ
 למחלקת אג"מ, ע"פ פקודת המל"ג

72.000.-	4.-	18.000	1	מספרים המיוחסים למחלקת אג"מ כולל: פקודת המל"ג ופקודת המל"ג ע"פ פקודת המל"ג, ע"פ פקודת המל"ג 40.10.1 384/1
54.000.-	0.-	18.000	2	מספרים המיוחסים למחלקת אג"מ כולל: פקודת המל"ג ופקודת המל"ג ע"פ פקודת המל"ג, ע"פ פקודת המל"ג 40.10.1 384/1
448.000.-	280.-	1600	3	מספרים המיוחסים למחלקת אג"מ כולל: פקודת המל"ג ופקודת המל"ג ע"פ פקודת המל"ג, ע"פ פקודת המל"ג 40.10.1 384/1

574.000.-
 26.000.-
 600.000.-

מספרים המיוחסים למחלקת אג"מ
 ע"פ פקודת המל"ג

מספרים המיוחסים למחלקת אג"מ
 ע"פ פקודת המל"ג

אוגדה - עבודות פיתוח ל-24 יחידות

חוזה מס' 9078/75398/78

סדר החשבושים

85%	1. לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות
8%	2. גמר ומסירת העבודה
2%	3. ע"ח קרן ביטוח
5%	4. אישור חשבון סופי
<u>100%</u>	סה"כ

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ומתוח בע"מ

רמת-גן, רחוב הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 73 14 36, 72 42 35

המוסד: נתיבות עלמון 2220-057

12.10.78

משרד השיכון תאריך

מינהל לגביית כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

נחקבל בתאריך

דאר נכנס

15-10-1978

לכבוד

מינהל לבניה כפרית

הקריה.

א.נ.א.

לטיפול של

לעיונו של

הנדון: חוזה 78/75398/78

עבודות פתוח במושב אוגדה.

ביום 6.10.78 קבלנו מכס חוזה הנ"ל, אשר נערך
על סמך חוזה עבודה מיוני 1977 - עם עדכון עד אפריל
1978.

הסכמנו לבצע את העבודה בהנאים אלה במרץ 1978,
אך מאחר וכבודכם עכבתם את הבצוע עד עכשיו - אין
באפשרותנו לבצעה מאחר ומחוש אפריל 1978 עד אוקטובר
1978 חלו עליות דרסטיות במחירי מרצפות, שכר עבודה,
ועבודות כלים.

אנו מוכנים לבצע את העבודה במחירים שמופיעים
במכרז שזכינו בו עבודות פתוח בפריאל מס' 60/78.

רצ"ב מוחזר חסר החוזה.

בכבוד רב,

"סולכביש" בע"מ

העמק: מ.ב.כ. - מחוז הנגב.

4606/

"סולכביש"

12.10.78

חברה לעבודות כבישים ופתות בע"מ	
דירת-גן, רחוב הרא"ה 7, ת.ד. 2742	מינהל לבנייה נכונת ויישומים חדשים
טלפון: 73 14 36, 72 42 35	מחוז הנגב
המוסד: נתיבות טלפון 057-2320	תאריך
דאר נכנס	נחקבל בוארין
15-10-1978	
לטיפול של	
לעיתו של	

לכבוד

מינהל לבנייה כפרית

הקריה.

א.ב.א.

הנדון: חוזה 78/75398/78

עבודות פתוח כמחשב אובדה.

ביום 6.10.78 קבלנו מכס חוזה הנ"ל, אשר נערך על סמך חוזה עבודה מיוני 1977 - עם עדכון עד אפריל 1978.

הסכסכו לבצע את העבודה בהנאים אלה במרץ 1978, אך מאחר וכבודכם עכבתם את הכצוע עד עכשיו - אין באפשרותנו לבצעה מאחר ומחדש אפריל 1978 עד אוקטובר 1978 חלו עליות דרסטיות במחירי מרצפות, שר עבודה, ועבודות בליט.

אנו מוכנים לבצע את העבודה במחירים שמופיעים במכרז שזכינו בו עבודות פתוח בפריאל מס' 60/78.

רצ"ב מוחזר הכר החוזה.

כבוד רב,

"סולכביש" בע"מ

העמק: מ.ב.כ. - מחוז הנגב.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
ויישובים חדשים

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נתקבל בתאריך
31-07-1978
לטיפול של
לעיונו של

הקריה, תל-אביב
תאריך: 20.07.78
6358 - מ.ב.כ. / 279/78

אל: מר ר. לשם, ממנה על עליות חדשות
מאת: מר א. בלף, הממונה על חוזים ומכרזים

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החתמה

הנדון: הפעלת חוזה

הסקום - אגרה
העבודה - עבודות פתוח ל-12 בחים
הקבלן - סולכביש בע"מ

א. נא לערוך חוזה עם - סולכביש בע"מ
כתובת -

לבצוע העבודה שבנדון, לפי תכנית -
בהתאם לכתר כמויות ומחירים הרצ"ב בסך

210,000.-

ב. רצ"ב - 1. סדר תשלומים

2. סעיפים מיוחדים בדבר התיוקרות, תקופת הביצוע ובדיקת החסרים

ג. אסמכתא לבצוע העבודה -

העבודה מיועדת ליישורי קרקע לניקוזי מים וכן לריצוף ושבילים ל-12 בחים
המוקמים לפי חוזה 77/60869/77.
המחירים לפי מכרז מבכ/25/77 (עבודות פיתוח בניה אברהם).

אין להתחיל בבצוע
לפני אשור החתמה

בבחה

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתק:

מהנדס המחוז - הנגב

הקבלן -

Handwritten text in a box, possibly a header or address, including the word "LONDON".

Handwritten text in a box, possibly a date or reference number, including the word "JANUARY".

Handwritten text in a box, possibly a signature or a note, including the word "SIGNED".

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית

סדר התשלומים

1.	לפי התקדמות העבודה וכמויות מאושרות	85%
2.	גמר ומסירת העבודה	7%
3.	ע"ח קרן בסוף	7%
4.	אישור חשבון סופי	5%
	סה"כ	<u>100%</u>

תאריך המחרים:

תקופת הביצוע _____ חדשים מיום מהן הוראת ביצוע.

הורדה ע"ח בריקוה 0.2%

1941-1942
1943-1944
1945-1946

1947-1948

1. 1947-1948

2. 1949-1950

3. 1951-1952

4. 1953-1954

1955

1956-1957

1. 1956-1957

2. 1958-1959

1960-1961

כתב כסויות

12 במי מגורים - אוגדה עבודות פתוח

סעיף	מאור	יח"	כמות	מחיר יח"	סה"כ ל"
1.	א. עבודות עפר יטורים סופיים ± 50 ס"מ יטורי קרקע לניקוז מים כולל חפירה ומילוי בחומס האחר כולל סילוק עודפים וחבאת מילוי במחיר בגבולות 150 מ"ס. ויום הביצוע עד ± 3 ס"מ	דונם	21	1.500.-	31.500.-
2.	ריצוף שבילים ומסעדות, פרט 01- אספקה והנחה מרצפות 30/60/5 אפור חלק כולל הכנת צורה הדרך והידוק שלא של החשמית כולל חול נקי מקומי בשכבה של 5 ס"מ יטור השטח בחומס שטח הרצוף כולל במחיר וכולל הגורה סמויה שלא חיסדר, כולל 15 ס"מ חומר וארי מהדק	מ"ר	425	100.-	42.500.-
3.	כנ"ל אבל מרצפות צבעוניות הנחה 5% למי המכרז 30/4/78 עדכון מ 6/77 ב-ס.ק. עד 5/78 57.1% ע"ח סונות וב.נ.מ.	מ"ר	425	125.-	53.125.-
					127.125.-
					6.356.-
					120.769.-
					68.959.-
					189.728.-
					20.272.-
					210.000.-

משרד הביטחון והשכון
מנהל לבניה הפכפכית וישובים חדשים
מחוז הנגב

30/6/78

אל: מר א. בלף - ממונה על חוזים ומכרזים.

31/1457

הנדון: אוגדה - עבודות פתוח ל- 12 בית.

הבנו ממליצים למסור את בצוע העבודה הנ"ל לח"סולכביש" בהתאם להצעתם במכרז לעבודות פתוח במושב ביר אבוהם (מכרז מס' 25/77 - וחוזת מס' 77/60889/77 שהיתה ההצעה הזולה ביותר). הערכון לחודש, 5.78.

היות והעבודה הנ"ל היא קטנה והקבלן עובד באזור הבנו ממליצים למסור לו את העבודה בהתאם לב"ל.

רצ"ב התאור וכתב הכמריץ קסך - 20,000, - לי כולל ערכון עד 5.78.

ב ב ר כ ה,

מחוז הנגב

העתק:

מר א. שטרן - ס/ראש המיבוא
מר ר. לשם - ממונה על עליות חדשות
מר ר. קנטרובסקי - מ.ט. ראש צוות אזור הערבה וסיבי

אש/יז

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C. 20315

MEMORANDUM FOR THE ADJUTANT GENERAL

SUBJECT: ADJUTANT GENERAL - 101ST AIRBORNE DIVISION

1. The Adjutant General of the 101st Airborne Division is responsible for the maintenance and management of the personnel files of all personnel assigned to the division.

2. The Adjutant General is also responsible for the maintenance and management of the personnel files of all personnel assigned to the division.

3. The Adjutant General is also responsible for the maintenance and management of the personnel files of all personnel assigned to the division.

John Doe

4. The Adjutant General is also responsible for the maintenance and management of the personnel files of all personnel assigned to the division.

כתב כספיות

12 בחי פגורים - מוגדה עבודות פסוח

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ ל'
1.	א. עבודות עפר <u>יטורים סופיים 50 ± ס"מ</u> יטורי קרקע לניקוז מים כולל הפירה ומילוי בחומר האחר כולל סילוק עודפים והבאת מילוי במחצ' בגובה 150 ס"מ. דיוק הביצוע עד 3 ± ס"מ	דונם	21	1.500.-	31.500.-
2.	<u>ריצוף שבילים ומטותים, שטח 01-</u> אספקת והנחת מרצפות 30/60/5 אחרי חלק כולל הכנת צורה הדרך והירוק בלא של המטות כולל חול נקי מקומי בטובה של 5 ס"מ יטור השטח בחומר שטח הרצוף כולל במחיר וכולל הגובה המותר של המימד, כולל 15 ס"מ חומר ואדי מחורק	ס"ר	425	100.-	42.500.-
3.	בני' אבן מרצפות צבעוניות	ס"ר	425	125.-	53.125.-
	הנחה 5% למי המכרז				127.125.-
	דרכון מ 6/77 ב-8.ק. עד 5/78 57.1%				6.356.-
	ע"ה שונות וז.נ.מ.				120.769.-
					68.999.-
					189.728.-
					20.272.-
					210.000.-
