

02/10

מדינת ישראל

משרד הממשלה

מנהל חניה כפרית

3/11 הקמת יחידה

משרד

המל"מ

אחידה כפרית - חולית

המספר: 9077/60890/77

הקצאה: 550.000 ₪

6/1979 - 8/1977

מס' חיק מקורי

4470

מחלקה

7480/7 - 82



עבודות פיתוח - חולית

גל - 7 / 7480

1400571

27/08/2013

מס פריט:

109.18/1 - 1032

02-106-01-07-07

שם

מזהה פיוז:

מזהה לוגי:

כתובת:

סוג המבנה

שם הישוב

הקבלן

מס' החוזה

הסכום

תאריך התחלת העבודה: 16.10.77 תאריך גמר העבודה

שינויים - הגדלה
הקטנה

תנועת החשבונות


חשבון מס'	תאריך הישוב	מצב העבודה %	סכום	העבודה
1	23.12.77		116842.84	
2	23.1.78		261403.58	
3	20.2.78		34934-	
4	25.3.78		449434.54	
5	19.4.78	2/0	585632-	


הערות :-

התאריך	אל:
7/6/79	מר בן-צור - מנהל א' חינוך ומכשיר
ותיק מס'	כמות:
44701	בני יעריה מנהל תכנון.
	הנדון:

לחבר עילא - חילת.

ב"ר מעדיון אלך טלפס לחבר
חבר - ע"ר הולדו - מאוס - חילת





משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

תל-אביב

4470/20

אל: גזברות משרד הבינוי והשיכון
מאת: המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים.

א.ג.

הנדון: ש ח ר ר ע ר ב ו ת ;

44/60890/77

חוזת מס':

העבודה:

המקום:

הקבלן:

בזה הריני לאשר כי אפשר להחרר את הערבות להבטחת טיב העבודה של
העבודה הנ"ל.

9/78

החשבון הסופי של העבודה הנ"ל הועבר אליכם ביום

3/78

א.ג. חתום

הערות:

ב ב ר כ ה,

ממונה על חוזים ומכרזים


20677

תאריך:


אישור המחוז:



חתימת מהנדס המחוז



חתימת ראש צוות



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב

ראר נכנס נתקבל בתאריך

17-09-1978

לטיפול של

לעיונו של

תאריך: 5/9/1978

מספר: דד/60890/דד

אל : גזברות משרד הבינוי והשיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס. דד/60890/דד

העבודה: מחוז

המקום: חוליה

הקבלן: חב' סולבניש בע"מ

7 572.426,61

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון בסך
סכום לחלוטם לקבלן הוא - 572.672 ל"י לאחר ניכוי 0.2%
ע"מ בדיקת ו-2% ע"מ קרן ביטוח

נא להקטין/להגדיל את החוזה, שהיקפו עתה - 600.000

בסך - 27.573.39

7 סה"כ - 572.426,61

החשבון כולל:

חזרה ע"מ בדיקת - 1.164,61 ל"י

חזרה ע"מ קרן ביטוח - 11.449 ל"י

בברכה,

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון ובצוע

העתקים:

מר ~~המנהל~~ / ~~המנהל~~ / ר. לשם - נא להודיע לגזברות את מקור המימון לשינויים.

מהנדס מחוז הנגב

הקבלן חב' סולבניש בע"מ

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

סולכביש

חברת לעבודות כבישים ופתוח בע"מ
רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741
טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספר: 295/77-233

תאריך: 20.3.78

חשבוני סופי

חוזת מס' 77/60890

לכבוד: מנהל לבניה במריה

עבודות נחתות ותאורה למגרש ספורט בקבוץ חולית

הסכום	מחיר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט
	א"י	ל"י				
39968.-	2.-		19984	מ"מ	עבודות יטור קרקע 50 מ"מ	1.
28738.-	200.-		143.69	מ"מ	קירות חומטים מחלוקי נחל עם גב בסון	2.
6100.-	200.-		30.50	מ"מ	קירות ישיבה מחלוקי נחל	4.
68689.50	115.-		597.30	מ"מ	רצוף סרצפות גרנוליט 30/60	6.
42126.-	85.-		495.60	מ"מ	רצוף 45/45 למגרש כדורסל עץ	7.
4127.50	65.-		63.50	מ"מ	אבני ספה במגרש כדורסל עץ	8.
2500.-	2500.-		1	יח"	צביעת סימון סגור כדורסל עץ	9.
13000.-	6500.-		2	יח"	עמודי כדורסל	10.
4000.-	2000.-		2	יח"	עמודי כדור עץ	11.
162457.50	150.-		1083.05	מ"מ	יציאת סדרכות בסטון מזוין	12.
812.-	80.-		10.15	מ"מ	בניה סדרכות סלוחות סרומיים	13.
700.-	350.-		2	יח"	יציאת בסון בסכמי שוחרת ביוז	14.
					התקנת סרנוליים	17.
1200.-	200.-		6.00	מ"מ	סנבור 4"	
5160.-	120.-		43	מ"מ	סנבור 25	
					תאורה סגור ספורט	
14000.-	3500.-		4	יח"	עמוד תאורה	1.
14400.-	1800.-		8	יח"	פנס יוד קוורץ	2.
4525.-	50.-		90.50	מ"מ	חפירת תפוחה לכבלים	3.
4650.-	60.-		77.5	מ"מ	פנור סלמי קשיח 55 מ"מ	4.
1980.-	60.-		33.0	מ"מ	כנ"ל אן 74 מ"מ	5.
2275.-	65.-		35.0	מ"מ	פולין ג.וי.ני.וי 5+16	6.
5934.-	46.-		129.0	מ"מ	כבל ג.וי.ני.וי 3+4 מ"מ בתאורה לוחית חתכין חוכנט כבל 5x2.5 לכן נוכח ספחיר חתוכה האחרת בין כבל 5x2.5 ל- 5x4	7.
427342.50					להעברה	

חשבוני סופי
העבודה נוצע

האוצר
מס' חשבונית שולח
מס' אישור 3375/9

295/77-233

מספרו

20.3.78

תאריך

- 2 -

סולכביש

חברה לעבודות כבישים ומתחם בע"מ

רמתגן, דח' הוא"ח 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 24 36

חשבוני

חודש מס' 77/60890/77

מינהל לבניה כפרים

לכבוד

קבוץ חולית

הסכום	מחיר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט
	א"י	ל"י				
427342.50					מהעברה	
3000.-	3000.-		1	יח'	אספקה בלבד של לוח חשמל לכדור סל	8.
7500.-	2500.-		3	יח'	א. ס"ז סקס 3x100 אספר	
9600.-	800.-		12	יח'	ב. כנ"ל 3x65 אספר	
1600.-	800.-		2	יח'	ג. ס"ז ח"א ברוד	
800.-	800.-		1	יח'	ד. ביה חקק 1x10 אספר	
3000.-	3000.-		1	יח'	ה. כנ"ל 5x25 אספר	
1500.-	1500.-		1	קומ"	ו. ארון לנ"ל	
					התקנת לוח והיבור קוים	9.
454342.50						
1500.-					מפסיק זרם ראשי בלוח חדר בגרסור 3x25	10.
455842.50					לפי מחיר בחוזת ניר אברהם 77/60889/77	
13675.25					בסיס החוזת 6/77	
442167.25					3% הנחה	
56155.23					ערכון בחירים לחקופה מ-6.77 - 10.77	
60935.90					442167.25 סך 15.59%	
511101.10					185.4 - 164.8	
498502.46					164.8	
					החיקרה לחקופה הבצוע (סדר בניה)	
					בסיס העורכן - 10.77	
13205.50					203.9 - 11.77	
26411.09					203.7 - 12.77	
57208.20					409.6 - 17.77	
524795.51					511101.10 סך 7.28% = 37 - 10.28% = 204.8	
548309.30					185.7	
511591.96					העברה לרכון	

3/.

שלה הנדסת בנין בע"מ
העבודה בוצע

האוצר

מס' חשבונית שולם
מס' אישור 3375/8

"סולכביש"

מס' העבודות כבישים ופיתוח בע"מ

רמת גן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספרנו 295/77-233

20.3.78

תאריך

- 3 -

חשבוני סופי

מחוז מס' 77/60890/77

מנהל לכביש במחוז

לכבוד

ע"פ מחוז והמורה למשרת פקיד בכיר מרליה

מס' העבודה	חידת המידה	כמות	מחיר היחידה		הסכום	הסעיף לפי המפרט
			א"י	ל"י		
עבודות נוספות						
1.	מ	12.09	3665.20		44312.25	קירות בסוף מזרין למי מרש
2.	מ	390.08	40.-		15603.20	סלוי בידים בין הקירות ע"י חדר האוכל
3.	יח'	1	800.-		800.-	הספקה והתקנה סכנה לשוהה מ 100 כולל ביטוח והתאמת לגובה הרצוף
4.	מ"ק	8	192.-		1536.-	עבודה מרקטור פיאט למי יומן מס' 9
5.	יח'	8	192.-		1536.-	התאמת שוחה לגובה הדרוש למי חוכניה מחוז
6.	מ"ק	16	32.-		512.-	עבודות מועל ליסודים בידים יומן מס' 9 2 י"ק = 16 שעות
7.	יח'	1	500.-		500.-	התאמת מבנה לניקוז צלוחין בחוף ביתן השפה כולל יבטוח וקבור שפועים מסוף יומן מס' 11
סה"כ עבודות נוספות						
ר כ ו						
1.						עבודה לפי המורה
2.						עבודות נוספות
סה"כ כללי						
(סה"כ מורה שלוש עשר אלף פחמים וסכומה לירות + 75 אג').						
בכל הכבוד,						
"סולכביש" בע"מ						

64899.55
60848.65
511.527.96
498322
50443.55
548302.30
60898.65
64899.45

559,221.11
613200.75
88662.20
572.4266
1,144.613

571.282
11.449

559.233

מחיר
18.8.78

מחיר הנדסת בנין בע"מ
העבודה בוצע

האוצר
מס' חשבונית שולט
3375/9
מס' אישור 9

DATE: _____

בחירה מחירים

- סעיף 1 - קצונה בסוף לפי מחיר חוזה פתוח ברלוק
ס"א חוזה 77/75044/77 - המחיר
בסיס המחירים בחוזה הנ"ל 8/77,
מדו סלילה ללא שעות קיץ
ערכון 12.77 - 8.77 = $\frac{605.9}{462.84}$ = 30.9%
2800.- × 30.9% = 865.20 ₪
3665.20 ₪/מ
30.40 ₪/מ
800.- ₪/מ
150.- ₪
192.- ₪
198.- ₪
150.- ₪
32.- ₪/שעה
500 ₪/מ
500.- ₪/מ
- סעיף 2 - בלוי בסקטור ועבודה פועלים בורים
- סעיף 3 - הספקה ותחזוקה סבבה ביום 100
- סעיף 4 - עבודה סקטור לפי חוזה 77/60889/77
ביר אכרס
בסיס מחירים 6/77 בלי שעות קיץ
ערכון 12.77 - 6.77 = $\frac{205.7}{160.65}$ = 28%
המחיר העודכן 150.- × 28% = 42.- ₪
192.- ₪
198.- ₪
- סעיף 5 - התאמת שעות ביום - מחיר החוזה 150.- ₪
לפי חוזה הנ"ל וערכון כנ"ל מחיר מקורכן
- סעיף 6 - עבודה מועל לפי חוזה כנ"ל 25 ₪ לשעה
ערכון כנ"ל 25.- × 128% = 32.- ₪/שעה
- סעיף 7 - התאמת סבבה כולל במסוף ועבוד
שמוקים

מחירי
החברה רשומה בלשון ופועל בע"מ

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

4440 / 216

19.4.48

באר-שבע

אל: מר. בן ג'אן
מאת: ממשלת המנדט

הנדון: מ-ן ס'פ' מס. 5 עבודה
פג'ח מוק'ג

5

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני-חלקי/סופי פס'

עבודה / לעבודה עבודה פג'ח

מס' 1

מס' כה"ש

הקבלן

44/60890/44

במשק / מושב

לפי חוזה

585632

על סך

הערות: רצ"ב משולם במל"ג מ"ח עבודה
גוב'ג, אשור עמ'ג עבודה, נג'ח
מח'ל'ק

/

לוטת: 44/ עמ'ג מ-ן

ל-כ
מנהל המס'ח

העתק:

מנהל מס'ח

הקבלן: מס' כה"ש

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 19.4.48

באר-שבע

אל.ג. 19.4.48

מאת: א.מ.ל. מ.מ.ל.

הנדון: מ.ל. סל' 5.04 ובהיקף
בג'ח חלוצי

5

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשכון-אלי/פועי פס'

בג'ח כמ"ח

לעבודה

במשק / מושב

מ.ל. 19.4.48

למי חוזה

הקבלן

א.מ.ל.

58563

על סך

הערות:

רצ"ב מעבירים אליך/כס חשכון-אלי/פועי פס'
בג'ח כמ"ח
מ.ל. 19.4.48
א.מ.ל.

מנהל המחוז

לוחה: 19.4.48

העתק:

מנהל אזורי-מ.ל.

הקבלן: א.מ.ל.

0^u_r

הוכן ע"י	דף מס' 38	חישוב כמויות	"סולכביש" חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ רמת-גן, רחוב הרא"ה 7 טלפון: 72 42 35, 73 14 36 טלפון פרטי: 73 96 47
תאריך:		שם העבודה	
סוג העבודה:		יום העבודה	
מקום העבודה:		מס' העבודה	
הוכן עבור:			
אסמכתא:			

(6) 8.30 0.50 1.65	83.27 8.92 92.19 51.50 51.50 92.19 143.69	מחשבת (6) $0.50 + 1.65 \times 8.30$ 2 92.19 קיטוב גומים סל יט"ז בס"ן מסל"ן (6) $1.90 + 1.65 \times 19.70$ 2 34.97 $(2.35 + 4.10 + 2.25) \times 1.90$ 16.53 51.50 51.50 92.19 143.69 סל קיטוב גומים אל גל בס"ן

[illegible]

חתימה

הוכן ע"י	דף מס' 16A	חישוב כמויות	"סולכביש" חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ רמת גן, רחוב הרא"ה 7 טלפון: 72 42 35, 73 14 36 טלפון פרטי: 73 96 47
תאריך:	סוג העבודה:		
מקום העבודה:	הוכן עבור:	יום העבודה	
אסמכתא:		מס' העבודה	ינקני שרוליס

		שרוליס 4"			שרוליס 2"
		2.00 (6)			10.50 (1)
		2.00 (13)			2.00 (2)
		2.00 (14)			1.50 (3)
		<u>6.00</u> ✓			7.50 (4)
					1.50 (5)
					2.00 (6)
					2.00 (8)
					1.50 (9)
					1.50 (10)
					1.50 (11)
					1.50 (12)
					1.50 (15)
					1.50 (16)
					1.50 (17)
					1.50 (18)
					1.50 (19)
					1.50 (20)
					1.50 (21)
					1.50 (22)
					1.50 (23)
					1.50 (24)
					2.00 (25)
					2.00 (26)
					<u>52.00</u>
					<u>43.00</u>

שולח הנדסת בנין בע"מ
העבודה בוצעה

החתימה

הוכן ע"י	דף מס' 78	חישוב כמויות	"סולכביש" חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ רמת גן, רחוב הרא"ה 7 טלפון: 72 42 35, 73 14 36 טלפון פרטי: 73 96 47
תאריך:	שם העבודה		
סוג העבודה:	חול	מס' העבודה	
מקום העבודה:			
הוכן עבור:			
אסמכתא:			

768.24	מחיר	560.63	מחיר
840.88	XIX	840.88	XV
31.20	19.50 X 1.60	0.60	1.10 X 1.10 / 2
0.60	1.10 X 1.10 / 2		
9.36	7.45 + 8.15 X 1.20 / 2	24.24	20.20 X 1.20
0.74	1.35 X 1.10 / 2	3.12	2.60 X 1.20
41.90	41.90	22.20	18.50 X 1.20
	XX	50.16	50.16 ✓
37.12	23.20 X 1.60	13.68	11.40 X 1.20
13.28	8.30 X 1.60	0.24	0.40 X 0.60
1.60	0.50 X 3.20	7.98	(3.90 X 0.90 X 2) + 0.40 X 0.60 X 4
18.88	13.60 + 10.00 X 1.60 / 2	21.90	21.90
70.88	70.88		XVII
	XXI	33.36	27.80 X 1.20
56.16	16.50 - (2.00 + 2.80) X 4.80	0.24	0.60 X 0.40
17.60	4.00 X 4.40	7.98	(3.90 X 0.90 X 2) + 0.60 X 0.40 X 4
7.60	2.00 X (4.75 + 2.80) / 2	3.60	200 X 1.80
5.70	2.85 X 0.80	2.40	200 X 1.20
87.04	87.04	3.60	2.00 X 1.80
46.72	46.72	4.44	4.00 + 3.40 X 1.20 / 2
	XXII	55.62	55.62
1014.74	1001.20		XVIII
	מחיר אסמכתא	66.4	41.50 X 1.60
45.0	45.00	3.89	4.55 + 4.10 X 0.90 / 2
		0.60	1.00 X 1.20 / 2
		8.44	9.60 + 9.15 X 0.90 / 2
3.18	3.18	0.60	1.20 X 1.00 / 2
1049.38			
20.12	כ"א ג' / 25.0 X 8.05	74.93	74.93
1083.05		768.24	

מכירת חשמל

מכירת חשמל

200	✓	החשבון
16.00	✓	החשבון - פנקס
15.00	✓	החשבון - חשבון
35.00	✓	200 ✓ החשבון - חשבון

1. מכירת חשמל 10.4

2. מכירת חשמל 10.8

3. מכירת חשמל 10.8

1.20	✓	החשבון
12.00	✓	החשבון - חשבון
12.00	✓	החשבון - חשבון
17.00	✓	החשבון - חשבון
10.00	✓	החשבון - חשבון
54.50	✓	2.30 החשבון

24.00	✓	החשבון - חשבון
17.00	✓	החשבון - חשבון
12.00	✓	החשבון - חשבון
21.50	✓	החשבון - חשבון
16.00	✓	החשבון - חשבון

12.00	✓	החשבון
1.20	✓	החשבון - חשבון
17.00	✓	החשבון - חשבון
10.00	✓	החשבון - חשבון
42.50	✓	2.30 החשבון
1.20	✓	החשבון - חשבון
6.50	✓	החשבון - חשבון
10.00	✓	החשבון - חשבון

12.00 + 2.10	14.00	✓	החשבון - חשבון
12.00 + 1.00	13.00	✓	החשבון - חשבון
10.00 + 1.10	14.00	✓	החשבון - חשבון
12.00 + 2.10	14.00	✓	החשבון - חשבון
6.50 + 2.10	8.50	✓	החשבון - חשבון
77.50			

12.00 + 6.00	1.20	✓	החשבון - חשבון
	18.50	✓	החשבון - חשבון
<u>22.00</u>	<u>2.30</u>	✓	החשבון - חשבון
129.00	✓	סה	

10.0 + 1.0	(34) 74 'Gola 200
+ 5.0	16.00
16.0	11.00 חשבון 500
	16.00 ✓ חשבון 500
188.00	4.00 חשבון 200
38.00 ✓	4.00 חשבון 200
	33.00 ✓

[Signature]

His kids are 8

3x100 54 (✓)

$\overline{1.3} \quad 5 \times 65 \quad \overline{5.4} \quad (3) \quad \checkmark$

✓ 6 מנחם 12. וסמך ל' אלף מה. לבטל.

$$\bar{a} = 2 \pm 100 \text{ fpa m.s.d.} \quad 4 \quad \checkmark$$

7/1 2008 1/2 1/2 ✓ ✓

6. חנוכה בליל חמשה עשר שבט

3. המספר האוכלוסני של קהילת

2.1. Für eine beliebige untere Grenze a .

3x 1450 A. ~~1450~~ . 1450 1450



י'ומו עבודה

משרד השיכון

ונגמר כתאריך

לשבוע המסתחיל בתאריך

2/11/88

מספר חוות/חומה		שם החוות	שם המקום	שם הקבילן	מס' מחוז/מס' ישוב/מס' אזור	מספר המבנים :	
מספר חוות/חומה		שם החוות	שם המקום	שם הקבילן	מספר זרוע		מס' חוות

מרסי עבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

חומרים שנשלחו
לבריקה:

[illegible][illegible]

הומרים ופריטים שהוכאו לשטח			
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט

העדות ראש חצות	העדות הקבלן	גיתון עיי ובמאריך	הוראות לסנזורים
4	3	2	1
			2/4/44 / אמר בקט' הרב/ע ואם שבת יש דבר רבי (הקט') של אפקי דברים זה גילוי ו עם סוף הדבר של כוונתם של ה' יצי'

הערות המפקח

המורה צבי הירש
המורה צבי הירש
המורה צבי הירש

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
המנכ"ל	המנכ"ל	המנכ"ל
המנכ"ל	המנכ"ל	המנכ"ל

	מספר חוות/הוספה	שם הסחור	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי	כס' מתחזקים "ישוב כס" חוב'	מספרי המבנית :	
מס' המפקד								

מרטי עבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

ח ל ק י

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

יחידות שהגיעו לשלב השליש
מבנה מספר קומה מספר יחידות שלב

ח/יח/מ ח/ש/ל
השלב
קומה מספר
לשלב

[illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידת	כמות	סוג החומר/הפריט	

[illegible]

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תפקיד	תפקיד	תפקיד
חתימה ב"כ הקבלן	חתימה ראש הבית	חתימה מפקח משרד השיכון
תאריך	תאריך	תאריך

14/11/44

12/11/44

ונגמר בתאריך

לשכונת המרחלים בתאריך

מספר חוזה/החלטה	שם המהוו	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהו"מ	מס' מתוואים 'ישוב טמ' אוב'	מספרי המבנים:
13/28	מלח	מלח	מלח	מלח	מלח	מלח

סרטי עבודה:

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח														סוגלי ביובונקיון		מנהל שומר עבודה
	אורל בנין	חוצב	מסכן	מספר ברול	בנאי	טיח	רצף	נזר	מסגר	שרי רכב	חשמ"א	צבאי	ס"ה (13-2)	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
א																	
ב																	
ג																	
ד																	
ה																	
ו																	

חלק ה

חומרים שנשלחו לבריקה:

חלק ד

יחידות שהגיעו לשלב תשלום

מכנה מספר קומה מספרי יחידות שלב

עבודות יומיות (רג"י) - סועלים ציוד וחומרים

יום בשבוע מהות העבודה מספר העובדים מקצוע העובד שעות העבודה שעות העבודה שעות העבודה

9 8 7 6 5 4 3 2 1

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח

סוג החומר/הפריט מידה כמות סוג החומר/הפריט מידה כמות

הוראות לשנויים	ניתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש הצוות
1	2	3	4
הערות המפקח			

חתימת מפקח משרד השיכון	חתימת ראש הצוות	חתימת ב"כ הקבלן	חתימת החומר
האריך	האריך	האריך	האריך

מספר חוות/חומרה	שם המחזר	שם המקום	שם הקבלן	כס' מחזורי: ישוב/כס' חזב	מספר המכניס:
					כס' המחזר
				מספר חזב	מספר

מרסי עבודה :

מספר העובדים בשטח										מנהל עבודה		מועלי ביוב ונקיון				ציד לכביה		יום בשבוע								
יום בשבוע	מועל בנין	חיצב	ססס	כוסף ברול	בנאי	טיח	רצף	גג	ספג	ער" ברב	חשכ" לאי	צבעי אדזג	ס"ה (13-2)	מנהל עבודה	שוכר	17	18	19	20	21	22	23	24	25	קוסמ" רשור	סריק" סור
א	1												14	1									1			
ב	1												13	1									1			
ג	1												12	1									1			
ד	1												11	1									1			
ה	1												10	1									1			
ו	1												9	1									1			

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבריקה:

[illegible][illegible]

הומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

העדות ראש חנות	העדות הקבלן	בית עיי ובתאריך	הזראות לשנויים
4	3	2	1
			24.11.74 (1) יל אביב את הלחם
			די חצו האדם / מאן ונצ (האל)
			ג.30 ס"מ בגלס מיל'3 הלחם לילול' חלק
			הלחם
			(2) כדור סל וילוף במחפלה אכילה
אח	93/	23	הלחם 2600 x 1400 מטה אלף הלחם בריחה המנהל /33
			אלוף יהל מחפלה /3' מיל' הליח 090 .ח

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
העריך	העריך	העריך
חתימת ב"כ הקבלן	חתימת ראש הבנות	חתימת מפקד משרד השיכון

חלק א	מספר חוות/חומנה	שם המחיר	שם המקום	שם הקבלן	כס' מתווסף/ש"ב כס' אוב'	מס' החכמים

פרטי עבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

ח ל ק ד

[illegible]

העדות ראש חזנות	העדות הקבלן	גיתו ע"י ובתאריך	הוראות לשכנויים
4	3	2	1
			28/4/44 בשבועים עם המהנדס בלשם סוכה נכאמן:
			(1) מוצגות לזכור של ופול עם שצפ
			(2) מוצגות בטן לא עלים הער לקצ אלא ופוקר
			לצור הסכמין כל 2.50 מ. היצוק מריה בלעבר
			אחז עם חצר צד ופיצור מלא יהל ופני פסוק במאטא
			(3) מהמקן, ולמח פשט בקצ וקניות/הותן אלהם
			(4) היצוק יריה ממוצגות אקולס כחול לפי פושלם בחלום
			מהמקן, ולמח סכום הנה בקצ לא נכאמנה
			(5) מהמקן ומצוא ציגמח של ממוצגות אקולס

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	המחשב ראש הצוות	הפקיד
האגף	המחשב כלכלי הקבלן	המחשב משרד השיכון

לשכנע המסתחיל בתאריך

ונגמר בתאריך

4/12/77

9/12/72

6

	מספר תרומה/הוצאה	שם המסור	שם המקום	שם הקבלן	כס' מתרומות 'ישובים' אר"ב	מספר תרומה	מס' המסוק

מרטי עבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

[illegible][illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

[illegible]

הערות המפקח

שם החתום _____ הפקיד _____ האריך _____ החיתום ב"כ הקבלן _____	שם החתום _____ הפקיד _____ האריך _____ החיתום ראש המוות _____	שם החתום _____ הפקיד _____ האריך _____ החיתום ספק משרד השיכון _____
---	---	---

[illegible]

מרסי עבודה:

יום בשבוע		שועל בגין	חוצב	סמסן	כוסף גדול	בגא	טית	רצף	נגר	ססגר	דר' כרב	חשמי' לאי	צבעי אורנג	סירה (13-2)	סנהל עבודה	שומר	שועלי ביום ונקיון		ציד לבניה					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
א	11	3	1												1	1								
ב	11	3	1												1	1								
ג	11	3	1												1	1								
ד	11	3	1												1	1								
ה	11	3	1												1	1								
ו	11	3	1												1	1								

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבדיקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שרכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

הערות ראש הצוות	הערות הקבלן	ניתן צ"י ובחתימה	הוראות לשכנויים
4	3	2	1
			בזמן, ול-ליג את השלטת סג'ר אגוד כבוד של הממשלה לענינים המסחריים המ'ק'ר. הנהל בולטות א. כבולטת פ'ה'ל'א עם המעור א. א'ל' ג'ר פ'א'נ'ס'ר

הערות המפקח

שם החותם	שם החותם	שם החותם
תאריך	תאריך	תאריך
חתימת כ"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת מפקח משרד השיכון

ונגמר בתאריך

לשכנע המסתחיל בתאריך.

18/12/77

23/12/74

מספר חרזה/הזכרה	שם החזר	שם המקום	שם הקבלן	כס' מחזורי 'י שרכס' אר"י	מספר 'המכנים'
מספר חרזה/הזכרה	שם החזר	שם המקום	שם הקבלן	מספר חרזה	מס' המפקד

פרסי עבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

ח ל ק ד

[illegible][illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

[illegible]

הערות המפקח

שם החותם		שם החותם	
תפקיד	תפקיד	תפקיד	תפקיד
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
חתימת כ"כ הקבלן	חתימת ראש הצוות	חתימת ספקת משרד השיכון	חתימת ספקת משרד השיכון

חלק א	מספר חרזה/הזכרה	שם המסחר	שם המקום	שם הקבלן	בס' מחזורים/יטובס' טוב'	מספר תמכ"כ:	ס' המסחר
		שם המסחר	שם המקום	שם הקבלן	מספר זרוע		

פרטי קבוצה:

[illegible]

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבריקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות

הוראות לסגנויים	ייתן ע"י ובתאריך	הערות הקבלן	הערות ראש חצות
1	2	3	4
20/12 מוצע עלי באג ה'36. אצמח וישיב בני פלג ה'36 בני גלב מלס האצמח ה'36 א - סממנה' - הקנו של חצר האס באגים 92.22 א 92.04 ג'36 מקובל' - אלוק ה'36 האס א' לקי ו'36 ס' וא' א'36 ה'36 + 2 באגים, ש'36 ה'36			

הערות המפקח

שם החותם החתימה האריך	שם החותם החתימה האריך	שם החותם החתימה האריך
--	--	--

לשכנע המסתחיל בתאריך.

ונגמר בתאריך

11/1/1978

6/1/1978

9

[illegible]

מרסי עבודה:

מספר העובדים בשטח										מנהל עבודה		שומר		שוער		סוכן		מנהל		יו"ם בשבוע	
יום	שבת	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת	שבת	שבת	שבת	שבת	שבת	שבת	שבת	שבת	שבת	שבת	שבת	שבת	שבת
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
א	11	3	1				2							1	1						
ב	11	3	1				2							1	1						
ג	11	3	1				2							1	1						
ד	11	3	1				2							1	1						
ה	11	3	1				2							1	1						
ו	11	3	1				2							1	1						

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבריקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהובאו לשטח			
סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	סוג החומר/הפריט

הערות ראש הצוות	הערות הקבלן	גיתן ציי ובתאריך	הוראות לסגנויים
4	3	2	1
			28/1/78, יש להמשיך את שירותי הביטוח & להגיש את המסמכים הנדרשים י"א שירות הביטוח. החל 28/1/78 יש להמשיך את שירותי הביטוח & להגיש את המסמכים הנדרשים י"א שירות הביטוח.

הערות המפקח

השם: מר. יצחק יוסף יעקב

שם החוקם	שם החוקם	שם החוקם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך
החלטת כ"ס הקבלן	החלטת ראש הברית	החלטת מפקח משרד השיכון

לשבוע המתחיל בתאריך

ונגמר בתאריך

8/1/1978

13/1/1978

M

מס' התקן	1000 חכמים					
	מס' חוזר/הוספה	שם המחבר	שם העוסק	שם הקבלן	כס' מחזור/מס' חשבונס' חשב' חשב' חשב'	מס' חוזר/הוספה

מרטי עבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

ח ל ק ד

[illegible][illegible]

הערות המסמך

יש לספק את פתית לבזל של חלקים
כמו כן יש להוציא הארון-ארוג לבזל של
אי הוציא נקט יצבה אסיה סקולר.

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
תחיתת ב"כ הקבלן	תחיתת ראש דביות	תחיתת ספקה משרד השיכון
תאריך	תאריך	תאריך

מס' התפקוד	שם המחוז/המחנה	שם המחוז	שם המקום	שם הקבילן	מספר זמני	מס' מתורגם "שורשים" א"ב	מספר המכונים
		נ/א	חולדה	עליזה			

מרטי עבודה:

[illegible]

ח ל ק ה

ח ל ק ד

חומרים שנשלחו
לבריקה:

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

העדות ראש חצות	העדות הקבלן	גיתן ציי ובתאריך	הוראות לסגנויים
4	3	2	1
			1. אסוף את הקבלות בצלמין (2) הפקד את המס' בציוס וסגור (3) מוצי' האונק' בציוס סגור חלקי אגרת חלק ל' ח' ח' חלק (3) אגרת אגרת (4) סוף בוקר קבל' אגרת אגרת אגרת


העדות המפסקה
בשאלות - המעלות כלל קרה אה. ילדיו של
בצל אהרן בן 50 וסוס אהרן
בן 50 קרה אהרן בן 50 וסוס אהרן
בן 50 קרה אהרן בן 50 וסוס אהרן

שם החומר	שם החומר	שם החומר
הפקיד	המפקח ראש הדינה	המפקח
האגף	האגף	המפקח
המחלקה	המחלקה	המחלקה

מחלקת - חולית


1:250



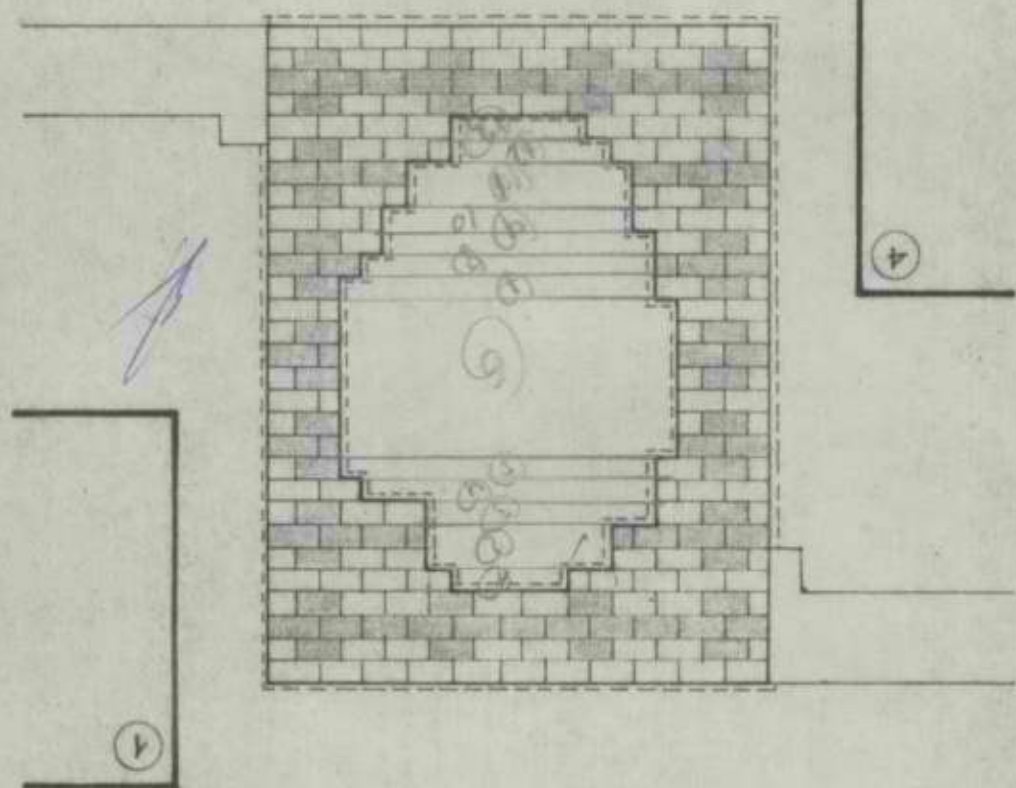

ЧАСОВ. Н.


מגשש ב'

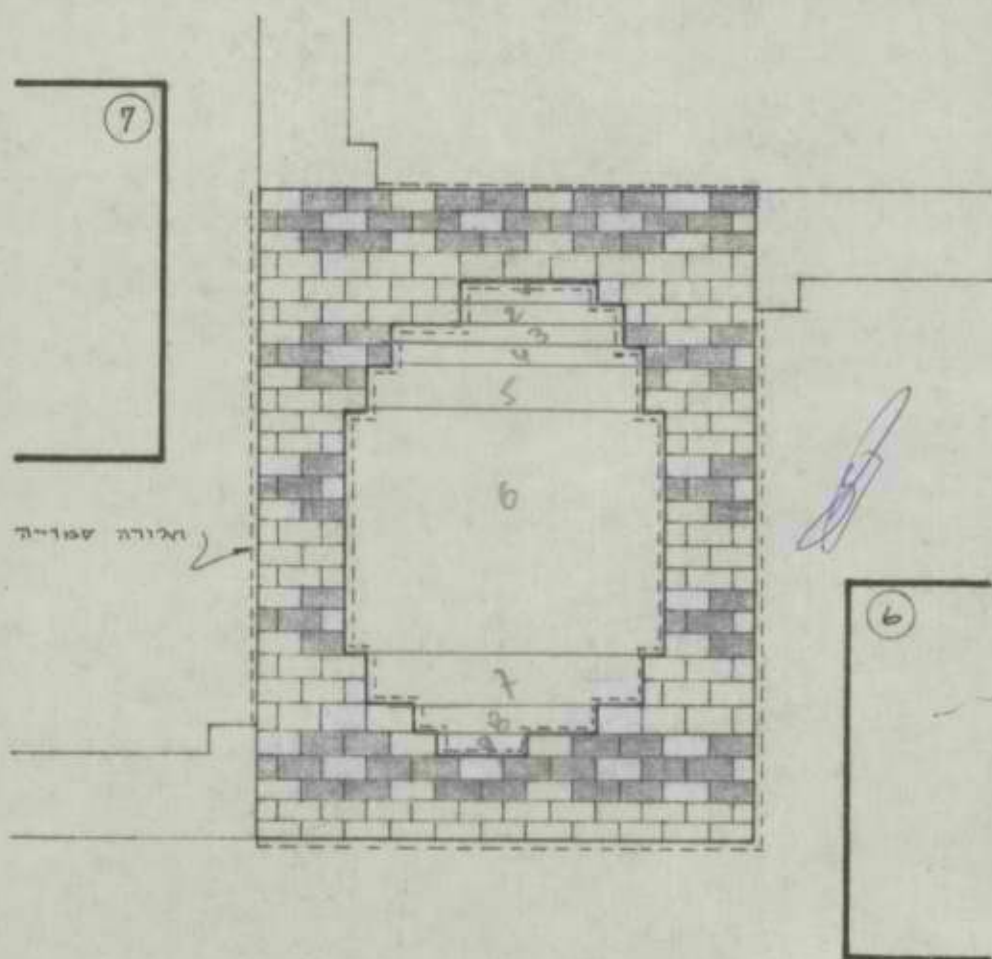

גשי עב-לים מרופים באזור המגורים

ק.מ. 1:100


מפת ג'

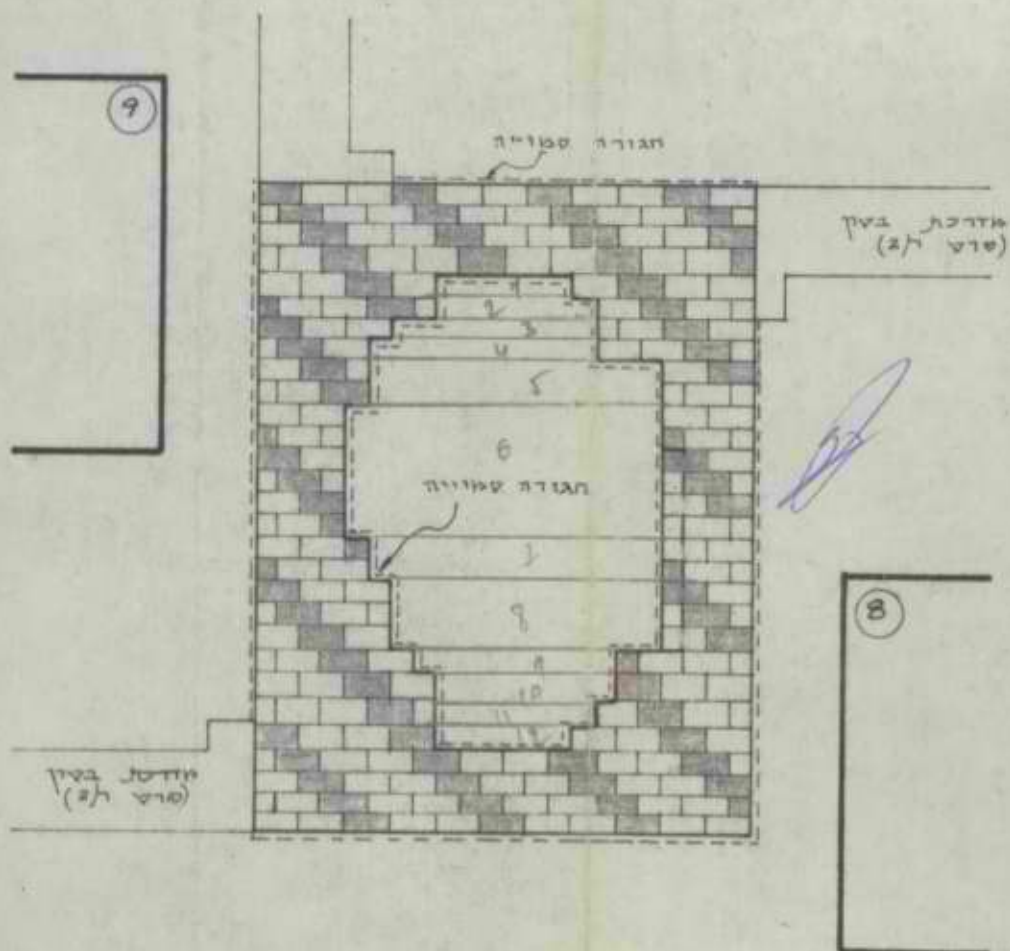



תבנית ד'

19

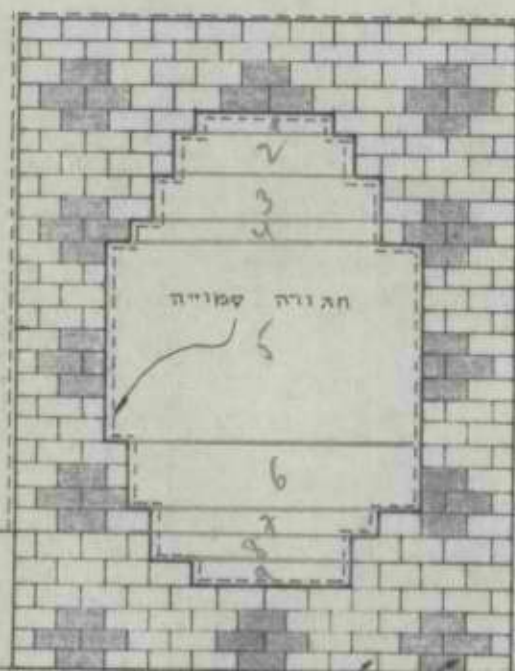

דרכה בסוף
12/7

חלון סמויה

18

מחיצות ברזליות דקות מס' 2, 5x60x30
1 פאנל מס' 30x50 עם סדק בגוף
אחורי קובע
ושתור סמנטי לוח' חיצ.

תפיש'ה

9.00 (מסלול בנייה בינוי)

6.60

קו מחנה כתיבה חדיסות

13

1.20

4.20

1.20

1.20

0.40

3.90

3.90

7.50

1.20

0.40

0.40

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


7




1.20

0.40

[Handwritten signature]

מסגרת 7

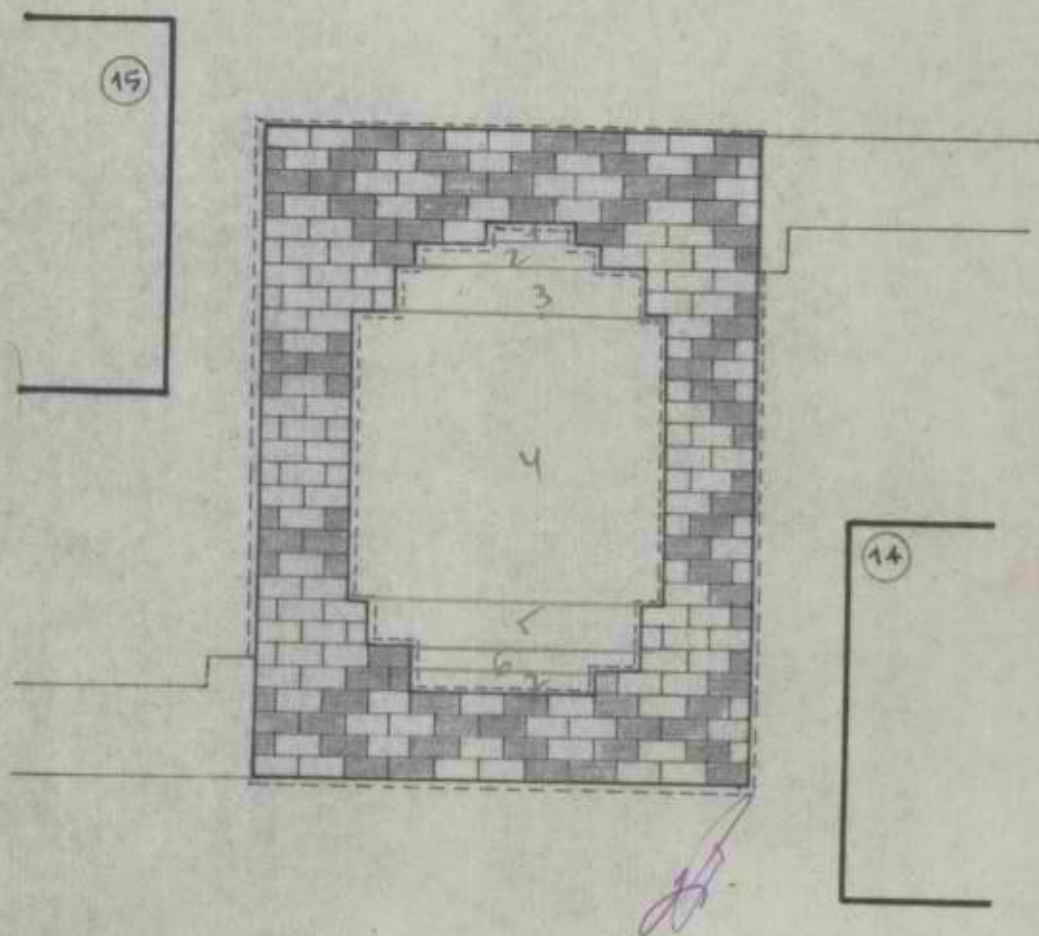

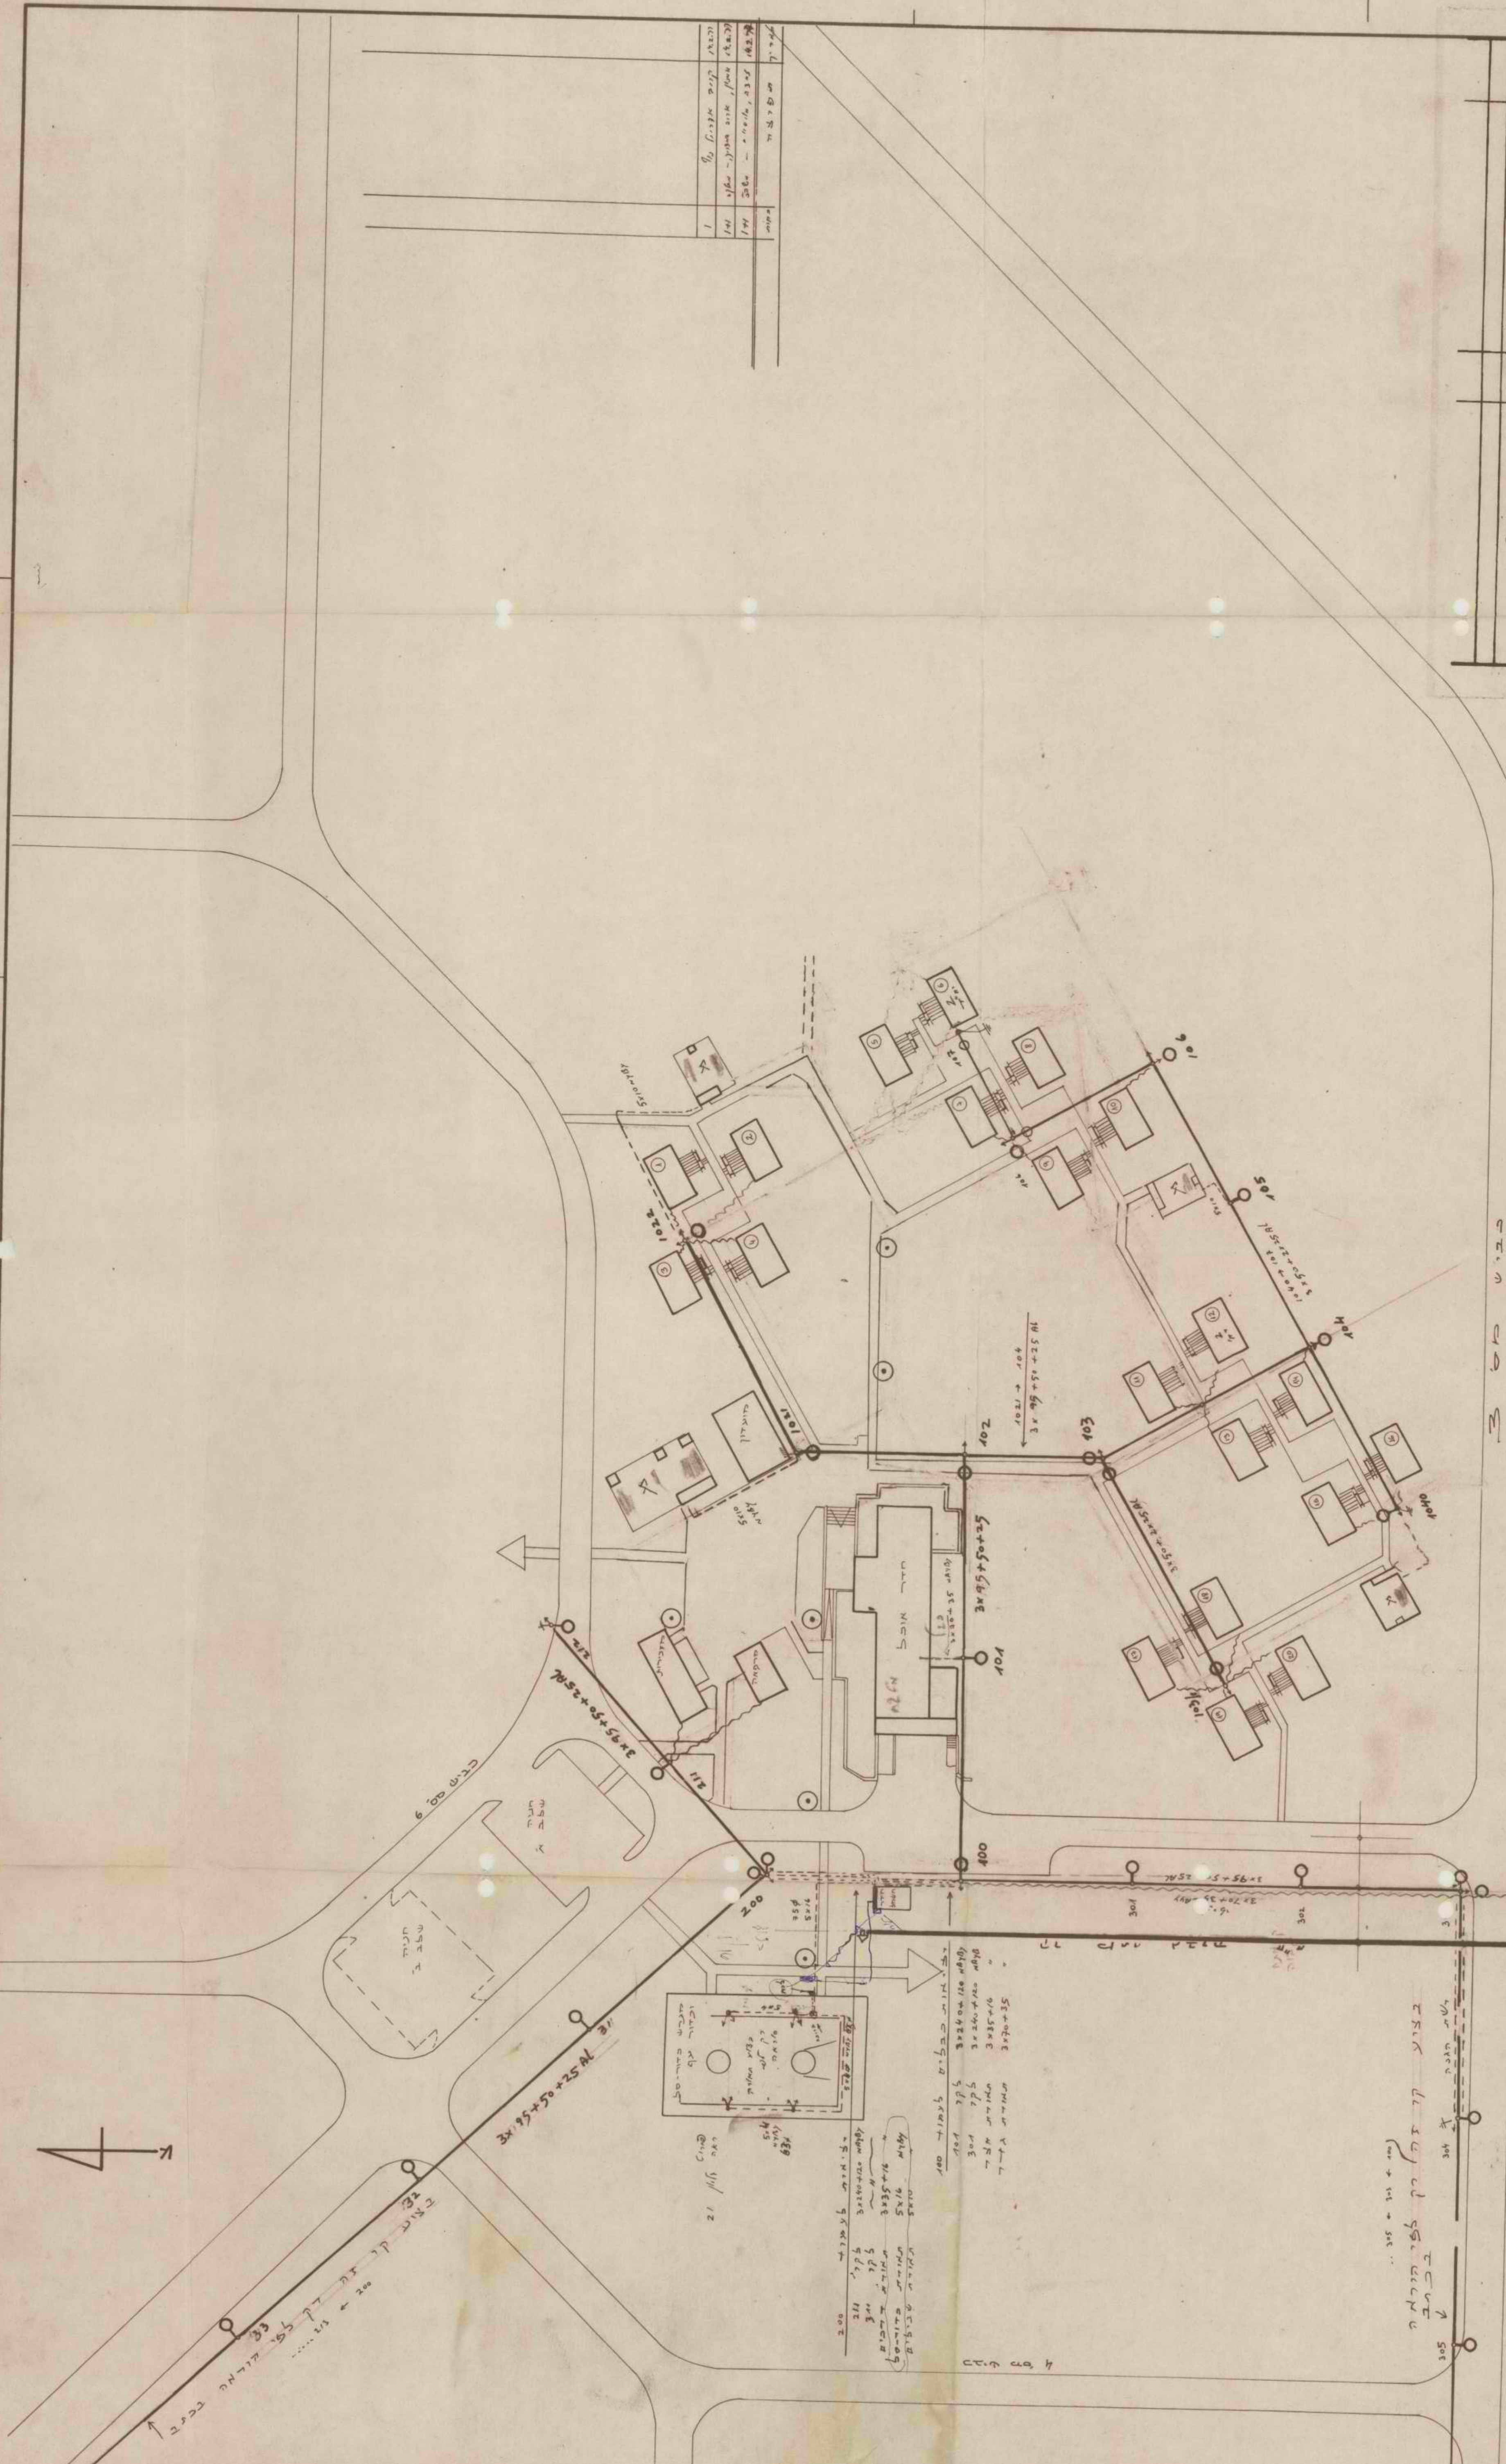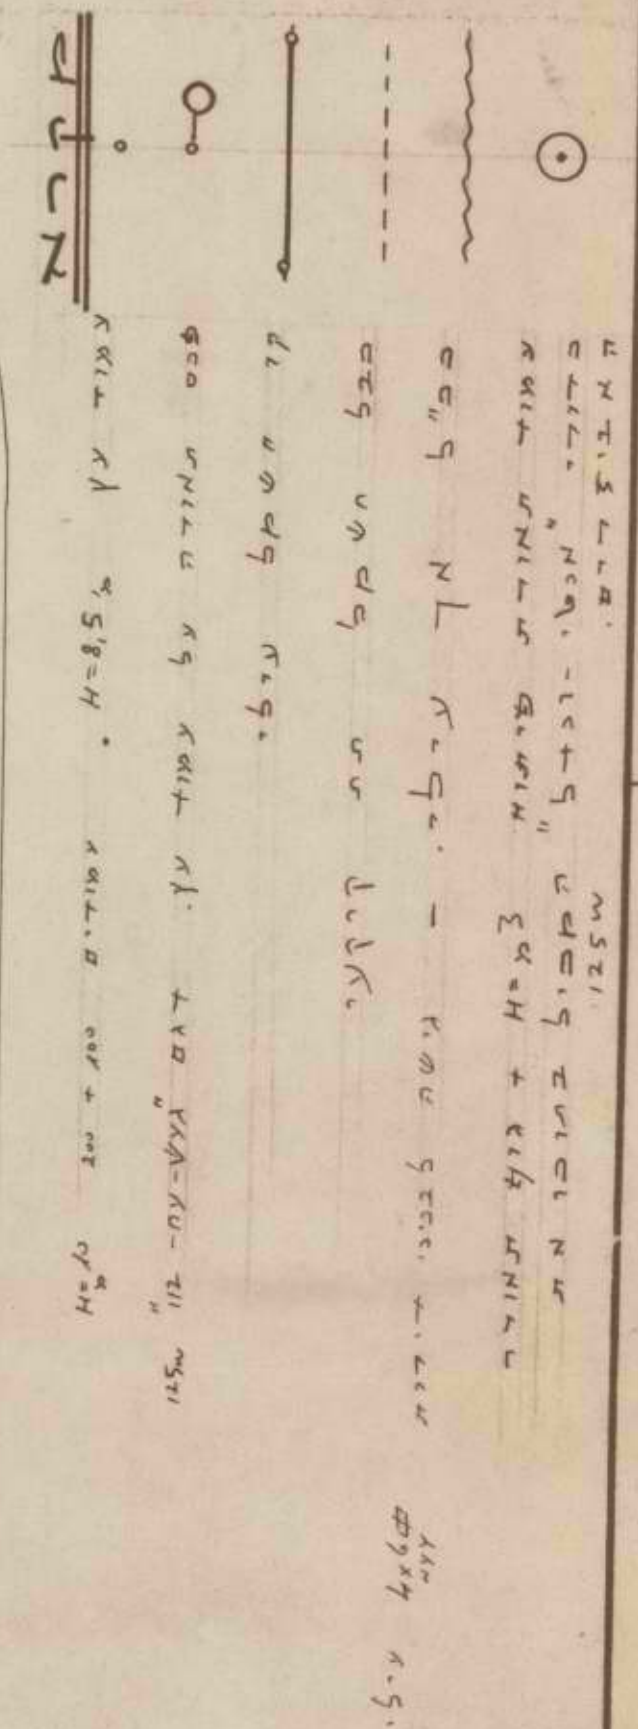


מדרכת בטון מצויין


חילובינים

תכנון לעבודות כבישים ופחח בע"מ

חלק 1:10

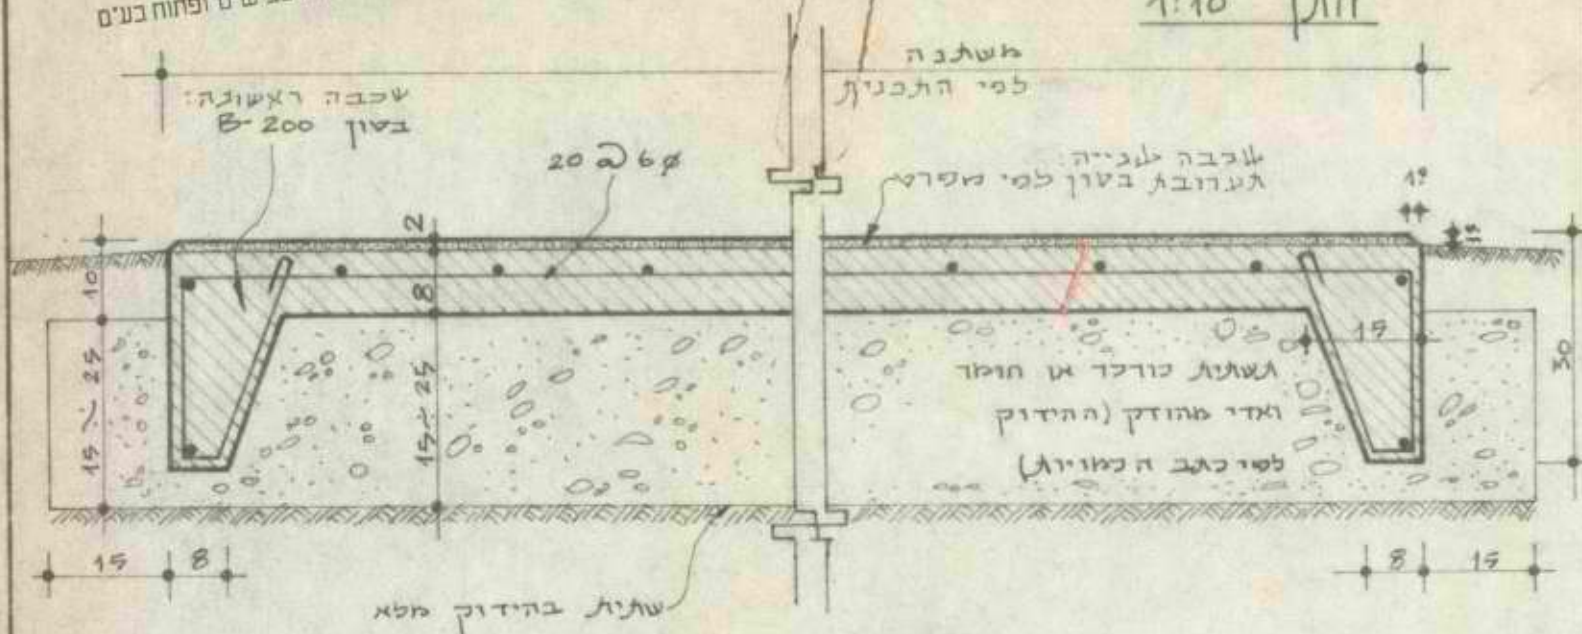

חלוקה למידים 1:100

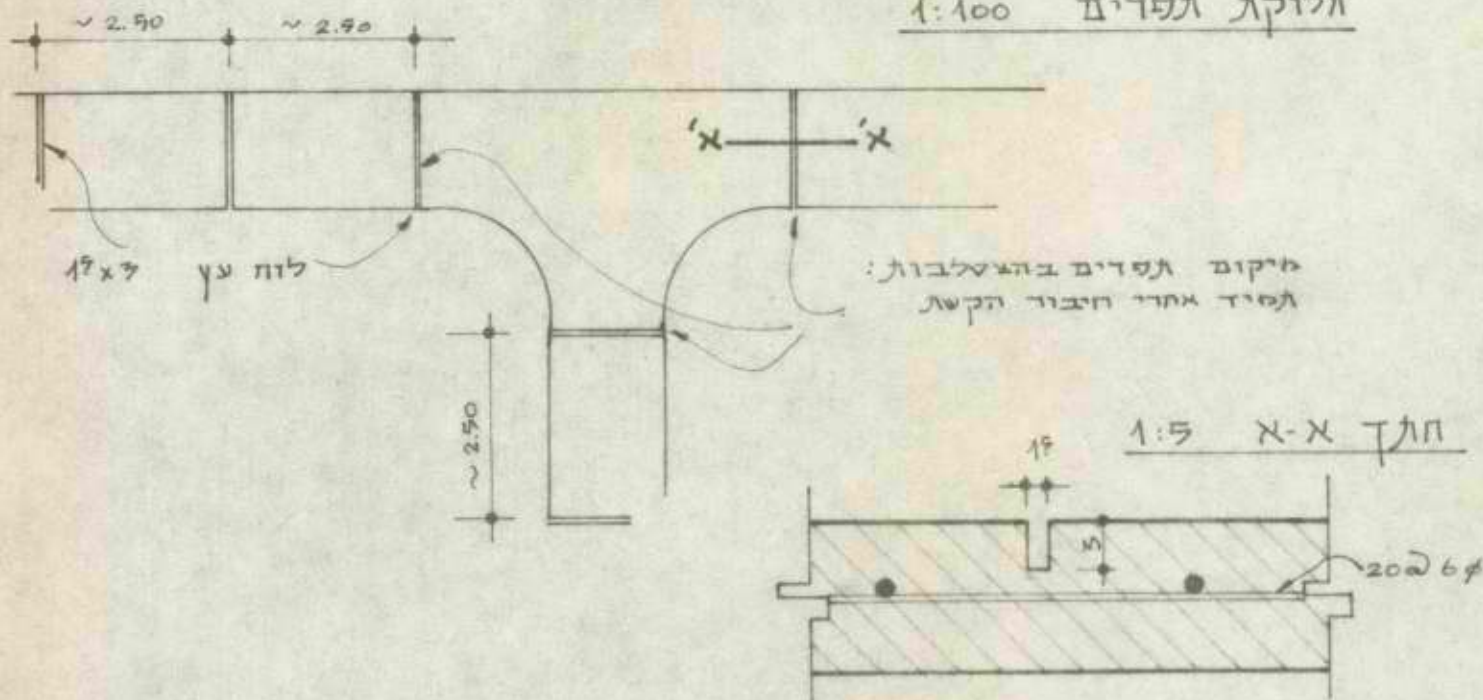


העבודה כוללה:

- מדידה, סימון, חסימה או חציבת צורה-דרך והידוק שהיה בהידוק מלא. במידה והמדרכת בנוייה על פלוי על הקבלן לתקן בהתאם המדרכת שבכמות של 20 ס"מ בהידוק מלא, עד לגובה השתייה.
- אספקת חומר ואני או מוכר מאוחד, פיזור והידוקו למי קובי השכבה הנקובת בהכניה, לאחר הידוק ויברציוני מסורט בהכניה (96% עד 98% פור' א.א.מ.ה.ו.).
- חבנת הסכנות ליציקה, בקישים ישרים וללא פגם, לשם קבלת ערוי חוואי וקטנות רצופים וללא פחוליס, וכמו-כן חיבור פחוליס מהמים לקיטום פינות.
- אספקת ברזל ובנייה דשא הדיון למי הפרט, כולל חיבור מרמי-מרחק ק"מ לחבנית מיקום הפרט באמצע עובי היצקה, למי הפרט.
- יציאת המדרכת מהמי שכבות: השכבה התחתונה בבטון ב-200, כולל שיני עיגון, והשכבה השנייה, כאשר השכבה הראשונה עורכת טרייה, מוערבת בטון: זימון סגורה ובטון, כיש 1:3. מיד לאחר ייצום השכבה השלישונה, יש לפזר שכבה דקה של בטון יבש, לעבר עמוד קליין בטמפרטורה גבוהה לקו חוואי ובחזון שוליים במקף שכבה ברוחב 5 ס"מ. יש להאריך הפרט כל 2.50 מ' עליו קרישים ניגבים לקו החוואי, בגודל 1.5x3 ס"מ.
- לאחר סיווק ההסכנות יש לקרב הקרקע מן הצדדים וליישרה למי גובה המדרכת, חזון הידוק ידני קל.
- סילוק כל שאריות, טיפול וקידוש אדמה מאחר העבודה.
- שיה לבן - על הקבלן לנקות בטלס ראשון כ 5 מטר בלבד, שייעשו דוגמה, והטקס היציקה יחול רק לאחר אדמה הדוגמה הנ"ל במתב. המאיר כולל כל הנ"ל למי מ"ד מדרכת.

קירון ישיבה מחלוקי נחל

חתך - 1:10

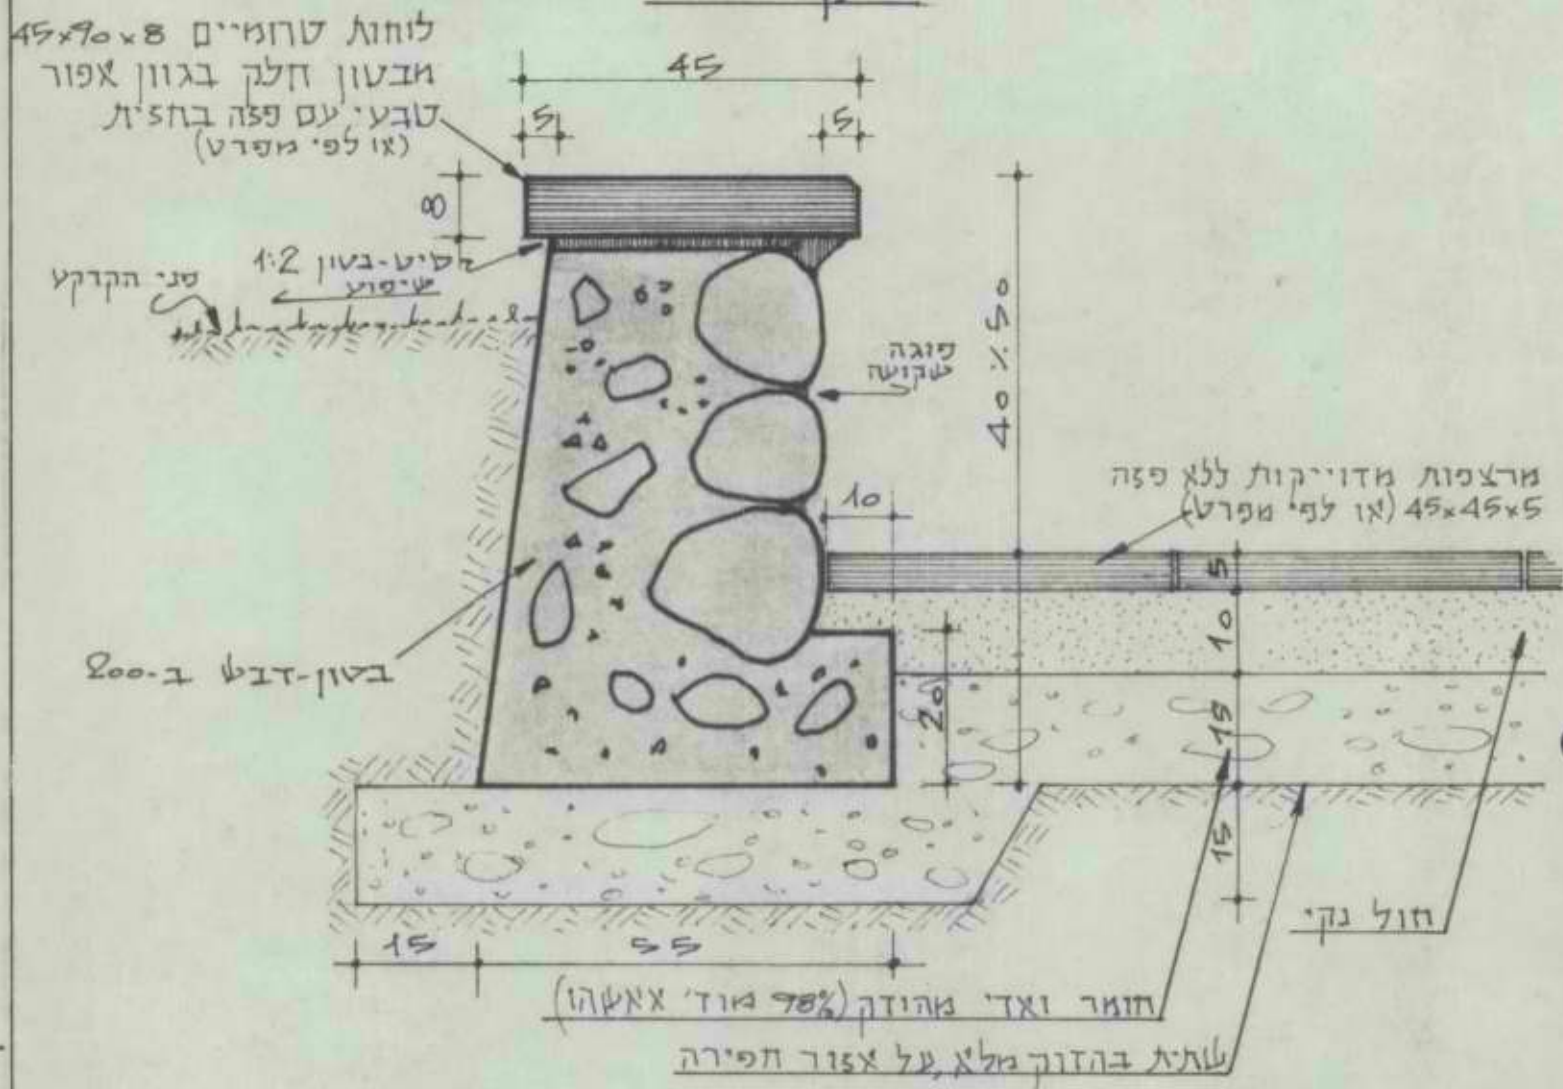

העבודה כוללת:

. מדידה, סימון.

. חפירה ליסוד ומילוי חוזר בהדוק ידני עם גמר העבודה.

. הידוק שתי בהידוק מלא, אסטקה, מיזור והידוק שכבה מצד מחומר ואדי מאושר, לפי 98 מוד. אאשהו.

. בניית קירון מחלוקי נחל על גב ויסוד בטון ב-200, עם מוגות שקועות 3 ס"מ. בטון חסובות, בתעריב צמנט-זימדיף ביחס 2:1. גודל האבנים בממוצע 20x20 ס"מ, סיניסות 12 ס"מ (במבטות 15 ס"מ כמות האבנים).

. אסטקה לוחות טרומיים למדרגות בגודל 90x45x8 מבטון חלק בגוון אפור טבעי (או לפי מפרט), עם טזה בחזית, ישרים וללא פגם, וחבורים על ראש הקיר בטון-בטון מחוזק, בקו ישר וללא סטיות,

. נקוי פני הקיר והקומינג מכל שאריות בטון.

טולכביות


ה מ ד י ד ה : מ . א . קירון עם קומינג קומפלט כולל יסוד. חפירה ליסודות

ק.ח. - 1:10


אדריכלות גוף - דן שוקס, יוסף קריב - ברור חיל, דג-תוף אשקלון 05194341

פרט ק/3

ירידה לבור אשפה : שינוי
(קירות בטון חלק לסי פדרט 19/ק) 1:25

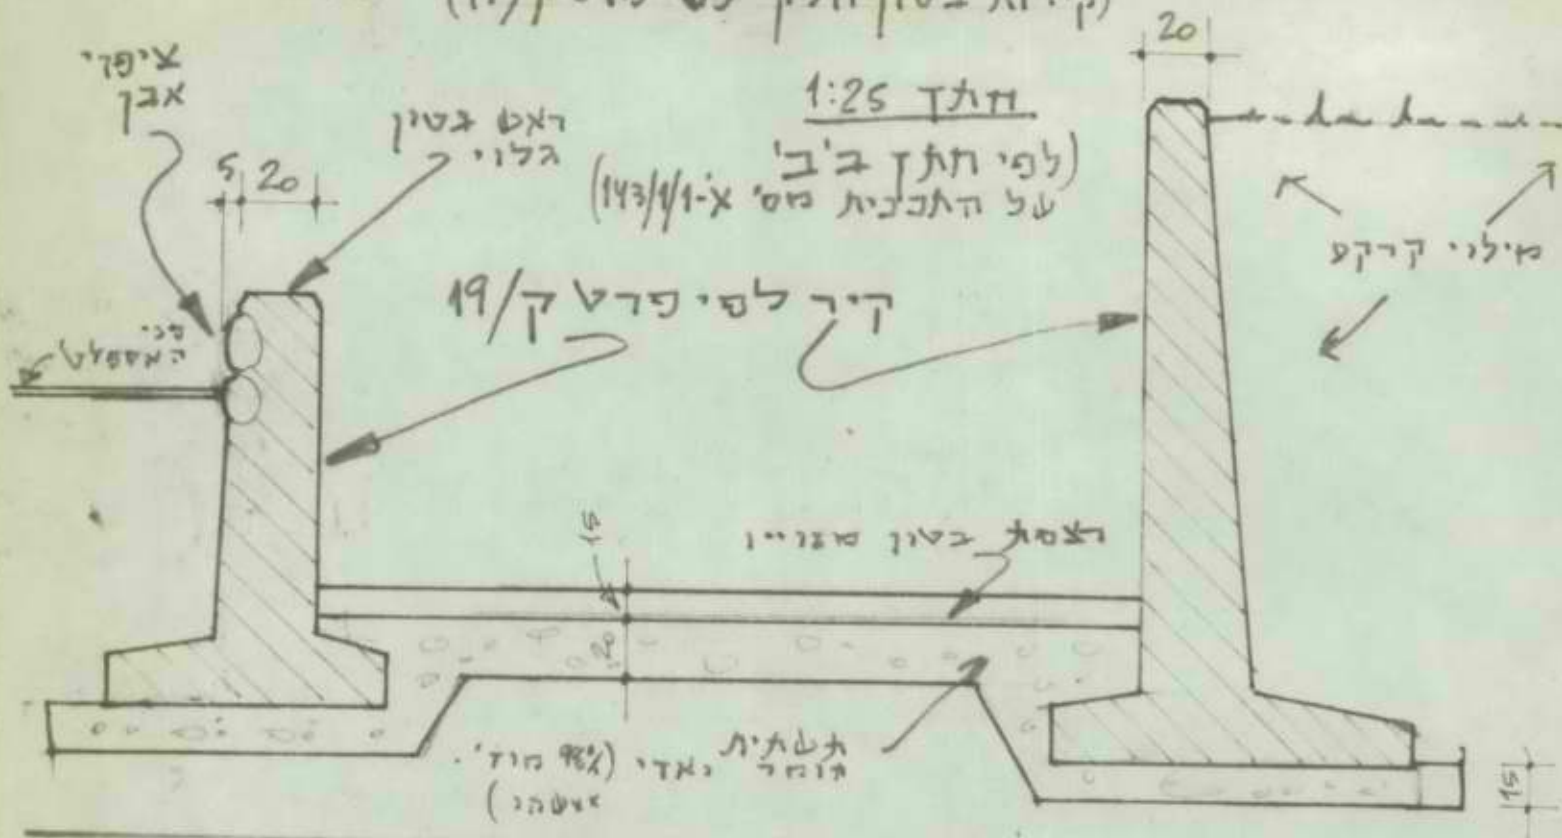

ירידה לבור אשפה :
תכנית, ק.מ. 1:50

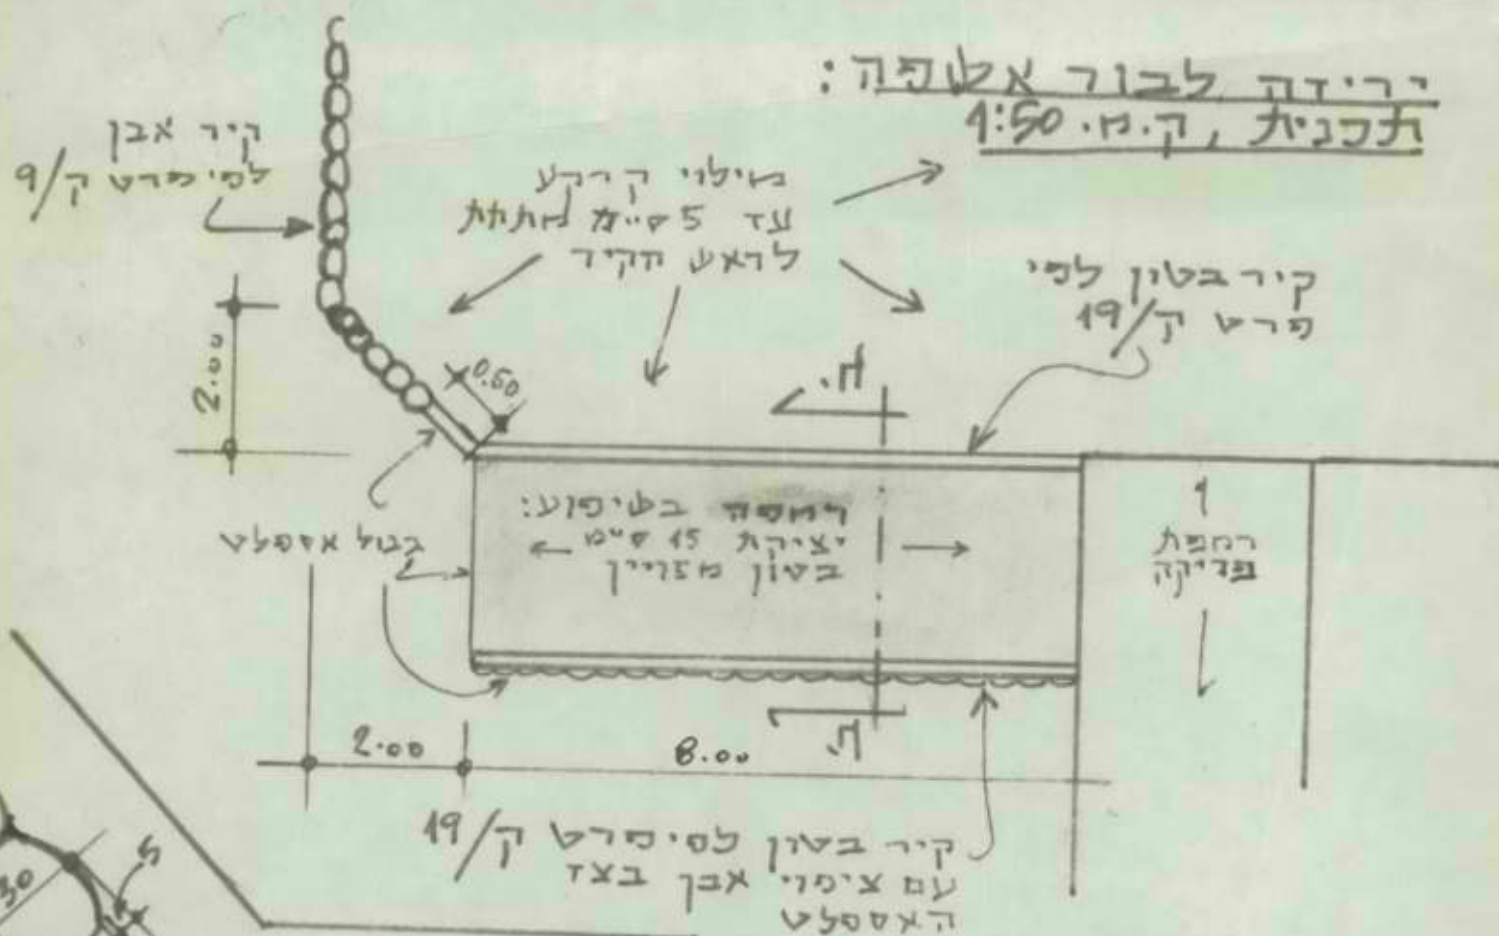

חולית - גישה לבור אשפה
קירות תומכים, שינויים

29/11/1977


י.מ. קלג

הערה: כל יתר הפרטים לפי התכנית מס' א-1/143

חיבור קיר בטון
עם קיר אבן
תכנית, 1:20

קיר תומך מבטון מזויין

מקד 1:10

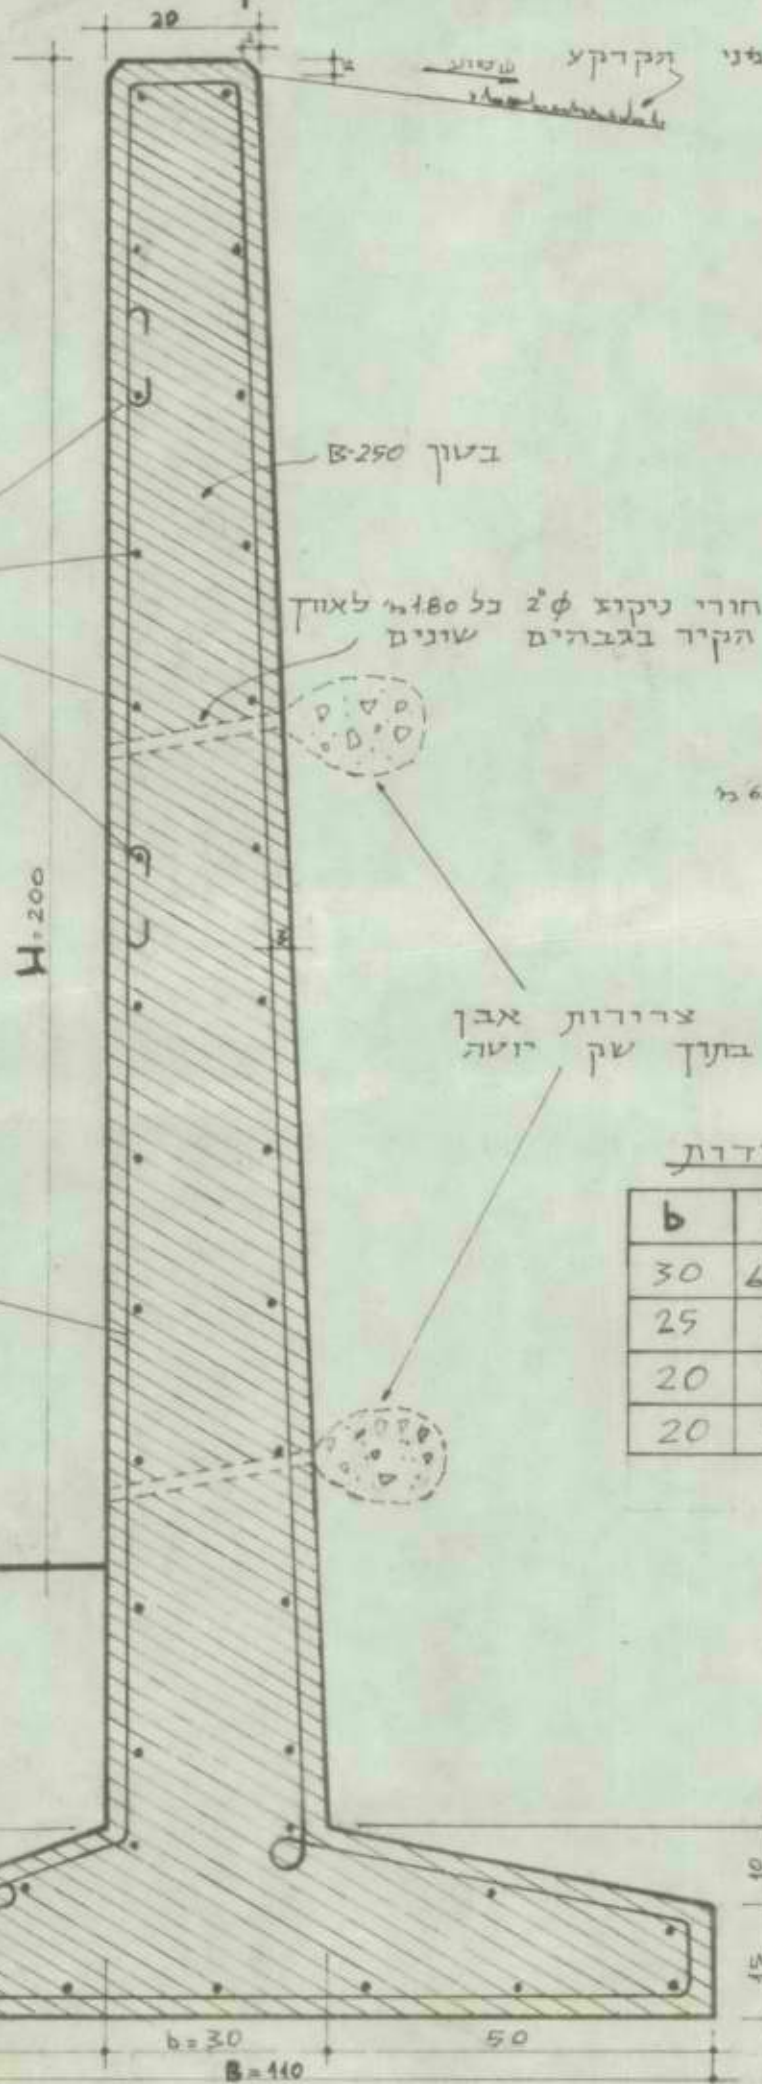

בטון B-250

חורי ניקוז $\phi 2$ כל 180 לאורך הקיר בגבהים שונים

תסדי התשטעות אנכיים כל 650

ציריות אבן בתוך שק יזעה

טבלת מידות

b	B	h	H
30	65-110	60	100-225
25	65	30	80-100
20	55	30	40-80
20	50	25	40 עד


$\phi 10 \omega 20$

פני התחתון חתוכים

קיר תומך מחלוקי נהל, ללא חגורה עליונה

חצי"ת - 1:20

חצי"ת - 1:20

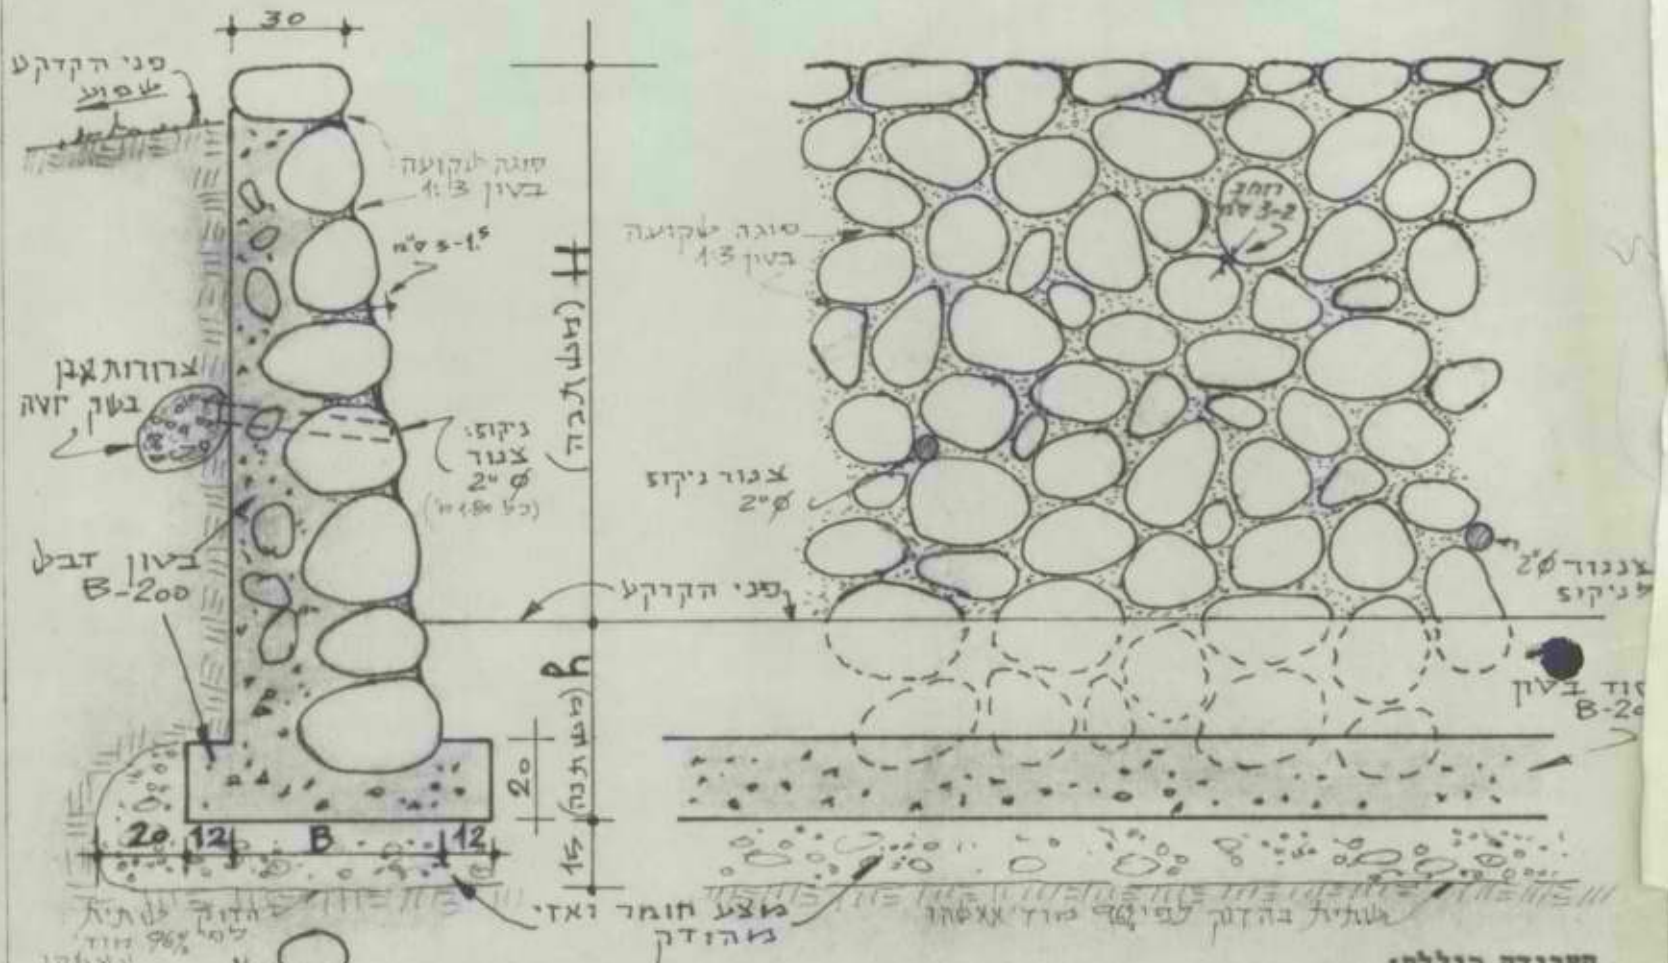

ואל הקיר
מבט מלמעלה
1:20

B	h	H
30	30	60
40	40	100
45	45	120
50	50	140
55	55	160
60	62	180
65	68	200

כאשר $H \geq 180$ היסוד
וגגג של הקיר יהיו
בבטון מזוין, ברזל $\phi 10$
20x20 מ"מ

העבודה כוללת:

- מדידה, סימון, חפירה לעבודות היסוד על אדמה טבעית. במקרה והקיר ייבנה על חזיר מילוי, זה ייעשה, בתחום יסוד הקיר, תוך הידוק מלא בטכנות עד לגובה המצע.
- אספקת חומר וארי או כורכר מאושר, שיזורו והידוקו לפי 98% מוד"א אשחור (מצע ליסוד).
- אספקת חלוקי נחל בגודל ממוצע 25x25 ס"מ, אך לא קטנות מגודל 15x15 ס"מ (15% ס"מ כמות האבנים). האבנים הגדולות לא יעברו את המספיקות של 35x35 ס"מ. יש לשבול את החלוקים במים ולנקותם מכל שארית אדמה, לפני הוילת הבנייה.
- בניית הקיר על היסוד לפי מידות השבלה ותוך מילוי הגב בבטון-דבש ב-200 (אין להשתמש בבטון-חומר וארי!), ותוך חלוקה האבנים בצורה מאוזנת.
- בניית מוגות שקועות ברוחב 2 עד 3 ס"מ במקומות המגע בין החלוקים, ובעומק בין 1.5 - 3 ס"מ. בטון המוגות בתערובת צמנט-זיפצוף 1:3.
- קביעת חורי ניקוז ע"י צנורות $\phi 2$ בגובהים שונים, כל 1.80 מ'. יש להשאיר כפתח הצנורות שקי יומה מלאים צנורות אבן, למניעת סתימת הפתחים.
- במר עליון ללא חגורה, ע"י חלוקים מוחאמים כך שיתחבל קו ישר ואחיד. יש להבטיח עיגון טוב של אבני ראש הקיר.
- מילוי חוזר בגב הקיר תוך הידוק ידני של רצועת המילוי שבמגע עם הקיר.
- ניקוי פני האבנים מכל שארית בטון. הרטבה פני הקיר הגלויים כמה פעמים ביום, במשך 7 ימים לפחות.
- ניקוי כל הסביבה משאיות וקורטשים, עם גמר העבודה.
- כאשר הקיר מעל 1.80 מ' גובה מפני הקרקע, היסוד והגב ייבנו בבטון מזוין. הדיון מגודל $\phi 10$ מ"מ ברוח 20x20 ס"מ.

- החומר כולל יסוד וכל הנ"ל, לפי:
- א- מ"ר קיר תומך על גב בטון.
- ב- מ"ר קיר תומך על יסוד וגב בטון מזוין.


סולרדיון

תכנה


מדרגות בלוחות בטון

חתך: מדרגות H=15 ק.ב. 1:10


לוחות בטון פרומית, 80x40x8 ס"מ א' עם 50 בחזית, או 45/90/8 או 45/45/8 (כחית תבנית) ו"רייזרים" (צפי בטון פרומית) 6x8, בגוף שחור עם פיגמנט תוצרת חוץ.

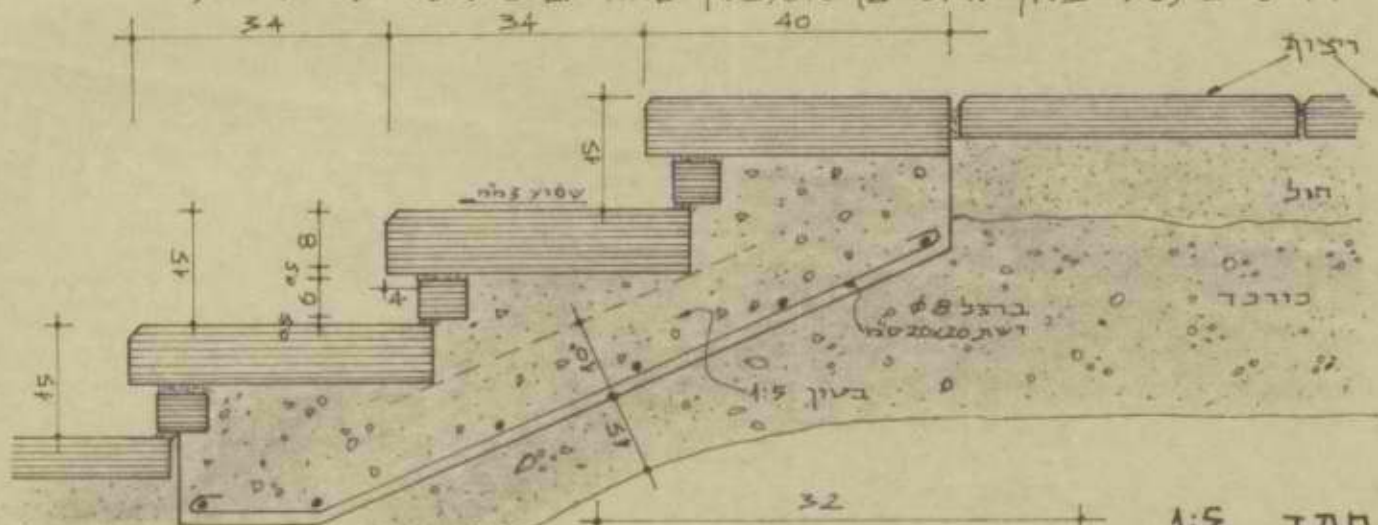


בטון חלחעלה 1:20

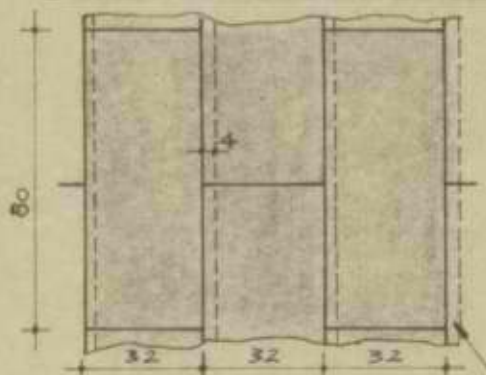


מדרגה H=16

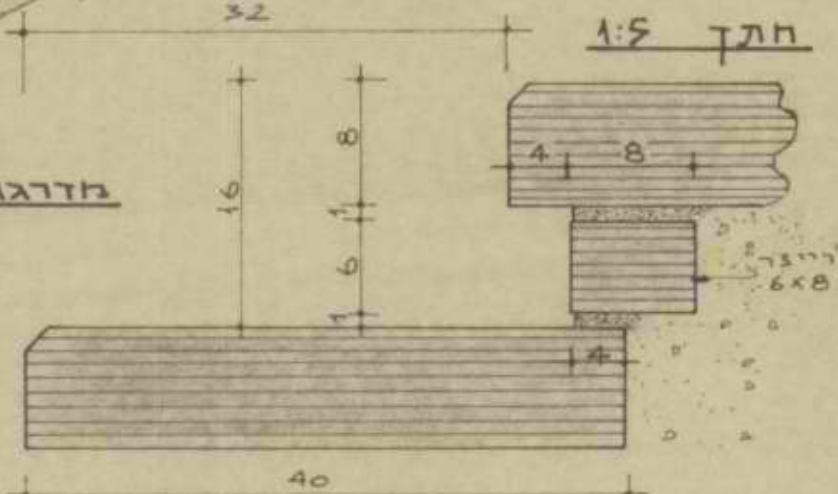

בטון חלחעלה 1:20

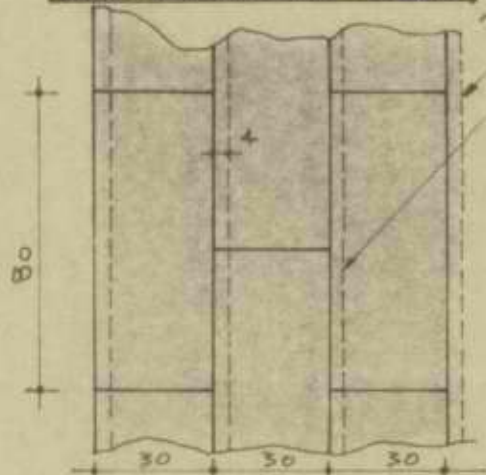

מדרגה H=17

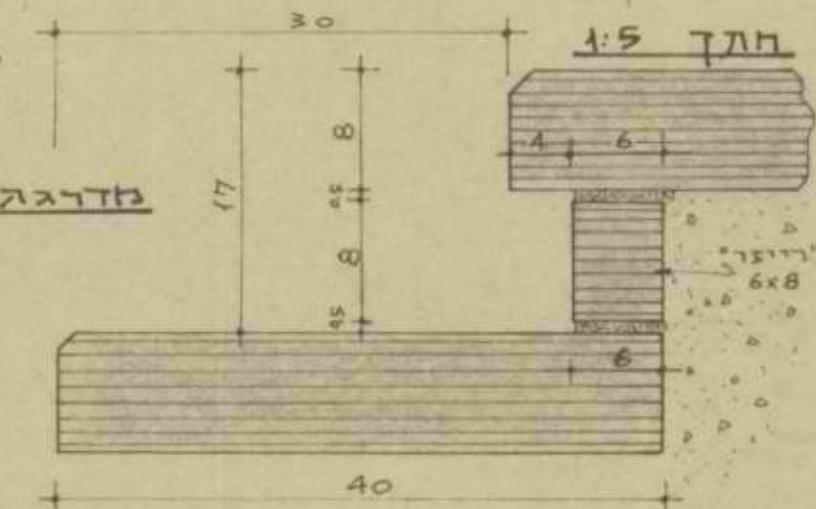


העבודה כוללת:


- מדידה, סימון, חפירה.
- אספקת מצע ליסוד, כורכר או חומר ואדי מאוסר, חידוק משכבה של 15 ס"מ לאחר חידוק ויברציוני מלא.
- יציקת יסוד בטון מזוין ב-250, חזיון בברזל 8 מ"מ, רשת 20x20 ס"מ.
- בניית מדרגות מלוחות בטון פרומיים בגודל 40/80/8 או 45/90/8 ס"מ עם פדה בחזית סוג א' ללא פגם, לפי ת.י. החלטות יהיו מבטון חלק או גרנוליט לפי התכנית. הרייזרים יהיו פרומיים, בגודל 6x8 ס"מ והאורך לפי אורך המדרגות, בתוספת פיגמנט שחור חוצרת חוץ בעת הכנה בטון הרייזר.
- יסוד השטח סביב למדרגות ופינוי כל שארית או פסולת.

סולל-ינה בע"מ
מחלקת מכשירים והעפר
ת.י. 252
באר שבע

המדידה: לפי מ.א. מדרגות כולל כל הנ"ל

מצב קיימים - חולית

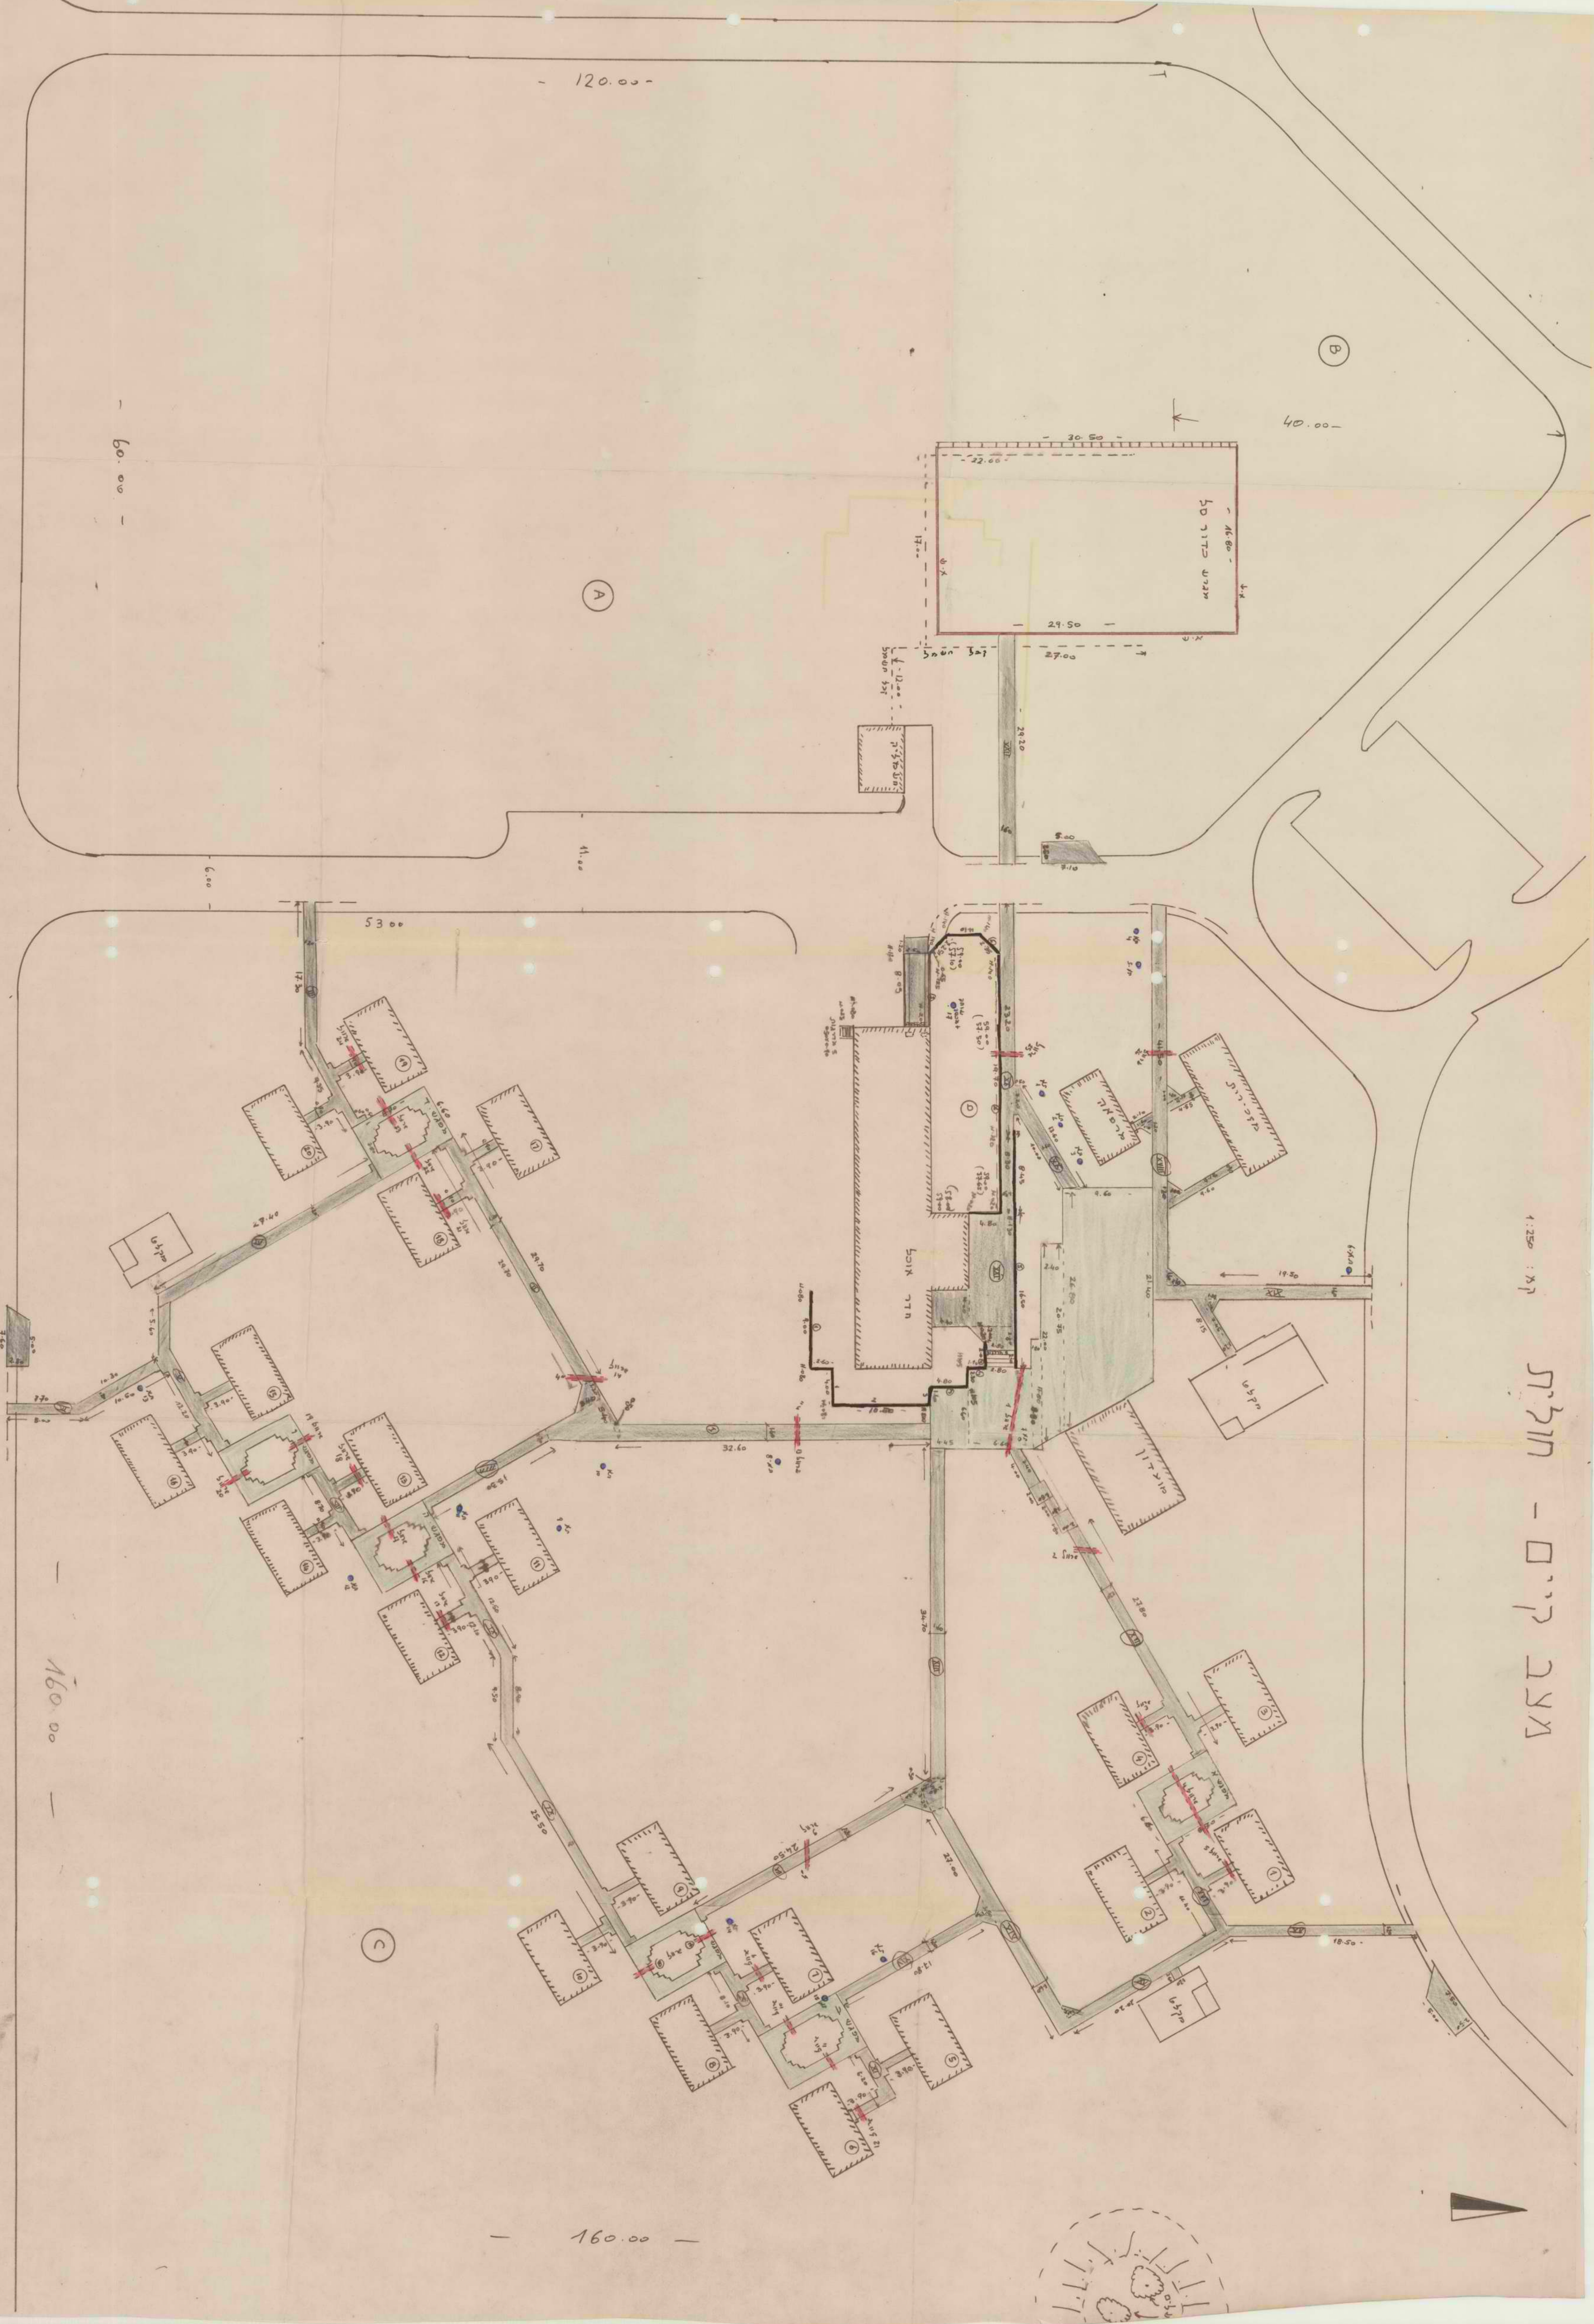

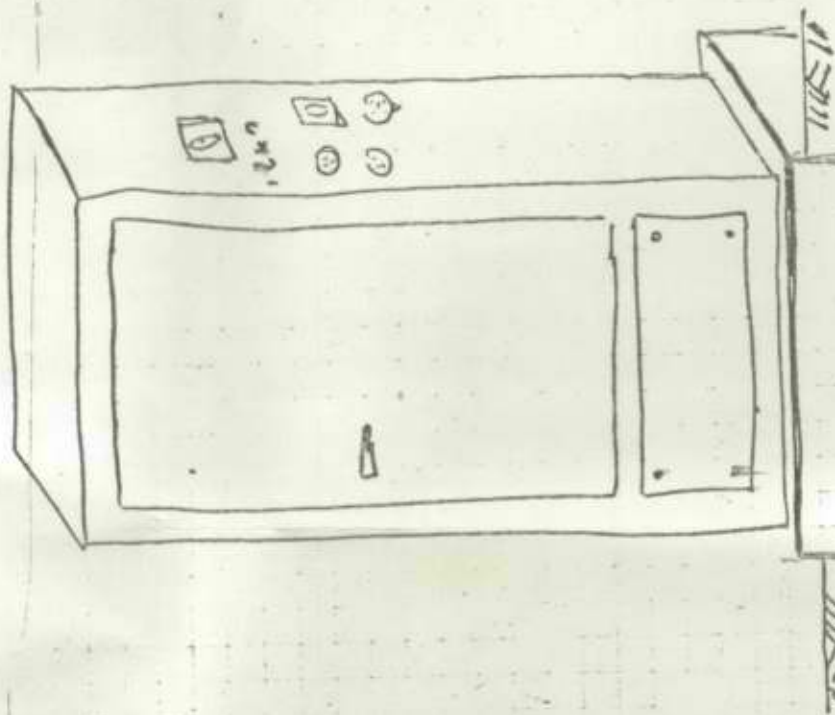

דיוט בולב
2 +
זיכרון נוסף

בעיה

אולי זה מוכן סתם + בלי ירייה ונעקע


סלולר ולב על בסיס בולב

בסיס בולב אבולן לולול קרוע לולול
א בולב + א לולול סססול
2 לולול לולול

3 פולס בולב לולול בולב יקק + יולל בקק
אם מולול בולב יולל בקק

4 יס לולול יולל לולול

יולל

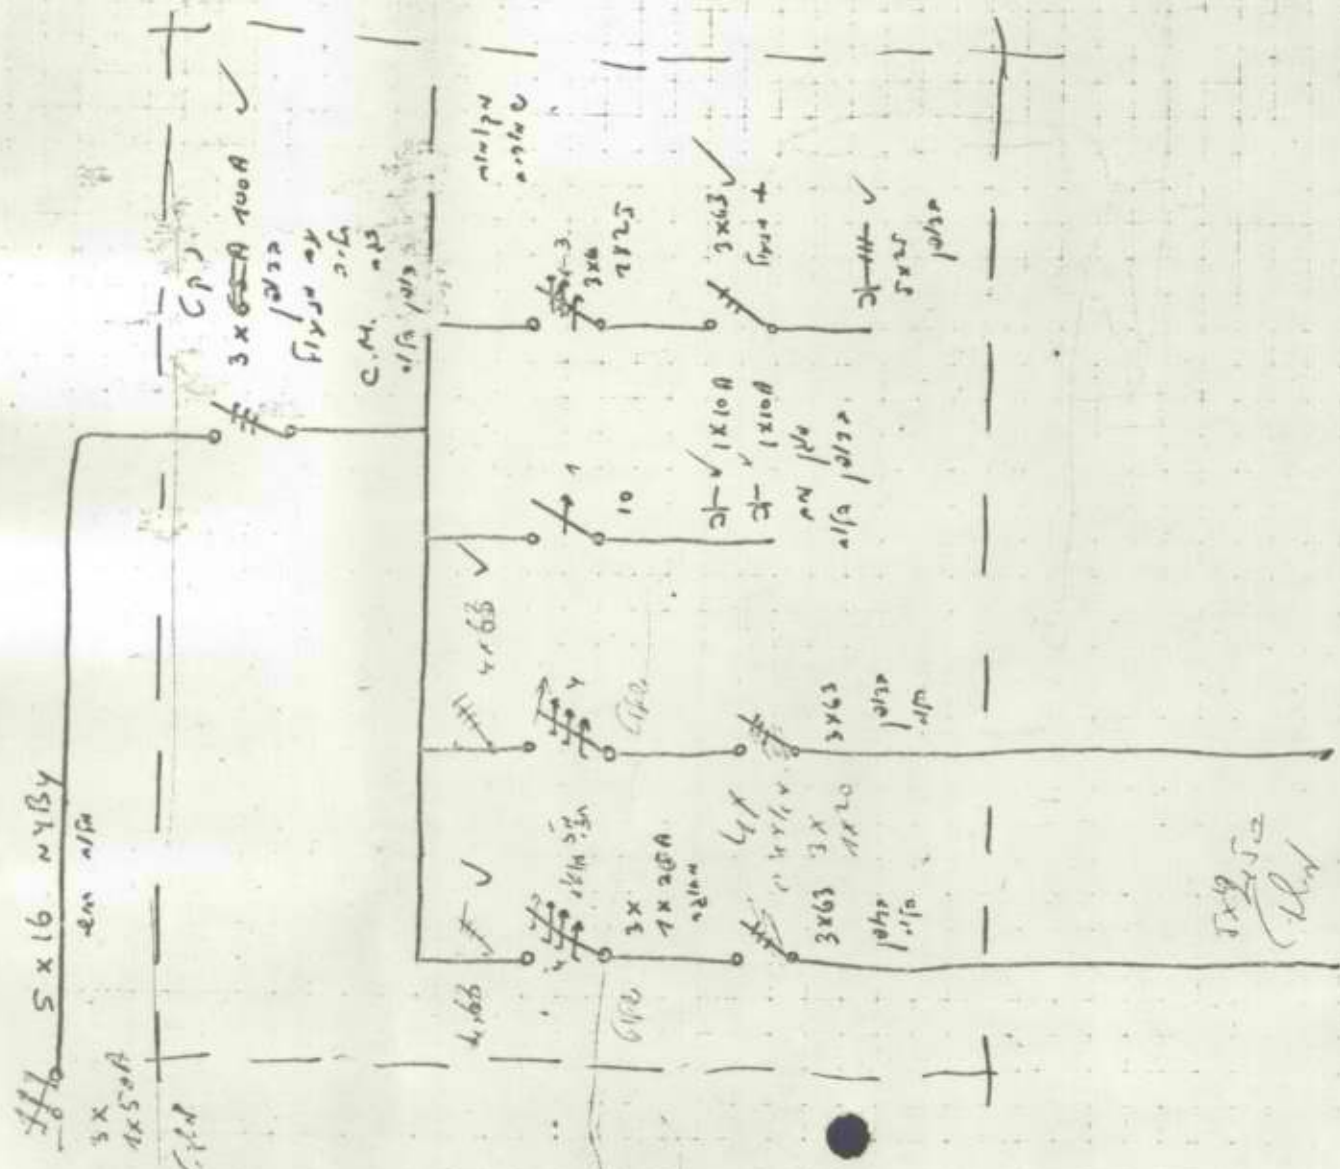

קל עולול

1, 2

3, 4

מולול מולול

בולב

שבט מולול, מולול יולל בולב

מולול חולל וולול

יולל מולול
מולול מולול
מולול מולול

יולל
לולול לולול

.....DD

המקום: חולדה המבנה: א' צ' א - שטח של א' א'
מס' החוצה: מגדל בצל סל דאלף האלי - במגרש

חאריץ גמר העבודה:

הערות: /

1. וְקָרָא הַשְׁבָּעָה וְנִשְׁבַּע לְהַחֲיוֹת וְלִפְדּוּת קִיבּוּ וְאֵל
2. אֵלֶיךָ וְלִפְדּוּת אֵלֶיךָ וְלִפְדּוּת אֵלֶיךָ וְלִפְדּוּת אֵלֶיךָ
3. אֵלֶיךָ וְלִפְדּוּת אֵלֶיךָ וְלִפְדּוּת אֵלֶיךָ וְלִפְדּוּת אֵלֶיךָ

המבנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשביענות ראובנו, ולראיה באו על החתום :-

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

המסך
תחילת

מינהל לבניה כפריה וישובים חדשים

פרטי - כל לגטר מבנה

מס' החוזה

תאריך התחלת העבודה:

תאריך גמר העבודה:

הערות: -

המבנה נמסר לשימוש וסיומו הוא לשביעות רצוננו, ולראיה באנו על החתום :-

המשק

ס.ס. מהגרים מחוץ הנגב

DATE: _____
NO: _____

STATE OF NEW YORK

County of _____

City of _____

State of New York

County of _____

City of _____

Page 1

1. _____

2. _____

3. _____

NOTED FOR THE RECORD OF THE COUNTY OF _____, STATE OF NEW YORK

DATE

DATE

STATE OF NEW YORK

STATE OF NEW YORK

STATE OF NEW YORK

DATE

DATE

STATE OF NEW YORK

County of _____

City of _____

State of New York

County of _____

City of _____

Page 1

1. _____

2. _____

3. _____

NOTED FOR THE RECORD OF THE COUNTY OF _____, STATE OF NEW YORK

DATE

DATE

STATE OF NEW YORK

מס' 1000
אורגון
1000

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמתגן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספרנו 295/77-233

תאריך 20.3.78

חשבוני סופי

חווה 77/60890/77

לכבוד מנהל לבניה כפרים

עבודות פתוח ותאורה למגרש ספורט בקבוץ חולית

הסכום	מחיר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט
	א"ג	ל"י				
39968 67000.-		2.-	19984 35500	2 מ	עבודות ישור קרקע $\pm$ 50 ס"מ	1.
28438 26000.-		200.-	143.69 130	2 מ	קירות חומכים מחלוקי נחל עם גב בסון	2.
6000.-		250.-	24	2 מ	קירות חומכים כנ"ל אך על יסוד וגב בסון	3.
6100 6400.-		200.-	30.50 32	מ"א	קירות ישיבה מחלוקי נחל	4.
12800.-		200.-	64	2 מ	קיר גדר מחלוקי נחל	5.
68689.50 69000.-		115.-	594.30 600	2 מ	רצוף מרצפות גרנוליט 30/60	6.
42120 54400.-		85.-	495.60 640	2 מ	רצוף 45/45 למגרש כדורסל עץ	7.
4122.50 4680.-		65.-	63.50 72	מ"א	אבני שפה במגרש כדורסל עץ	8.
2500.-		2500.-	1	יח	צביעת סימון מגרש כדורסל עץ	9.
13000.-		6500.-	2	יח	עמודי כדור סל	10.
4000.-		2000.-	2	יח	עמודי כדור עץ	11.
162457.50 162000.-		150.-	1083.85 1080	2 מ	יציאת מדרגות מבסון מזוין	12.
812 2000.-		80.-	12.15 25	מ"א	בניה מדרגות מלוחות טרומיים	13.
705 1050.-		350.-	2 3	יח	יציאת בסון במכסי שוחות ביוב	14.
12600.-		600.-	21	יח	התקנת סלי אשפה	15.
24000.-		3000.-	8	יח	עמודי תאורה	16.
					התקנת שרולים	17.
1200 1100.-		200.-	6.00 5.50	מ"א	מצנור 4"	
5760 6600.-		120.-	43 55	מ"א	מצנור 2"	
					תאורת מגרש ספורט	
14000.-		3500.-	4	יח	למוד תאורה	1.
14400.-		1800.-	8	יח	פנס יוד קוורץ	2.
4525 4000.-		50.-	90.50 80	מ"א	תפירת תעלות לכבלים	3.

507530.-

להעברה

412503.50

האוצר
מס חשבונית שולם
מס' אישור 3375/9

295/77-233 מספרנו

20.3.78 תאריך

הברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת-גן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

72 42 35 ,73 14 36 : טלפון

חשוב וסופי

תוצה 77/60890/77

סנהל לבניה כפרית

71255

קבורץ חולית

הסכום		מחיר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף למי המפרט
ל"י	א"י	ל"י	א"י				
507530.-						מהעברה	
412 503.50				77.5	מ"א	מנור פלסטי קשיח 55 מ"מ	4.
3000.-	60.-	50		33.0	מ"א	כנל אך 74 מ"מ	5.
1980.-	60.-	30		35.0	מ"א	מוליך נ.וי.ני.וי 5+16	6.
2225.-	65.-	45		129.0	מ"א	כבל נ.וי.די 5x4 מ"מ	7.
2925.-	46.-	80				אספקה בלבד של לוח חשמל לכדור סל	8.
5934.-	50.-					א. מ"ז פקס 3x100 אמפר	
4000.-						ב. כנ"ל 3x63 אמפר	
				1	יח"כ	ג. מ"ז ח"א בודד	
3000.-	3000.-			3	יח"כ	ד. בית חקע 1x10 אמפר	
7500.-	2500.-			10	יח"כ	ה. כנ"ל 5x25 אמפר	
9600.-	800.-			2	יח"כ	ו. ארון לנ"ל	
8000.-	800.-			1	יח"כ	התקנה לוח וחיבור קוים	9.
1600.-	800.-			1	יח"כ		
800.-	800.-			1	יח"כ		
3000.-	3000.-			1	יח"כ		
1500.-	1500.-			1	קומפ		
434 342.50						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 107.50	10
544 655.-						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 136.25	
455 842.50						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 113.75	
16339.65						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 4084.6	
13675.25						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 3418.75	
442 167.25						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 1105.625	
528 315.35						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 1320.6875	
68433.90						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 17108.475	
82364.35						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 20591.0875	
511 101.10						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 12775.275	
610 679.70						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 15266.9925	
						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 38367.35	
37208.20						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 9317.05	
548 309.30						הסכום הנ"ל כולל מע"מ 25% - 13707.7275	

o g e t

77/00800/77

and been seen

very often

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

אחרי מחר
 תאריך

הקריה, תל-אביב
 ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: 15 אפריל 1978

4470

מספר:

טופס שינוי חוזה

מספר החוזה: 9077/60090/77

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 ניהול בתאריך: 1-05-1978
 לטופס: *אבני, א' א' א' א'*
 לעיונו של: *[Signature]*

אל: גזברות (2)

מאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליות חדשות.

שם המחוז	שם הישוב	שם הקבלן
נגב	חולדה	חב' סול כביש בע"מ
ב. הרכב החוזה הקיים:-	מבוצה פיתוח	
הקיים ב-5	המתוקן ב-5	השינוי ב-5
350,000	600,000	50,000
ג. מהות השינוי:	מחלום ההיקשרות	
ד. סעיף תקציבי:	90.60.785/01	9039

בכרחה,

ד. בן-יהודה
 חשב המשרד

[Signature]
 י. מרגלית
 ראש המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

חתימת הקבלן

[Signature]
 חב' סול כביש בע"מ
 חתימה

20-4-1978

תאריך

העתיקים

מר א. שטרן, סגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וכיצוע
 מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
 מר א. כלף, ממונה על חוזים ומכרזים
 מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז נגב
 אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
 גזברות (2)

8914
 18 920
 1978

4470

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המיוהל לכנייה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, חל-אביב
ת.ד. 7021, מיקוד 61070

תאריך: 16 אפריל 1978

מספר

טופס שינוי חוזה

מספר החוזה: 9077/60890/77

אל: גזברות (2)

טאת: המחלקה האירגונית להתיישבות, עליוח חדשות.

שם המחוז	שם הישוב	שם הקבלן
נגב	חולות	חב' סול כביש בע"מ
ב. הרכב החוזה הקיים:-	עבודות פיתוח	
הקיים ב-5	המתוקן ב-5	השינוי ב-5
550,000	600,000	50,000
ג. מהות השינוי:	חשולם ההיקריות	
ד. סעיף תקציבי:	9039 - 90.60.788/01	

בכרחה,

ד. בן-יהודה
חשב המשרד

י. מרגלית
ראש המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

חתימת הקבלן
"סולכביש"
חברת יטורדית רייטיס ופיל
חתימה

20-4-1078
תאריך



העתקים
מר א. שטרן, חגן ראש המינהל ומנהל האגף לתכנון וביצוע
מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות
מר א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוזי לבנייה כפרית, מחוז נגב
אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (2)

ס"ע 1978

18920

8914

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית-

מס' 7240/216

בשר-שכר 29.3.48

אל: הר"ר ג"א

פא: מחלק הנכס

הנדון: ח.ו. חק' חס. 4 עובד
חל'ג בג'ח

4

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון אלקי/פומי פס'

לעבודה עובד בג'ח

במשק / מושב חל'ג

למי חוזה 44/60870/44 מ"כב"ש הקבלן

על סך 8448434.54

הערות:

(A large diagonal line is drawn across the empty space for notes.)

(A large handwritten signature is written in the bottom left corner.)

מחלק הנכס

לוט: 44/60870/44

העתק:

מהגדס אזור מחלק הנכס

הקבלן מ"כב"ש

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית -

מס': 100/100
 באר-שבע, 19/1/77

אל: 100/100
 מא: 100/100

הגדרון: 100/100
 100/100

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס השכון אלקי/טופי מס'
 לעבודה
 במשק / מושב
 למי חוזה
 על סך
 הערות:

100/100
 100/100
 100/100

מנהל הסחור

לוחה: 100/100

העתק:
 מהגוס אזור
 הקבלן

סולכביש

חברה לעבודות כבישים ומתוח בע"מ

רמת גן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספרנו 286/77-233

תאריך 15.3.78

חשבוני חליקת מס' 4
חוצה מס' 9077/60890/77

לכבוד מינהל לבניה כפרית

עבודות פתח ותאורה מגרש ספורט בקבוץ חולית

הסכום	מחיר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט
	א"ב	ל"י				
71,000.- 67,000.-	2.-		35500	מ"מ	עבודות ישור קרקע ± 50 ס"מ	1.
26000.-	200.-	✓	130	מ"מ	קירות חומכים מחלוקי נחל עם גב בטון	2.
6000.-	250.-	✓	24	מ"מ	קירות חומכים כנ"ל אך על יסוד וגב בטון	3.
6400.-	200.-	✓	32	מ"מ	קירות ישיבה מחלוקי נחל	4.
12800.-	200.-		64	מ"מ	קיר גדר מחלוקי נחל	5.
69000.-	115.-	✓	600	מ"מ	רצוף מרצפות גרנוליט 30/60	6.
54400.-	85.-	✓	640	מ"מ	רצוף 45/45 למגרש כדורסל עץ	7.
4680.-	65.-	✓	72	מ"מ	אבני שפה במגרש כדורסל עץ	8.
2500.-	2500.-	✓	1	יח"ד	צביעה סימון מגרש כדורסל עץ	9.
13000.-	6500.-	✓	2	יח"ד	עמודי כדור סל	10.
4000.-	2000.-	✓	2	יח"ד	עמודי כדור עץ	11.
162000.-	150.-	✓	1080	מ"מ	יציקה מדרכות פבטון מזוין	12.
2000.-	80.-	✓	25	מ"מ	בניה מדרכות מלוחות פרומיט	13.
1050.-	350.-	✓	3	יח"ד	יציקה בטון במכסי שוחות בירב	14.
12600.-	600.-		21	יח"ד	התקנת סלי אשפה	15.
24000.-	3000.-		8	יח"ד	עמודי תאורה	16.
					התקנת שררולים	17.
1100.-	200.-	✓	5.50	מ"מ	פנור 4"	
6600.-	120.-	✓	55	מ"מ	פנור 2"	
					תאורה מגרש ספורט	
14000.-	3500.-	✓	4	יח"ד	עמוד תאורה	1.
14400.-	1800.-	✓	8	יח"ד	פנס יור קדורץ	2.
4000.-	50.-	✓	80	מ"מ	חפירת תעלות לכבלים	3.

507530.-

להעברה

שהל המדסת בנין כעס
העבודה בוצע

חשוק

תאריך
מס חשבונית שולם
מס' אישור 3375/9

סולכביש

מספר: 286/77-233

- 2 -

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת גן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

תאריך: 15.3.78

ח ש ב ו ן חלקי מס' 4

חווה 77/60890/77

לכבוד מנהל לבניה כפרית

קבוץ חולית

הסעיף לפי המפרט	תאור העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר היחידה		הסכום	
				א.ג.	ל.י.	א.ג.	ל.י.
	מהענקת						
4.	צנור פלסטי קשיח 55 מ"מ	מ"א	50	60.-	✓	3000.-	507550.-
5.	כנ"ל אך 35 מ"מ	מ"א	30	60.-	✓	1800.-	
6.	מוליך נצוי. נוי.וי 5x16	מ"א	45	65.-	✓	2925.-	
7.	כבל נ.וי.וי. 5x4 ממ"ר	מ"א	80	50.-	✓	4000.-	
8.	אספקה בלבד של לוח חשמל לכדור סל						
	א. מ"ז פקס 3x100 אספר	יח'	1	3000.-	✓	3000.-	
	ב. כנ"ל 3x63 אספר	יח'	3	2500.-	✓	7500.-	
	ג. מ"ז ח"א בודד	יח'	10	800.-	✓	8000.-	
	ד. ביח תקע 1x10 אספר	יח'	2	800.-	✓	1600.-	
	ה. כנ"ל 5x25 אספר	יח'	1	800.-	✓	800.-	
	ו. ארון לנ"ל	יח'	1	3000.-	✓	3000.-	
9.	התקנת הלוח וחיבור קווים	קומפ.	1	1500.-	✓	1500.-	
	3% הנחה						
	עדיכון מחירים לחקומה מ-6.77.- 10.77.- לפי מכחכם מ-20.12.77						
	528315.35 מסך 15.59%						
	10%						
	עם גמר העבודה להשלום 90% מסך 610679.70						

סוף תשלום כמין כע"ס

העבודה בוצע

אמפקה

בכל הכבוד,

"סולכביש" בע"מ

האוצר
מס' חשבונית שולם
מס' אישור 3375/9



21/2/78

44701

משרד השיכון
מחוז הנגב
נחלקל בתאריך
24-02-1978

לכ

מר.ש. רודניק

מר. זיידה

המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

משרד הבינוי והשיכון

באר-שבע

א.נ.

המידון: פיתוח חולית

עם סיום עבודות הפיתוח בחולית, ברצוני להביע סיפוק על הרמה הנאותה של הביצוע, אשר נעשה במהירות ובנאמנות לדרישות התיכנון, הודות למאמצים של הקבלן "סולכביש" ולהתמסרות והקפדה של יחיאל קוזלובסקי, הממונה על הפיקוח, איתו עבדנו בשיתוף פעולה ובהבנה מלאים.

מכרחה,
י. קריב

העתק: יחיאל קוזלובסקי, משה"ש, באר שבע.

8-1/8

UNITED STATES AIR FORCE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D.C. 20330

TO:

Mr. [Name]

Mr. [Name]

Mr. [Name]

Mr. [Name]

Mr. [Name]

ROOM 30-11

RECEIVED

TO: [Name], [Address], [City], [State], [Zip].
FROM: [Name], [Address], [City], [State], [Zip].
SUBJECT: [Subject]

DATE:

TIME:

BY: [Name], [Signature], [Title], [Address], [City], [State], [Zip].

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס': 7740 / 20.2.78
באר-שבע

אל: מ"ר ג'א
מא: זמאז (נכח)

הנדון: חן חיל' מס. 3 עביוג
פג'ח חיל'ג

3

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כח השכון אלפי/מדי מס'

עביוג פג'ח

לעבודה

חיל'ג

כמסע / מושב

חיל'ג

הקבלן

44/60890/44

למי תוזה

301934.32

על סך

הערות:

מהגוס המוזן

לוטה: 4/4/78 חן

העתק:

העובד מס'

מהגוס אזור

חיל'ג

הקבלן

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-

מס' _____

באר-שבע, _____

אלי: _____

מאמ: _____

הנדון: _____

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון אלקי/דושי פס' _____

לעבודה _____

במשק / מושב _____

לפי חוזה _____

על סך _____

הערות: _____

מנהל המחוז

לוטסה: _____

העתק: _____

מהנדס אזור _____

הקבלן _____

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ

רמת גן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספר: 250/77-233

תאריך: 15.2.78

ח ש ב ו ו חלקי מס' 3

ח,ה מס' 9077/60890/77

לכבוד מנהל לבניה במרית

עבודות סלילה ופאזורה בגוש ספורט בקבוץ חולית

הסעיף לפי המפרט	תאור העבודה	יחידת המידה	כמות	מחיר החזרה		הסכום	
				א' ב'	א' ב'	א' ב'	א' ב'
1.	עבודות יסוד קרקע + 0.50 ס"מ	מ"ר	35500	2.-		60000	67000.-
2.	קירות חומטים מחלוקי נחל על גב בסון	מ"ר	130	200.-		26000.-	
3.	קירות חומטים בג"ל אך על יסוד וגב בסון	מ"ר	20	250.-		5000.-	
4.	קירות ישיבה מחלוקי נחל	מ"ר	30	200.-		6000.-	6400.-
5.	קיר גדר מחלוקי נחל	מ"ר	64	200.-		12800.-	
6.	רצוף במרצפות גרנוליט 30/60	מ"ר	600	115.-		69000.-	
7.	רצוף 45/45 למגרש כדורסל - קף	מ"ר	640	85.-		54400.-	
8.	אבני סורי במגרש כדורסל - קף	מ"ר	70	65.-		4550.-	4620.-
12.	יציאה סדרכות בסון מזוין	מ"ר	1080	150.-		162000.-	
13.	בניה מדרגות פלוחות טרומיים	מ"ר	25	80.-		2000.-	
14.	יציאה בסון במטי שוחות כיוו	מ"ר	3	350.-		1050.-	
17.	התקנת שרולים						
	שרולים סגור פ' 4	מ"ר	5.50	200.-		1100.-	
	שרולים סגור פ' 2	מ"ר	55	120.-		6600.-	
						377300	419130.-
						11319	12574.-
						365981	406556.-
						36548	57056.-
						63502.-	
						308985	409938.-
						423007	4025149
						301934	

3 הנחה לפי תנאי החוזה

ערבון מחירים להקדשה 6.77 - 10.77

לפי מכרז מס' 20.12.77

15.59% סך 10%

(ארכיון מאגזין המס' להקדשה סלולרים)

הסכומים (לירות).

בכבוד רב

האוצר
מס' חשבונית שולמ
3575/9

"סולכביש" בע"מ.

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

4470

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך
 27-01-1978
 לטיפולו של
 לעיניו של

הקריה, תל-אביב

תאריך: 23.1.78

מספר: 4375/מספר: 77/60890/77

אל: מר ר. לט

סאח: מר א. בלף

הנדון: הגלית / הקטנה חרזה 77/60890/77

העבודה - עבודות טיחות

המקום - חולית

הקבלן - חב" טולכביש בע"מ

טחוח השנוי - התיקירות

כסך - 50,000.- ל"י
 - 550,000.- ל"י
 ס"ה 600,000.- ל"י

נא להגדיל את החוזה הנדון,

ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך כצו: -

עדכון המחירים עד להתחלת העבודה 10/77.

א. בלף
 מסונה על חוזים ומכרזים

העתיקים:
 מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן -

אגף לבניה כפרית -

23. 5. 48, 28-48

ה'תש"ח
בית דין

הנדון: מל' ח' 2011 עמ' 87
מל' ח' 2011 עמ' 87

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון אלקי/מנמי מס' 2

לעבודה ח'מא ג'תשס"ב

כמסע / מושב

למי תורה 44/10090/94 הקבלו מילכה'ש

על סך 261403.08

הערות :

[illegible]

לוח: 144

העתק :

מהנדס אזור העירייה וס' י'

הקבלן 1022'ש

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' 1011

באר שבע, 13.5.77

אל: 1011

מאת: 1011

הנדון: תוכנית חלק 1011

בית 1011

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשכון אלקי/בנאי מס' 2

לעבודה 1011

כמשק / מושב 1011

למי חוזה 1011/1011

על סך 1011

הערות:

לוטסה: 1011

העתק:

מהגדס אזורי ליבה 1011

הקבלן 1011

מחברים ושותפים

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ומתחם בע"מ

רמת-גן, רח' הרא"ה 7, ת.ד. 2741

טלפון: 72 42 35, 73 14 36

מספר: 229/77-233

תאריך: 20.1.78

ח ש ב ו ן חלקי מס' 2

חוזת מס' 9077/60890/77

מנהל לבניה כפרית

עבודות מתחם וחאורה מגרש ספורט בקבוץ חולית

המטרה לפי המפרט	תאור העבודה	יחידת המידה	כמות	מוצר היחידה		הטכום	
				ל"י	א"י	ל"י	א"י
1.	עבודות יסוד קרקע + 0.50 ס"מ	מ"מ	30.000	2.-		60000.-	
2.	קירות תומכים מחלוקי נחל על גב בסון	מ"מ	130	200.-		26000.-	
3.	קירות תומכים כנקל אך על יסוד וגב בסון	מ"מ	20	250.-		5000.-	
4.	קירות ישיבה מחלוקי נחל	מ"מ	24	200.-		4800.-	
5.	קיר גדר מחלוקי נחל	מ"מ	28	200.-		5600.-	
6.	רחצוף בסרצפות גרנוליט 30/60	מ"מ	64	200.-		12800.-	
7.	רחצוף 45/45 למגרש כדורסל - עץ	מ"מ	500	115.-		57500.-	
8.	אבני שפרי במגרש כדורסל - עץ	מ"מ	600	85.-		51000.-	
12.	ציקת מדרכות מבטון מזוין	מ"מ	490	65.-		31850.-	
13.	בניה מדרבות מלוחות טרומיטים	מ"מ	62	150.-		9300.-	
14.	ציקת בסון במסי שוחות ביוג	מ"מ	72	80.-		5760.-	
17.	התקנת שרולים	מ"מ	1000	350.-		350000.-	
	שרולים מצנור 4"	מ"מ	5.50	200.-		1100.-	
	שרולים מצנור 2"	מ"מ	55	120.-		6600.-	
3% הנחה לפי הנאי החוזת							
ערכון מחירים לחקומה מ - 6.77 - 10.77							
לפי סכתבכם מ - 20.12.77 - 15.59% מסך - 406556							
(ארבע מאות ששים וחשע אלף חשע מאות שלושים ושמונה לירות).							
בכבוד רב							
האוצר							
מס חשבונות ששים							
בסי אישור 3378/9							

261403.58

45% קבוע

"סולכביש" בע"מ.

האוצר
מס חשבונות ששים
בסי אישור 3378/9

אגף לבניה כפרית -

23, 12. 44

ע"א פאך 24

25th Jan: MON

הנדרין: ח-ח / ח-ח / ח-ח

1

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/לפני פס'

ਮ/ਦਭ ਅ/ਤੰਦਰ

לעבודה

2/10

במחשק / מושב

ש'כ"ו

הקבלן

44/60390/42

לפי חרזה

116842.84

על סך

הערות:

תחילת חג: לוח:

: תע"פ

10/10/20

פרינץס אדור

ע'ר א' מ'ע

הקבלן

01/09/2019 09:11:00

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית -

מס'
 באר-שבע,
 אל:
 סא:

הגדרון:
 כליה
 חלוג

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/טופי מס'
 לעבודה
 במשק / מושב
 למי חוזה
 על סך
 הערות:

לוטה:
 העתק:
 מהגדס אזור
 הקבלן:


 מהגדס המחוז

"סולכביש"

חברה לעבודות כבישים ופתוח בע"מ
רמתגן, רח' הרא"ה 7, טל. 731436, 724235
טלפון פרטי: 739647

מספר: 215/77-233

תאריך: 20.12.77

ח ש ב ו ן חלקי מס' 1

חווה מס' 9077/60890/77

מנהל לבניה כפרית

לכבוד

עבודות פתוח ותאורת מגרש ספורט בקבוץ חולית

הסכום	מחיר היחידה		כמות	יחידת המידה	תאור העבודה	הסעיף לפי המפרט
	א	ב				
40,000.- 67,000.-		2.-	20,000 53,500	מ"מ	עבודות יסוד קרקע + 0.50 סמ'	1.
26,000.-	200.-		130	מ"מ	קירות חומכים מחלוקי נחל על גב בסון	2.
38,250.- 54,400.-	85.-		450 640	מ"מ	רצוף למגרש כדורסל - עף	7.
3,400.- 4,680.-	65.-		60 72	מ"מ	אבני שפה למגרש כדורסל - עף	8.
52,500.-	150.-		350	מ"מ	יציאה מדרגות בסון מזוין	12.
160,650.- 204,580.-					ס"ה	
78,195.- 61,377.40					הנחה 3% לפי חנאי החוזה	
155,830.50 198,442.60					ס"ה	
(מאה חשבים ושמונה אלף ארבע מאות ארבעים ושניים לירות + 60 אג').						
מאה חשבים ושמונה אלף ארבע מאות ארבעים ושניים לירות + 60 אג'.						
בכל הכבוד						
"סולכביש" בע"מ						
החברה מוצעת בניה						
העבודה מוצעת						
החברה						

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

הקריה, חל-אביב
ת.ד. 7021 מיקוד 61070

סדר השלומים

חוזר מס' 9077/60890/77

75%	(1) לפי אומדן התקדמות העבודה בהחאט לכמויות מאושרות ע"י המהנדס
13%	(2) לאחר הגשת ח-ן סופי וקבלת העבודה
2%	(3) לקרן בטוח פועלי בניין וכבישים
10%	(4) לאחר אישור חשבון סופי
<u>100%</u>	<u>סך הכל</u>

..סולכביע"
חברה לעבודות כבישים ופיתוח בע"מ

מדינת ישראל

משרד השיכון

תוספת א' לחוקה בניה מס' 44 / 9044 / 60890

תנאים מיוחדים

1. מוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה, המפרט וההצהרה על טיב החומרים וההצהרה על אחריות הקבלן לאי-חדירת רטיבות מהורים חלק בלתי נפרד מהחוזה הזה, והצדדים לחוזה זה מחייבים למלא את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בתנאי החוזה.
2. מחירי היתירות המופיעים בחוזה כוחם יפה גם לגבי עבודות דומות.
3. מוסכם בין הצדדים כי המנהל הכללי של משרד השיכון או מי שיומנה על ידו למטרה זו בכתב, תהינה לו הסמכויות הניתנות למנהל הנזכר בתנאי החוזה.
4. מוסכם בין הצדדים כי המהנדס א. שרון, מנהל האגף לבנייה כפרית יהיה בא כוחו של המנהל הנזכר בתנאי החוזה האמורים.
5. תאריך גמר העבודה הנ"ל 2 חודשים מתאריך מסירת השטח.
6. כל ההיטלים והמיסים שיוטלו ע"י הממשלה עד לתאריך חתימת החוזה כלולים במחיר.
7. בניגוד לנאמר בפרק י"א (תשלומים) סעיף 62 (3) של החוזה "ישולם לקבלן בתשלומי ביניים לחודש האמור על חשכון שכר החוזה תוך 60 יום מתאריך אישור החשכון ע"י המפקח, לפי האמור בסעיף קטן (2)".
8. על אף האמור בפרק ו' סעיף 49 של תנאי החוזה הזה, יהיה הסכום שעל הקבלן לשלם לממשלה בעד אחוד לכל 10 של מסירת כפיצויים קבועים מראש 200 ל"י / ל"י שהעבודות השארנה בלתי גמורות.
9. המחירים לחוזה מבוססים על תאריך ההתיקרות לעבודה הנדונה, תשולט בהתאם לנאמר בסעיף 64 של החוזה הסתוקן הוצאה (מדף 3402) ובהתאם לתנודות מוד הבנייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי בסיס 10 44. אולם בהתאם לחישוב המקובל באגף לבנייה כפרית במשרד השיכון.
10. הרשות בידי משרד השיכון לבצע עבודות בשלבים בהתאם להתקדמות הבנייה במקום או בכפיפות לתהליך פינוי השטחים אשר בהם יש צורך לבצע עבודות פיתוח במסגרת חוזה זה.

טווינגי
חברה לעבודות כבישים ופיתוח

DECLARATION OF OFFENSE

I, JOHN DOE, do hereby declare that the foregoing is a true and correct statement of the facts and circumstances surrounding the offense charged in the indictment.

I, JOHN DOE, do hereby declare that I am the person who committed the offense charged in the indictment.

I, JOHN DOE, do hereby declare that I am the person who committed the offense charged in the indictment.

I, JOHN DOE, do hereby declare that I am the person who committed the offense charged in the indictment.

I, JOHN DOE, do hereby declare that I am the person who committed the offense charged in the indictment.

I, JOHN DOE, do hereby declare that I am the person who committed the offense charged in the indictment.

I, JOHN DOE, do hereby declare that I am the person who committed the offense charged in the indictment.

I, JOHN DOE, do hereby declare that I am the person who committed the offense charged in the indictment.

I, JOHN DOE, do hereby declare that I am the person who committed the offense charged in the indictment.

11. מחירי היחידות ברשימת הכמויות והמחירים כוללים תשלום לקרן בטוח והטבות סוציאליות החלים על מחירי העבודה.
12. הרשות כידי משדו השיכון להעביר את אחריות הקבלן לטיב העבודה וביצוע התיקונים השנתיים לפי פרק ה' בסעיף 53 של תנאי החוזה לפי שיקבע בנפרד. במקרה הנ"ל יועברו זכויות המנהל הנזכר בתנאי החוזה לפי קביעה בנפרד.
13. לפי מסירת העבודה לידי הממשלה חייב הקבלן להגיש חשבון סופי של העבודה שביצע. הממשלה לא תקבל את העבודה לפני שיוגש החשבון לידיה.
14. הספקת מים לבנייה כולל תשלום בעד מים אלה, מד מים לצורך זה והתקנת קו מים זמני (אינו כולל כל תשלום המהווה חלק מאגרה להספקת מים קבועה) תהיה על חשבון הקבלן.
15. הכנת דרכים תכניות הדרושות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוננו הוא.
16. על הקבלן להעמיד במקום העבודה צריף שיטמט למפקח מטעם הממשלה.
17. על הקבלן לבקר במקום העבודה ולהכיר את סיב וקרקע, את הגישה למקום הכבישים הקיימים בשטח, את השטח הפנוי ואת יחיד הגורמים והעוללים להשמיד על ביצוע העבודה.
18. על אף האמור בפרק א' סעיף 8, ימציא הקבלן לממשלה להבטחת מלוי ההתחייבויות על פי החוזה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח להבטחת יעשה של הממשלה ובנוסף שנקבע על ידה. סכום הערבות יהיה בהתאם לפרק א' סעיף 8.
19. בניגוד לנאמר בפרק ו' סעיף 40 סעיף קטן (6) של תנאי החוזה יהיה הסכום העומד לרשות המנהל עבור בדיקות חומרים במעבדות 0.2% מהיקף החוזה, בסכום זה נכללות בדיקות חוזרות שתמורתם יחוייב הקבלן (נוסף על 0.2% המבוצה).

Page 10

The first of these is the fact that the
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...

The second of these is the fact that the
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...

The third of these is the fact that the
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...

The fourth of these is the fact that the
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...

The fifth of these is the fact that the
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...
... of the ... of the ... of the ...

חוליות - פיתוח איגוד ביגוד שלב א'

סדר	חומר מקבוצה ומחיר	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סכום כולל
-----	-------------------	-------	------	------------	-----------

כל הקבוצה הנובעת לפי התכנית ולמחיר
מחירים בחלק, לפי חוק "מחירים בלתי חסויים" לפי
המחיר המצוי למכירה בפועל לפי המחיר
המקובל במקור.

קבוצה יסוד קרקע (50 מ"מ)

1.

הקבוצה כוללת חזית, תאילת אחורי החומר
לאיגוד המילוי, איגוד ויגוד לפי תוכנית
המחירים, חוק מקום חומרה לדיקון המבוצע,
סילוק הקבוצה למרחק עד 300 מ"מ מאחד הקבוצות,
לפי חומרה המקום

67,000.- | 2.- | 33,500 | מ"ר

קירות חומרים מלווים בחל על גב בטון (טרס 9/ק)

2.

הקבוצה כוללת חזית, סיטון, חזית ליתוס
בגובה החומר וקיר מלווה בחל על גב בטון
ב-200, חומרה מקומה בבטון 34, יציאות
בזקוק 2" סילוק חומר בגב הקיר, ביקור בגי
הקיר, בחל הקבוצה הנובעת והמחירים
בטרס 9/ק

26,000.- | 200.- | 130 | מ"ר

קירות חומרים מלווים בחל על יסוד וגב בטון פזויג

3.

(טרס 9/ק) קירות חומרים מלווים בחל חזית.

הקבוצה כוללת כל החומר בטרס 2, אך היחיד
והגב יחיד פזויגים בחזל 10 מ"מ, ריב 2000
מ"מ

6,000.- | 250.- | 24 | מ"ר

קירות יציבה מלווים בחל על קומינג (טרס 3/ק)
לאורך גב החומר.

4.

הקבוצה כוללת כל החומר בטרס 2 בחומרה "קומינג"
יציבה מלווה בחל פזויג, בחל חלק על חזית
בחזית, בחזל 4000 מ"מ, בחזית חומרה כולל
כל הקירות בחל חזית הקרקע נע בין 40 ל-50 מ"מ,
החומר כולל כל החומר בטרס 3/ק לפי מ"מ.

6,400.- | 200.- | 32 | מ"מ

סולמכיש

חברה לעבודות כבישים ופחית כעים

תכולת = סכומים מיוחדים בנכס

סעיף א	אזור תעבורה ומוסדות	יחידה	כמות	סכום יח.	סכום ב"ר
5.	קיר ברז מתכת, גומי (טור 15/ק)				
	הקבוצה כוללת: מדידה, סימון, תחזוקה, תחזוקה ומכשיר הנדרש למחיר גבוה, יציבה, יסוד, בטיחות קיר מכשיר מתכת, מתכת, מדידה, מדידה, מדידה 15/ק, גומי, מדידה, מדידה, מדידה	מ"ר	64	300.-	12,800.-
6.	ריצוף ברזנט, ברזנט, ברזנט מכשיר - 143/1/1 (טור 7/ר)				
	הקבוצה כוללת: מדידה, סימון, תחזוקה, תחזוקה ומכשיר הנדרש למחיר גבוה, יציבה, יסוד, בטיחות קיר מכשיר מתכת, מתכת, מדידה, מדידה, מדידה 15/ק, גומי, מדידה, מדידה, מדידה	מ"ר	600	115.-	69,000.-
7.	ריצוף ברזנט, ברזנט, ברזנט מכשיר - 143/1/1 (טור 7/ר)				
	הקבוצה כוללת: מדידה, סימון, תחזוקה, תחזוקה ומכשיר הנדרש למחיר גבוה, יציבה, יסוד, בטיחות קיר מכשיר מתכת, מתכת, מדידה, מדידה, מדידה 15/ק, גומי, מדידה, מדידה, מדידה	מ"ר	640	85.-	54,400.-
8.	מכשיר מתכת, ברזנט, ברזנט מכשיר - 143/1/1 (טור 7/ר)				
	הקבוצה כוללת: מדידה, סימון, תחזוקה, תחזוקה ומכשיר הנדרש למחיר גבוה, יציבה, יסוד, בטיחות קיר מכשיר מתכת, מתכת, מדידה, מדידה, מדידה 15/ק, גומי, מדידה, מדידה, מדידה	מ"ר	72	65.-	4,680.-
9.	מכשיר מתכת, ברזנט, ברזנט מכשיר - 143/1/1 (טור 7/ר)				
	הקבוצה כוללת: מדידה, סימון, תחזוקה, תחזוקה ומכשיר הנדרש למחיר גבוה, יציבה, יסוד, בטיחות קיר מכשיר מתכת, מתכת, מדידה, מדידה, מדידה 15/ק, גומי, מדידה, מדידה, מדידה	יח.	1	2,500.-	2,500.-

סעיף	מחיר העבודה והחומר	יחידה	כמות	מחיר יחידה	מכסה כלי
10.	קפודי בודד-פל (פרט 5/ט)				
	העבודה כוללת הסקה עמוקה ל-1 חפר, כולל כל החומרים והחפצים, לוח עץ ורשת, הסקתה בשיטות בטון למי הפרט וכל יתר העבודות והחפצים הנדרשים למיחזור למי פרט 5/ט.	יח.	2	8,500.-	13,000.-
11.	קפודי בודד-פל (פרט 5/ט)				
	העבודה כוללת הסקה עמוקה עם כל החפצים הנדרשים לביטויים למי הפרט, כולל סידור הסחבות הסקתה על שוליים ביטוי בטון למי הפרט, סכנת ליטוליים, מוטות ברייקנות לבונה וריצוף, כולל הסקה בכל מלוא רשת בודד-קפ סטנדרטי, הכל למי הפרט קופסת	יח.	2	2,000.-	4,000.-
12.	יציאת מדרגות בטון מודפן (פרט 2/ד)				
	העבודה כוללת מדידת, סימון, מליחה אורח דרך והידוק מליחה, הסקה ומיחזור הסקה מחומר וארי האויר, הידוק לוח 900 מ"ר המותקן בגובה הוסמנות בלוחות עץ מליטות, הסקה וזיון במרזל 6 מ"מ, מודד לחץ מיני העיגון, מליחה כל 2.50 מ"מ במחלק, יציאת המכיל במקום 200-2, גמי עליזון סדק במחלק, למי ייחוס סכנת צמח למיחן סמון הידוק סכנות מי (סכנת מליקה) הכל למי פרט 2/ד כולל כל המכשירים בו	מ"ר	1000	150.-	162,000.-
13.	בניית מדרגות בלוחות סדומיות על יסוד בטון פרט 17/ט למי סדומים ורשתה על הסכנת פרט 7/ט לבניית לוח סומל				
	העבודה כוללת כל המכשירים הנדרשים, עם לוחות 45x90x3 עם מזה בלוח, ברייקות 2.00 רחוק בגוון אפור ספקי ורייזיות סדומיות 6-8 בגוון אפור	מ.מ.	25	80.-	2,000.-

סוף תכנית

המנהל לעבודות כבישים ופחית בע"מ

תולדות - סיכום תולדות תולדות

מקור	מאגר תעבורה ותחבורה	תחבורה	כמות	מחיר יחיד	סכום כולל
14.	לביקת כלי תחבורה תחבורה תחבורה	תעבורה כוללת תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה, עם תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה של תחבורה תחבורה או תחבורה, לפי תחבורה תחבורה	3	250.-	1,050.-
15.	תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה (תחבורה תחבורה)	תעבורה כוללת תחבורה תחבורה כל תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה	21	600.-	12,600.-
16.	תעבורה תחבורה תחבורה	תעבורה כוללת תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה, תחבורה	8	3,000.-	24,000.-
17.	תחבורה תחבורה	תעבורה כוללת תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה	5.50	200.-	1,100.-
	תחבורה תחבורה	תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה	55	120.-	6,600.-
					475,130.-
					14,253.-
					40,877.-
					64,448.-
					528,317.-
					21,882.-
					550,000.-

בסיס המידע: יוני 1977 - ג.ל.י.

6

סוף תולדות
תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה

משרד הכינוי והשכון
מינהל לבניה הכפרית
וישובים חדשים
מחוז הנגב

17.10.77

4470 / סנג" 680

לכבוד
חברה סול כביש בע"מ
רמת-גן

א. ג.

הנדון: עבודות פיתוח - חולית

במכתבו מיום 9.10.77 מספר 661/סנג" 4470 נפלה טעות,
תאריך התחלת העבודות ב-16.10.77 ולא ב-15.10.77.

גא לתקן ולתכנס הסליחה.

בכבוד רב,

ש. חודניק

מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:

פר שטרן - ס-ראש המינהל ומנהל אגף התכנון

מר ר. שלם - ח"א

מר בלף - ממונה על חוזים ומכרזים

מר זיידה - מהנדס אזור ערבה וסיני

חבל הנגב ולכיש

מר ש. אורבך

רי/בע

OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
OFFICE FILE

NY, OF, NY

OFFICE
STATE OF NEW YORK
OFFICE FILE

OFFICE FILE

NY, OF, NY

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL - OFFICE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL - OFFICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL - OFFICE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL - OFFICE

OFFICE FILE

OFFICE FILE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL - OFFICE

OFFICE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL - OFFICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL - OFFICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL - OFFICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL - OFFICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL - OFFICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL - OFFICE

OFFICE

משרד הבינוי והשיכון
מינהל לבניה כפרים וישובים חדשים
מחוז הנגב

9/10/77

4470-טנב-661

לכבוד
חב' סולכביש בע"מ
רמת גן
...א

הנדון: עבודות מיתוח - חולית

נא לגשת לביצוע עבודות מיתוח כמובט חולית בהתאם לתוצה מס' 77/60890/77.

אבקשכם להחקשר עם מר זיידה - ראש צוות איזור הערבה וסיני לקבלת פרטים
ותיאום העבודה.

תאריך התחלת העבודה 16/10/77.

מכבוד רב
ש. רודניק
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב

הערות:
מר שרון - ס/ראש המינהל
מר לשם - ממונה על עליות חדשות
מר בליך - ממונה על חוזים ומכרזים
מר זיידה - מהנדס איזור הערבה וסיני
חבל הנגב ולכיש
מר ש. אורבך - מקום

רי/כט

4470

תל-אביב, תל-אביב
ת.ד. 7021 מקור 61070

אלול תשל"ז
אוג' 1977

מ.ב.כ. 212/77

משרד הביטחון והשירות
המיוחד לבריאות כפרית
ד"ר שמואל חסדוני
מנהל מחלקת בריאות השנים
סניף ה' 10
רחוב בתאריך
דאד נא
31-00-1977
למחלקת של
לעיון של

א ל: ר. לשם - מסונה על עליות חדשות
מאת: א. בלף - מסונה על חווים ומכרוים

1991 | אשור חחוחה
1992 | להתחיל בצוע

• • •

הנדון: חזוה לעבודות פתוח ותאורת במגרש ספורט במושב חולית
מכרז מס. מ.ב.כ. 30/77, מיום 5.8.77

1. בהתאם להחלטת ועדת המכרזים במכרז חנדון, נא לערוך חווה עם הקבלן חב' סולכביש בע"מ, רח' הרואה 7, רמת-גן לעבודות פתוח ותאורת מגרש ספורט במושב חולית בהתאם לכתב כמויות ומחירים הרצ"ב ומטאכס בסכום כללי: 550.000.- ₪.

2. סדר התשלומים יהיה כדלקמן:-

א. לפי אומדן התקדמות העבודה, בהתאם לפניות מאושרות ע"י מפקד 75%

13%

ב. לאחר הגשת ח-ן סופי וקבלת העבודה

2%

ג. לקרן ביטוח פועלי בניין וכבישים

10%

ד. לאחר אישור ח-7 סופי

100%

אין להתחיל בבצוע
לפני אשר החזקה

3. בסיס המחירים יוני 1977 - ב.ש.ק.

4. תקופת הביצוע - 2 חרשים מיום קבלת חוראות ביצוע.

5. בהתאם לסעיף 49, של חוק הכללי יהיו דמי הפצויים המוסכמים בעד אזור במסירת העבודה - 200.- ל"ל לכל יום שהעבודה תשאר בלתי גמורה.

6. הוצאות לבדיקת חומרים 0.2% מערך העבודה

7. רצ"ב אנו מעבירים לכם העתק החלטת ועדת המכרזים

8. המחירים אינם כוללים ט.ע.מ.

ב ב ר כ ה

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

הערת:

מהנדס מחוז הנגב
הקבלן

1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 26

חולית - מימון איזור בינוי שלב א'

| סעיף | תאור העבודה והחריט | יח. מדה | כמות | מחיר יח. | סכום בלי |
|------|---|---------|--------|----------|----------|
| | כל העבודות תבוצענה לפי התכניות ופרטים מצורפים בחיך, לפי הדף "תנאים כלליים" לפי המפרט הבין-ממדי לעבודות מניין לפי הנחיות המפקח באזור. | | | | |
| 1. | <u>עבודות יסוד קרקע (50 ס"מ ⁺)</u> | | | | |
| | העבודה כוללת: חפירה, הובלת החומרי החסור לאיזור המילוי, מיזור ויטורן לפי הרומים הממוכנים, חוך הקמה חומרה לדיוק המועים, טילוק חפודים למרחק עד 300 מ"מ מאחד העבודות, לפי הנראות המפקח | מ"ר | 33,500 | 2.- | 67,000.- |
| 2. | <u>קירות תומכים מחלוקי נחל על גב בטון (פרט 9/ק)</u> | | | | |
| | העבודה כוללת: מדידה, סימון, חפירה ליסודות בניית היסוד וקיר חלוקי נחל על גב בטון ב-200, סוגות שקועות בטון 3:1, יציאות גיקוז ϕ 2" טילוי חוזר בגב הקיר, גיקוי מני הקיר, וכל העבודות הנוספות המפורטות בפרט טס. 9/ק | מ"ר | 130 | 200.- | 26,000.- |
| 3. | <u>קירות תומכים כנ"ל אך על יסוד וגב בטון מזויין (פרט 9/ק) קירות התומכים את בור האשפה.</u> | | | | |
| | העבודה כוללת כל המפורט בטעיף מס. 22, אך היסוד והגב יהיו מזויינים בברזל ϕ 10 מ"מ, רשת 20x20 ס"מ | מ"ר | 24 | 250.- | 6,000.- |
| 4. | <u>קירות יטיבה מחלוקי נחל עם קומינג (פרט 3/ק לאורך מברט המפורט).</u> | | | | |
| | העבודה כוללת כל המפורט בטעיף 2 בחוספת "קומינג" יטיבה מלוחות בטון מריקסט, בטון חלק עם מזה בחזית, בגודל 45x90x8 ס"מ, כאשר תבונה כולל של הקירות מעל מני הקרקע נע בין 40 ל-50 ס"מ, המחיר כולל כל המפורט בפרט 3/ק לפי מ.א. | מ.א. | 32 | 200.- | 6,400.- |

חולית - מיתוחז הידור בכדי

| סעיף
X | תאור העבודה והמריט | יח.מרה | כמות | מחיר יח. | סכום בלי |
|-----------|--|--------|------|----------|----------|
| 5. | קיר גדר מחלוקי בחל (מרט 15/ק) | | | | |
| | העבודה כוללת: מדידה, סימון, חפירת חפירות ומלוי חוזר לאחר גמר הבניה, יציאת יסוד, בניית קיר פנים כחולית מחלוקי בחל, מוגות שקועות בבטון 3:1, הבל לפי המרט מס. 15/ק כולל זיון | מ"ר | 64 | 200.- | 12,800.- |
| 6. | ריצוף במרצפות גרנוליט רחוף
חכניה א-143/1/1 מרט 7/ר | | | | |
| | העבודה כוללת: מדידה, סימון, חפירת צורה דרך הידוק שתי, אספקה, מידור והידוק חפית חומר וארי, הנחת שכבת מצע של חול נקי, אספקה מרצפות גרנוליט רחוף מס. 2 30x60x5 ו- 30x30x5 עם פזה בגוון אפור טבעי ובגוון שחור (סיגמנט חוצ. חוף) הנחתן לפי המרקמים המוככנים, חוף הקדמה חמורה לדיוק הספועים, בניית הגורה סמויה בבטון ב-200, מילוי חול במרווחים בין המרצפות, גמר מינות ביציאת השלמה לפיסקטורה המרצפות ו/או בחיחון מדויק בקווי ישרים ע"י מסור כחון מתאים (שטח מרצפות בגוון שחור 166 מ"ר) | מ"ר | 600 | 115.- | 69,000.- |
| 7. | ריצוף במרצפות מדויקות ללא פזה 45x45x5
מרט 5/80 למברט כוורטל-קף 22.5x45x5 | | | | |
| | העבודה כוללת כל המתואר בסעיף מס. 6 עם מרצפות הנ"ל חוצות "אקורטיין" בגוון אפור טבעי ובגוון אדום, עם סיגמנט חוצ. חוף (שטח מרצפות אדומות במברט 162 מ"ר) ללא הגורות כחון. דרוש דיוק מירבי לביצוע השימועים המוככנים | מ"ר | 640 | 85.- | 54,400.- |
| 8. | אבני שפה במברט כדור סל-קף (מרט מס/5) | | | | |
| | העבודה כוללת: מדידה, סימון, חפירת חפלה מצע אספקה אבני שפה 100x25x17-14 לתי מ.י. 19, הנחתן על בטיס וגב בטון ב-150, בסכיבה, מילוי חפריט בטיס-כטון גרולי, ניקוי מבי האבנים מכל שאריות בטון | מ.א. | 72 | 65.- | 4,680.- |
| 9. | צביעת סימון מברט כדור סל-קף (מרט מס/5) | | | | |
| | העבודה כוללת: מדידה, סימון, אספקה צבעים ניקוי שטח הצביעה מכל שאריות חול או חומר אחר, צביעה מדויקת לפי המרט, בפטיס ברוחב אחיד 5 ס"מ, המדידה לפי צביעה סימון קוממלט | יח. | 1 | 2,500.- | 2,500.- |

| טעיף | תאור העבודה והפרט | יח.מדי | כמות | מחיר יח. | סכום בלי |
|------|--|--------|------|----------|-----------|
| 10 | <p><u>עמודי כדור-טל (פרט טס/5)</u></p> <p>העבודה כוללת אספקת עמודים למי הפרט, כולל כל החומרים והכוזרים, לוח עץ ורשת, החקנתם ביסודות בטון למי הפרט וכל ימי העבודות והחפצרים הדרושים לביצוע למי פרט טס. 5/טס</p> | יח. | 2 | 6,500.- | 13,000.- |
| 11 | <p><u>עמודי כדור-עץ (פרט טס/5)</u></p> <p>העבודה כוללת אספקת עמודים עם כל האבזרים הדרושים לבנייתם למי הפרט, כולל סידור המתיחה החקנתם של טרולים ביסוד בטון למי הפרט, מכסה לטרולים, מותאם בדיקנות לגובה הריצוף, כולל אספקת כבל מלדה ורשת כדור-עץ טטנורטי, הכל למי הפרט קומתלס</p> | יח. | 2 | 2,000.- | 4,000.- |
| 12 | <p><u>יציאת מדרכות בטון מזויין (פרט ר/2)</u></p> <p>העבודה כוללת: מדידה, סימון, חפירה צורת דרך והידוק שהית, אספקת ופיזור השמים מחומר ואדי מאוסר, הידוקו למס 98% מוד"א אשפחור, בניית חומסנות בלוחות עץ מתיישים, הכנת זיון בהרזל 6 מ"ט, החודר לחוף שיני העיבון, תמרים כל 2.50 מ"ט בממוצע, יציאת הטביל במסון ב-200, גמי עליון סרוק במטאפה, לאחר ייסום שכבת אטנט לחוף הבטון היבוק כשהוא טרי (שכבת שחיקה) הכל למי פרט טס. 2/ר כולל כל המפורט בו</p> | מ"ר | 1080 | 150.- | 162,000.- |
| 13 | <p><u>בניית מדרגות בלוחות טרומיים על יסוד בטון</u></p> <p>פרוט מ/17 לבחי מגורים ורמפה של המטבח פרוט מ/7 לכניסה לחדר אוכל</p> <p>העבודה כוללת כל המפורט בפרטים הנ"ל, עם לוחות 45x90x8 עם מזה בחזית, גרנוליט טס. 2 רחוף בגוון אפור טבעי ורייזרים טרומיים 6x8 בגוון שחור</p> | מ.א. | 25 | 80.- | 2,000.- |

חולית - פיתוח איזור ביבוי

| סעיף | תאור העבודה והחריט | יח. מדי | כמות | מחיר יח. | סכום בלי |
|------|---|---------|------|----------|-----------|
| 14. | יציקת בטון ברזולים במקסי שוחות כיוב | | | | |
| | העבודה כוללת יציקת כנ"ל ברחבה המרוצפת באיזור המרכז, עם ברזולים מס. 2 שיהיה זהה לברזולים של המרצמות בגוון אפור טבעי או שחור, לפי מדידת הריצוף | יח. | 3 | 350.- | 1,050.- |
| 15. | החפנת מלי אספקת לצרי שבילים (פרט רב/9) | | | | |
| | העבודה כוללת כל הספורט במרס הג"ל, אספקת כל החומרים עיגון בגוט בטון וצביעה, בגוון אפור כהה | יח. | 21 | 600.- | 12,600.- |
| 16. | עמודי תאורת-חצר | | | | |
| | העבודה כוללת אספקת גומי תאורה דגם "אבטי-דגל" מפוליקרבוט, כווריים, 45 ס"מ, גוון אופל, עם גורות כספית 125 ווט, על עמודים סחומנים בגובה 3 מ' מעל מני הקרקע, במרחק 1 מ' מקו השבילים אס סקסחיה, מבוטנים לפי הנראות היצרן, כולל כל הסכסירים ואביזרים לחבור לימוד יהיו כובנים ע"י מריחת אספלס. צביעת עמודים בצבע"אס בגוון אפור כהה | יח. | 8 | 3,000.- | 24,000.- |
| 17. | החפנת שיוולים | | | | |
| | העבודה כוללת אספקת והעברת צנורות מליה מחמת לשבילים, משטחים ומעבר לקירות, בעומק שכבת החפית בדלקסן: | | | | |
| | שיוולים מצנור 4" | מ.א. | 5.50 | 200.- | 1,100.- |
| | שיוולים מצנור 2" | מ.א. | 55 | 120.- | 6,600.- |
| | | | | | 475,130.- |
| | | | | | 14,253.- |
| | | | | | 460,877.- |
| | | | | | 67,440.- |
| | | | | | 528,317.- |
| | | | | | 21,683.- |
| | | | | | 550,000.- |

3% הנחה

סה"כ פיתוח ביבוי שלב א'

סה"כ תאורת מברש כדורסל

סה"כ כל העבודה

ע"ה שונות וב.ב.מ.

60

חוליות - מברש כדור סל

| סעיף | תאור העבודה והמדידת | יח. מדידה | כמות | מחיר יח. | סה"כ ל |
|--|---|-----------|------|----------|----------|
| <u>תאורת מברש ספורט (1 מברש) כדור סל</u> | | | | | |
| 1. | עמוד האורה מבגורות 6" ו-4" + בסיס בסוף + פתח לאביזרים + מבש + מבטיחים שלבי סיפוט זרועות למנחים חיווט פנימי וכבלים פנימיים | קוטמ. | 4 | 3,500.- | 14,000.- |
| 2. | פנס יורד קוורץ 1500 וט + גורח | יח. | 8 | 1,800.- | 14,400.- |
| 3. | תעורה ו/או חציבה של העלה לכבלים בעומק 90 ס"מ כולל בלסטוי הידוק ייסור ומיגוי החומר העודף | מ.א. | 80 | 50.- | 4,000.- |
| 4. | צנור מלמטי קשיח במד 53 מ"מ | מ.א. | 50 | 60.- | 3,000.- |
| 5. | כנ"ל אך בקוטר 74 מ"מ | מ.א. | 30 | 60.- | 1,800.- |
| 6. | סולין ג.וי.וי 5x16 סמך. | מ.א. | 45 | 65.- | 2,925.- |
| 7. | כבל ג.וי.וי 5x4 סמ"ר | מ.א. | 80 | 50.- | 4,000.- |
| 8. | אספקה בלבד של לוח חשמל לכדור סל המכיל את האביזרים הבאים מותקנים ומחוטטים: | | | | |
| | א. מ"ז סקס 3x100 אמפר עם ירידה לנפילה דגם קלוקר מילר | יח. | 1 | 3,000.- | 3,000.- |
| | ב. כנ"ל 3x63 אמפר | יח. | 3 | 2,500.- | 7,500.- |
| | ג. מ"ז ח"א בורד או מוגש עד 32x1 | יח. | 10 | 800.- | 8,000.- |
| | ד. בית הקק 1x10 אמפר | יח. | 2 | 800.- | 1,600.- |
| | ה. כנ"ל 3x25 אמפר | יח. | 1 | 800.- | 800.- |
| | ו. ארון לב"ל דגם פגליט עם דלת לעמידה בחוץ בחנאי חול וגשם מוצב על בסיס בסוף כולל הבסיס | קוטמ. | 1 | 3,000.- | 3,000.- |
| | סה"כ לוח חשמל | " | 1 | 1,500.- | 1,500.- |
| | התקנת הלוח באחר וחיבור כל הקווים | קוטמ. | 1 | 1,500.- | 1,500.- |
| | סה"כ הנחה 3% | | | | 69,525.- |
| | | | | | 2,085.- |
| | | | | | 67,440.- |

66

חוליות - פיתוח איזור כינוי סלב א'

| סעיף | מאור העבודה והפרטים | יח. מדידה | כמות | מחיר יח. | מכסה בלי |
|------|---|-----------|--------|----------|----------|
| | כל העבודות תבוצענה לפי התכניות והפרטים מצורפים בתיק, לפי הדף "תנאים כלליים" לפי המפורט הבין-מסדדי לעבודות הבין לפי הנחיות המפקח באזור. | | | | |
| 1. | <u>עבודות יסוד קרקע (50 ס"מ ±)</u>
העבודה כוללת: חפירה, הובלת חומרי החפור לאיזור המילוי, מיזורו ויזורו לפי הרומים הממוכנים, מוך הקטרה חומרה לריפוף הסופעים, סילוק העודמים למרחק עד 300 מ' מאזור העבודה, לפי הוראות המפקח | מ"ר | 33,500 | 2.- | 67,000.- |
| 2. | <u>קירות חומכים מחלוקי נחל על גב בטון (פרט 9/ק)</u>
העבודה כוללת: מדידה, סימון, חפירה ליסודות בגיית היסוד וקיר חלוקי נחל על גב בטון ב-200, פובות שקועות בבטון 311, יציאות ניקוז 2" מילוי חוזר בגב הקיר, ניקוי מני הקיר, וכל העבודות הנחשבות המפורטות בפרט 9/ק. | מ"ר | 130 | 200.- | 26,000.- |
| 3. | <u>קירות חומכים בנ"ל אך על יסוד וגב בטון מזויין (פרט 9/ק)</u>
העבודה כוללת כל המפורט בסעיף מס. 22, אך היסוד והגב יהיו מזויינים בברזל 10 ס"מ, רשת 20x20 ס"מ | מ"ר | 24 | 250.- | 6,000.- |
| 4. | <u>קירות ישיבה מחלוקי נחל עם קומינג (פרט 3/ק)</u>
לאורך גבול המפורט.
העבודה כוללת כל המפורט בסעיף 2 בחומש "קומינג" ישיבה מלוחות בטון מריקסט, בטון חלק עם מזה בחזית, בגודל 45x90x3 ס"מ, כאשר הגובה כולל של הקירות מעל מני הקרקע נע בין 40 ל-50 ס"מ. המחיר כולל כל המפורט בפרט 3/ק לפי מ.א. | מ.א. | 32 | 200.- | 6,400.- |

חוליות - מיתות איזור בנני

| סעיף
X | מחיר העבודה והחומר | יח.מדה | כמות | מחיר יח. | סכום בלי |
|-----------|---|--------|------|----------|----------|
| 5. | קיר גרד מחלוקי נחל (פרט ק/15) | | | | |
| | העבודה כוללת: מדידה, סימון, חפירת חסירות ומלוי חוץ לאחד במר הבניה, יציקת יסוד, בניית קיר פנים כפולית מחלוקי נחל, מוגות שקועות בבטון 1:1, הכל לפי הפרט סט. 15/ק כולל זיון | מ"ר | 64 | 200.- | 12,800.- |
| 6. | ריצוף במראמת גרנוליט רחוף
הכניה א-143/1/1 מרש 7/7 | | | | |
| | העבודה כוללת: מדידה, סימון, חפירת צורה דרך הידוק שתי, אספקה, מיזור והידוק שתי חומר ואדי, הנחת שכבה מצע של חול בקי, אספקה מראמת גרנוליט רחוף סט. 2 30x60x5 ו- 30x30x5 עם מזה בגוון אפור טבעי ובגוון שחור (מיגמנט חוב. חוץ) הנחתן לפי המרשמים המסוכננים, חוף הקפדה חפורה לדיוק השפוקים, בניית חבורה סמויה מבטון ב-200, מילוי חול במרווחים בין המראמות, גמר סיגות ביציקת השלמה למיטקססורת המראמות ו/או בחיתוך מדייק בקווים ישרים ע"י מטור בסוף סתמים (שטח מראמות בגוון שחור 166 מ"ר) | מ"ר | 600 | 115.- | 69,000.- |
| 7. | ריצוף במראמת מדייקות ללא מזה 45x45x5
פרט 5/ס למברט כדור-טל-קו 22.5x45x5 | | | | |
| | העבודה כוללת כל המאמר בסעיף סט. 6 עם מראמות הנ"ל חוצרת "אקרשטיין" בגוון אפור טבעי ובגוון אדום, עם מיגמנט חוב. חוץ (שטח מראמות אדומות במברט 162 מ"ר) ללא חבורות בטון. דרוש דיוק מירבי לביצוע השיפוקים המסוכננים | מ"ר | 640 | 85.- | 54,400.- |
| 8. | אבני שטח במברט כדור-טל-קו (פרט סט/5) | | | | |
| | העבודה כוללת: מדידה, סימון, חפירת העלת מצע אספקה אבני שטח 100x25x17-14 לפי ח.י. 19, הנחתן על בטיס וגב בטון ב-150, בטיבה, מילוי חסרות בטיס-בטון גרנולי, ניקוי פני האבנים מכל שאריות בטון | מ.א. | 72 | 65.- | 4,680.- |
| 9. | אביקת סימון במברט כדור-טל-קו (פרט סט/5) | | | | |
| | העבודה כוללת: מדידה, סימון, אספקת אבנים ניקוי שטח הנביקה מכל שאריות חול חן חומר אחר, אביקה מדייקת לפי הפרט, בטיס ברוחב אחיד 5 ס"מ, והמדידה לפי אביקה סימון קוממלט | יח. | 1 | 2,500.- | 2,500.- |

| סעיף | מאגר העבודה והפרט | יח. מדי | כמות | מחיר יח. | סכום בלי |
|------|--|---------|------|----------|-----------|
| 10 | עמודי כדור-סל (פרט 5/ס) | | | | |
| | העבודה כוללת אספקת עמודים לפי הפרט, כולל כל החומרים והכורים, לוח עץ וריש, התקנתם ביסודות בטון לפי הפרט וכל יתר העבודות והחומרים הדרושים לביצוע לפי פרט 5/ס | יח. | 2 | 6,500.- | 13,000.- |
| 11 | עמודי כדור-עץ (פרט 5/ס) | | | | |
| | העבודה כוללת אספקת עמודים עץ כל החומרים הדרושים לבנייתם לפי הפרט, כולל סידור הבטיחה התקנתם של שריוולים ביסוד בטון לפי הפרט, מכסה לשריוולים, כוונתם בדיקנות לבובת הריצוף, כולל אספקת כבל מלוח וריש כדור-עץ סטנדרטי, הכל לפי הפרט קומפלט | יח. | 2 | 2,000.- | 4,000.- |
| 12 | יציאת מדרגות בטון פזויין (פרט 2/ר) | | | | |
| | העבודה כוללת: מדידה, סימון, השירת אורה דרך והידוק טיחה, אספקת ומיזור הטחית מחומר ואדי סופר, הידוק למח 98% מוד' השטה, בניית חומסנות בלוחות עץ טה-ימים, הכנת זיון בברזל 6 מ"מ, החודד לחוך טיגי העיגון, חסרים כל 2.50 מ' בטמאק, יציאת המביל במסלול ב-200, גמר עליון טרוק בטמאק, לאור ייסוס טכנת אבנט לחוך המסלול היצוק כחומה טרי (טכנת שחיקה) הכל לפי פרט 2/ר כולל כל המפורט בו | מ"ר | 1080 | 150.- | 162,000.- |
| 13 | בניית מדרגות בלוחות טרומיים על יסוד בטון פרט 17/מ לבחי סבורים ורימפה של המטבח פרט 7/מ לכניסה לחדר אוכל | | | | |
| | העבודה כוללת כל המפורט בפרטים הנ"ל, עם לוחות 45x90x8 עם מזה בחזית, בגוליש 2. רחוף בגוון אפור טבעי וריצורים טרומיים 6x8 בגוון שחור | מ.א. | 25 | 80.- | 2,000.- |

חוליות - פיתוח איזור ביבוי

| סעיף | מאור העבודה והחריט | יח.מרה | כמות | מחיר יח. | טכום בלי |
|------|---|--------|------|----------|-----------|
| 14. | <u>יציקת בטון גרנדוליס במסמך שנחתם ביום</u>
העבודה כוללת יציקת כנ"ל ברטבה המיוצאת
באיזור המרכז, עם גרנדוליס מס. 2 שיחיה
זוה לגרנדוליס של המראות בגוון אמור טבעי
או סחור, לפי בקש הדיכוף | יח. | 3 | 350.- | 1,050.- |
| 15. | <u>התקנת פלי אספקט לצדי שבילית (פרט רג/9)</u>
העבודה כוללת כל הסמורט במרס הג"ל, אספקט
כל החומרים עיגון בגוש בטון וצביעה, בגוון
אמור כזה | יח. | 21 | 600.- | 12,600.- |
| 16. | <u>עמודי תאורה-חצר</u>
העבודה כוללת אספקת גומי תאורה דגם "אנטי-
ונדל" סטוליקרבונט, כוריים, פל 45 ס"מ, גוון
אטל, עם גורות כמסית 125 ווט, על עמודים
מחוטמים בגובה 3 מ' מעל פני הקרקע, במרחק 1 מ'
סקו והשבילים הם סממנים, מבוטמים לפי הנחיות
היארן, כולל כל המכשירים ואביזרים לתכנון
ליסוד יהיו מובנים ע"י מריחת אסמלט.
צביעה עמודים בצבע אטל בגוון אמור כזה | יח. | 8 | 3,000.- | 24,000.- |
| 17. | <u>התקנת שרולים</u>
העבודה כוללת אספקת והעברת גזירות פלדה מתחת
לשבילים, מסמכים ומעבר לקירות, בקובץ חבבה
המתנית בולקמן
שרולים סגור פל 4"
שרולים סגור פל 2" | ס.מ. | 5.50 | 200.- | 1,100.- |
| | | ס.מ. | 55 | 120.- | 6,600.- |
| | | | | | 475,130.- |
| | | | | | 14,253.- |
| | | | | | 460,877.- |
| | | | | | 67,440.- |
| | | | | | 528,317.- |
| | | | | | 21,683.- |
| | | | | | 550,000.- |

3% חבחה

סה"כ פיתוח ביבוי שלב א'

סה"כ תאורה מוגש מיוחסל

סה"כ כל העבודה

ע"ח שנחתם וב.ב.מ.

6

חוליות - טברש כדור סל

| סעיף | טאור העבודה והפרים | יח. מדה | כמות | מחיר יח. | סה"כ לי |
|--|---|---------|------|----------|--------------|
| <u>תאורת טברש פטורט (1 טברש) כדור סל</u> | | | | | |
| 1. | עמוד תאורת טברזרות 6" ו-4" + בסיס בטון + סמך לאביזרים + מבט + מבטיחים שלבי מיזום זרועות למנפים חיווט מנימי וכבלים מנימיים | קוטמ. | 4 | 3,500.- | 14,000.- |
| 2. | מנס יורד קוורץ 1500 וט + גורה | יח. | 8 | 1,800.- | 14,400.- |
| 3. | חמירה ו/או חציבה של תעלה לכבלים בעומק 90 ס"מ כולל ביטוי הידוק ייסור ומיגוי החומר העודף | מ.א. | 80 | 50.- | 4,000.- |
| 4. | גנור מלסטי קטית כבד 63 ס"מ | מ.א. | 50 | 60.- | 3,000.- |
| 5. | כנ"ל אך בקוטר 74 ס"מ | מ.א. | 30 | 60.- | 1,800.- |
| 6. | פולין ג.וי.ני.וי 3x16 ממו. | מ.א. | 45 | 65.- | 2,925.- |
| 7. | כבל ג.וי.ני.וי 5x4 סמ"ר | מ.א. | 80 | 50.- | 4,000.- |
| 8. | אספקה בלבד של לוח השמל לכדור סל המכיל את האביזרים הנאלים מותקנים ומחושבים | | | | |
| | א. מ"ז סקס 3x100 אסטר עם ידיה לנעילה דגם קלוקר מילר | יח. | 1 | 3,000.- | 3,000.- |
| | ב. כנ"ל 3x63 אסטר | יח. | 3 | 2,500.- | 7,500.- |
| | ג. מ"ז ח"א בודד או מוגס עד 3x32 | יח. | 10 | 800.- | 8,000.- |
| | ד. בית הקע 1x10 אסטר | יח. | 2 | 800.- | 1,600.- |
| | ה. כנ"ל 5x25 אסטר | יח. | 1 | 800.- | 800.- |
| | ו. ארון לנ"ל דגם פגלים עם דלת לעמידה בחוץ בתנאי חול וגסט מוגב על בסיס בטון כולל חבטים | קוטמ. | 1 | 3,000.- | 3,000.- |
| | סה"כ לוח השמל | " | 1 | 1,500.- | 1,500.- |
| 9. | התקנת הלוח באתר וחיבור כל הקווים | קוטמ. | 1 | 1,500.- | 1,500.- |
| | | | | | סה"כ הנחה 3% |
| | | | | | → 69,525.- |
| | | | | | 2,085.- |
| | | | | | → 67,440.- |

60

4470

י ש ר א ל

משרד השיכון
המינהל לבניה כפרית
וישובים חדשים
הקריה, חל-אביב

תאריך: 15.8.77


משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז הנגב
תאריך: 31-08-1977
מס' 585
לכבוד
חגי סולכביש חצי"מ
יח' כולאק ד.ימח"ט/

הנדון: מכרז מ.ב.ב. / 130/77
לעבודה ב- פתוח מאוסה חוליות

הרינו שסכים להודיעכם שבהתאם להחלטה ועדת המכרזים,
נמסרה לכם העבודה שבנדון.

כספית המבוצה מומ"ג מאוסה חוליות התקציבית
בברכה,

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים



רס.

מכרזים מחוז הנגב

1957-12-18

DATE: 12-18-57
RECEIVED: 12-18-57
BY: [illegible]

AMOUNT: \$ [illegible]

TO: [illegible]

FROM: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
