

ס' 7/8

מזכ"ל ושרה משרד החמ"ל

משרד הסיכון
מ/3 הקמת ומ"ת

שם: ~~משרד~~
תפקיד: ~~משרד~~

שם התיק: הקמת מנהל - אג"ר
מ/3: 39/46185/73, הקמת: אג"ר

Barcode: 7475 / 5 - גל

שם: הקמת מבנים - אג"ר

מזהה פיוז: 1397350 מס פריט: 109.18/1 - 927

מזהה לוגי: 27/08/2013

כתובת: 02-106-01-07-06

מיכל מס'
תיק מס'

מתאריך: 1/1975

עד תאריך: 10/1979

3983

מס' מחשב

שם הישוב _____ ט"ו המבנה _____
 מס' החודש _____ הקבלן _____
 הסכום _____

תאריך התחלת העבודה: 2.3.75 תאריך גמר העבודה _____

שינויים - הגדלה _____
 הקטנה _____

תנועת החשבונות

חשבון מס'	תאריך האישור	מזב העבודה %	סכום	העבודה
1			44000	
2	21.3		57700	
3	25.11	—	682.000	
4	26.6	—	66600	
5	24.11	—	1855450	
6	28.4	—	370230	פ"ב
6	58	—	3402.300	
7	25.10	—	3669600	
8	25.1	—	3999.400	
9	25.11	—	4109.400	פ"ב
10	23.11	—	4109.400	
11	25.11	—	4201550	
12	28.10/12	א/ס	2595	
			4794512	

ט' חשוון תש"ט

30.10.79

3983/-2848

לכבוד
הסוכנות היהודית
אגף חוזים ובטחונות
לידי מר חלד

א.נ.א.

הנדון: הקמת 40 בתים באוגדה - חוזה מס' 39/46185/72

בהשוכה למכתבך בנדון מיום 3.10/79 הננו להודיע כי
הח-ן המופי עבור 40 בתים באוגדה הסתכם בסך -
4,877.356.40.- ₪

מספרי הבתים הם ממס' 1 עד מספ' 40, שטח המתיישבים
יש לקבל מהסוכנות היהודית.

בכבוד רב,



ר. קטורובסקי

ס/מהנדס מחוז הנגב

בי/זב

ST. PAUL, MINN.
JULY 11, 1904

DEAR MR. BROWN

RECEIVED
JULY 11, 1904
ST. PAUL, MINN.
JULY 11, 1904

RE: ST. PAUL, MINN. - JULY 11, 1904

ST. PAUL, MINN. JULY 11, 1904. DEAR MR. BROWN -
I have just received your letter of the 10th inst. -
- JULY 11, 1904 -

Very respectfully,
J. H. BROWN

RECEIVED
JULY 11, 1904
ST. PAUL, MINN.
JULY 11, 1904

ט" חשוון תש"ס

30.10.79

3983/-2848

לכבוד

הסוכנות היהודית

אגף חוזים ובטחונות

לידי מר חלד

ס.ל.א

הנדון: הקמת 40 בתים במחצבה - חוזה פט" 39/46185/72

בהשכרה למכתבך בנדון מיום 3.10/79 הננו להודיעך כי
הח-ן הסופי עבור 40 בתים באוגדה הסתכם בסך -
4.877.356.40.- ₪

מספרי הבתים הם ממס'ר 1 עד מספר 40, שטח המתיישבים
יש לקבל מהסוכנות היהודית.

בכבוד


ר. קנטרובסקי
ס/מהנדס מחוז חגלב

בי/זב

39831

שדה

חב/

3.10.79

החבר

חידוד הישיבה

ינהל לבניית בית ישיבה חדשים
מחוז הירושלם

נוקבל בתאריך

ד ר נכנס

12-10-1979

לשירותי של

לשירותי של

40 בחים

בניה

שדה

הנדון: שם הישוב

מיום

39/46185/72

מכתבכם מס'

בהמשך למכתבכם הנ"ל הנכם מתבקשים להמציא לנו את הפרטים להלן בקטר

39/46185/72

לעבודה שתכננתם/בצעתם לפי אסמכתא/חוזה בניה מס'

2,200,000.4

ע"ס ל"י

מספרי המגרשים ושטוח המתייבטים.



החלוקה בין הישובים.



חלוקת הכספים במימון הקציבי



פרוט המבנים ופרוט המימון לכל מבנה ומבנה.



דו"ח הריטה.



נבקש תשובתך בהקדם בהתאם לדרישתנו.

בכבוד רב,

א. חלד

דוד

העתק:

סמן X במשובצת הנדרשת.



דב/אס

אח/אס 6/79

3983

משרד התכנון

מכון התכנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151

סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר חגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 72534

בתאריך

1977-02-28

המחלקה לבנין

מס א-בש/89836

תעודה על בדיקת אריחי רצפה מבטון

ביום: 6.1.77

מזמין הבדיקה: מנהל לבניה כפרית, משרד השכון - באר-שבע.

חווה מסי

בנין 12 יחידות דיור במושב אוגדה.

הקבלן: חב' אשטרום

החומר לבדיקה: 9 מרצפות רצפה תוצרת מפעל זהבי.

המפקח:

המדגם ים: נמסרו ע"י ב"כ המזמין מר מוסקוביץ יהוצה, ביום 6.1.77.

מהות הבדיקה: התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 6 משנת תשל"ד 1974 לאריחי רצפה מבטון

תוצאות הבדיקה

סדות

חוק הכפיפה (ניסוח למסמך)	
שכבת המדרן (ניסוח)	שכבת בטון (ניסוח)
כלפי מעלה	כלפי מעלה (לסמ"ר)
2082	698
2156	675
1495	682
1911	684
דרישות התקן	
מ"מ 1700/1450	מ"מ 600/500

שעור העשיקה (מ"מ)			
(1)	(2)	(3)	ממוצע
1.7	1.6	1.6	1.6
דרישות התקן			
מין	תאור	מכסי מ"מ	
א	לבניני צבוע	2.00	2.30
ב	למגורים	2.20	2.50
ג	דרישות מוקטנות	2.60	2.90

חכולת צמם בשכבת המדרן	
ק"ג למ"ק	380
דרישות התקן	
רגילות	מיני 400
עם אגרגט גרול	מיני 350

מבדק מס'	אורך הצלע (מ"מ)	עובי כולל (מ"מ)	תאור	עובי (מ"מ)
1	200x200	20	טרצו חום לבן	7
2	200x200	20		8
3	200x200	20		6
4	200x200	20		6
5	200x200	20		6
6	200x200	20		6
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-

דרישות התקן			
מדה 2 M	199 ± 0.5		
3 M	299 ± 0.5	מיני 15	-
4 M	399 ± 0.5		-
הפרש מירבי במדגם 0.5		3	מיני 4

המדגם הנ"ל מתאים לדריש ות התקן.

משקל מרחבי של המרצפות - 2340 ק"ג/מ"ק.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מר שטרן
מר אלואיל
חב' אשטרום.

באר שבע 1977-02-23
מא/

חנ 18837/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אוור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף בארשבע: המכון לחקר חנוג, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

עוסק מורשה לענין
 מע"מ
 מס' 545000119

נציבות מס הכנסה
 מס' מ"כ
 מס' מתשלומים
 בעד שירותים
 מס' 4502837

האוצר
 מס' חש' שולם
 מס' האשור 114/9

סניף בארשבע

№ 188837

חשבונית מס מספר

לכבוד

1977-02-23

55-60

61-66

תאריך

מנהל לבניה כפרית,
 משרד העובן
 באר-שבע.

מיום

חווה/הומנה מס'

הקבלון חב' אשדוד

שם המזמין

ל"י	אג'	פרטים	תעודת	
			מס'	מיום
			67-80	
		שכור בדיקה 9 מדידות רצפה-12 יחידות דיוור במחשבים אוגדת	69336/ש	1977-02-23
102.- 117.- 270.- 52.-		חוק כבישה של מדידות רצפה סעיף 12541 -17.0 לי 6 שכור החזיקה של מדידות רצפה סעיף 12543 39.6 לי 3 מבטלת גומט סעיף 22160 נסירה לפי 25.- לי 2 סעיף 12550		
541.-		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
541.-		סך הכל כללי		
37-44	46	14-15	16-23	49-54

בעת החשלוט נא לציין את מספר החשבונית

מס' שוטף	לזכות	אג'	ל"י	מס' שוטף
14-15	24-31	46	37-44	47-80
	15	2	541.-	2
	15	2		2
	15	2		2
	15	2		2
	15	2		2
	15	2		2
	8730027	9		2

DUP

מא/

א

39831

מדינת ישראל

משרד השיכון

המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
חבל בתאריך
9-01-1977
מספר: 39/46185/72-325

תאריך: 6/12/1975

מספר: 39/46185/72-325

אל : בזכרות משרד השיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

חשבון סופי של חוזה מס. 39/46185/72

הנדון:

העבודה: 40 יחידות דיור

אוגדה

המקום:

חברת: אשדוד בע"מ

הקבלן:

4.877.356,40

רצ"ב הרינו מעבירים חשבון סופי של החוזה הנדון, בסך

המכוסה לחשבות הוא 4.721.572 ל"י לאחר נכוי של 0.2% ע"ח בדיקות ו-3% ע"ח קרן בטוח

נא להקטין / להגדיל את החוזה, שהיקפו עתה - 4.441.000

בסך 436.356

סה"כ 4.877.356,40

החשבון כולל: התיקדיות נוספות 2.132.000 - 2.322.676 = 290.676 ל"י

ל"י 146.710

עם נוספות למי מירוש כגוף החשבון

חוריה ע"ח בדיקות 9.756,40 ל"י

חוריה ע"ח קרן בטוח 146.028 ל"י

ב ב ר כ ה ,

אינג' א. שטרן

סגן ראש המינהל

ומנהל האגף לתכנון וביצוע

ר. לשם

העתקים:

מר י. רבינוביץ / ר. יצחקי / ~~ג. אבנאי~~ - נא להודיע לגזברות את מקור המימון לשינויים.

מנהל מחוז

חברת אשדוד

הקבלן

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

[illegible]

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

רשימת כמויות ומחירים
ח-ן סומי

2

העבודה: חוגבה 40 יח"ד

חשוב
והערכה ע"י
נבדק ע"י

מספר
המרכז/החזוה

מספר
ההזמנה

תאריך

ס.ס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בליי	הסכום		סה"כ	
						אג'	ליי	אג'	ליי
		אגודה - 40 יח"ד פסוס 686							
	1.	מחיר בית לפי חוזה					55.397 -		
	2.	חורבה בטון 8 מ"מ על הקורה לפי חוזה - 65% x 1.10%	מ"ר	60.15	44.17		2871.05		
					71.50		2,870.72		
	3.	חורבה יסודות למדידה לפי החוזה (647.35+1,936.-) x 1.10% x 1.159%							
	1.	יסודות למדידה							
	1.	חסירה למלוח יסוד ער קומק 1.5 מ"א (יומק 225026) מחיר לפי חוזה	מ"ר	14.78	45.20		668.06		
	2.	כנ"ל אך לעומק מעל 2,04150 מ"א יומק 225027 (מחיר לפי חוזה)	מ"ר	0.12	69.55		8.35		
	3.	כנ"ל אך לעומק מעל 2,04150 מ"א יומק 225027 (מחיר לפי חוזה)	מ"ר	0.04	81.15		3.25		
	4.	יציקת בטון רוח/חממה למלוח יסוד	מ"ר	9.85	15.10		148.74		
	5.	יציקת מלוח בטון	מ"ר	2.74	370.-		1,013.80		
	6.	יציקת עמודי יסוד	מ"ר	0.93	695.-		648.35		
	7.	זלצר חממה לקורות יסוד	מ"מ	43.38	5.-		216.90		
	8.	חרוץ זיר קגול	מ"ר	0.026	2,200.-		497.20		
		חוסמה לפי חוזה עבור רצועת צוה 10%					42.40		
							3,245.05		
							3,245.05		
							324.50		
							3,569.55		

להעברה / סיה

ס.ס.

חוגבה בוצע

המפקח

[illegible]

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

רשימת כמויות ומחירים

ח-נ כו"מ

4

העבודה: מוצגות 40 יח"ד

חשוב
והערכת ע"י
נבדק ע"י

מספר
המרכז/החזות

מספר
הרזומה

תאריך

ס.ס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בליי	הסכום אג' ליי	הסכום אג' ליי	ס.ה.כ. ליי
5.	תוספת כבלים השלם על הגג, כולל חיזוק עם גלום וברגים. הכנסת צינור פריטץ 1/2" לאחר הרכבת קנק שנוי המיועד לקונדולה ע"י דלת חדר מנועים במקום ע"י כביסה לפי תכנית (221043) (מ"מ 4 כמ"מ)	קונס	(X)	1	160.-	80.-	160.-	40.-
6.	הצבת חור בגג אסבסט פבארקו רוח עבור העברה קונדולה דרך הגג כולל הטיפת הגג	קונס	(X)	1	65.-	65.-	65.-	35.-
7.	הקונס כולל לחצן וטרנספורטור	קונס		1	42.-	42.-	42.-	42.-
8.	נקודת טלפון	יח"		1	46.-	46.-	46.-	46.-
9.	תוספת מ"ז דו-קוטבי (2 פיל)	יח"	(X)	1	50.-	50.-	50.-	50.-
10.	לחצונה כביסה חיזוק לוח השלם כחוף ארון השלם לפי דרישה מ" השלם קנור מיקום לפונס	יח"	(X)	1	100.-	100.-	100.-	1,085.-
11.	הכנה לחיבור השלם עבור מ" השלם כולל הצבת חור 20/20 בקיר מעל ארון השלם הרכבת גנור מריכץ 1/4" מיקון קיר לאחר הרכבת לטיור	קונס	(X)	1	100.-	100.-	100.-	1,085.-
12.	הכנת סל צנר 1 1/2" סלמר קו יחסי זמנה משק (צנר 68 ס"מ)	יח"	(X)	1	60.-	60.-	60.-	60.-
13.	העגה נקעה איבון	קנק	(-)	1	40.-	40.-	40.-	82.-

להעברה / סיה

החל הנדסה בנין בע"מ
העבודה בוצע
המפקח

רשימת כמויות ומחירים		אשטרום" חברה להנדסה בע"מ תל-אביב, רחוב צירלסון 4 טלפון: 443181	
חשבו		חשבו	
נבדק ע"י		חשבו ע"י	
מספר המכרז/החוזר		מספר החזמה	
ס"ה כ"א		ס"ה כ"א	
ס"ה כ"א		ס"ה כ"א	
5	5	5	5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17

רשימת כמויות ומחירים		"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ תל-אביב, רחוב צירלסון 4 טלפון: 443181	
6		תעבורה: פוגדה - 40 יח"ד	
חשבוש והערכה ע"י		מספר ההזמנה	
מספר המרכז / החזות		תאריך	
ס ה כ		סוג העבודה	
אג' ליי		מס.	
ה ס כ ו ס		סוג	
אג' ליי		מס.	
מחיר יחידה בליי		כמות	
יחידת המדה		סוג העבודה	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	
מס.		סוג	

רשימת כמויות ומחירים		"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ תל-אביב, רחוב צירלסון 4 טלפון: 443181	
חשבוש נבדק ע"י		העבודה: אובדן 40 יח"ד	
מספר המרכז / החוזה		מספר ההזמנה	
39/46185/73		תאריך	
ס"ה	כ"ל	מחיר יחידה בלי	יחידת המדה
עבודות שונות לכל הבתים			
יומן 225026 מ' 7/3 75			
1.	הובלות מים עם מיכלים בגלים	3	מ"ע
1260	- 420.-		
(איטור המטקה) הובלות מים			
2.	יומן 225027 - 14.3.75	2	מ"ע
840	- 420.-		
הובלות מים עם מיכלים 8 הובלות			
3.	יומן 225028 - 21.3.74	2	מ"ע
840	- 420.-		
הובלות מים (איטור המטקה מיכלים)			
4.	יומן 225034 - 2.5.75	6	מ"ע
720	- 120.-		
עבודת טרקטור וניקוי דרכים למנוף			
לאחר סיום חול			
5.	יומן 225042 - 4.7.75	1	קומ
150	- 150.-		
חיפול בורות ד עם בחסירה בגלל			
סינוי מיקומם, כולל מחסירה בורות הנ"ל			
עם אדמה (אי-די-מטקה)			
6.	יומן 225043 - 11.7.75	40	קומ
3200	- 80.-		
הוספת חומת צנור מרינף מעל הגב כולל			
בזון מסימון דרך הקרניים כולל המס			
(איטור המטקה) מורן הקו 8 מ"מ			
7.	יומן 225050 - 30.8.75	40	קומ
2,000	- 50.-		
מורן והרכבה מחד קונסוליות המל			
2/2" קנק מורן בקבוצות חתום (ראש)			
סינוי דברים 26.6.75 להרכיב			
קונסולות לפני הרכבה קונסולות צנורות			
הגב והרכבה מחד			
8.	יומן 65604 - 5.9.75	3	מ"ע
1260	- 420.-		
הובלות מים מחלקת המים במיכלים			
על מטה (איטור)			
9.	יומן 65607 - 26.9.75	1	מ"ע
420	- 420.-		
הובלות מים במיכלים			
10. איטור דרכי גישה עם חומר וורי מבורק			
(לפי הגרלה החזרה) קראמק כמויות			
מאטרת ק"י המטקה מיום 21.9.75			
127,650	- 20.-	6382,50	2ח
מחיר מאטרת (15% + 17.40) מ"מ			

להעברה / ס"ה

העבודה בוצע

המסמך

חשוב	נבדק
והערכה ע"י	ע"י

מספר
ההזמנה

מספר
המרכז / החוזה

מס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בלוי		הסכום		סה"כ לי
					אג' לי	אג' לי	אג' לי	אג' לי	
11		חוספת קרוב לבזר ספינה ע"י בזה							
		12 כולל טבעות 59 + 1.10	קומ"	12	64.90	80	778		
		ב. ספינת בור ספינה כנ"ל עקב שינוי	"	1	150.-	-	150		
		ג. הרכבת קו כיוון לבזר הנ"ל עם צנורות אטבסט 4"	מ"א	6	32.90	40	197		
		ד. סרוק קו כיוון הנ"ל כולל פילון החפלה (ראח ה-ן דך בפנייה ע"י אסטרוס)	קומ"	1	100.-	-	100		
12		בבוע בורח ספינה נוספים בתאריך 2/76 לפי דריסת העקום כנחית 19,21,14,24 (5 בורח 212מ"א)	מ"א	60	159.-	-	9,540		
13		חוספת ספינה עבור ארטמורה מיוחדת דגם היג 1309 (לפי דריסת הספקה-סיכום דברים)	יח"	80	19.-	-	1,520		
14		הרכבת דור חשמל מעל הגג במקום בחדר אפכטיה בתנאים קשים, לאחר גמר גג אטבסט כולל חוספת צנורות מנולבנים 2" ברז בסחון, אביזרים וחציבת חורים	קומ"	40	150.-	-	6,000		
15		חוספת עבור הרכבת הגנה נגד הדירה חול בדלתות חוץ כולל גם אלומיניום ובומי 4 מ"מ לאורך הדלתות וברגים (דלת כניסה ופרוזדור)	קומ"	40	50.-	-	4,000		
16		יזמור טטה והוצאת אדמה אל מחוץ לאחר עקב הפירה לסלוק פוקסים א מחשבה	מ"א	6.5	1200.-	-	7,800		
		ב. עבודת פועלים	מ"א	17	100.-	-	1,700		
							160,626	20	
							14,710		

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בש/89625

מוזמין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית משרד השכון באר-שבע.
 בניה : מבנים באוגדה.
 החומר לבדיקה : 40 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה ביום 76-12-27.
 מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
 תנאי הבקרה: תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חזק נדרש	חזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה דור (אינץ') קצום (ס"מ)	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדגם מס'
	330 320 334 348 333	76-12-28	76-10-25			קורות יסוד	בית 71		1 2 3 4
	247 207 201 224 220	76-12-28	76-10-27			"	בית 72		5 6 7 8
	216 235 279 246 244	76-12-28	76-10-31			"	בית 89		10 11 12

התאחדות העובדים הכללית

התאחדות העובדים הכללית
התאחדות העובדים הכללית
התאחדות העובדים הכללית

התאחדות העובדים הכללית

התאחדות העובדים הכללית

שנה	חודש	יום	שם	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר
1953	ינואר	1	התאחדות העובדים הכללית	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1953	פברואר	1	התאחדות העובדים הכללית	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1953	מרץ	1	התאחדות העובדים הכללית	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1953	אפריל	1	התאחדות העובדים הכללית	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1953	מאי	1	התאחדות העובדים הכללית	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1953	יוני	1	התאחדות העובדים הכללית	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1953	יולי	1	התאחדות העובדים הכללית	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1953	אוגוסט	1	התאחדות העובדים הכללית	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1953	ספטמבר	1	התאחדות העובדים הכללית	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1953	אוקטובר	1	התאחדות העובדים הכללית	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1953	נובמבר	1	התאחדות העובדים הכללית	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1953	דצמבר	1	התאחדות העובדים הכללית	1000	1000	1000	1000	1000	1000

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בש/89625/2

מומין הבדיקה : ביום:
בנין : אסמכתא/חיק עיריה מס':
החומר לבדיקה : הקבלן:
הדוגמאות הוכנו ע"י : המפקח:
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם להקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970. תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבסון הנדרש	שקיעה כדור (אינץ') קרוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (קיג לסמ"ר)	חוזק נדרש
13		בית 68	קורות יסוד			76-11-04	76-12-28	249	
14								207	
15								235	
16								265	
							ממצע	239	
17		בית 67	"			76-11-06	76-12-28	307	
18								390	
19								318	
20								337	
							ממצע	338	
21		בית 66	"			76-11-09	76-12-28	181	
22								255	
23								293	
24								258	
							ממצע	247	

3./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' א-בש/3/89625

מוזמין הבדיקה :
בנין :
החומר לבדיקה :
הדוגמאות הוכנו ע"י :
מזהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בתתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.
תנאי הבקרה:
ביום:
אסמכתא/תיק עיריה מס':
הקבלן:
המפקח:
- 3 -

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה כדור (אינץ') קוטרו (ס"מ)	סוג הבסון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מדרג מס'
	145 242 223 201 203	76-12-28	76-11-12			קורות יסוד	בית 65		25 26 27 28
	238 280 309 253 270	76-12-28	76-11-13			"	בית 61		29 30 31 32
	510 434 395 400 435	76-12-28	76-11-17			"	בית 64		34 35 36

4./.

הצהרה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 38367
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 2534, 4841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

מס' אבש/4/89625

מוזמין הבדיקה :
 בנין :
 החומר לבדיקה :
 הדוגמאות הוכנו ע"י :
 ביום :
 אסמכתא/תיק עיריה מס' :
 הקבלן :
 המפקח :
 תנאי הבקרה :
 מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

מדרג מס'	דוגמא מס'	פרטי הבנין	חלק המבנה	סוג הבטון הנדרש	שקיעה כדור (שיגור) קונוס (ס"מ)	תאריך היציקה	תאריך הבדיקה	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	חוזק נדרש
37		בית 63	קורות יסוד			76-11-19	76-12-28	320	
38								320	
39								322	
40								298	
							ממוצע	315	

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנטילה ברצעה לא ע"י ב"כ המכון.

שלמה טרברל
 מנהל סניף באר-שבע

העתקים: חב' אשטרם.
 מר שטרן
 מר אלואל

באר-שבע, 76-12-30
 צח/

תן/187963

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזמין או בא"כחו.
 אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית -

מס': 3813/4

בשר-שבע: 28.10.76

אל: מ. ב. - 10

מאת: מ. ב. - 10

הנדון: מקלה מ. ב. - 10
 3813/4

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/מוסי פס 10

לעבודה

ממשק / מושב

הקבלן

למי חווה

על סך

הערות:

1.00

3.00

10.00

מהנדס המזון

לוטה:

העתק:

מהנדס אזור

הקבלן

רשימת כמויות ומחירים
חשבון סופי

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

העבודה: אגודה 40

מספר
המרכז / החוזה
39/46185/72

מספר
ההזמנה
טפוס 686

תאריך
20.4.76

מס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בל"י	הסכום אג' לי	סה"כ אג' לי
		<u>אגודה 40 - בחים טפוס 686</u>					
		<u>דף רכוש</u>					
1.		בית טפוס 686 - 40 יח"א	מ"ר	63,262	61.75881	2,446,352.40	2,530,480
2.		עבודות שונות לכל הבתים				160,626	148,710
3.		התיקור				2,691,106	2,593,062.40
						2,201,572	2,528,250
						478,751.2	
						5,219,356	
4.		הורדת דמי בדיקה 0.2%				(-)10,456	
							5,208,900

להעברה / ס"ה

שהל הנדסת בנין בע"מ
העבודה בוצעה

המפקח

רשימת כמויות ומחירים
ח-ן סופי

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

העבודה: אובדה 40 יח"ד

מספר
המרכז / החוזה
39/46185/73

מספר
ההזמנה
טפוס 686

תאריך

ס.ס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בליי	הסכום		סה"כ ליי	סה"כ אג'
						אג'	ליי		
		אובדה - 40 יח"ד טפוס 686							
	1.	מחיר בית לפי חוזה					55.397 -		
	2.	הורדת בטון 8 מ"מ על התקרה לפי חוזה - 65.10% x 1.10% x 1.15	מ	2	71.50	40.15	2,870.72 (-)	2.812	
	3.	הורדת יסודות למדידה לפי החוזה							
		1.10% x 1.159% x (647.35 + 1,936.-)					3,293 -	49.230	
	1.	יסודות למדידה							
	1.	חפירה לפלטות יסוד עד עומק 1.5 מ"א (יומן 225026) מחיר לפי חוזה	מ	3	45.20	14.78	668.06		
	2.	כנ"ל אך לעומק מעל 2,0 ÷ 150 מ"א							
		יומן 225027 (מחיר לפי חוזה)	מ	3	69.55	0.12	8.35		
	3.	כנ"ל אך לעומק מעל 2,0 ÷ 2.50 מ"א	מ	3	81.15	0.04	3.25		
	4.	יציקת בטון רזה מחתך לפלטות יסוד	מ	2	15.10	9.85	148.74		
	5.	יציקת פלטות בטון	מ	3	370.-	2.74	1,013.80		
	6.	יציקת עמודי יסוד	מ	3	695.-	0.93	646.35		
	7.	קלקר מחתך לקורות יסוד	מ"א	3	43.38	5.-	216.90		
	8.	ברזל זיו" עבול	טון	1	2,120.-	0.226	497.20		
		תוספת לפי חוזה עבור רצועת עזה 10%					3,245.05		
		2. המבנה							
	1.	מילוי שקע בקיר מקלחת עקב החלפת סטנדרט מרצוף קיר להרסינה	קומט	1	25.-		25 -		
	2.	תוספת עבור הרחבת טף מוזאיקה							
	3.	הגדלת חדר מגורים ופרוזדור	מ"א	2	2,40	6.-	14.40		
		3. נגרות							
	1.	תוספת עבור הרכבת חלון נוסף 120/50 עם טיחוח במטבח, כולל זכוכית, צבע וסגירה מתח מחתך לחלון 90/160 עם בלוקים טיח ופייד 2 במקום דלת למטבח 2/205	קומט	1	206.-		206 -		
		התקנת חלון בטון בלוקים							

להעברה / סיה

שחל הנדסת בנין בע"מ
העבודה פוזע

במספר

רשימת כמויות ומחירים		אשטרום - חברה להנדסה בע"מ תל-אביב, רחוב צירלסון 4 טלפון: 443181	
חשבוש נבדק ע"י		חשבוש והערכה ע"י	
מספר המרכז / החוזה		מספר ההזמנה	
מס. סד.		סוג	
מחיר יחידה בל"י		כמות	
הסכום		יחידת המדה	
ס"ה כ"א		ס"ה כ"א	
3	אוגדה 40 יח"ד	מספר 686	מספר 686
2	חוספת עבור זכוכית משוריינת בדלת	1	קומפ
11.50	11.50	8	יח"
40	5.-	1	יח"
30	30.-	2	יח"
70	35.-	1	יח"
12	12.-	1	יח"
369	50		
4 חשמל			
1	תאורה היזונית כולל ארמטורה מיוחדת	1	יח" (x)
98	98.-	1	יח" (x)
28	28.-	1	יח" (x)
2	הכנת בקורה לתאורה חוץ	1	יח" (x)
3	חוספת ללוח חשמלי עבור מבטחים	1	יח" (x)
2	אוטומטיים (יומן 225043)	1	יח" (x)
231	231.-	1	יח" (x)
4	הרכבת קונזולה חשמל מצנור 2 1/2 עבור	1	יח" (x)
180	180.-	1	יח" (x)

להעברה / ס"ה

שהל הודעת בנין בע"מ

העבודה בוצע

המפקח

רשימת כמויות ומחירים

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

ח-ן סופי

4

חשוב
והערכה ע"י
נבדק ע"י

העבודה: אובדה 40 יח"ד

מספר
המרכז/החזות

מספר
ההזמנה

תאריך

מס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בל"י	הסכום	ס"ח כ	ס"ח א
					בל"י	אג"ל	ליי	אג"ל
5.		תוספת כבלים חשמל על הגג, כולל חיזוק עם שלוח וברגים הכנסת צינור מריחף 1 1/2" לאחר הרכבה עקב שגוי המיקום לקונזולה ע"י דלת חדר מגורים במקום ע"י כניסה לפי תכנית (225043) (אג"ל מנהל) (X) קומס		1	160.-	160.-	160	160
6.		חציבת חור בגג אסבסט לבארגז רוח עבור העברת קונזולה דרך הגג כולל אטימת הגג		1	65.-	65.-	65	65
7.		פעמון כולל לחצן וטרנספורמטור		1	35.-	35.-	35	35
8.		נקודת טלפון		1	42.-	42.-	42	42
9.		תוספת מ"ז דו-קוטבי (2 פיל)		1	46.-	46.-	46	46
10.		למכונת כביסה		1	50.-	50.-	50	50
11.		הדחת לוח חשמל בחוף ארון חשמל לפי דרישת ח" חשמל עבור מיקום למזנה הכנה להיבור חשמל עבור ח" חשמל כולל חציבת חור 20/20 בקיר מעל ארון חשמל מרכבת צנור מריחף 1/4" תיקון קיר לאחר הרכבה לסיור		1	100.-	100.-	100	1,085
12.		יומן מס' 5.7.1976 228314 (ד"ר הירשפלד) (אג"ל מנהל) (X) קומס		1	60.-	60.-	60	60
13.		הקניית צנב"ק 1/2" אג"ל חל"ה יסוד (אג"ל מנהל) (X) קומס		1	40.-	40.-	40	820

להעברה / ס"ח

בע"מ

העבודה בוצעה

המפקח

רשימת כמויות ומחירים

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

5

ח-ן סופי

חשוב
והערכה ע"י
נבדק ע"י

העבודה: אובדה 40 יח"ד

מספר
המכרז / החוזה

מספר
ההזמנה

תאריך

מס. סד.	סוג	טווח העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בל"י	הסכום אג' ל"י	סה"כ אג' ל"י
5 אינסטלציה סניטרית וביוב							
1.	חיבור מים למכונת כביסה כולל צנורות מגולבנים 2" למים קרים וחמים וצנור מגולבן 1 1/2" לדלוחין מחיר לפי חוזה 103.25 ל"י + 10% (עזה) (x) קומפ	1	קומפ	113.58	113.58	58	113
2.	הכנה לבז	1	קומפ	35.-	35.-	-	35
3.	סוללות לכיור מטבח וקערה רחיצה	2	יח"	50.-	50.-	-	100
4.	צנור מגולבן כולל צבע לחליה וולון	1	יח"	22.-	22.-	-	22
5.	תוספת עבור קערה רחיצה מתוצרת הוץ במקום תוצרת הארץ (116.15-103.35) + 15% (אישור משה"ש) (x) יח"	1	יח"	14.70	14.70	70	14
6.	תוספת לאסלה מתוצרת הוץ כנ"ל כולל התאמת לסטנדרט ארצי	0.5	יח"	32.20	32.20	10	16
7.	תוספת צנורות 2" לכיור מטבח עקב שנוי מיקום ארון מטבח ע"י קיר חיצוני במטבח (2x3מ"מ) מ"א	6	מ"א	15.-	15.-	-	90
8.	תוספת לבור רקב יצוק במקום מורכב מאלומיניום (באישור ע"י משה"ש) קומפ	1	קומפ	125.-	125.-	-	125
9.	תוספת למחיר תא בקורת 60 Ø במקום לפי חוזה 50 Ø	1	יח"	50.-	50.-	-	50
10.	תוספת תא בקורת 60 Ø	0.1	יח"	131.-	131.-	10	13
11.	מגוף להחלפת בורח ספינה	1	יח"	75.-	75.-	-	75
12.	צנורות הגבהה מעל תאי ובור רקב 50x40 Ø	4.1	יח"	50.-	50.-	155	205
13.	כנ"ל אך מעל בורח ספינה 50/35 Ø	2	יח"	35.-	35.-	70	70
14.	תוספת צנורות אסבסט 4" לקו ביוב (x) מ"א	27.71	מ"א	32.90	32.90	66	911
15.	תוספת צנורות מגולבנים 2" למי דלוחין ער תא הראשי	4,09	מ"א	18.50	18.50	67	75
16.	תפירה תוספת לקו ביוב מעל עומק 0.75 ועד 1.0 מ"א	17.70	מ"א	4.-	4.-	80	70
17.	הכנה לחיבור דוד חשמל למים	1	קומפ	42.-	42.-	-	42

2,029.61

1730.57

117.90

131.-

להעברה / סיה

0.9

העבודה בוצעה

המפקח

רשימת כמויות ומחירים		"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ תל-אביב, רחוב צירלסון 4 טלפון: 443181						
6		העבודה: אגודה - 40 יח"ד						
מספר המכרז / החוזה		מספר ההזמנה	תאריך					
מספר 686		מספר ההזמנה	תאריך					
ס"ה	כ	ה ס כ ו ם	מחיר יחידה בליי	כמות	יחידת המדה	סוג העבודה	סוג	ס.ס.
ליי	אג'	ליי	אג'					
6 צבע ושונות								
1. תוספת עבור התיקרות רשתות ברזל								
85	80	60.-	1.43	סוג		באלמנטים (אישור)		
49	70	1.42	35	ק"ג		2. תוספת כמות ברזל לרשתות בקירות		
3. הגדלת עובי קיר בכניסה 20 ס"מ במקום								
130	-	130-	1			12 ס"מ עבור השקעה ארון חשמל בקיר קומ"ס		
4. תוספת עבור בטון ב-200 במקום								
22	40	5.-	4,48	מ		ב-150 בקורות יסוד		
5. צביעה מסד עם צמנטקוט (לפי משה"ש								
180	60	5.-	36.12	מ"א		מ 11.6.74		
6. תוספת עבור צביעה חלק מנגרות								
בצבע הוט (יחד צבע לבן - עבודה בשני צבעים)								
20	-	20.-	1	יח"		א. צביעה חוט ארון חשמל		
70	-	35.-	2	יח"		ב. צביעה חוט דלתות כניסה		
90	-	15.-	6	יח"		ג. משקופים לדלתות		
60	-	10.-	6	יח"		ד. משקופים לחלונות		
10	-	5.-	2	יח"		ה. משקופים לאשנבים		
90	-	15.-	6	יח"		ו. ארנזי שטורים		
7. צביעה גלופי חלונות ודלתות חוץ								
155	20	4.-	38.80	מ"א		עם צמנטקוט		
168	50	5.-	33.70					
8. בג אסבסט (לפי מכתב משה"ש 11.7.75)								
מחיר לפי מדד 3.73 (165.5) 65 ל/מ								
מ"מ = 2/3 + 43.30 מחיר למדד 1.73								
1.10% x 160.4 x 43.30 = (160,4)								
4409	15	3,850	75	46,15	83.44	2	מ	
4,852	75	25	-	25.-	1	יח"		
9. מספור לביה								

להעברה / סיה

ס"ח בנין בע"מ
דה כונע

להעברה / סיה

שרה הנדסה בנין בע"מ
העבודה כנצח

המפקח

[illegible]

[illegible]

9		רשימת כמויות ומחירים			"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ תל-אביב, רחוב צירלסון 4 טלפון: 443181		
חשוב והערכה ע"י		מספר ההזמנה			העבודה: אובדה 40 יח"ד		
נבדק ע"י		מספר המרכיב / החוזה			תאריך		
ס"ה כ	ס"ה א	חשבוש ל"י	מחיר יחידה ב"י	כמות	יחידת המדה	סוג העבודה	סוג מס. סד.
						חוספת קדחה לבור ספיגה ע"י בית	11
		778.80	64.90	12	קומ"	12 כולל טבעות 59 + 1.10%	
		150	150.-	1	"	ב. סתימת בור ספיגה כו"ל עקב שיפוץ	
						ג. הרכבת קו ביוזב לבור הנ"ל עם צנורות אסבסט 4"	
		197.40	32.90	6	מ"א	ד. פרוק קו ביוזב הנ"ל כולל מגלוי החעלה (ראה ה-ן דף כמויות ע"י אשטרום)	
		100	100.-	1	קומ"		
						בצוע בורות ספיגה נוספים בתאריך 2/76 לפי דרישת העקוב	12
		9,540	159.-	60	מ"א	בנחים 19, 21, 14, 24 (5 בורות 12 מ"א)	
						חוספת מחיר עבור ארמטורה מיוחדת דגם היג 1309 (לפי דרישת המקום - סיכום דברים)	13
		1,520	19.-	80	יח"		
						הרכבת דוד חשמל מעל הגג במקום בחדר אמבטיה בהנאים קשים, לאחר גמר גג אסבסט כולל חוספת צנורות מגולבנים 2" ברז בטחון, אביזרים וחציבת הורים	14
		3,300	80	40	קומ"		
		6,000	150.-				
						חוספת עבור הרכבת הגנה נגד חדירת חול בדלתות חוץ כולל סם אלומיניום וגומי 4 מ"מ לאורך הדלתות וברגים (דלת כניסה ופרוזדור)	15
		2,000	50.-	40	קומ"		
		4,000					
						יישור שטח והוצאת אדמה אל מחוץ לאחר עקב הפירה לסלוק מוקשים - מהשטח	16
		6,000	1200.-	5	י"ע	א. עבודה טרקטור	
		7,800	100.-	6.5	י"ע	ב. עבודה סועלים	
		1,000		10			
		1,700		17			
		160,626	20				
		146,710	148,710				
				להעברה / סיה		שול הנדסת בנין בע"מ העבודה נוצע	

20.4.76 תאריך: 11 דף

חשוב התייקרויות

הכין:

נרע בניה כפרית

39/46185/73 חוזה:

עבודה: אובדה 40 יח"ד

מדר בסיס:

חודש	מדר הכניה	התייקרות		חשבונות			סכום לחוספת יוקר	סכום התייקרות	הערות
		%	% לאחר החסר 3%	מס'	סכום	החסרות			
<u>חישוב סכום להתייקרות</u>									
1.	סה"כ חשבון סופי							2,446,352 2,691,106 146,710 (-) 160,626	
2.	הורדת שונוה לכל הבתים								
3.	הורדת קצרות ואסלות תוצרת חוץ					34.-			
	הורדת תוספת לקצרות				85.8	204.-			
	הורדת תוספת לבטון				22.4	532.-			
								280 / (-) 11,520 = 40 x 288.- 282.-	
								228,830	2,518,960
4.	הורדת מפרעה					(מפרעה שולמה ב-4/73)		470 סמ (-) 440,000	
								1848362	2,078,960
5.	תוספת התייקרות התחלחית							2067208	2,343,820
								3915570	4,422,780
<u>רכון התייקרויות</u>									
1.	התייקרות התחלחית							2,672,080 = 111.84% + 1848362 2,343,820 = 112.74% + 2,078,960	
2.	התייקרות שוטפת							132304 = 3.43% + 3915570 184,430 = 4.17% + 4,422,780	
								2201512	
	סה"כ							2,528,250	

רשימת כמויות ומחירים חשבון סופי						אשטרום - חברה להנדסה בע"מ תל-אביב, רחוב צירלסון 4 טלפון: 443181	
העבודה: אגודה 40							
מספר ההזמנה: 686						תאריך: 20.4.76	
מספר המרכז / החוזה: 39/46185/72							
מ.ס. קד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בל"י	הסכום אג' לי	סה"כ אג' לי
		<u>אגודה - 40 בחים טפוס 686</u>					
		<u>דף רכוש</u>					
1.		בית טפוס 686 - 40 יח"א X 63,262.-				2,530,480 -- 176,710 -- <u>160,626 --</u>	2,446,352 זכ
2.		עבודות שונות לכל הבתים				2,691,106 -- 257,062 זכ <u>2,528,250 --</u>	
3.		התיקונים				5,219,556 =	
4.		הורדת דמי בדיקות 0.2%				(=) 10,456 --	
						<u>5,208,900 --</u>	→ 5,208,900 --
להעברה / סיפה							

רשימת כמויות ומחירים
ח-ן סופי

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

2

העבודה: **אוגדה 40 יח"ד**

חשוב
והערכה ע"י

נבדק
ע"י

מספר
המרכז / החוזה

מספר
ההזמנה

תאריך

מס. סדר	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בלי	הסכום	ס"ה	כ"א	כ"א
		אוגדה - 40 יח"ד טפוס 686							
✓	1.	מחיר בית לפי חוזה				55.397 -			
	2.	הורדת בטון 8 מ"מ על הקמרה לפי חוזה	מ"מ	65.00	44.17	2871.05			
	3.	הורדת יסודות למדידה לפי החוזה	מ"מ	40.15	71.50	(-) 2,870.73			
	1.	יסודות למדידה							
	1.	הפירה לפלטות יסוד עד עומק 1.5 מ"א	מ"מ	14.78	45.20	668.00			
	2.	כנ"ל אך לעומק מעל 2,0÷150 מ"א	מ"מ	0.12	69.55	8.35			
	3.	כנ"ל אך לעומק מעל 2,0÷2.50 מ"א	מ"מ	0.04	81.15	3.25			
	4.	יציקה בטון רזה למטה יסוד	מ"מ	9.85	15.10	148.74			
	5.	יציקה פלטות בטון	מ"מ	2.74	370.-	1,013.80			
	6.	יציקה עמודי יסוד	מ"מ	8.93	695.-	6146.35			
	7.	קלקר מתחת לקורות יסוד	מ"מ	43.38	5.-	216.90			
	8.	ברזל זיו עגול	מ"מ	0.020	2,120.-	42.40			
		חוספת לפי חוזה עבור רצועה עזה 10%				3,245.05			
	2.	המבנה				324.50			
	1.	מילוי שקע בקיר מקלחת עקב החלפת סטנדרט מרגוף קיר לחרסינה	קומה	1	25.-	25.-			
	2.	חוספת עבור הרחבת טף מוזאיקה	מ"מ	2,40	6.-	14.40			
	3.	הגדלת חדר מגורים ופרגולדור	מ"מ	0.86	90.-	77.40			
	1.	חוספת עבור הרחבת הלון נוסף 120/50 עם מיחנה במטבח, כולל זכוכית, זבזע וסגינה מתח מתחת לחלון 90/160	קומה	1	206.-	206.-			

להעברה / סיפה

[illegible]

רשימת כמויות ומחירים

ח-ן סופי

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ

תל-אביב, רחוב צירלסון 4

טלפון: 443181

4

חשוב
והערכה ע"י
נבדק ע"י

העבודה: אובדה 40 יח"ד

מספר
המרכז / החוזה

מספר
ההזמנה

תאריך

מס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בל"י	הסכום	ס"ה כ"א	ס"ה ל"י
5.		תוספת כבלים חשמל על הגג, כולל חיווך עם שלוח וברגים הכנסת צינור מריחף 1 1/2" לאחר הרכבה עקב שנוי המיקום לקונזולה ע"י דלת חדר מגורים במקום ע"י כניסה לפי הכניה	קומפ	1	160.-	160.-	40.-	160.-
6.		הציבה חור בגג אסבסט לבארגז רוח עבור העברת קונזולה דרך הגג כולל אטימת הגג	קומפ	1	65.-	65.-		
7.		פעמון כולל לחצן וטרנספורמטור	קומפ	1	35.-	35.-		
8.		נקודת טלפון	יח"	1	42.-	42.-		
9.		תוספת מ"ז דו-קוטבי (2 פיל) למכונה כניסה	יח"	1	46.-	46.-		
10.		הזזת לוח חשמל בחוף ארון חשמל לפי דרישה ח" חשמל עבור מיקום למונה	יח"	1	50.-	50.-		
11.		הכנה להיבור חשמל עבור ח" חשמל כולל הציבה חור 20/20 בקיר מעל ארון חשמל מרכבה צנור מריחף 1/4" מיקון קיר לאחר הרכבה לסיווד יומן מס' 5.7.1976 228314	קומפ	1	100.-	100.-	1,085.-	100.-
12.		(החלפת חלון בגג המבנה)	יח"	4	60.-	60.-	60.-	
13.		(החלפת חלון בגג המבנה)	יח"	1	40.-	40.-	820.-	(-) 40.-

להעברה / ס"ה

רשימת כמויות ומחירים		אשטרום חברה להנדסה בע"מ תל-אביב, רחוב צירלסון 4 טלפון: 443181	
ח-ן סופי		5	
חשוב וחכמה ע"י נבדק ע"י		העבודה: אובדה 40 יח"ד	
מספר המרכז / החזרה		מספר ההזמנה	
686		מספר	
מס. סד.		סוג	
ס ה"כ		סוג העבודה	
אג' לי		יחידת המדה	
כמות		מחיר יחידה בל"י	
הסכום		אג' לי	
ס ה"כ		אג' לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	
לי		לי	

7/30 - מחיר קבלת אביהלם 0.9 x 139 - 114.90 (-)

רשימת כמויות ומחירים

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ
תל-אביב, רחוב צירלסון 4
טלפון: 443181

5

חשוב
והערבה ע"י
נבדק
ע"י

העבודה: אוגדה - 40 יח"ד

מספר
המרכז / החוזה

מספר
ההזמנה
טמוס 686

תאריך

מס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בל"י	ה ס כ ו ס אג' ל"י	ס ה * כ אג' ל"י
		6 צבע ושונות					
		1. תוספת עבור החיקרות רשתות ברזל באלומנלם (אישור)	סוג	1.43	60.-	80	85
		2. תוספת כמות ברזל לרשתות בקירות	ק"ג	35	1.42	70	49
		3. הגדלת עובי קיר בכניסה 20 ס"מ במקום 12 ס"מ עבור השקעה ארון השמל בקירקום		1	130-	-	130
		4. תוספת עבור בטון ב-200 במקום ב-150 בקורות יסוד	מ ³	4.48	5.-	40	22
		5. צביעה מסד עם צמנטקוט (לפי משה"ש 11.6.74)	מ"א	36.12	5.-	60	180
		6. תוספת עבור צביעה חלק מנגרות בצבע חום (יחד צבע לבן - עבודה בשני צבעים)					
		א. צביעה חום ארון השמל	יח"	1	20.-	-	20
		ב. צביעה חום דלתות כניסה	יח"	2	35.-	-	70
		ג. משקופים לדלתות	יח"	6	15.-	-	90
		ד. משקופים לחלונות	יח"	6	10.-	-	60
		ה. משקופים לאשנבים	יח"	2	5.-	-	10
		ו. ארגזי שטורים	יח"	6.5	15.-	-	90
		7. צביעה בלופי חלונות ודלתות הוצ עם צמנטקוט (לפי מכתב משה"ש 11.7.75)	מ"א	33.70	5.-	50	168
		8. גב אסבסט (לפי מכתב משה"ש 11.7.75)					
		מחיר לפי מדד 3.73 (165.5) 65 /					
		"מ + 2/3 = 43.30 מחיר למדד 1.73					
		(160,4) = $1.10\% \times 160.4 \times \frac{43.30}{165.5}$	מ ²	83.44	46,15	75	3,850
		9. מטפורי לביה	יח"	1	25.-	-	25

להעברה / סיה

רשימת כמויות ומחירים

ח - 7 סופי

"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ

תל-אביב, רחוב צירלסון 4

טלפון: 443181

7

חשוב
והערכה ע"י
נבדק
ע"י

העבודה: אגודה - 40 יח"ד

מספר
המרכז/החזות

מספר
ההזמנה 686

תאריך

מס. סד.	סוג	סוג העבודה	יחידת המדה	כמות	מחיר יחידה בליי	הסכום		סה"כ ליי
						אג'	ליי	
	10	10 סממט למחיר לפי חנוה						
		2. המכונה						
		3. נגרות (12.-, 206.-, 369.50)						
		4. חשמל (98 - 231 - 180)						
		5. אינסטלציה ביוב						
		6. צבע ושיונוח						
		חוספת עד 1/73 (115.9%) -1.0 (2.159% x 1.10%) = 37.5% x 1.981						
		הוררות לפי חנוה						
		1. מדרגות בטון - 62. - ליי + 10%						
		2. מעקה עץ לדלה ח' מגורים - 50. + 10%						
		3. צנורות בטון 4" 23,40 * 10%						
		4. מחלק						
		5. קלינגר						
		6. קלינגר גולן						

להעברה / סיה

רשימת כמויות ומחירים		"אשטרום" חברה להנדסה בע"מ תל-אביב, רחוב צירלסון 4 טלפון: 443181	
ח-ן סופי		העבודה: אוגדה 40 יח"ד	
מספר החוזה / המרכז		תאריך	
39/46185/73		סוג העבודה	
חשוב	נבדק	מחיר יחידה	כמות
והערכה ע"י	ע"י	בל"י	בל"י
מספר	מספר	החזמה	החזמה
המרכז / החוזה	המרכז / החוזה	החזמה	החזמה
ס"ה כ"א	ס"ה כ"א	ס"ה כ"א	ס"ה כ"א
ל"י	ל"י	ל"י	ל"י
עבודות שונות לכל הבתים			
יומן 225026 מ" 7/3 75			
1. הובלות מים עם מיכלית בגליל			
(איטור המפקח) הובלות מים			
1260	420.-	3	י"ע
2. יומן 225027 -14.3.75			
הובלות מים עם מיכליות 8 הובלות י"ע			
840	420.-	2	י"ע
3. יומן 225028 21.3.74			
הובלת מים (איטור המפקח מיכלית) י"ע			
840	420.-	2	י"ע
4. יומן 225034 2.5.75			
עבודת טרקטור וניקוי דרכים למנוף			
לאחר סופות חול			
720	120.-	6	ש"ע
5. יומן 225042 4.7.75			
חיסול בורות ר קב בחמירה בגליל			
סינוי מיקומם, כולל סחמת בורות הנ"ל			
עט אדמה (איטור המפקח) קומפ			
150	150.-	1	קומפ
6. יומן 225043 11.7.75			
חוסמתהנחה צנור מריכף מעל הגב כולל			
בטון ספסל דרך הקרניז בכוון המסע			
(איטור המפקח) אורך הקו 8 מ"א			
3200	80.-	40	קומפ
7. יומן 225050 30.8.75			
פרוק והרכבה מחדש קונסולית חשמל			
2 1/2" עקב צורך בעבודות התזה (ראה			
סיכום דברים 26.6.75 להרכיב			
קונסולות לפני הרכבת קונסטרוקציות			
הגב והרכבה מחדש			
2,000	50.-	40	קומפ
8. יומן 65604 5.9.75			
הובלות מים מספסל ופתחת דרכים במיכלית			
על משאית (איטור)			
1260	420.-	3	י"ע
9. יומן 65607 26.9.75			
הובלת מים במיכליות			
420	420.-	1	י"ע
10. מידור דרכי גישה עם חומר וודי מהודק			
(לפי הגדלת החוזה) נרשמת כמויות			
מאושרת ע"י המפקח מיום 21.9.75			
ומחיר מאושר (15% + 17.40) סה"			
127,650	20.-	6382,50	מ
להעברה / סיה			

20.4.76 תאריך: 10 דף

הכין: ח. גולדברג

חשוב התיקרויות

בניה כפרית

39/46185/73 : חסות

עבודה: אוגרה 40 יח"ד

מדר בסיס

[illegible]

חשוב התיקרויות

חזיון


נרע **בניה כפרית**

39/46185/73 חסד


עבודה: אונגדה 40 יח"ד

מדד בסיס:

חודש	מדר הבניה	התייקרות		חשבוניות			סכום התייקרות	הערות
		%	% לאחר החסר 3%	מס'	סכום	החסרות		
<u>הישב סכום להתייקרות</u>								
1.	סה"כ חשבון סופי						2,691,106-	
2.	הורדת שונות לכל הבתים						(-)160,626-	
3.	הורדת קצרות ואסלות תוצרת חוץ					31.-		
	הורדת תוספת לקצרות			85.8	+ 23.75%		204.-	
	הורדת תוספת לבטון			22.4	+ 237.5%		532-	
							(-) 11,520- = 40 x 288.-	
							2,518,960-	
4.	הורדת מפרקה					(מפרקה שולמה ב-4/73)	(-)440,000-	
							2,078,960-	
5.	תוספת התיקרות התחלית						2,343,820-	
							4,422,780-	
<u>רכוז התיקרות</u>								
1.	התיקרות התחלית						2,343,820-	112.74 % + 2,078,960.-
2.	התיקרות שוטפת						184,430-	4.17 % + 4,422,780.-
							2,528,250-	סה"כ



מזרח
קמ. 1:1000
דוד קליס אדריכל
מבט ימיני



אשטרם

חברה להנדסה בע"מ



ASHTROM

ENGINEERING CO. LTD.

Date : 15.8.76 תאריך :

Our Ref. : מספרנו :

לכבוד

משרד השכון לידי מר י. רוסיאנסקי

מנהל לבניה כפרית - מחוז הנגב

בנין מרכז הנגב

באר - שבע

א.נ. ,

הנדון : אגדה 40 יח"ד - חשבון סופי

חזרה 39/46185/72

הננו מתכבדים להגיש חשבון סופי לעבודה הנ"ל ע"ס - 5,208,900 ל"י

נודה לכם על בדיקת החשבון ואשורו בהקדם.

בכבוד רב

אשטרם

חברה להנדסה בע"מ

העתק : מר ש. אורבך רחוב טאגור 41 ת"א

לוטה : 5 העתקי ח-ן וחשובי כמויות

MORTHE

ENGINEERING AND



WORLD

CONSTRUCTION

NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF
MORTHE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
AND IS TO BE KEPT IN THE OFFICE OF
THE ENGINEER

DATE: 10/10/1964
BY: [Signature]

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF
MORTHE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
AND IS TO BE KEPT IN THE OFFICE OF
THE ENGINEER

DATE: 10/10/1964
BY: [Signature]

שם העבודה: 686 ס'סב - ז"ר

מסי העבודה

תבנית מס'

[illegible]

תבנית מס'

מס' העבודה

שם העבודה: כ"ד - זרע חלב 686

[illegible]

חישוב כמויות

דף 3 הכין

תאריך 197

תכנית מס'



מס' העבודה

שם העבודה אולפן - ג. ג. סביס 686

6. גרסת דגד, קוטר 100 מ"מ למטה של אולפן במקום פליטה (סכום 1 א"מ)	2. המזנה	1. מילוי קוטר בקוטר 100 מ"מ ע"י המזנה המזנה מזרחי קוטר למזנה	2. גרסת סט מילוי 100 מ"מ היה דגד ג' מילוי 100 מ"מ
4. גרסת	1. גרסת אולפן 100 מ"מ פין 399, אולפן נכס 100 (2-3)	2.40	3. גרסת מילוי 100 מ"מ
2. גרסת 100 מ"מ	3. גרסת 100 מ"מ	1	3. גרסת 100 מ"מ
3. גרסת 100 מ"מ	4. גרסת 100 מ"מ	1	4. גרסת 100 מ"מ
5. גרסת 100 מ"מ	6. גרסת 100 מ"מ	1	5. גרסת 100 מ"מ
6. גרסת 100 מ"מ	7. גרסת 100 מ"מ	1	6. גרסת 100 מ"מ
7. גרסת 100 מ"מ	8. גרסת 100 מ"מ	1	7. גרסת 100 מ"מ
8. גרסת 100 מ"מ	9. גרסת 100 מ"מ	1	8. גרסת 100 מ"מ
9. גרסת 100 מ"מ	10. גרסת 100 מ"מ	1	9. גרסת 100 מ"מ

883

7617-73d/p

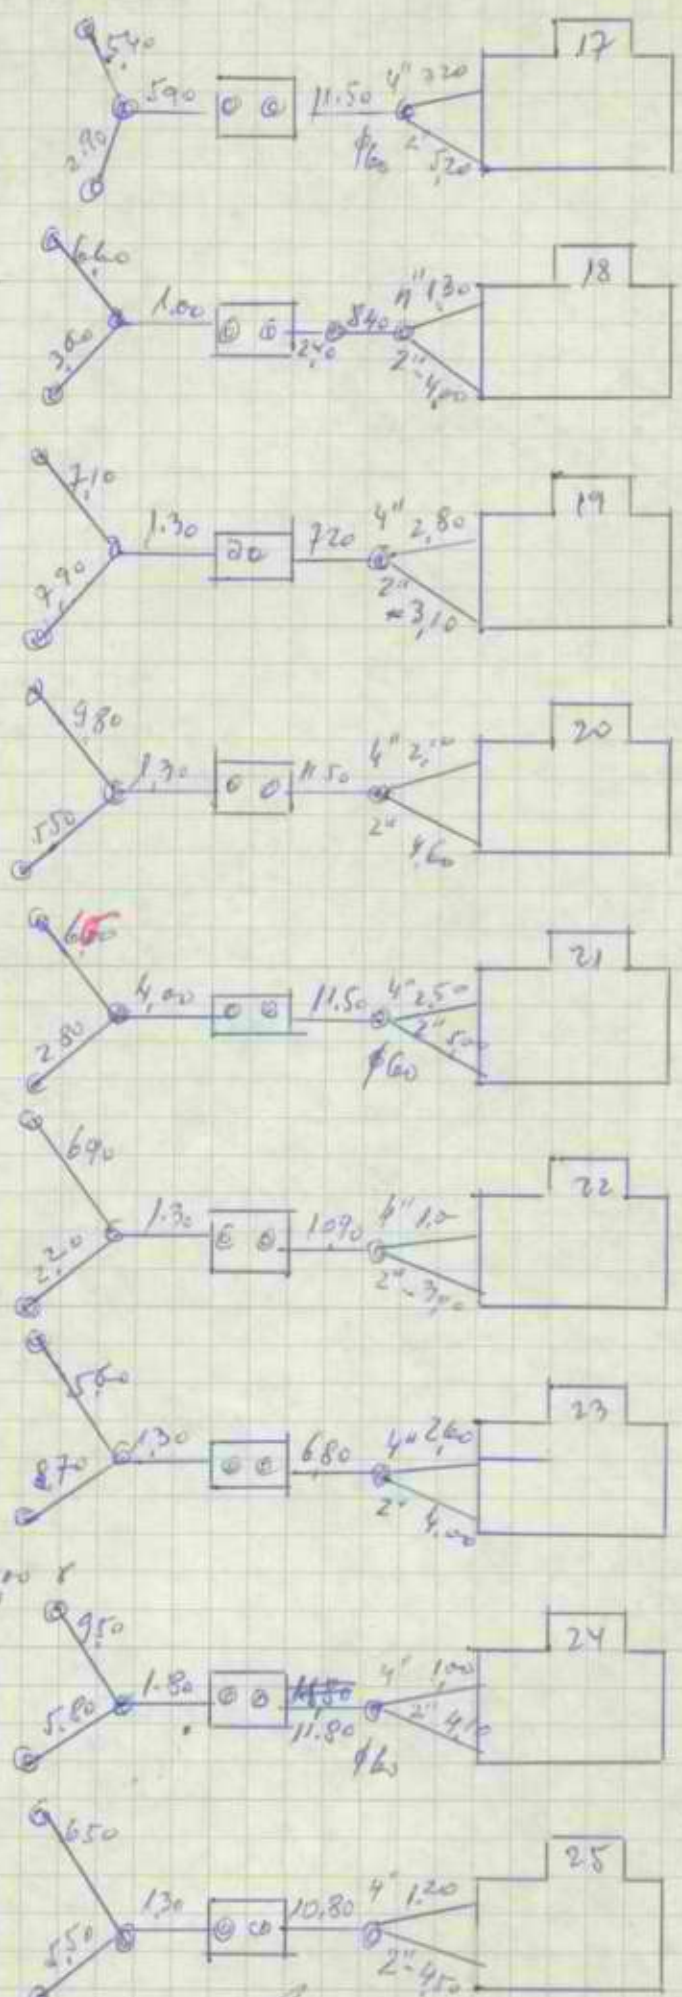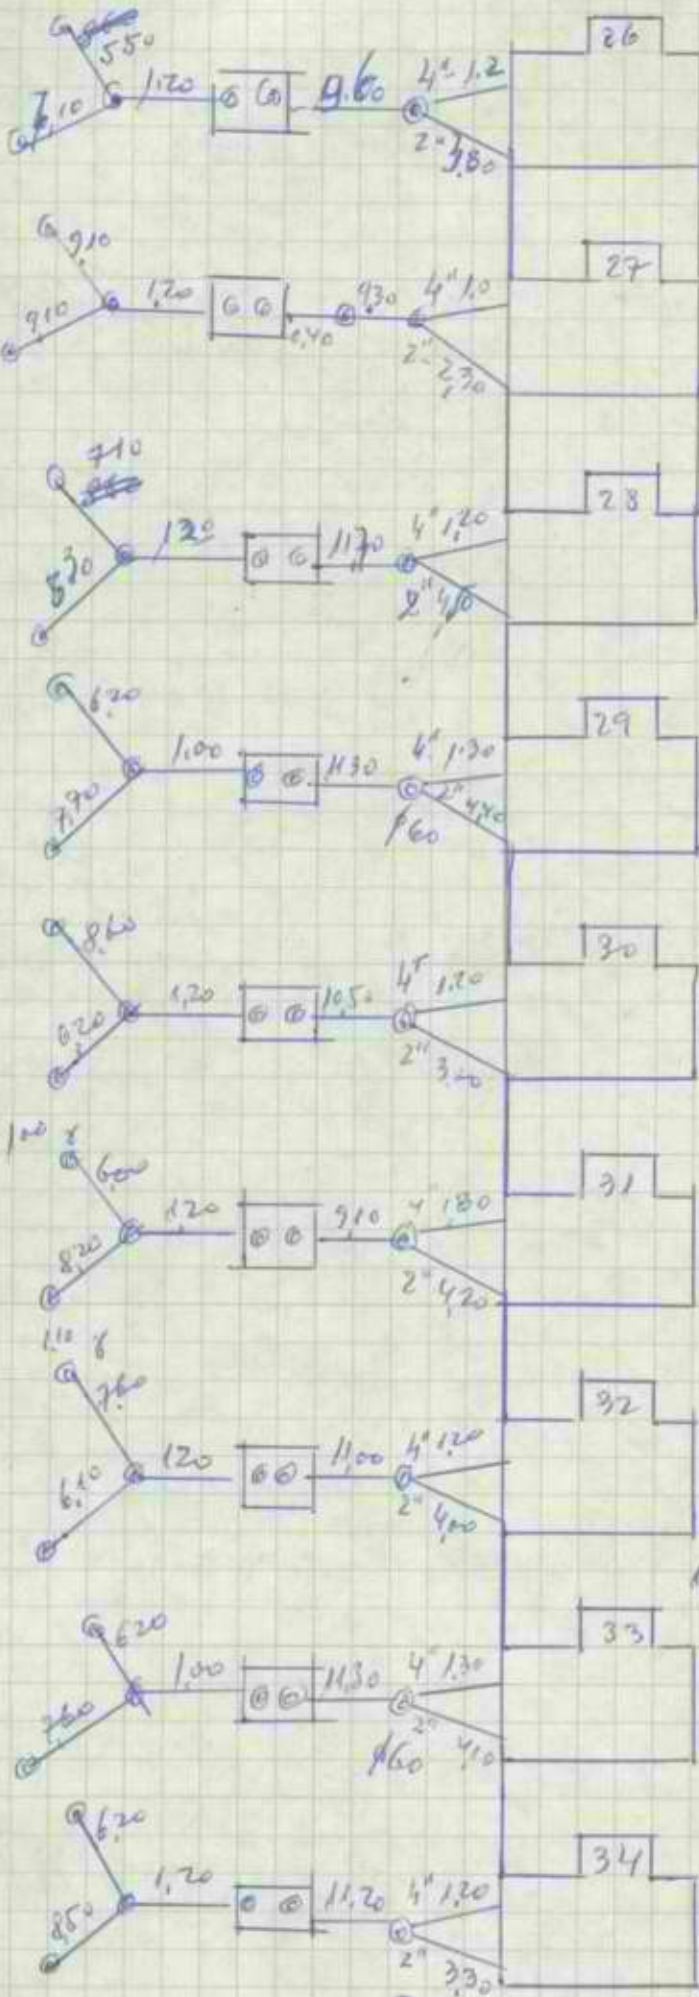

מסלול מים


653

686/26 מ"מ 240 - 33

39/46/85/73 מ"מ

מ"מ 240 - 33

686 מ"מ

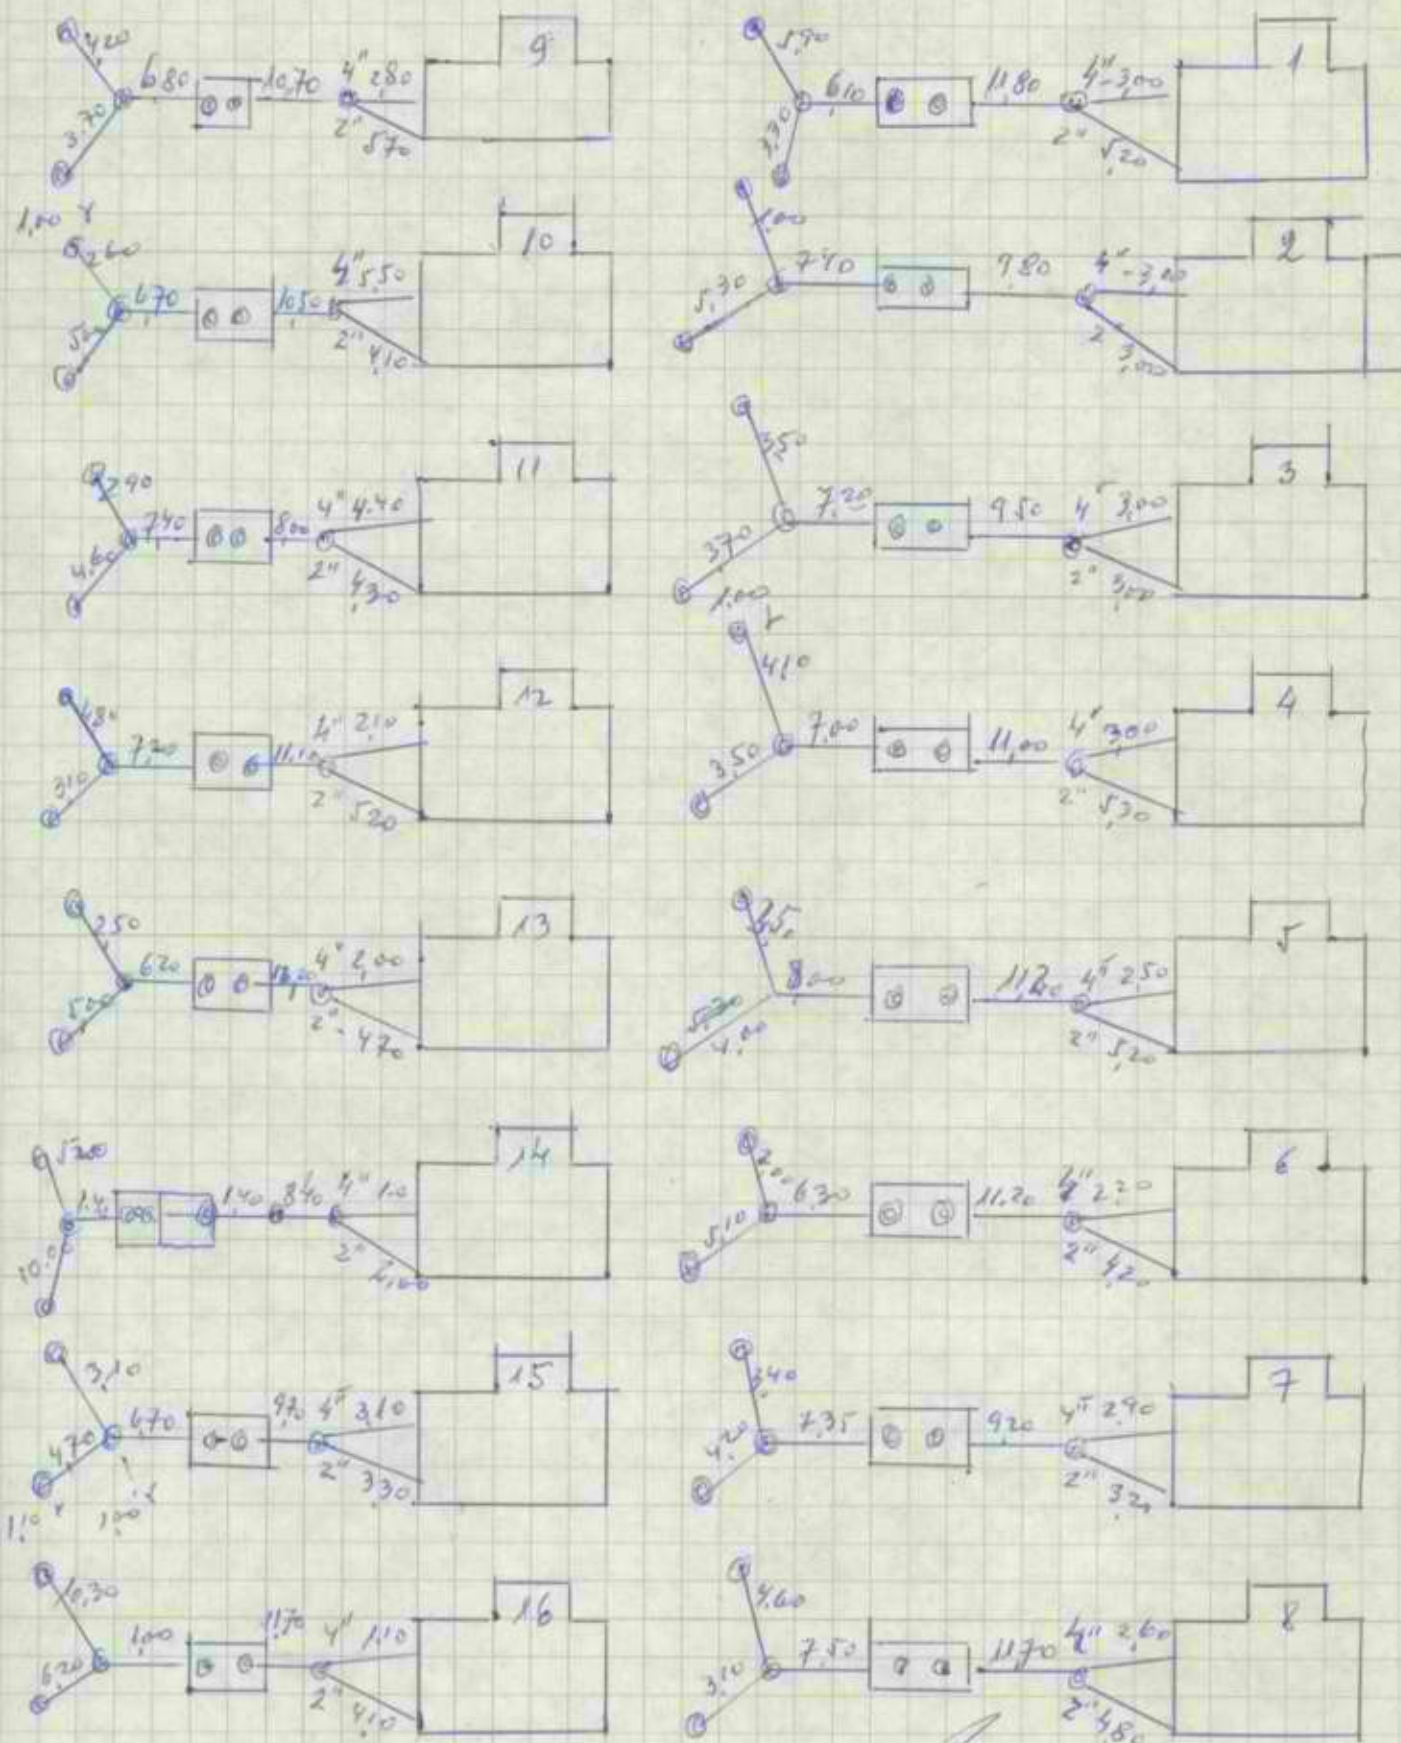





מ"מ 240 - 33

53

686 מ"מ 7'11" ח"ה

מ"מ 40-2 2'1"8 2'3"3 5'1"7
686 מ"מ

מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
1	2	3	5.20	30.10	1	1
1	2	4	3.00	26.50	1	2
1	2	4	3.00	26.90	1	3
1	2	4	5.30	28.60	1	4
1	2	4	5.20	29.20	1	5
1	2	4	4.20	26.80	1	6
1	2	4	3.20	27.05	1	7
1	2	4	4.80	29.50	1	8
1	2	4	5.70	28.20	1	9
1	2	4	4.10	30.30	1	10
1	2	4	4.30	27.30	1	11
1	2	4	5.20	28.30	1	12
1	2	4	4.70	27.70	1	13
1	2	4.5	8.00	27.40	2	14
1	2	3.4	3.30	28.30	1	15
1	2	3.4	4.10	30.30	1	16
1	2	3.4	5.20	28.90	1	17
1	2	4.5	4.00	23.30	2	18
1	2	3.4	7.10	26.30	1	19
1	2	4.4	4.60	30.20	1	20
1	2	4	5.00	26.80	1	21
1	2	4	3.00	22.30	1	22
1	2	4	4.00	25.00	1	23
1	2	4	4.10	29.90	1	24
1	2	4	4.50	25.30	1	25
1	2	4	3.80	24.60	1	26
1	2	4.5	2.30	33.20	2	27
1	2	3.4	4.50	29.50	1	28
1	2	4	4.40	27.50	1	29
1	2	4	3.00	27.70	1	30
1	2	4	4.20	26.30	1	31
1	2	4	4.00	27.40	1	32
1	2	4	4.10	27.40	1	33
1	2	4	3.30	28.30	1	34
1	2	4	3.80	29.00	1	35
1	2	4.5	4.30	27.60	2	36
1	2	3.4	4.30	28.20	1	37
1	2	3.4	3.80	27.50	1	38
1	2	3.4	5.10	27.00	1	39
1	2	3.4	4.00	26.70	1	40
40	80	164	163.70	1108.35	44	
40	80	164	163.70	1108.35	44	
1	2	4.10	4.09	27.71	0.1	



מ"מ 40-2 2'1"8 2'3"3 5'1"7
686 מ"מ

מ"מ 40-2 2'1"8 2'3"3 5'1"7
686 מ"מ

חישוב כסויות

הכין 7.97
תאריך

197

תכנית מס'

מס' העבודה

שם העבודה סל/צבה - כיג סבלס 686

3	סל/צבה - כיג סבלס	1	2
4	סל/צבה - כיג סבלס	1	2
5	סל/צבה - כיג סבלס	1	2
6	סל/צבה - כיג סבלס	1	2
7	סל/צבה - כיג סבלס	1	2
8	סל/צבה - כיג סבלס	1	2
9	סל/צבה - כיג סבלס	1	2
10	סל/צבה - כיג סבלס	1	2
11	סל/צבה - כיג סבלס	1	2
12	סל/צבה - כיג סבלס	1	2
13	סל/צבה - כיג סבלס	1	2
14	סל/צבה - כיג סבלס	1	2

חישוב כמויות

דף 8
הכין
תאריך

197

תכנית מס'

מסי העבודה

שם העבודה
אולצבה - 2 ג' סלס 686

			הוירגותא בקל		
			11. מ'ססמ אולצבה		
			סלס (סלסמל)		
			15. מ'ססמ צ'רלסמס		
			ס'ן. 21		
			16. מ'ססמ צ'רלסמס		
			ס'ן. 21		
			17. גבורה נ'סמס		
			21. מ'ססמ אולצבה		
			23.6 אולצבה		
			1. מ'ססמ אולצבה		
			2. מ'ססמ אולצבה		
			3. מ'ססמ אולצבה		
			4. מ'ססמ אולצבה		
			5. מ'ססמ אולצבה		
			6. מ'ססמ אולצבה		
			7. מ'ססמ אולצבה		
			8. מ'ססמ אולצבה		
			9. מ'ססמ אולצבה		
			10. מ'ססמ אולצבה		
			11. מ'ססמ אולצבה		
			12. מ'ססמ אולצבה		
			13. מ'ססמ אולצבה		
			14. מ'ססמ אולצבה		
			15. מ'ססמ אולצבה		
			16. מ'ססמ אולצבה		
			17. מ'ססמ אולצבה		
			18. מ'ססמ אולצבה		
			19. מ'ססמ אולצבה		
			20. מ'ססמ אולצבה		
			21. מ'ססמ אולצבה		
			22. מ'ססמ אולצבה		
			23. מ'ססמ אולצבה		
			24. מ'ססמ אולצבה		
			25. מ'ססמ אולצבה		
			26. מ'ססמ אולצבה		
			27. מ'ססמ אולצבה		
			28. מ'ססמ אולצבה		
			29. מ'ססמ אולצבה		
			30. מ'ססמ אולצבה		
			31. מ'ססמ אולצבה		
			32. מ'ססמ אולצבה		
			33. מ'ססמ אולצבה		
			34. מ'ססמ אולצבה		
			35. מ'ססמ אולצבה		
			36. מ'ססמ אולצבה		
			37. מ'ססמ אולצבה		
			38. מ'ססמ אולצבה		
			39. מ'ססמ אולצבה		
			40. מ'ססמ אולצבה		
			41. מ'ססמ אולצבה		
			42. מ'ססמ אולצבה		
			43. מ'ססמ אולצבה		
			44. מ'ססמ אולצבה		
			45. מ'ססמ אולצבה		
			46. מ'ססמ אולצבה		
			47. מ'ססמ אולצבה		
			48. מ'ססמ אולצבה		
			49. מ'ססמ אולצבה		
			50. מ'ססמ אולצבה		
			51. מ'ססמ אולצבה		
			52. מ'ססמ אולצבה		
			53. מ'ססמ אולצבה		
			54. מ'ססמ אולצבה		
			55. מ'ססמ אולצבה		
			56. מ'ססמ אולצבה		
			57. מ'ססמ אולצבה		
			58. מ'ססמ אולצבה		
			59. מ'ססמ אולצבה		
			60. מ'ססמ אולצבה		
			61. מ'ססמ אולצבה		
			62. מ'ססמ אולצבה		
			63. מ'ססמ אולצבה		
			64. מ'ססמ אולצבה		
			65. מ'ססמ אולצבה		
			66. מ'ססמ אולצבה		
			67. מ'ססמ אולצבה		
			68. מ'ססמ אולצבה		
			69. מ'ססמ אולצבה		
			70. מ'ססמ אולצבה		
			71. מ'ססמ אולצבה		
			72. מ'ססמ אולצבה		
			73. מ'ססמ אולצבה		
			74. מ'ססמ אולצבה		
			75. מ'ססמ אולצבה		
			76. מ'ססמ אולצבה		
			77. מ'ססמ אולצבה		
			78. מ'ססמ אולצבה		
			79. מ'ססמ אולצבה		
			80. מ'ססמ אולצבה		
			81. מ'ססמ אולצבה		
			82. מ'ססמ אולצבה		
			83. מ'ססמ אולצבה		
			84. מ'ססמ אולצבה		
			85. מ'ססמ אולצבה		
			86. מ'ססמ אולצבה		
			87. מ'ססמ אולצבה		
			88. מ'ססמ אולצבה		
			89. מ'ססמ אולצבה		
			90. מ'ססמ אולצבה		
			91. מ'ססמ אולצבה		
			92. מ'ססמ אולצבה		
			93. מ'ססמ אולצבה		
			94. מ'ססמ אולצבה		
			95. מ'ססמ אולצבה		
			96. מ'ססמ אולצבה		
			97. מ'ססמ אולצבה		
			98. מ'ססמ אולצבה		
			99. מ'ססמ אולצבה		
			100. מ'ססמ אולצבה		

שם העבודה: אולצרה - 2.5 יולי 2010 686

מסי העבודה תכנית מס'

[illegible]

14.33

בזכר מלחמת ווארש

מס' הענ

הקבלה: אלטרים קמח/מלחמה סוף כבוד

					10325	בזכר מלחמת ווארש מלחמת השבוע
						הבזק ביוצר האליזק השבוע הון הממנים אפי הסניט כבשקמח ההכנה מצורפת
						כוחה הבזק 500.
				45.00		224 מתנים - 22
				22.00	99000	מאגלים כל המגש
						45.00
						2 מעבדים הון המאגלים הוהב
				10.00		10.00
				2.	20.00	
						3 שטח מעבד נולד דלגה למבני 3 ג'ר
					110.00	
						4 רהב המגש הבזק אבגם המבניות אנקמה הממנים
						מתנה 24 ר נכבים
					17.00	
					1137.00	
					5.00	
					5685.00	
				2/	26.00	רהב המגש 4
					13.00	476.00
				4/R.	538	4/R.
				4	21.50	476.00
						2.500
					6382.50	500 - (500 - 500)

סוף מ' בין מלחמת ווארש מלחמה

6382.50

רשימת מומות הזיון לבנין

תאריך

תאריך: 29/46/85/73 חוזה מס':

תכנית מס' 686

688 0106 1-2 - 73d/14

[illegible]

רשימת מוטות הזיון לבנין

תכנית מס'

689 000 12 - 23/10

[illegible]

ל ש ד י ב י

מחיר: 7001 סי.קד. 61070
הקריה, תל-אביב
וייטנאם חדשים
המיוחל לבנייה כפרית
ואיסוף

מנחם יד:

117 111 2 (172) 113 11

9039/46185/72 :01 100 1900

3's 24
138

על: מנכ"ל (2)

מחבר: ד"ר יצחק יעקבס, מנהל מחלקת המחקר, משרד החינוך, תל אביב.

— 574119 Y 80-10 .25

שם הקבלן
חברת אשטרום בע"מ

התאריך: 11.11.11

T 7027 187
—
221

[illegible]

4/5 11/17/71

101050

2000 0000 0000

95,000.-

4,441,000.-

4,346,000.-

2. מדינת הים : שלום התיקרויות

90,60,54,51,46,42,37,32,27,22,17,12,7,2,0

ה. ב. ר. ה.

7. צי-הורדת
מחבר

חתימת הקבלן
אשרוס
חברה להנדסה בע"מ
חתימה

13.8.46

ש. אבני
אשר חתם בזה לפניה
כפרית ויגור בית חזקית

207 pages

[illegible]

173 54 / 77 / X 71 76

7261-7-X⁷

130

- 0.380.00 Δ

THE

4824 13 AUG 76

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

3983/2/C

25 יולי 76

אל: מר בן ג'א

מא: מחוז פ"מ

הנדון: מ"ב חלק מס 11 הקמ"ג
י"ח' א"ש 3

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס חשבון אלקי/פופי מס' 11

לעבודה דקמ"ג י"ח' 3

במשק/מושק א"ש 3

לפי חוזה 39/46/85/75

על סך 420/550

הערות:

/

לוט: 4/4 כחלק מ"ב

העתק:

מנהל אזורי מנהל וס' 1

הקבלן: א"ש 3

מנהל המחוז

29.8.76

20.8.76

לכבוד
משרד השכון
רחוב הלל 23,
ירושלים
ר.נ.

הנדון: חשבון חלקי מט. 11 לחיזה 39/46185/73
הקמת 40 יח"ד באגודה (שדות ג')

היקף החיזה: ₪ 4,441,000.-

	2.	לאחר פטירת העבודה והגשת חשבון מומי
2,024,000.-		40 יח"ד ערכם - 2,200,000.- × 92%
126,000.-	2.	התקנת דרכי גישה
1,629,600.-	3.	התיקונים - 1,680,000.- × 97%
329,800.-	4.	התיקונים - 340,000.- × 97%
92,150.-	5.	התיקונים - 95,000.- × 97%
4,201,550.-		סה"כ
4,109,400.-		סה"כ קבלנו
92,150.-		סה"כ מניע

בכבוד רב,

"אשרום" חברה להנדסה בע"מ.

29.8.76

[Handwritten signature]



4224 r

29.8.02

ONLY \$926!

pure and dry.

metals

545

2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835

NAME: _____

1. Year Ending 1999
1999 Actual
00 1999 Actual = 0.000,000.00 % 100

4,000,000.0

2. 7000 7000 7000

5.05.051

[illegible]

—080.000.1

$$b. \quad \text{arranged} = .001, \text{CNS} = .001 \times 10^3$$

- 128 -

[illegible]

—051.59

107.250 - 3" x 3"

an"e uader =.001.901.2

0012 6172 - 0012 6172

4000' "E."

^aMS-IPD[®] with carbon 200.

להתישבות

המחלקה

מספר

באר-שבע, כט' סיוון תשל"ו
27.6.76

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל

המחלקה להתישבות חקלאית

חבל הנגב לכיש - באר-שבע

טלפון 25-77321 - ת.ד. 5



לכבוד

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

לידי מר רוסיאנסקי

ב א ר - ש ב ע

א.נ.א.

במושב אוגדה אושרו 15 משפחות בועדה הקבלה.

תאריך כניסתם למושב, במחינת העונה וגמר משוער של הדירות היה בערך מאי 1976.

לאור זאת המשפחות עשו סידורים עם הדירה בעיר והבטיחו אותה להשכרה לקראת יולי 1976.

מאחר ועומדים עם חוזים והתחייבויות, אבקשם לאשר למשפחות גפנר ויופה להכניס את הריהוט שלהם לבתים מס. 34 - 30.

אנא דאו זאת בבקשה חד פעמית ודחופה ביותר.


בכבוד רב,

י. חסון

העתק: מנהל החבל
מר ש. צוקרמן

יח/טח

U.S. GOVERNMENT
OFFICE



SECRET
U.S. GOVERNMENT
OFFICE
RECEIVED
U.S. GOVERNMENT

U.S.

U.S. GOVERNMENT OFFICE

U.S. GOVERNMENT OFFICE
RECEIVED

U.S. GOVERNMENT OFFICE
RECEIVED

U.S. GOVERNMENT OFFICE
RECEIVED

U.S. GOVERNMENT OFFICE

SECRET

SECRET
U.S. GOVERNMENT
OFFICE

SECRET

U.S.

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

3983 / ע"ס

23-11-76 באר שכם, ע"ס

אל: מר. בן ג"א

מא: מ/מ. הנ"ל

הנדון: מ/מ. חק' מס. 10 בקמ"ה
מ"ח"ג אש"ה

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשכון אלקי/פנמי מס' 10

לעבודה בקמ"ה מ"ח"ג

במשק / מושב אש"ה

לפי חוזה 39/46185/43 הקבלן אלטריוק

על סך 84.109400 -

הערות:

לוח: א/א בעתק פ"א

מהנדס המחוץ

העתק:

מהנדס אזור: בצריקה וס"ל

הקבלן: אלטריוק

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

פס' _____

באר-שבע

אל: _____

מאת: _____

הנדון: _____

רצ"ב הגנו מעבירים אליך/כם חשבון אלקי/פומי פס' _____

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה _____ הקבלן

על סך

הערות: _____

לוטסה: _____

מנהל המחוז

העתק: _____

מהגדס אזור

הקבלן

21.3.76

לכבוד
משרד הטיכון
רחוב הלל-23
ירושלים

ה.א.ל.

הנדון: חשבון חלקי סט' 10 לחודש 39/46185/T3
תקפת 40 יח"ד באוגדה (שדות ג')

היקף החזרה: 4,346,000.-

440,000.-	1. עם תחילת חייצור $20\% \times 2,200,000.-$
650,000.-	2. עם גמר חייצור כולל עזרת אלמנטים של חסל וגרור 40 יח"ד $\times 55,000.-$ 30%
220,000.-	3. לאחר גמר יטורים 40 יח"ד $\times 55,000.-$ 10%
220,000.-	4. לאחר גמר הרבה קומה ב 40 יח"ד $\times 55,000.-$ 10%
154,000.-	5. לאחר גמר בידור ורפורמא 40 יח"ד $\times 55,000.-$ 7%
220,000.-	6. לאחר גמר אינסטלציה חסל וגרור 40 יח"ד $\times 55,000.-$ 10%
110,000.-	7. לאחר סטירת הקבורה ותגמול חשבון סופי 40 יח"ד $\times 55,000.-$ 5%
126,000.-	8. התקנה דרכי ביטחון
1,629,600.-	9. החיקריות - $1,680,000.- \times 97\%$
329,800.-	10. החיקריות - $340,000.- \times 97\%$
4,109,400.-	סה"כ
3,779,600.-	סה"כ קבלנו
329,800.-	סה"כ פגיע

בכבוד רב,

"אשרום" חברה להנדסה בע"מ.

משרד הטיכון
מנהל תחנת בדיקת ויטורים חדשים
סניף תל אביב
תחשול בתאריך
26-03-1976
לטיפול של
אשרום

11.5.15

11.5.15
11.5.15
11.5.15
11.5.15

11.5.15

11.5.15
11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15
11.5.15
11.5.15

11.5.15
11.5.15
11.5.15

11.5.15

11.5.15

11.5.15

1360

מדינת

מזרד התיכון

ח"א, רח' ג' 13, הקריה
טלפון 269211

9334

תאריך: 1076

בנייה בהתישבות

טופס לצורכי חרזה

מספר החרזה 9039/46185/72

אל: הגזברות (2)

מאת: המחלקה הארגונית להתישבות, עליות חדשות.

- א. פרטי זהוי:
 - שם המחרז
 - שם הלישוב
 - שם הקבלן
- ב. חשב החרזה הקיים:
 - נבב
 - ארגזה
 - חב' אשורם בע"מ
- ג. הקיים בל:
 - המחוקן בל
 - הסגול בל
 - 4,006,000
 - 4,346,000
 - 340,000
- ד. סעיף הקצבני
 - השלום החיקרויות
 - 90.60.516/66 - עליות חדשות

שם	מספר	הערות

בברכה,
ד. בן-יהודה
השב המסוד

ש. א. א. א.
ראש המנהל הכללי
רשמיים חדשים.

העתיק:

מר א. שמיר, מנהל האגף לבנייה כפרית.
מר ג. אביב, ממונה על עליות חדשות.
מר א. בלי, ממונה על חרזים וכסדות.
ממונה מחוז לבנייה כפרית מחוז
אגף חרזים ובמחוזות המרכנות היהודית ח"א
בזכרות (2)

משרד השיכון
האגף לבנייה כפרית

12. 2. 76

מחוז הנגב

3983

מדינת ישראל משרד השיכון

מ"ר 35
מ"ר 38

הפינחול לבנייה כפרית וישובים חדשים

2.1.76

תאריך:

39/46185/73

מספר:

א. א. א. א.

אל: מר ש. כהן

מאת: מר א. כלף

הנדון: הגדלת/הקטנת חוזה 39/46185/73

העבודה - 40 יח"ד ז"ר

המקום - אגדה (סדה ג')

הקבלן - חב' אשדוד בע"מ

מהות השנוי -

כסך - 95,000 ל"י

נא לתבדיל את החוזה הנדון,

- 4,346,000 ל"י

ערך החוזה עתה

ס"ה 4,441,000 ל"י

ההנדלה היא לצורך בצוע: -

ע"ה התיקרות להתחלת עבודה ובזמן הבצוע - 95,000 ל"י

60

א. כלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן - אשדוד צירלסון 4, ת"א.

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

3943/516 מס' _____

255-48 בער-סבא _____

13/24 אלי _____

10/24 מאה _____

הנדרון: _____

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כס השכון חלקי/סופי מס' _____

לעבודה _____

במשק / מושב _____

למי חוזה _____

על סך _____

הערות: _____

מנהל המחוז

העתק:

מנהל אזור

הקבלן

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

מפי:

בא-שכר,

אלי:

מאת:

הנדון:

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבוני חלקי/פומי פט'

לעבודה

במשק / מושב

לפי חוזה הקבלן

על סך

הערות:

לוטת:

מהגוס הפחוז

העתק:

מהגוס אזור

הקבלן

20.1.76

לכבוד
משרד השיכון
רחוב הלל 23
ירושלים

ה.ג.ב.

הנדון: חשבון חלקי מט. 9 לחודש 39/46185/73
תקפת 40 יח"ד באוגדת (שדות ג')

היקף החודש: 4,346,000.-

440,000.-	1. <u>שם החלפת חייב</u> 20% x 2,200,000.-
680,000.-	2. <u>עט בטר חייב</u> חולל פביעת מלגות של השל ונגרות 40 יח"ד x 55,000.- x 30%
220,000.-	3. <u>לאחר בטר יסודות</u> 40 יח"ד x 55,000.- x 10%
220,000.-	4. <u>לאחר בטר הרבנות קופת גב</u> 40 יח"ד x 55,000.- x 10%
154,000.-	5. <u>לאחר בטר בודד וראש</u> 40 יח"ד x 55,000.- x 7%
220,000.-	6. <u>לאחר בטר אינטסלציה השל ונגרות</u> 40 יח"ד x 55,000.- x 10%
110,000.-	7. <u>לאחר במירת העבודות והגשת חשבון סופי</u> 40 x 55,000.- x 9%
126,000.-	8. <u>החקנת דרכי גישה</u>
1,629,600.-	9. <u>החיקריות</u> 1,680,000.- x 97%
329,800.-	10. <u>החיקריות</u> 340,000.- x 97%
4,109,400.-	
3,999,400.-	סה"כ קבלנו
110,000.-	סה"כ פביק

בכבוד רב,

"אשרות" תורה להנדסה בע"מ.



ST. 1. 15

RECEIVED
 1900
 12 15
 1900

RECEIVED FROM THE
 1900

1.	1900	1900
2.	1900	1900
3.	1900	1900
4.	1900	1900
5.	1900	1900
6.	1900	1900
7.	1900	1900
8.	1900	1900
9.	1900	1900
10.	1900	1900
	1900	1900
	1900	1900
	1900	1900

RECEIVED

RECEIVED

מ"א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
מ"ב. אביבי, ממונה על עליות חדשות
מ"א. בלף, ממונה על חוזים ומכרזים
מהנדס מחוז לבנייה כפרית מחוז המזרח
אגף חוזים ובטחונות הסוכנות היהודית ת"א
גזכרות (2)

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000

100-1000000


100-1000000

3983 | מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

תאריך: 27.10.75

מספר: 39/46185/72



אל: מר ש. כהן

מאת: מר א. בלף

הנדון: הגדלת/הקטנת החוזה 39/46185/72

העבודה - 40 בחים, מקלטים

המקום - אובדה

הקבלן - חב' אשטרום בע"מ

מהות השנוי -

ל"י בסך - 340,000.-

נא להבדיל את החוזה הנדון,

ל"י - 4,006,000.-

ערך החוזה עתה

ל"י ס"ה - 4,346,000.-

ההגדלה היא לצורך בצוע: -

ע"ה התיקרויות להתחלת עבודה ובזמן הבצוע - 340,000.- ל"י

6

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:

מהנדס מחוז - הנגב

הקבלן - אשטרום בע"מ

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית -

3983/5
135/5
מס' _____
באר-שבע

ג' 13
מאת: _____

הנדון: _____
אוסר

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשכון חלקי/סופי מס'

לעבודה _____
במשק / מושב _____
לפי חוזה _____
על סך _____
הערות: _____

מהנדס המבחן



לוטס: _____
11 יוני 1973

העתק: _____
מהנדס אזור _____
הקבלן _____

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' _____

באר-שבע, _____

אל: _____

מאת: _____

הנדון: _____

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/בומי מס'

לעבודה _____

במשק / מושב _____

הקבלן _____

למי חוזה _____

על סך _____

הערות: _____

לוטת: _____

מהנדס המחוז

העתק: _____

מהנדס אזור _____

הקבלן _____

39836



20.11.75

לכבוד
משרד המס
רחוב חלל 23
ירושלים.
י.א.א.


הנכס: חשבון חלקי מס. 8 לחודש מס. 39/46185/73
הקטן 40 יח"ד באגודה (שדות ג')

היקף החודש: 4,346,000.-


440,000.- ✓	1. עם החלפת הייצור $20\% \times 2,200,000.-$
660,000.- ✓	2. עם גמר הייצור כולל קביעת אלמנטים של חשכל ונגרות $40 \text{ יח"ד} \times 55,000.- \times 30\%$
220,000.- ✓	3. לאחר גמר יסודות $40 \text{ יח"ד} \times 55,000.- \times 10\%$
220,000.- ✓	4. לאחר גמר הרכבת קומה גב $40 \text{ יח"ד} \times 55,000.- \times 10\%$
154,000.- ✓	5. לאחר גמר בדוד ורצוף $40 \text{ יח"ד} \times 55,000.- \times 7\%$
220,000.- ✓	6. לאחר גמר אינטלציה חשכל ונגרות $40 \text{ יח"ד} \times 55,000.- \times 10\%$
126,000.- ✓	7. החקנה דרכי גישה
1,629,600.- ✓	8. נחיקדויות $97\% \times 1,680,000.-$
329,800.-	9. נחיקדויות $97\% \times 340,000.-$
3,999,400.-	סח"כ
3,669,600.-	סח"כ קבלנו
329,800.-	סח"כ פגיע

בכבוד רב,

"אשרות" חברה להנדסה בע"מ.



39831-210



20.10.75

לכבוד
משרד השיכון
רחוב הלל 23
ירושלים

ג.נ.ר


הנדון: חשבון חלקי מט' לחודש מט. 39/46185/73
הקמת 40 יח"ד באוגדה (עדות ג')

היקף החזרה: 4,006,000.- ₪

440,000.- ✓	1. עם התחלת הייצור 20% x 2,200,000.-
660,000.- ✓	2. עם גמר הייצור כולל קביעת אלמנטים של חשמל ונגרות 40 יח"ד x 55,000.- x 30%
220,000.- ✓	3. לאחר גמר יסודות 40 יח"ד x 55,000.- x 10%
220,000.- ✓	4. לאחר גמר הרכבת קומת גג 40 יח"ד x 55,000.- x 10%
154,000.- ✓	5. לאחר גמר בדיד וריצוף 40 יח"ד x 55,000.- x 7%
220,000.- ✓	6. לאחר גמר אינסטלציה חשמל ונגרות 40 יח"ד x 55,000.- x 10%
126,000.- ✓	7. החקנת דרכי ביטחון
1,629,600.- ✓	8. החיקריות 97% x 1,680,000.-
3,669,600.- ✓	סה"כ
3,402,300.- ✓	סה"כ קולנו
267,300.- ✓	סה"כ מביע

בכבוד רב,

"אשרום" חברה להנדסה בע"מ.



מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

3983 / 30/12/73

בא-שכר

אלי: ד"ר ר' ג'א
מאת: ואלו יקבע

הנדון: מ"א חוקיות / הקנין הג'ק
אוסדה

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/שופי פס' 6

לעבודה: הקנין הג'ק
במשק / מושב: ח"ש
לפי חוזה: 39/12/73
על סך: 23,340
הערות:

מהנדס הכתוב



לוטה: מ"א

העתק:
מהנדס אזור: 22/12/73
הקבלן: אלסטרם

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית-

3983 / 315
מס'.....

58.11
באר-שבע,.....

אל:.....

מאת:.....

הנדון: מ"ח הקניסה הקטנה בג'ר
אשדוד

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/שופי פס'

לעבודה.....

במשק / מושב.....

לפי חוזה..... הקבלן

על סך.....

הערות:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

מהנדס המחוז

העתק:

מהנדס אזור.....

הקבלן.....

מוסד השיכון
האגף לבניה בפריית

1.10.75

מחוז הנגב

28.9.75

לכבוד
סגור השבון
רחוב הלל 23
ירושלים.

א.נ.י.


הנדון - השבון חלקי טס. 6 לחודש טס. 39/46185/73
הקטן 40 יח"ד באוגדה (שדות ג')

היקף החודש - 4,006,000.-

440,000.-	1.	עם החלפת הייצור $20\% \times 2,200,000.-$
660,000.-	2.	עם גמר הייצור כולל קביעת חלופות של השל ונגרות 40 יח"ד $\times 55,000.-$ 30%
220,000.-	3.	לאחר גמר יסודות 40 יח"ד $\times 55,000.-$ 10%
220,000.-	4.	לאחר גמר הרכבת קומה ג' 40 יח"ד $\times 55,000.-$ 10%
115,500.-	5.	לאחר גמר ברזי וריצוף 30 יח"ד $\times 55,000.-$ 7%
176,000.-	6.	לאחר גמר אינסטלציה חשמל ונגרות 32 יח"ד $\times 55,000.-$ 10%
126,000.-	7.	התקנת זריכי גישה
1,444,800.-	8.	החיקריות - $86\% \times 1,680,000.-$
3,402,300.-		סה"כ
1,855,700.-		סה"כ קבלנו
1,546,600.-		סה"כ מביע

בכבוד רב,

"אשדוד" חברה להנדסה בע"מ.



אשור גמר בצוע / ~~בצוע חלקי~~ לחודש: 75 22 60

מריקט: אילוצים

שם הקבלן: סוכבול

מקצוע:

חנני מאשר שהעבודות המפורטות בזה כוצעו ב:

בכך אלוטו וילצ' אילוצים א' מציור חק'ם
חלקי' וכלו' מציורם

6382.50 מ 14.40 111.055.50

111.055.50

הערות:

69.600

41.455.50

חיוכים:

21.9.75

חתימה:

תאריך:

28.8.75

3883

20.8.75

לכבוד
משרד הסכונ
רחוב הלל 23,
ירושלים.

א.נ.א.

הנדון: הסכונ חלקי מט. 6 לחזקה מט. 39/46185/73
הקפה 40 יח"ד באוגדה (סדור ג')

	היקף וחזקה	4,006,000.- ₪
1.	עם החזקה הייצור	
	20% x 2,200,000.-	440,000.-
2.	עם גמר הייצור כולל קביעת אלמנטים של חשמל ונגרות	
	40 יח"ד x 55,000.- x 30%	660,000.-
3.	לאחר גמר יסודות	
	40 יח"ד x 55,000.- x 10%	220,000.-
4.	לאחר גמר הרכבת קומה בג	
	40 יח"ד x 55,000.- x 108%	220,000.-
5.	לאחר גמר בדוד ורצוף	
	30 יח"ד x 55,000.- x 7%	115,500.-
6.	לאחר גמר אינסטלציה חשמל ונגרות	
	32 יח"ד x 55,000.- x 10%	176,000.-
7.	הקפה דרכי ביטח	126,000.-
8.	התיקונים	
	86% x 1,680,000.-	1,444,800.-
	סה"כ	3,402,300.-
	סה"כ קבלנו	1,855,700.-
	סה"כ מביע	1,546,600.-

בכבוד רב,
"אמרום" חברה להנדסה בע"מ.

[Signature]

[Signature]

משרד הסכונ
2061/75

מדינת ישראל

משרד השיכון

אגף לבניה כפרית

מס' _____

כפר-סבך

א"י _____

מאת _____

הנדון: _____

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי מס'

לעבודה _____

כמשק / מושב _____

לפי חוזה _____

על סך _____

הערות: _____

לוטסה: _____

העתק: _____

מהנדרס אזור _____

הקבלן _____

מהנדרס תכנון

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית-

מס'.....

באר-שבע,.....

אל:.....

מאת:.....

הגדרון:.....

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כם חשבון חלקי/סופי פס'

לעבודה.....

במשק / מושב.....

למי חוזה..... הקבלן.....

על סך.....

הערות:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


מהנדס המבחן

..... לוחה:

..... העתק:

..... מהנדס אזור:

..... הקבלן:

3983

20.7.75

משרד השיכון
חמ"ד לבנייה כפרית
20.7.75

לכבוד
משרד השיכון
רחוב חלל 23
ירושלים
ר.ג.

הנדון: חשבון חלקי מט. 4 לחודש מט. 39/46185/73
הקמת 40 יח"ד באגודה (שדות ג')

חיקף החודש: 2,326,000.-

440,000.-	1. עם התחלת הייצור $20\% \times 2,200,000.-$
660,000.-	2. עם גמר הייצור כולל קביעת אלמנטים של הסמל ונגרות 40 יח"ד $\times 55,000.- \times 30\%$
220,000.-	3. לאחר גמר יפודות 40 יח"ד $\times 55,000.- \times 10\%$
220,000.-	4. לאחר גמר חרכבת קומת גג 40 יח"ד $\times 55,000.- \times 10\%$
57,750.-	5. לאחר גמר בידוד וריצוף 15 יח"ד $\times 55,000.- \times 7\%$
132,000.-	6. לאחר גמר אינסטלציה הסמל ונגרות 24 יח"ד $\times 55,000.- \times 10\%$
126,000.-	7. חקנת דרכי גישה
1,855,750.-	סה"כ
1,666,000.-	סה"כ קבלנו
189,750.-	סה"כ מביע



במבד רב, א
"אשרות" חברה להנדסה בע"מ.

מס' חשבוני מולט
מס' הא"ס 2661/9

1. 1000
 2. 1000
 3. 1000
 4. 1000
 5. 1000

1000
 1000
 1000
 1000
 1000

1000
 1000
 1000
 1000
 1000

1000

1. 1000
 2. 1000
 3. 1000
 4. 1000
 5. 1000

1. 1000
 2. 1000
 3. 1000
 4. 1000
 5. 1000

1. 1000
 2. 1000
 3. 1000
 4. 1000
 5. 1000

1. 1000
 2. 1000
 3. 1000
 4. 1000
 5. 1000

1. 1000
 2. 1000
 3. 1000
 4. 1000
 5. 1000

1. 1000
 2. 1000
 3. 1000
 4. 1000
 5. 1000

1. 1000
 2. 1000
 3. 1000
 4. 1000
 5. 1000

1000

1000

1000

1000

1000
 1000
 1000
 1000
 1000

1000
 1000
 1000
 1000
 1000

11/7/75

אל : מר טלע משרד השכון ח"א

3983 טנג' 1773

הנדון : חוזה 39/46185/73 הקמת 40 בתים מרעב
אוגדה בבצוע חברת אשטרום

עד עתה טרם קבלנו את החוזה עם הפרט טכני להקמת הבתים, כך שלא ידוע לנו
מה נכלל במחיר הבית.

מחיר הבית צריך לכלול את העבודות הנוספות כפי שסוכם בזמנו :

- א. בג אסבסט
 - ב. בור סוגג גוסף (בבורות סומגיים כ"א כ-12 מ"א)
 - ג. הא חלוקה 60 ϕ כולל כף חלוקה
 - ד. כ-30 מ" אורך קו ביוב אסבסט 4" ϕ
- כ"כ אין עד היום חוזה למבני צבור, והדברים הנ"ל כוחם יפה גם למבני צבור
ויש לקחת את זה בחשבון.

ב ב ר כ ה

רנסיאנסקי
מ.מ. מהנדס מחוז הנגב.

העמק :

- מר גלויברמן שכון ח"א.
- מר אביבי משרד השכון ח"א.
- מר בלף משרד השכון ח"א.
- מר כהן משרד השכון ח"א.
- מהנדס אזור הערבה וסיני.
- חברת אשטרום.
- חברת ש.ה.ל.

יר/אל

[illegible][illegible]

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

3883

24.6.75

20.6.75

לכבוד
משרד הסכום
רחוב הלל 23
ירושלים

א.נ.ג.


הנדון - חשבון חלקי מט. 4 לחוזה מט. 39/46185/73
הקמת 40 יח"ד ב"אוגדה" (שדות ג')

היקף החוזה: 2,326,000.- ₪

440,000.-	1.	עם התחלת הייצור	20% × 2,200,000.-
660,000.-	2.	עם גמר הייצור כולל קביעת אלמנטים של חשל וגדרות	40 יח"ד × 55,000.- × 30%
220,000.-	3.	לאחר גמר יסודות	40 יח"ד × 55,000.- × 80%
220,000.-	4.	לאחר גמר הרכבת קומת גג	40 יח"ד × 55,000.- × 10%
126,000.-	5.	התקנת דרכי גישה	
1,666,000.-		סה"כ	
682,000.-		סה"כ קבלנו	
984,000.-		סה"כ מגיע	

בכבוד רב,

"אשורם" חברה להנדסה בע"מ.



מדינת ישראל

משרד השיכון

ת"א רח' ג' 13 הקריה
טלפון 269211

בנייה בהתיישבות

האריה ~~1077~~

טרפס שנוי חוז

39831

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית
6-6.75
מחוז הנגב

מספר החוזה 5009/40183/75

אל: הגזברות (2)

טאח: המחלקה הארבונית להתישבות, עליות חדשות

א. פרטי זהוי:-

שם המחוז	שם הישוב	שם הקבלן
נגב	חבריה	חב' מוסרס כ"ס

ב. הרכב החוזה הקיים:

הקיים בל	המחוקן בל	השנוי בל
2,200,000	2,326,000	126,000

ג. מחות הטינוי:

התקנת דרכי גישה למקום הבנייה

ד. טעיף תקציבי

50,00,510/04 עליות חדשות

חתימת הקבלן

ד. בן יהודה
חשב המשרד

סגן המנהל הכללי

חתימה

חא"ר

העתיקים

סר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית
סר ג. אביבי, ממנה על עליות חדשות
סר א. בלף, ממנה על חוזים ומכרזים
סר ג. אבנר, ממנה על חוזים ומכרזים
סר א. אבנר, ממנה על חוזים ומכרזים
אגף חוזים ובטחונות הסוכנות היהודית ת"א
גזברות (2)

מדינת ישראל

משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

מינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
תל-אביב, הקרייה.

תאריך: 11.5.75

מספר: 39/46185/75/1457

אל: מר ג. אביבי

מאת: מר א. בלף

משרד השיכון
האגף לבניה כפרית

20.5.75

מחוז הנגב

הנדון: הגדלת / הקטנת חוזה 39/46185/75

העבודה - 40 בתים

המקום - אוגדה

הקבלן - חב' אסטרום בע"מ

מהות השנוי - דרכי גישה

בסך - 126,000 ל"י

- 220,000 ל"י

ס"ה 2,326,000 ל"י

נא להגדיל את החוזה הנדון,

ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך כעוע: -

התקנת דרכי גישה מחומי ואדי לצורך מעבר עגלות ומגורף.

בזה מתבטל מכתבנו מיום 4.4.75 בו בקשנו להגדיל את החוזה בסך 8,000 ל"י
בוספים (ובט"ח 134,000 ל"י) לצורך הובלת מים במשך 10 ימים.

א. בלף

ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים:


מחנרס מחוז - הנגב

הקבלן - חב' אסטרום בע"מ, רח' צירלסון 4, תל-אביב

ר' בניסן חס"ה
18.3.75

בניית אוגדה

ד. נחמיאס
מדור תכנון ומיתוח



בהתאם להמלצת המרכז לתכנון והחלטת הנהלת המחלקה לתכנון הקמת הישובים
בפתח רפיח לפי העקרון של 60 יחידות או 120 יחידות, הוכן התכנון של אוגדה
ל-120 יחידות עם אפשרות לבצע בסלב א' 60 יחידות כמשיכת בפני עצמה.
אולם הביצוע אינו הואט את מחשבת התכנון, במקום לבצע את 40 היחידות
הראשונות סביב המרכז של הישוב מתבצעת הבניה לאורך רחוב אחד בישוב.
יובא, אימא, שכמיה שהישוב יטאר בגבולות 60 יחידות בלבד, נקבל ישוב מחוכנן
לא רציונלי.

אבקשן לזמן את כל הגורמים הנוגעים בדבר כדי להבטיח שבצוע הנ"ל לא
ישנה ביטויים הנוספים.

בברכה,

ב. חומי

העמק: ג. קריין - אגף לתכנון כפרי
י. רוטיאנסקי - מדור תכנון

ט. בלרמן

מדינת ישראל
משרד השיכון
אגף לבניה כפרית

מס' 3283 / 216

באר-שבע, 25 יוני 45

אלי: מר. ח. ג. ג'א
מא: מחלוקת ג'א

הנדון: סוף חלקי מסלול יקום ח'ג'ג
האסדה

3

רצ"ב הננו מעבירים אליך/כמ חשבון חלקי/שמי פס'

לעבודה ר"ג י"ג

במשק / מושב אשדוד

לפי חוזה 30/48185/43 הקבלן אשדוד

על סך - 8649.00

הערות:

לוט: 110 כמות ח"פ

סגור חתום

העתק:

מהנדס אזור ידועה וס'ג

הקבלן אשדוד

מדינת ישראל
משרד השיכון
 אגף לבניה כפרית-

מס' 3983 / 45

באר-שבע, 25.10.45

אל: המנהל הכללי
 מאת: המנהל הכללי

הנדון: התקן ח'ג'ג' יקום ח'ג'ג'
המאכל

3 רצ"ב הנגזר מעכירים אליך/כס חשבון חלקי/שופי פס'

לעבודה הק"מ

במשק / מושב אשכנזי

לפי חוזה 39/44185/43 הקבלן אשכנזי

על סך 8642

הערות:

לושה: ח'ג'ג' ח'ג'ג'

העתק:

מהנדס אזור ח'ג'ג' ח'ג'ג'

הקבלן אשכנזי

מהנדס השטח

20.4.1975

לכבוד
משרד השיכון
רחוב חלל 23,
ירושלים.

א.ב.,

הנדון: חשבון חלקי מס' 2 לחוצה מס' 39/46185/73
תקנה 30 יח"ד "באובדן" (שדות ג')

היקף החוצה 2,200,000.- ל"י

1. עם התחלת הייצור $20\% \times 2,200,000.-$ 440,000.-

2. עם גמר הייצור כולל קביעת אלמנטים
של חשמל וגגות $30\% \times 55,000.-$ 132,000.-

3. לאחר גמר יסודות $10\% \times 55,000.-$ 110,000.-

סה"כ 682,000.-

סה"כ קבלנו 517,000.-

סה"כ מביק 165,000.-

בכבוד רב,

"אשרוס" חברה לחנדטה בע"מ.

האוצר
מס' חשבונית סולם
מס' האישור 1661/9

20.4.75

3983/-1226

לכבוד
חב"א אשדוד בע"מ
רח' צירלסון 4
תל - אביב

א. ג. ,

הנדון: הקמה 40 יח"ד באוגדה חוקית מס' 39/46185/73

נא לבטח לביצוע הקמה 40 יח"ד באוגדה בהתאם לפירוט הר"מ.

1. מחיה הטבנה - 45,352.-

2. דוד השמלי 120 ליטר - 614.-

3. יביקה בטון בעובי 8 ס"מ על התקרה:
40.15 לי"א 65 מ 2,610.-

4. חוספת ברזל מפייחוח" לקבלת כחות אפקיים
לפי חכניה מאשרת ע"י צ.ה. 285.-
48,861.-

חוספת 10% עבור רצועת עזה
חוספת הובלה
4,886.-
1,650.-
55,397.-

המחאה משוערת עבור יסודות
1,100.-
54,297.-

חוספת עבור התיקרות ובלתי נראה מראש
703.-
55,000.-

סה"כ ערך החוזה $55,000 \times 40 = 2,200,000$ לי"א
מדד מחירים הוא ל-31 לינואר 1973

אבקשכם להתקשר עם מהנדס אזור הערבה וסיני מר זיידה לקבלת פרטים נוספים.

האריך להתחלת העבודה יחשב 2.3.75

לכבוד רב,

י. רוסיאנסקי
מ.ס. מהנדס מחוז הנגב

העוק:
מר א. גלויברמן - מנהל א.ב.כ.
מר אביבי
מר א. בלך
מר סלע
מהנדס אזור הערבה וסיני
חבל הנגב ולביש
מר ש. אורבך
מר מוסקאי
מר טרליוק

19.2.73

3984/27581

חל 1 מר בלף

באת 1 א. טלע

הגידון - חכנת חוזה לתקופה 40 יחידות דיור מסיכום 68.6 מ"ר
בשדות ג'

נא להכין חוזה לחברת אשטרום לתקופה 40 יחידות דיור בשדות ג'.
חוזה זה יהיה במסגרת 150 בחיט שהתגבש יזמין בחברת אשטרום בשנת 1973.

להלן פרט המחיר:

1. מחיר המבנה - 45,352.-

2. רווח משלם 120 ליטר - 614.-

3. יבשת בקווי 8 ס"מ על המקרה:
40.15 ליטר 65 מ"2 2,610.-

4. חומת ברזל "מגול" לקבלת כמות
מקיים למי חכנית מאושרת על ג.ח.ל. 285.-

48,861.-

חומת 10% עבור רבוקה קזה 4,886.-

חומת חובלה 1,650.-

55,397.-

החמת טעוקה עבור ימורים 1,100.-

54,297.-

חומת עבור המיקרום ובלתי נראה מראש 703.-

55,000.-

סה"כ ערך החוזה: 2,200,000 - 40 x 55,000

מדד באירים הוא ל-31 לינואר 1973.

הנאי המסלום ויתר פרטל החוזה בהתאם למכתבי 19.2.73...
בקשר לחכנת חוזים לחכ" אשטרום לתקופה 150 יחידות דיור
בשנת המקצב 1973.

בכבוד רב,

א. טלע

התקין מר ש. אבני

מר א. גלויברמן

מר י. טל

מר ג. אביבי

מר י. טרבלסי

מר א. טרבלסי

חברת אשטרום

מקצב חוזה
מ. א. טלע

מדינת ישראל

39831

משרד השיכון
/אמ"ל לבניה לדולת

תאריך: 4.4.75

מספר: 39/46185/72/982

משרד השיכון
מינהל לבניה כפרית
ויישובים חדשים
תל-אביב, הקרייה.

משרד השיכון
המנהל לבניה כפרית
תל-אביב, הקרייה
13.4.75
מחוז הנגב

(Signature)

אל: מר ג. אביבי

מאת: מר א. בלף

הנדון: הגדלת/הקטנת חוזה 39/46185/72

העבודה - תקפת 40 בתים

המקום - מושב ארבה

הקבלן - חב' אשדורס בע"מ

מהות השנוי -

בסך - 134,000 ל"י

- 2,200,000 ל"י

ס"ה 2,339,000 ל"י

נא להגדיל את החוזה הנדון,

ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך בצוע: -

סדור דרכי גישה נכדי לאפשר הקמת המבנים וע"ח הובלת מים יש להגדיל את ההזמנה בסך הנ"ל.

(Signature)

א. בלף
ממונה על חוזים ומכרזים

העתקים: הנגב
מהנדס מחוז -

הקבלן - חב' אשדורס בע"מ

20.3.75

לכבוד
משרד התיכון
רחוב הלל 23
ירושלים

,.2.8

הנדון: חשבון חלקי מט' 2 לחוזה מט' 39/46186/73
תקנת 40 יח"ד "באוגדה" (שדות ג')

חיקף החוזה: 2,200,000.- ל"י

1.	עמ' החלפת הייצור	2,200,000.- x 20%	440,000.-
2.	עמ' גמר הייצור כולל קביעת אלמנטים של השמל ובגרות	3 יח"ד x 55,000.- x 30%	49,500.-
3.	לאחר גמר יפודות	5 יח"ד x 55,000.- x 10%	27,500.-
	סה"כ		517,000.-
	סה"כ קבלנו		440,000.-
	סה"כ מגיע		77,000.-

בכבוד רב,

"אשורוס" חברה להנדסה בע"מ.

האוצר
מס' חשבונו: פולם
מס' האישור: 2661/9

CV. 1.0

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

מדינת ישראל

משרד השיכון

פר/11/1975

שבט השל"ה
1975 ינואר 42/75

אל: מר י. רוסיאנסקי מהנדס מחוזי לבנייה כפרית מחוז הנגב

הנדון: פרוגרמה לבנייה - מושב אוגדה
תקציב 1975

בשנת התקציב 1975 ייבנו במושב אוגדה המבנים הבאים:-

(1) מבני מגורים

40 יח"ד סיפוט איטרום
מקלחים עורשיים בהחאם לדרישות צה"ל

(2) מבני ציבור

~~מרכז קופקטי כולל~~

צרכניה

מועדון

גן ילדים

מזכירות

מרפאה, סיפת חלב

בית גנרטור

מחסן נשק

3968

3969

3970


(3) עבודות פיתוח

הכשרת השטח

גדר בטחון ותאורה

רשת חשמל

3971



בכבוד רב

י. אבני

סגן המנהל הכללי

העתיקים

מר א. גלויברמן, מנהל האגף לבנייה כפרית

מר ג. אביבי, ממונה על עליות חדשות

מר א. כלף, ממונה על חוזים ומכרזים

מר י. גודוביץ, ממונה על התכנון הכפרי

מר י. פס, ממונה על הבנייה הבטחונית

מר א. סלע, כאן

מר י. זיידה, מהנדס מחוז הנגב והערבה

מר מ. שמיר הסוכנות ירושלים

מנהל חבל הנגב חס כנות היהודית האר שבע

אג"מ הגמ"ר מטכ"ל צה"ל

תנועת המושבים
