

7

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

10-7

משרד

משרד הבינוי והשיכון

גילה, אוסיה, ז'בוז

8.79 - 12.81

תיק מס'

10-7

מחלקה

מחלקת



שם תיק: בניה עירונית -פרוגרמות - גילה - מוסדות ציבור

מזהה פנימי

גל-7/15487

מזהה פריט 000qgxq

כתובת: 2-113-2-1-4

26/12/2018

תאריך הדפסה

ב' כשנת תשמ"ב
28 בדצמבר 1981

אל:-
מר א. גדלביץ
ס/מנהל המחלקה השכנית

א.נ.ג.

הנדון:- הגדלת חוזה לעבודות עפר, סורגים לחלונות ולרצוף במקלט
בביה"ס בגילה שלב ד' - יובל גד - חוזה 40/66572/80

1. רצ"ב חשוב כמויות לעבודות עפר בשטח ביה"ס, בן ילדים בגילה שלב ד' המבוצעים ע"י חב' יובל גד כשהן כדורות ומאושרות על ידינו.

הכמויות הנ"ל הינן כמויות סופיות שלפיהן יש לבצע ההגדלה כדלקמן:-

א. היקף חוזה לעבודות עפר	=	405,190.-	שקל
ב. הגדלה בגין עבודות עפר נוספות שכוצעו בסך	=	381,944.20	"
הקטנה בגין עבודות עפר שלא בוצעו בסך	=	36,431.97	"
סה"כ להגדלה	=	345,512.23	"

ג. תנוות התנאי

תקומת הביצוע לעבודות העבר לפי החוזה - 3 חודשים.
המלצתי לתקומת הביצוע לעבודות הנ"ל הינה כדלקמן:-
עבודות עפר שנעשו בשטחי הבנינים - חודש ימי עבודה שהחלה כחאריך 7.2.81
(חאריך מסירת השטח) יתר העבודות שבוצעו בשטח תקומת הביצוע הינה 2 חודשים
החל מחאריך 5.11.81 ועד לחאריך 5.1.82.

ההמסקה בעבודות העפר ס- 7.3.81 ועד 5.11.81 נובעת מכך שהקבלן לא יכל לעבוד
בשטח הפתוח בגלל המצאות מתקנים, חומרים ואכיזורים של קבלנים אחרים שביצעו
עבודות בנייה סביב מבנה ביה"ס ובן הילדים.

2. כ"כ יש לבצע הגדלה עבור ביצוע סורגים לחלונות בקומות העליונות במבנה הכיתות בביה"ס
וכן ביצוע ריצוף במקלט (הכל זהה למחירים ולהחלטות הביצוע שניתנו גם עבור ביה"ס
שנבנה ע"י יובל-גד כרמות) - על פי בקשתה של עיריית ירושלים.
המחירים מאושרים ע"י משרד גדיש ומטהכ"ש ומעודכנים לאוקטובר 81. ראה דף הישוב כמויות
רצ"ב והצעת מחירי הקבלן המאושרים.

ב ב ר כ ה

פ. אברטוביץ
ראש צוות ירושלים

העמק:-

מר ס. קיטנר.
גב' ס. כרוור.
תיק פרוייקט.

of good made
in 1900

of M. Street
London

1899

of good made in 1900, of good made in 1900

1. of good made in 1900, of good made in 1900

of good made in 1900, of good made in 1900

of good made in 1900, of good made in 1900

of good made in 1900, of good made in 1900

of good made in 1900, of good made in 1900

of good made in 1900, of good made in 1900

of good made in 1900

of good made in 1900, of good made in 1900

of good made in 1900, of good made in 1900

of good made in 1900, of good made in 1900

of good made in 1900, of good made in 1900

of good made in 1900, of good made in 1900

of good made in 1900

of good made in 1900

of good made in 1900



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

מחלקת לשרותי הנדסה
والمرة الخدمات الهندسية

ירושלים יב"ב בסיון חשמ"א
14 ביוני 1981

פרוטוקול ישיבה על תכנון חטיבת בניינים בגילה בב - 9.6.81

השתתפו: א. ורון - מש"הש (משרד אוליניק)
מ. לופנפלד - אדריכל
י. סורוקו - שרותי הנדסה
י. קאלק - שרותי הנדסה
א. פדר - מח"חינוך
יח"בטיחות - הוזמן ולא הופיע

א. ורון מודיע שעבודה נמצאת בשלב לפני מכרז. במכרז יוכלו עבודות כדלקומן:
בנין חטיבת (בלי מנהל ומעבדות), פתוח לא יבוצע חוץ צאישור קרקע ב - 4.0 מ"ר
וחב סביב הבנין.

י. סורוקו דורש להשלים בשלב זה לפחות תכנון של פתוח.
מ. לופנפלד לוקח על עצמו לזרז תכנון פתוח.

כדלקומן השרות לתכנון מקובלות על הצדדים שיתוקנו לפני המכרז.

1. דלת כחה - יש להשלים פרטים לפי פנ-ו (עיריית ירושלים)
 2. חלון עליון מעל דלת כחה ובין כחה ומסדרון - סוכס להחליף זכוכית לחומר בלתי ש שביר "פרספקס".
 3. דלתות כניסה מאלומניום - יש לבצע שדה ההחלף מזכוכית מסוריינת, כנף עליון קבוע יש לסרג.
 4. סורגים לחלונות - יש לחת פרס בנוסף לחאור. סוכס שסורג יבוצע מפלדה, יש לחת בסורג אחד לכחה פתח מילוט (צריס ואוזניות)
 5. חלון כחה - חכניה של אלומייר יועבר לעיריה.
 6. פרס קירות מורכבים עם פלסות קלקר בפנים יבוצע עם חלל אוירי. (פרס מש"הש)
 7. גג לדריכה - איטום תחת הריצוף יבוצע לפי מפרט.
 8. הריצוף כבי"ס ייעשה לפי דגם 53601 של חמר.
 9. יש לתכנן תאורת מסחוק.
 10. בכל כחה יתוכנן ארון כחה.
- חוכניות אינטסלציה יועברו לעיריית ירושלים בהקדם.


רשם:

י. סורוקו
מנהל מדור פקוח עליון

הפצה:

נוחכים (5)

- מר דוד מלומד - מנהל חטיבת הבינוי
- מר י. שיפטן - מנהל מחלקת החינוך.
- מר ל. קוקוש - משרד השיכון
- מר מ. ברור - משרד השיכון

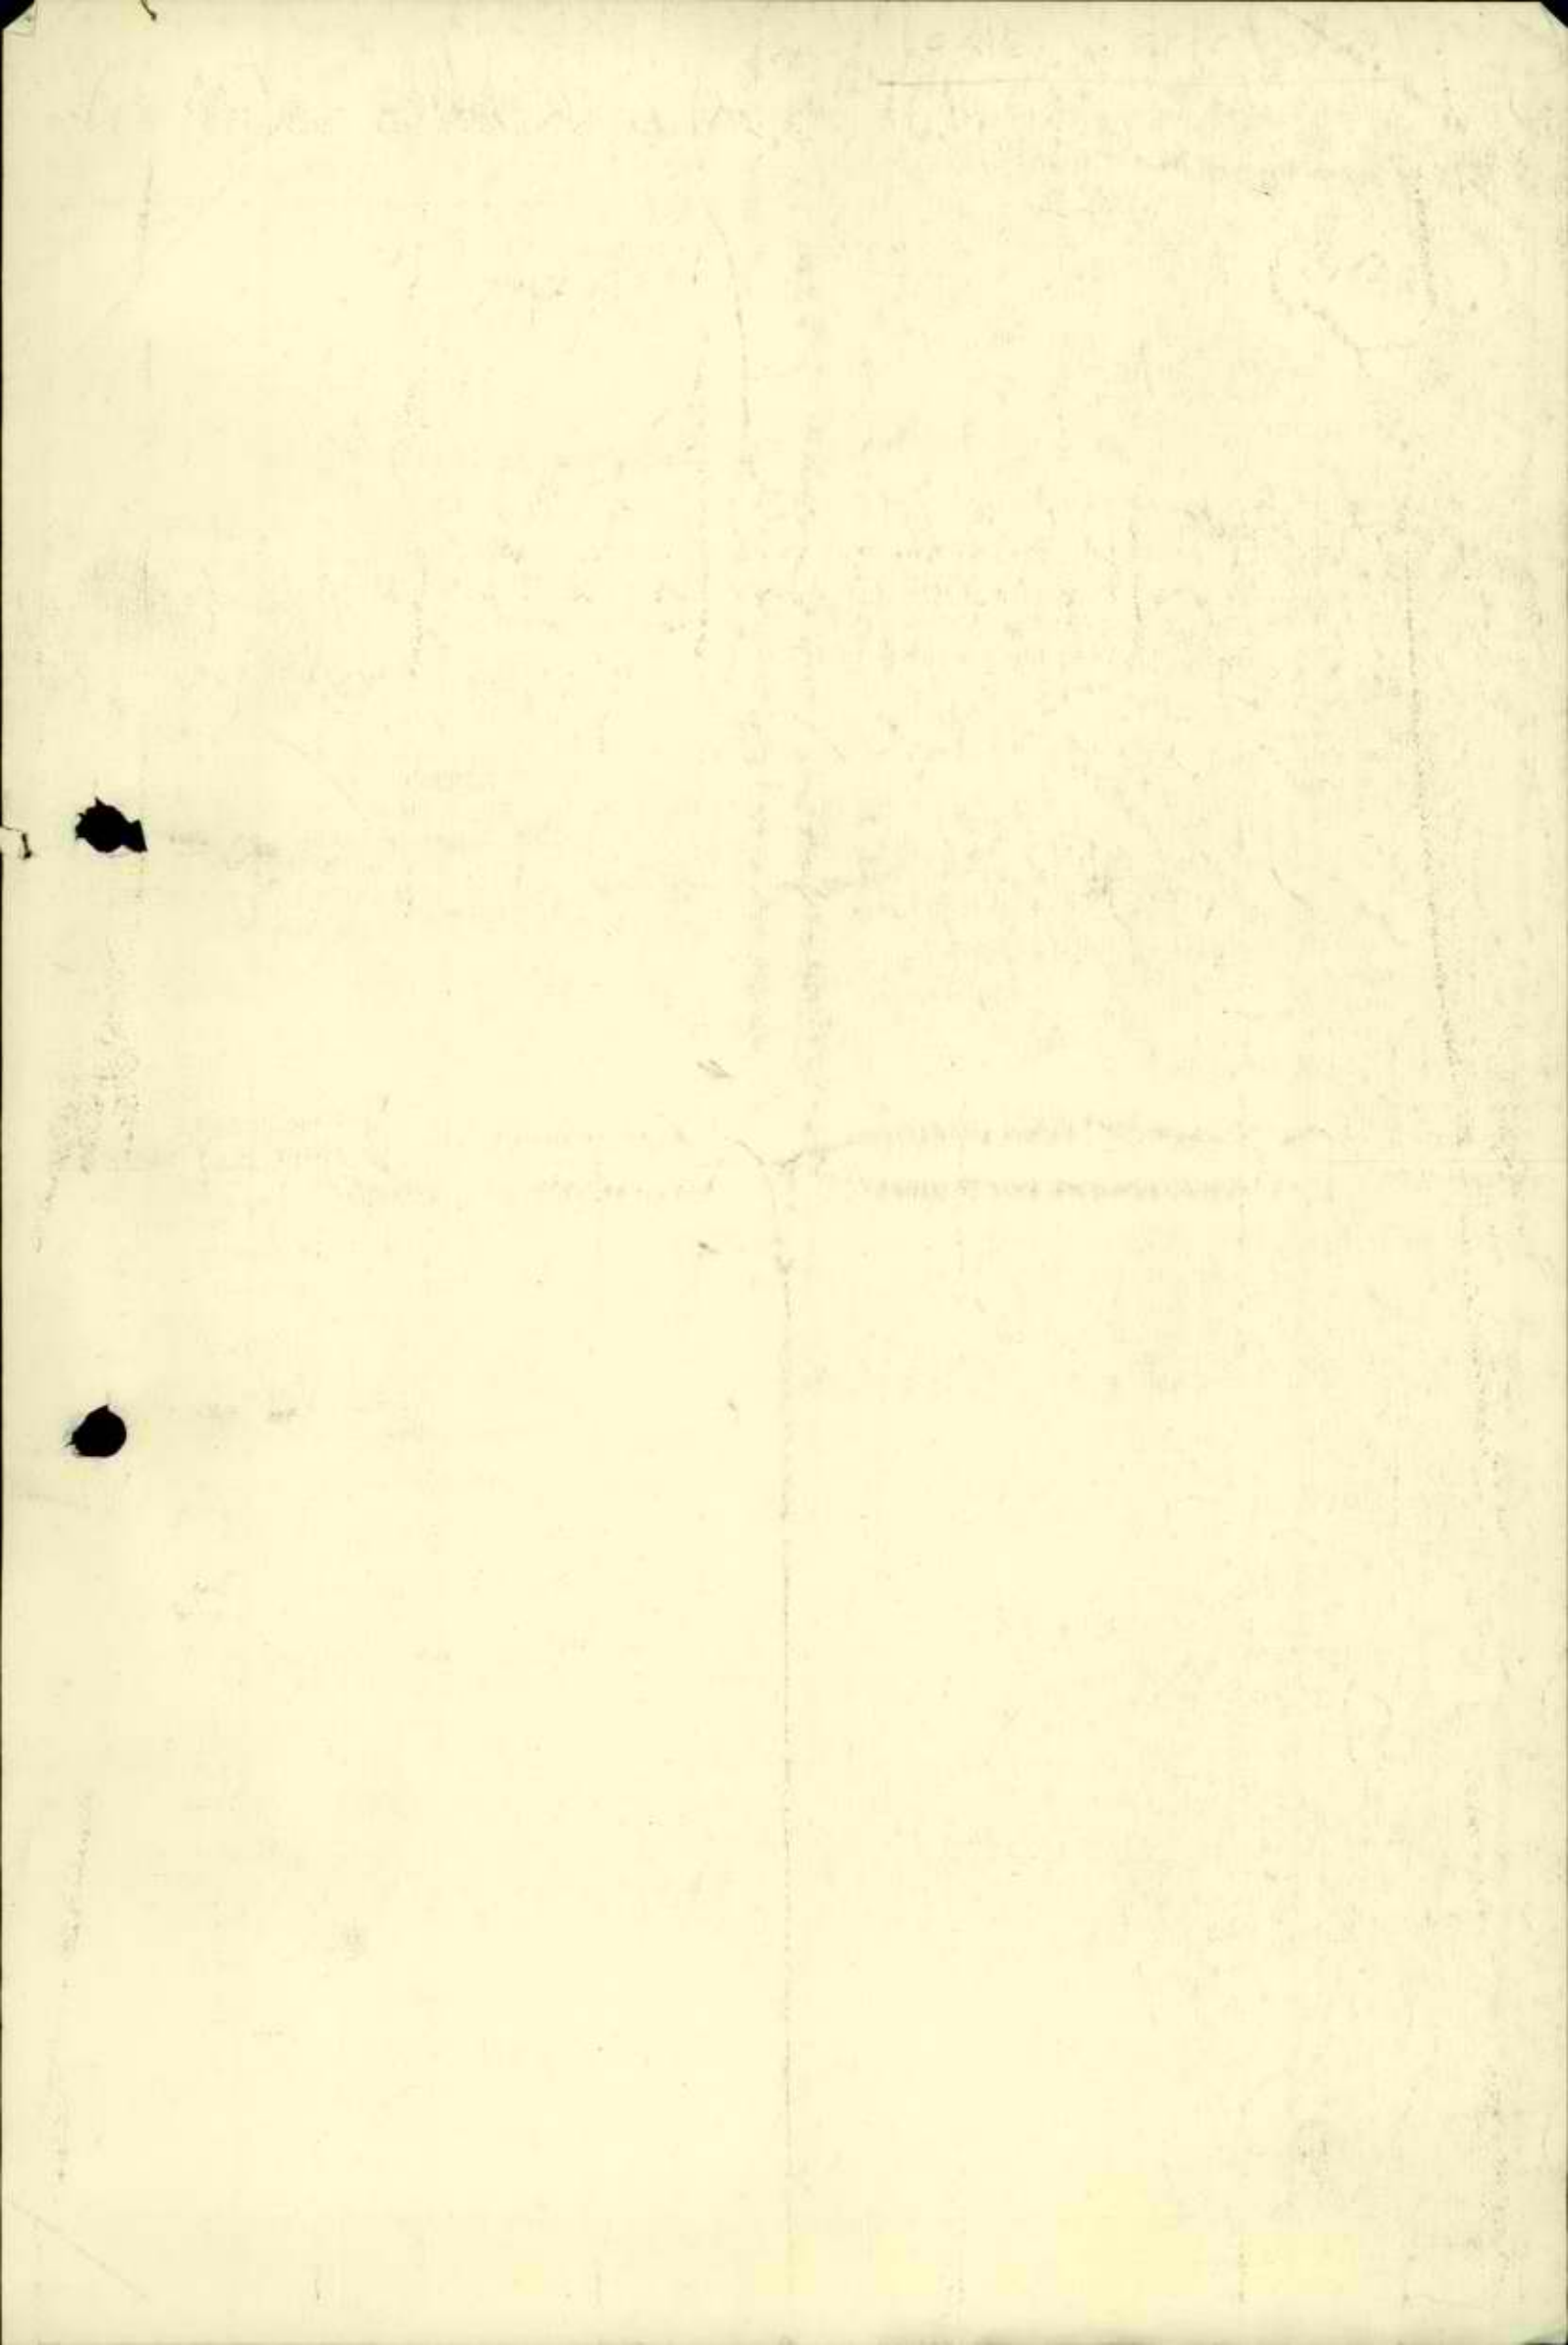

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

אגף פרוגרמות

תאריך: 15 ביוני 1981

אגף הבינוי והשיכון

אלן א. רינג - המנהל הכללי

הצדקה שטח מסחרי בגילה ליד המרכז המסחרי

על פי בקשתך בוצעה בדיקה יחד עם מחוז ירושלים מה ניתן לעשות עם כ- 20 חנויות בשטח של כ- 700 מ"ר, לאורך כביש מס' 2 והסובילות מצומת פת-גילה למרכז המסחרי של גילה הנמצא בבנייה ע"י ש"פ.

קיימות שתי בעיות - סך השטחים הסחורים להכונן גילה, השטחים הסחורים ליד המרכז המסחרי.

דעו, כאשר בבדיקה הפרוגרמה למרכז גילה, הובח כי "העיר" גילה, מצרייה ליד ירושלים וכמו הובח כי בעתיד יבנה המרכז המשני הדרומי, עם נגישות גבוהה לגילה (כביש מס' 4). לצורך השוואה בלקחו בתורים מיטובים מגוש דהם כמו למשל בת-ים, המצויה ליד תל-אביב. המקום שבחיד אז היה 0.35 מ"ר לכל גוש (כלומר כ- 12,000 מ"ר לשטחים סחורים, חנויות, משרדים וכו').

אין ספק שכיום סביר להניח כי מקדם זה גבוה בצורה משמעותית, וסביר יותר להניח מקדם של 0.15 - 0.2 מ"ר לגוש. כלומר שטח של כ- 5,250 מ"ר - 7,000 מ"ר.


זאת אומרת לפי הפרוגרמה הקיימת כיום, רצוי וביתן לרכז רב השטח הסחיר והמסחרי במרכז המסחרי הצבחה. יחד עם זה, קיימות היום מספר פובקציות המתגוררות בדירות, ומיקומן אינו אופטימלי. כך למשל, המשרד האזרחי ותחנת המשטרה, המש"מ.

קיים "ביקוש" לתוספת משרדים שעלולה להתמקם בדירות שכורות. למשל - עמידר ומבזלת הפוריקט השכונתי. שירותים אלה, לא מסוגלים לרכוש משרדים במרכז המסחרי מחוסר תקציב, אך מסוגלים לרכוש דירות בשוק החופשי. יתרה מזאת, מיקום ממוזר של פובקציות אלה, לא רק שאינו מחזק המרכז, אלא מחליש אותו, ללא תועלת לשירותים אלה.

הן מוצע כדלקמן:

1. לא למכור החנויות הב"ל, אלא להשכירן במחיר כלכלי לשירותים שונים ולא למרצרי מזון או דומיהם.
2. להעביר החנויות לניהול או לבעלות החברה הכלכלית לירושלים בתנאים לפי סעיף 1.
3. לדרוש מעיריית ירושלים לאסור פתיחת שירותים פרטיים או ציבוריים בדירות המיועדות למגורים (בפתוח כבר מרפאה פרטית בבית 101).
4. לדרוש מהשירותים הקיימים בדירות להחזיר הדירות ולאכלסן לפי יעודם המקורי.
5. לאפשר פתיחת חנות או שתיים ליד הצומת כשירות למאות הדיירים בסביבה הקרובה.
6. יש לבדוק האפשרות להקצות חנות אחת כבית כנסת לשלב ג', כיוון שאין כיום תכנון לביצוע בית כנסת ולא במוות הנדאה לעין.

2/...

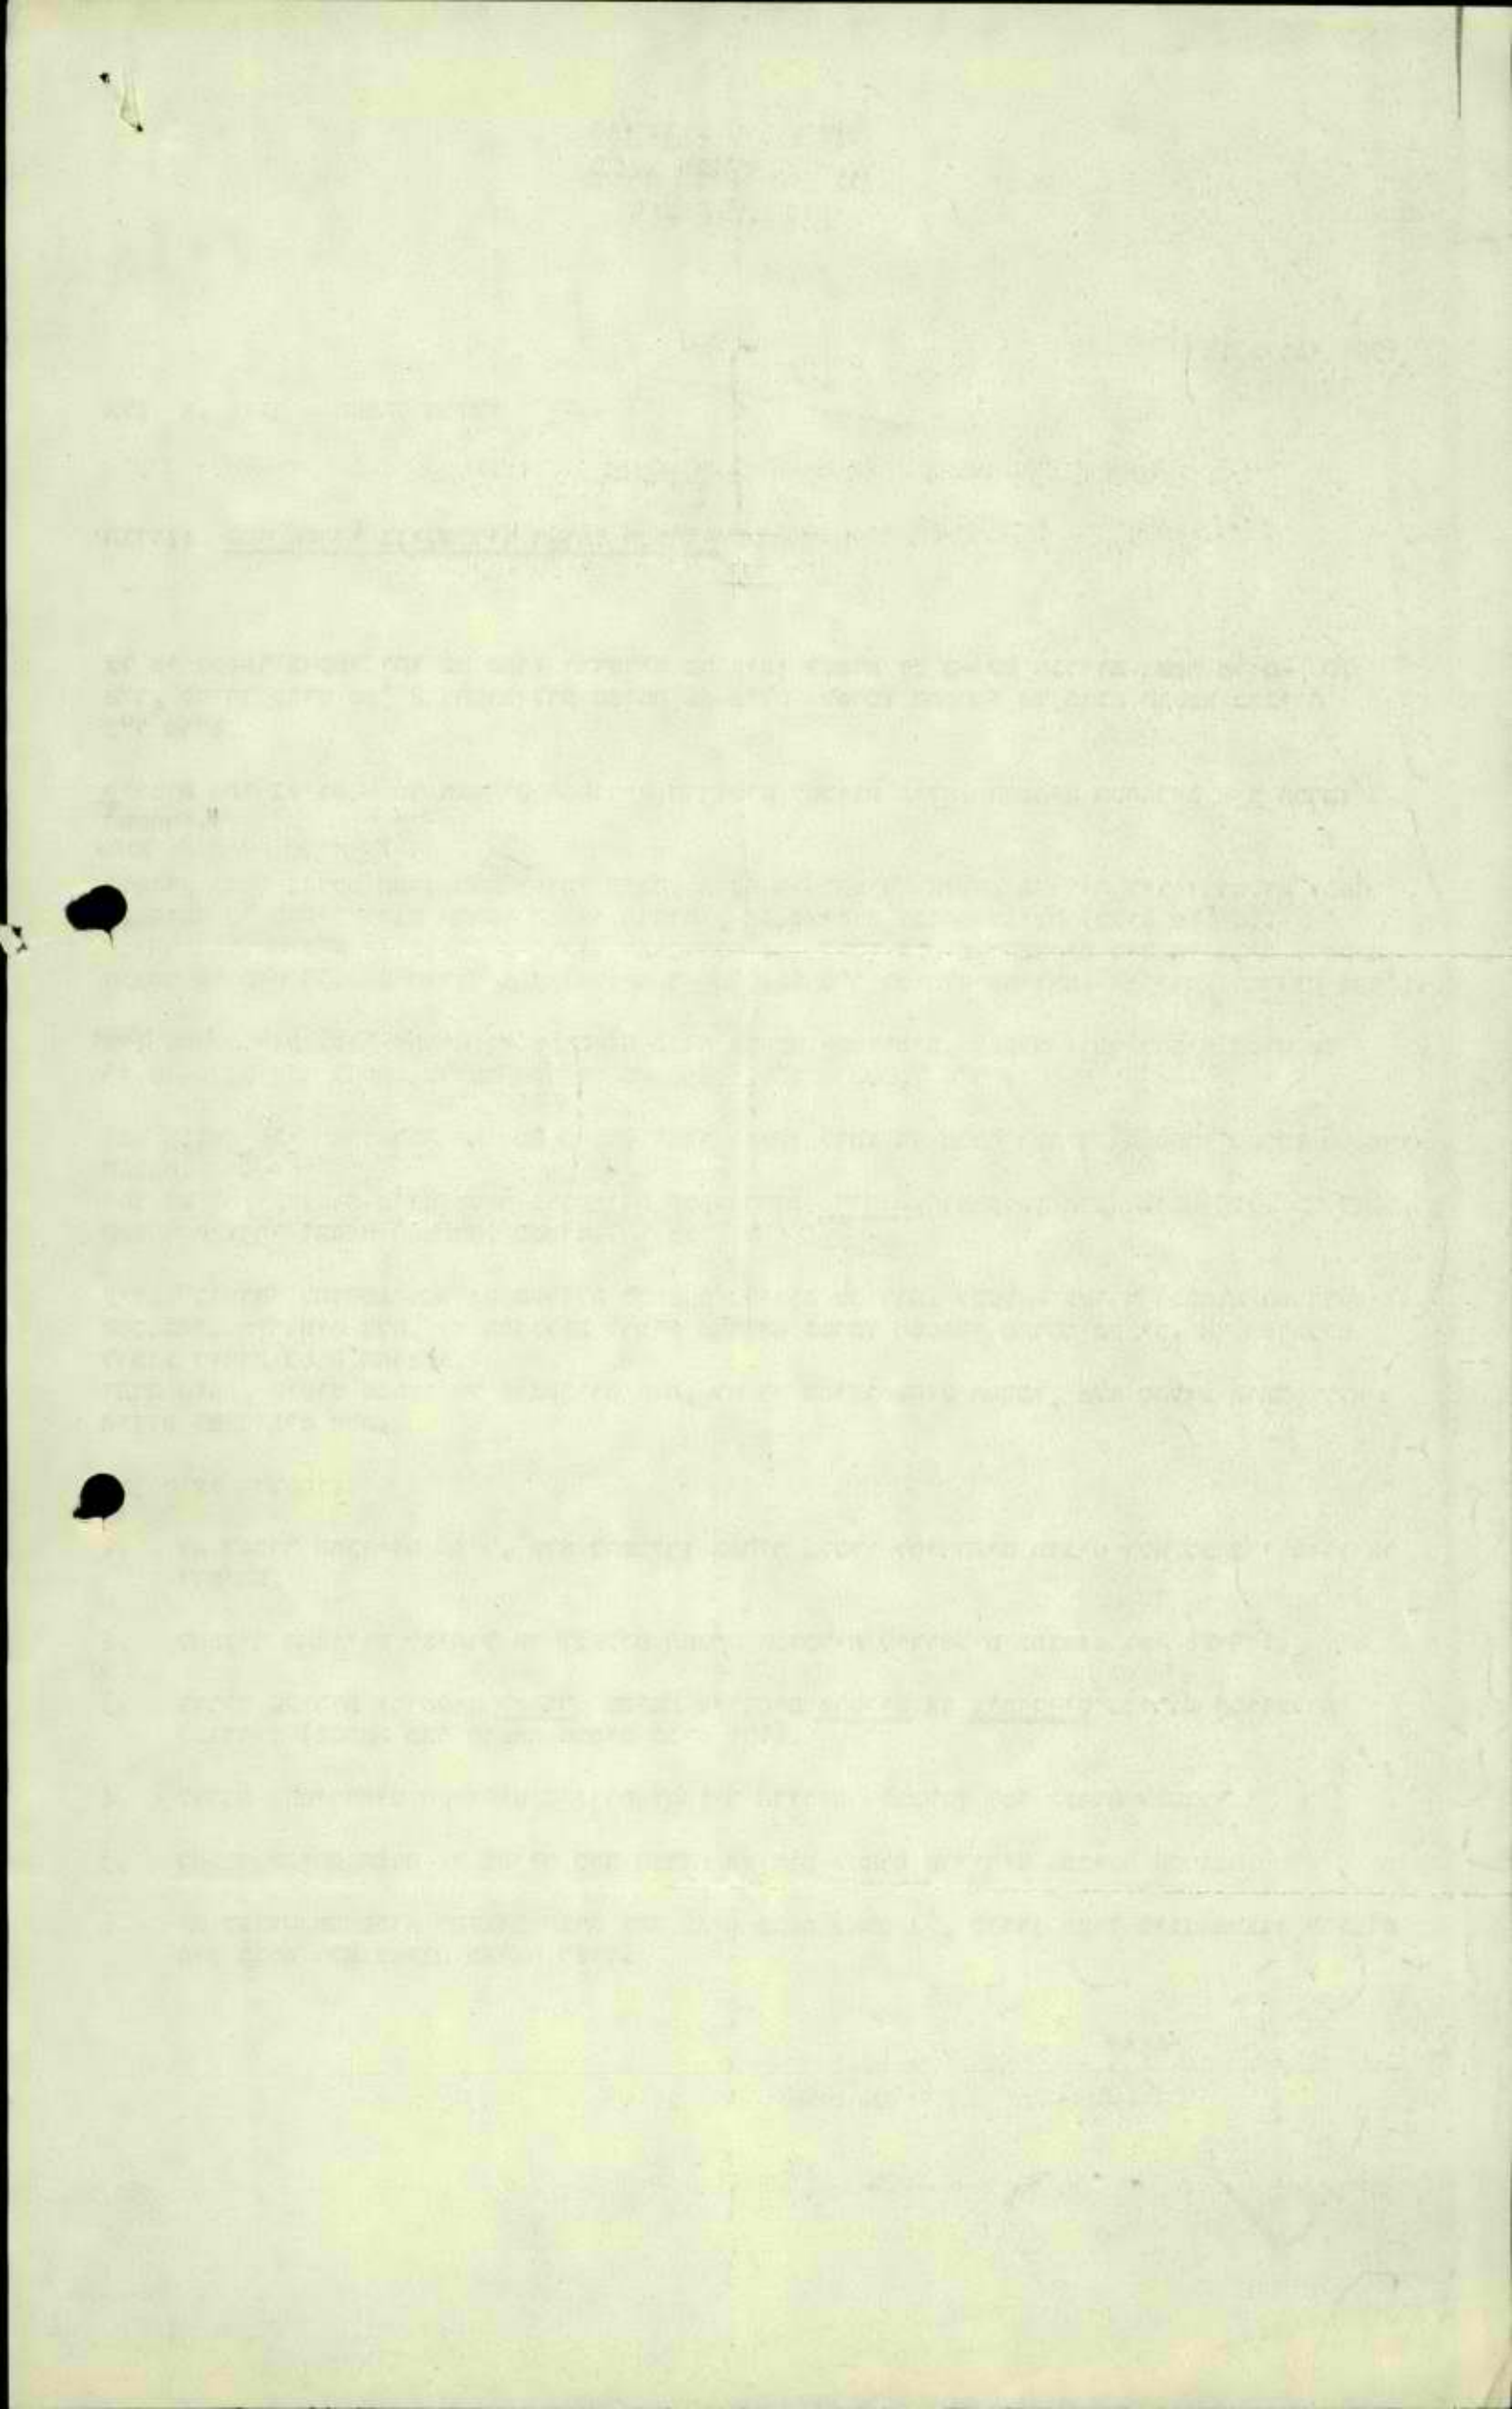

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
אגף פרוגרמות

תאריך:

- 2 -

מכנית פעולה זו תחזק המגמה הקיימת כיום, כאשר קיים משרד המפקח במקום ומשרדי מ"פ.
כמו כן יש לקחת בחשבון את התנגדות העירייה והתנגדות התושבים לשינויים. עלות השינויים
בתבונה שנקבל היתר וזאת כאשר דירות משמשות ליעד אחר.

ב ב ר כ ה

זאב ברקאי
מנהל אגף פרוגרמות

העתק א. גמף, מנהל אגף דיור וצרכים

א. תייר, מנהל מחוז ירושלים

ד. בן-אלול, ממרבה על מ"צ - כאן

ב. דביר, מנהל מחלקת פרוגרמות - מחוז ירושלים

ד' 1. קמול

ח' בחסוד השמ"א
10 ביולי 1981

אל: מר מ. מרחב, ס/מנהל אגף תכנון והנדסה

א.נ.נ.

הנדון: גילה - בית ספר מקיף חטיבה בצננים

מצ"ב מעבירים אליך את החומר הרוש לצורך הוצאת המכרז:

1. דף כחול.
2. הוראת ביצוע.
3. הנחיות ביסוס.
4. תכנית כללית של השטח.
5. 6 טטים תכניות ו-12 כתבי כמורה.
6. אומדן מחירים.
7. לוח זמנים (תאריך התחלה וגמר). עלינו לציין כי בשלב זה לא נוציא למכרז עבודות פיתוח השטח וחלק מעבודות העפר, וזאת מחוסר וקציב.

אבקשם לציין במכרז, כנ"ל של החוזה, שהקבלן מחייב לבצע את עבודות- הפיתוח החיר 5 חודשים לפני מועד גמר תקופת הביצוע שבחוזה לפי מחירו משהב"ש ברוק באותו עת.

ב ב כ ה

ל. קוקרש
מנהל המלקה הטכנית

העחק:

מר א. חייך
גב' ס. ברוור ✓
גב' א. רוזנברג
מר א. אולניק
חיק חוזה

והבינורי

י"ב כחמוז השמ"א
14 ביולי 1981

סיכום ישיבה בנושא: פעילויות ספורט בגילה

השתתפו: ב. דכיר, א. אולניק, ט.ס. ברור, גיל

סוכמו

1. הספורט בשטח המקיף הראשון לא ישונה רהיינו

2 מגרשי טניס
1 מגרש כדורסל
1 מגרש משולב
מחקני אתלטיקה קלה

2. מר א. אולניק ידאג להזמנת מדידות בשטח בין שלב ד' לשלב כ' עפ"י מפת פעילויות לשם הזמנת חכנון מרכז ספורט שכונתי לפי הפרוגרמה מה-13.5.81.

רשם: בני דכיר
מנהל יח' מרוגורמה

SECRET

NOV 1951
SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

1944
1945
1946
1947
1948
1949

1948

1949

1948
1949
1950
1951
1952

1953

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1971

1972
1973
1974

1975

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

ח' בחמוז השמ"א
10 ביולי 1981

אל: מר מ. מרחב, ס/מנהל אגף הכנון והנדסה

א.נ.נ.

הנדון: גילה - כיה ספר מקיף חטיבת בפניים

מצ"ב מעבירים אליך את החומר הרוש לצורך הוצאת המכרז:

1. דף כחול.
2. הוראה ביצוע.
3. הנחיות כיסוס.
4. חכניה כללית של השטח.
5. 6 סטים חכניה ו-12 כחבי כמויות.
6. אומדן מחירים.
7. לוח זמנים (תאריך התחלה וגמר). עלינו לציין כי בשלב זה לא נוציא למכרז עבודות פיתוח השטח וחלק מעבודות העפר, וזאת מחוטר תקציב.

אבקשכם לציין במכרז, כנתאי של החוזה, שהקבלן מתחייב לבצע את עבודות-הפיתוח החזר 5 חודשים לפני מועד גמר הקופת הביצוע שבחוזה לפי מחירון משהב"ש בחוקף באותה עת.

ב ב ר כ ה

ל. אוקוש

מנהל המחלקה השכניה

העחק:

מר א. תייר
גב' מ. כרוור
גב' א. רוזנברג
מר א. אולניק
תיק חוזה

תאריך : 23.6.81
מספרנו : 098

לכבוד
אדריכל גיורא גמרמן
רח' פנקס 51
תל - אביב 62 261

ר ש ו ס
מבלי לפגוע בזכויות

א.נ.א

הנדון : מכתב מס' 83 מיום 18.6.81
בי"ס מקיף ומתנ"ס בגילה - הכנון ופיהוח.

נדהמתי לקבל מכתבך הנ"ל וכנראה נפלה טעות בהאום עם שוחפך, אדרשכל
מ. לופנפלד.

1. ברצוני להזכירך שנפגשתי עם מר לופנפלד לפני כחודש ובאותה פגישה
נמסרו הנושאים הבאים :-

א. לאחר פרוק השותפות "כהנוביץ-שטרית", הוחלט ע"י בורר מוסכם
שהפרויקט "גילה" יועבר לטיפולי.
ב. שאין כל כוונה מכל הצדדים לפגוע בהמשך הטפול בפרויקט, ושבאפשרותי
לספק לכם ולמשרד השכון את כל החומר הדרוש להמשך העבודה.

2. באותה פגישה, התבקשתי ע"י מר לופנפלד להכין בדחיפות עבודות עפר
באזור ביה"ס. העבודה הוכנה תוך 48 שעות ולצעמי לאחר פניתי לגב'
מירי ברזר, ממשרד השכון, נמסר לי שאין צורך בכל הקשור בעבודות
הפיהוח בשלב זה, בגלל חוסר בתקציב.

3. במקביל לפגישה הנ"ל, נפגשתי בשטח האחר עם מתאם הפרויקט, ולאחר
שנמסר לי על שינויים שנעשו במשך ביצוע עבודות הפיהוח, נלקחו על
ידי כל הנתונים בשטח, בכדי לעדכן את ההוכניות המקוריות.

4. חבל שלפני פניחך בכתב למשרד השכון ולעו"ד א. שקד, לא פניה אלי
שלפניה, בכדי לשחף אותי בבעיות כגון: כיבוי אש וכו'.

אי לכך אינני מקבל את הפיסקה במכתבך :
"נבקשכם לרשום לפניכם שאם תוך שבוע ימים לא תסכמו את הנושא ביניכם
ותגשו בדחיפות לביצוע עבודתכם - נראה עצמנו חפשיים לבצע העבודה
בעצמנו ו/או באמצעות משרד אחר."

נדהמתי לקרוא הקטע :
"בנוסף לכך אנו שומרים לעצמנו הזכות לתבוע מכם כל הנזקים שנגרמו/שיגרמו
לנו ו/או לכל צד שלישי בגין מחדלכם."

תאריך: 16.6.00
מספר: 920

לכבוד
הוועדה המקומית לתכנון
וע"מ
של - הרצליה

ת.ד. 920
התחנה המרכזית

הצעה: הצעת תוכנית
לשינוי תכנון - התחנה המרכזית

הצעה זו נועדה להשלים את תוכנית התחנה המרכזית, כפי שהוגשה, ובהתאם
לפרט:

1. לשנות את תוכנית התחנה המרכזית על ידי הוספת שטח נוסף לתחנה
המרכזית -

א. שטח זה יכונה "השטח החדש", ויהיה בגודל של כ- 10 דונם.
השטח ייבנה על ידי הבעלים.

ב. שטח זה ייבנה על ידי הבעלים ויש להגיש תוכנית בנייה
ע"פ חוק התכנון והבנייה, תש"נ-1970.

2. לשנות את תוכנית התחנה המרכזית על ידי הוספת שטח נוסף לתחנה
המרכזית, שטח זה יכונה "השטח החדש", ויהיה בגודל של כ- 10 דונם.
השטח ייבנה על ידי הבעלים.

3. לשנות את תוכנית התחנה המרכזית על ידי הוספת שטח נוסף לתחנה
המרכזית, שטח זה יכונה "השטח החדש", ויהיה בגודל של כ- 10 דונם.
השטח ייבנה על ידי הבעלים.

4. לשנות את תוכנית התחנה המרכזית על ידי הוספת שטח נוסף לתחנה
המרכזית, שטח זה יכונה "השטח החדש", ויהיה בגודל של כ- 10 דונם.
השטח ייבנה על ידי הבעלים.


5. לשנות את תוכנית התחנה המרכזית על ידי הוספת שטח נוסף לתחנה
המרכזית, שטח זה יכונה "השטח החדש", ויהיה בגודל של כ- 10 דונם.
השטח ייבנה על ידי הבעלים.

6. לשנות את תוכנית התחנה המרכזית על ידי הוספת שטח נוסף לתחנה
המרכזית, שטח זה יכונה "השטח החדש", ויהיה בגודל של כ- 10 דונם.
השטח ייבנה על ידי הבעלים.

אין לי מנוס מהתחושה (ואינני בטוח שהינה טוביקטיבית) שהמכתב הנ"ל
לא בא לטרה את טובת העניין וטובת המזומין. משרד הבינוי והשכון, אלא
אינטרס של צד אחר.

בכבוד רב,

סילבאן שטרית



העתיקים ז-

משרד הבינוי והשכון - מחוז ירושלים.

עו"ד א. שקד

גב' מירי ברוור - משרד השכון ✓

מהנדס אורי - משרד אשר אולניק י"ם

עו"ד י. בן-טנחם

התוכנית מיועדת לתלמידי תיכון (מחזורי הלימודים השונים) ונושאת את השם "תוכנית הלימודים השונים".



התוכנית מיועדת לתלמידי תיכון (מחזורי הלימודים השונים) ונושאת את השם "תוכנית הלימודים השונים".

תוכנית הלימודים השונים

21/6/81	נתקבל
138	חתימה
	לטיפול

31 PINKAS ST. TEL-AVIV 62 201 ISRAEL • TEL. 45 80 13 • פ"ד 62 201 • רחוב סנקס 31

משה לופנפלד
ג'ורא גמורמן
אדריכלים בע"מ
M. LOFENFELD
G. GAMERMAN
ARCHITECTS LTD.

18.6.81

מס' 83

רשום - מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד ✓ ה' שיטריח מוזיר 7 ת"א 62963	לכבוד ה' כהנוביץ שד' חן 19 ת"א 64071
--	---

א.ג.,

הנחון: ב"מ מקיף ומתנ"ס בגילה - תכנון פיתוח

רשמנו לפנינו השתלשלות העניינים בגין התכנון הנזכר.

ביה"ס חטיבת הביניים יוצא מידידת למכרז וביצוע, כאשר בגין מחדליכם אין באפשרותנו להשלים סופית נושאים שונים כביוב, כינוי-אש וכד'.

נבקשכם לרשום לפניכם שאם תוך שבוע ימים לא תסכמו את הנושא ביניכם וחגשו בדחיפות לביצוע עבודתכם - נראה עצמנו חפשיים לבצע העבודה בעצמנו ו/או כאמצעות משרד אחר.

בנוסף לכך אנו שומרים לעצמנו הזכות לתבוע מכם כל הנזקים שנגרמו/שייגרמו לנו ו/או לכל צד שלישי בגין מחדלכם.

לתשובתכם והחלטתכם המיידית אנו מצפים כתודה מראש.

בכבוד רב,

עוזק: משרד הבינוי והשיכון מחוז י-ם.

עו"ד א. שקד.

ג. גלרמן
אדריכל



יובל גד בע"מ

המסעל: אזור התעשייה, אשקלון, ת.ד. 12, טלפון: 25141-051
המשרד: כן יהודה 99, ת.ד. 3036 תל-אביב, טלפון: 238221

מס' 198/81

כתשוכה נא להוכיח:

תל-אביב, 10 באפריל 1981

לכבוד
מר אברמוביץ
משרד הבנוי והשיכון
מחוז ירושלים

א.נ.

הנדון: אולם - התעמלות בבי"ס בגילה.

אנו מגישים בזאת את הצעתנו להוספת אולם-התעמלות בביה"ס בגילה, בהתאם לתוכנית המצורפת המאושרת ע"י משרד-החינוך.

1.	מחיר אולם - התעמלות :	=	1,680,970.- שקל
	(ראה ניתוח מחירים מצורף)		
2.	חוספת עבור הציבת יסודות :		
	(הכמות למדידה)		
	50 מ"ק × 280 שקל/מ"ק	=	14,000.-
3.	חוספת עבור תקרה-אקוסטית מפח מחורר		
	(לפי דרישה עיריית ירושלים) באולם		
	בלבר:		
	240 מ"ר × 300 שקל/מ"ר	=	72,000.-
	סה"כ		<u>1,766,970.- שקל</u>

הערות :

- מחיר האולם כולל הסקה וצפוי אבן נטורה.
- המחירים מעודכנים למדד פברואר 1981 - 2003.1 נק'.

בכבוד רב,
יובל גד בע"מ
YUVAL GAD LTD.

אולם - התעמלות בגילה

ניתוח מחירים

1. מחיר אולם התעמלות, בהתאם לחוזה 40/54616/65560/79, בי"ס רמות 01, (ללא יסודות, ראה הקטנה מס' 1) למדד אפריל 80 - 942.2 נק"ש:

672,295.- שקל

2. חוספת עבור הסקה לנ"ל:

57,735.-

730,030.-

עידכון למדד פברואר 81 - 2003.1 נק"ש

$$112.6\% = \frac{2003.1}{942.2}$$

822,020.-

1,552,050.- שקל

סה"כ:

3. חוספת עבור היסודות והרצפה, בהתאם

להפחתה בחוזה בי"ס גילה 40-54701/66372/80

80,000.- ש"ח

למדד 8/80 - 1243.3 נק"ש:

48,920.-

$$61.15\% = \frac{2003.1}{1243.3}$$

128,920.-

1,680,970.- שקל

סה"כ לאולם התעמלות :
(לא כולל מ.ע.מ.)

מדינת ישראל



משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: י' בניסן תשמ"א
14 באפריל 1981

מספר:

אל : מר בני דביר
מנהל יחידת הפרוגרמות
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

א.נ.א.

הנדון: תקציב לעבודות פיתוח ביה"ס וגן הילדים
בגילה שלב ד'

בישיבה שהתקיימה בתאריך 13.4.81 ראה סיכום דברים ר"ב, הוחלט לתכנן חכנון מפורט לביצוע עבודות הפיתוח באתר שכנדון, וזאת לאחר שהורדו מספר עבודות לצורך הקטנת היקף התקציב.

האומדן המעודכן לאחר כל ההורדות מסתכם כדלקמן:

שקל	1,850,000	1. עלות הפיתוח לביה"ס
"	350,000	2. עלות עבודות השקיה לביה"ס ואדמת גן
"	570,000	3. עלות עבודות פיתוח לגן ילדים
"	550,000	4. עלות עבודות פיתוח כללי (שביל ציבורי קירות שמורים לשביל, תאורת השביל ועבודות עפר)

לאור ההתחייבות של הקבלן ומשרד הבינוי והשיכון לסיים את הביצוע ולהביא את ביה"ס לתפעול לקראת שנת הלימודים הקרובה דהיינו 1.9.81,

הינך מתבקש לדאוג לתקציב המפורט לעיל. היות והזמן העומד לרשות הקבלן הינו קצר ביותר אודה לך באם תואיל לזרז תקציב זה במיוחד.

בכבוד רב,

מ. אברמוביץ

ראש צוות לפקות ותכנון ירושלים

העתקים: א. תייר, מנהל המחוז
ל. קוקוש, מ"מ מנהל המחלקה הטכנית
א. גדלביץ, סגן מנהל המחלקה הטכנית
מ. ברור
תיק פרויקט

STATE OF TEXAS

COMPTROLLER GENERAL

REPORT

FOR THE YEAR ENDING

1955

REPORT OF THE COMPTROLLER GENERAL
FOR THE YEAR ENDING
1955

REPORT OF THE COMPTROLLER GENERAL FOR THE YEAR ENDING 1955

1955

The Comptroller General has the honor to acknowledge the receipt of the report of the State Auditor for the year ending 1955, and to state that the same has been reviewed and found to be correct.

The following is a summary of the report of the State Auditor:

1. Total amount received from the State Treasury, \$100,000,000.
2. Total amount paid to the State Treasury, \$95,000,000.
3. Total amount of the State Treasury, \$5,000,000.
4. Total amount of the State Treasury, \$5,000,000.

The report of the State Auditor for the year ending 1955 shows that the State Treasury has received a total amount of \$100,000,000, and has paid a total amount of \$95,000,000 to the State Treasury.

The total amount of the State Treasury for the year ending 1955 is \$5,000,000.

1955

1955

1955

REPORT OF THE COMPTROLLER GENERAL
FOR THE YEAR ENDING
1955

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: יא' בניסן חשמ"א
15 באפריל 1981

מספר:

סיכום דברים מפגישה שהתקיימה בתאריך 13.4.81
בנושא: פיתוח ביה"ס וגן הילדים בגילה שלב ד'

משתתפים: מר דן צור - מחכנן הפיתוח
מר גלעד יוסף - מטעם יובל גד
הה"א. א. זילבר, מ. אברמוביץ, י. פטל - מטעם משב"ש

1. מר צור הציג את התכנון החדש בהתאם להנחיות של הגברת ברזקי - אדריכלית המחוז כולל אומדן עליות הביצוע בסך 3,300,000 שקלים, מתוך הסכום הנקוב באומדן - 550,000 שקל הינם עבודות פיתוח מראש (עבודות עפר ושביל ציבורי).
2. סוכם להוציא תוכניות מפורטות לביצוע עם התקונים הבאים:
 - 2.1 לבטל קיר נמוך מעל מגרש הספורט
 - 2.2 לבטל קיר הגובל עם בתי רזניק מס. 423 מדרום לביה"ס.
3. המחכנן יכלול את כל הקירות התומכים ואורך המעבר הציבורי במסגרת עבודות פיתוח מראש.

רשם: מ. אברמוביץ

תפוצה: לנוכחים + בני דביר, מירי ברוור, חיק פרויקט.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

στην Ιταλία

ημερομηνία: 28.12.1971
σε: Αθήνα

προς:

Κ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΤΗΡΙΑΡΧΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

אלב 1 : אולטק
א. גרוני

תיק גולד

ט"ז בניסן תשמ"א
20 באפריל 1981

אל: מר מ. שטיין, מנהל אנף הרישוי

אאת: מנהל המח' לנכסי העיריה

א.ג.,

הנדון: בקשה להיתר להקמת בית כנסת בשכ' גילה שלב ג'

מצ"ב הריני מעביר אליך בקשה להיתר בצירוף חכניות הנשח
להקמת בית כנסת בשכ' גילה שלב ג'.

אבקשך, להביא חקשה לאישור ועדות התיכנון ולהמציא את ההיתר
למשרד חכינוי משיכון בהקדם האפשרי.

בכבוד רב,

י. קלעי

העתק:

מנכ"ל העיריה

הגב' י. מוטקוביץ אדריכלית משרד השיכון רח' בן יהודה 25, י-ם.
מר א. גולדברג המועצה הדתית רח' החבצלת 12, ירושלים.

א.חי/ג.כ.

ל' בניסן תשמ"א
4 במאי 1981

לכבוד
יובל גד
אזור החקעשיה
ח.ד. 12
אשקלון

א.י.א

הנדון: רשיון בניה לב"ס רבן ילדים בגילה

ר"ב התראה שנמסרה לנו מעירייה ירושלים, אנף הפיקוח על הבניה.
החברד כי עד היום לא הושלמו ההליכים להוצאת הרשיון למבנים בנדון.
מועבר אליכם תצלוט טופס החלטה הוועדה מיום 31.12.80 והורישות להוצאת
הרשיון - המסומנות ב: X .
אודה לכם באם תואילו להעביר בהקדם המסמכים הדרושים להוצאת הרשיונות.

בכבוד רב,



מ. אברמוביץ

ראש צוות הכנון ופיקוח-ירושלים

העתק: מר עמוס לויין
אדר' אסא דאוכר
מידת כרוזר
חיק פרוייקט

SECRET
NOFORN

SECRET
NOFORN
NOFORN

SECRET

SECRET
NOFORN
NOFORN

SECRET
NOFORN
NOFORN

SECRET
NOFORN
NOFORN

מס. השינוי	13
------------	----

מספר החוזה / הזמנה	40/64231/78
--------------------	-------------

אל: הגזברות (2)
מאת: **אגף הכנון והנדסה**
.....

א. פרטי זהוי:

שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מס. מחוז	מס. ישוב	מס. אוביקס	מס. בית
			מספר	זהוי		

השנוי בבל"ג ש	ה ח ו ז ה	
	המחוקק בל"ג	הקיים בל"ג
1,031,876	9,747,830	8,715,954

ב. הרכב החוזה/הזמנה הקיים:

בית מסר 12 כימות

ג. מהות השינוי:

הגדלה בגין פוטנציאל יוקר לפעם עד המריבה גמר הקבוצה והקצבה על אגרון פוטנציאל יוקר בסכום של 290,020 שקל לעבודות א כיתוח נוספות ומקלט אזורי.

ד. הרכב החוזה/הזמנה החדש: **בהתאם לנ"ל המהירים יחיד:**

רצה דף רכז רצ"ב.

ה. שינויים ביעוד:

שם היעוד הקודם	שם היעוד החדש	כספר הכבנה	כס. יחידות	השינוי בסעיף התקציבי		הסכום בל"ג
				כס. סעיף קודם	כס. סעיף חדש	

ו. שינוי בתנאי התשלום:

ה ע ר ו ת	כ ס פ י ם		שנוי הנאי השלום לפי שלבים	קוד השלב
	קיים	שונה ל:		
1. תשלום הזמנת יוקר לפעמים 10, 11 שבועות הריכוז בהתאם לתכנון				
2. ליתור הפעמים - ללא שינוי				

הערות וחתימה עורך השינוי:

התיבה

התיבה סגן הכנהל הכללי

התיבה כנהל האגף לתכנון והנדסה

ה ע ת ק י ם

1. אגף האכלוס
2. אגף לתכנון והנדסה
3. אגף פרוגרמות
4. ההכחז הנובע **ירושלים**
5. הכחז הכבצע **ירוק לעולה** .. **המסוננים ה"ה**
6. ה"ה לכתקר כלכלי הבלתי-מסמיסטי
7. **תיק הנושא**

ריאז לעולה בעיס

התיבה חשב המשרד

0.-	1. בית ספר, אולם התעמלות
58,710.-	2. גן ילדים
ש' 456,333.-	3. עבודות פיתוח שבוצעו עד 29.9.80
ש' 16,227.-	4. עבודות נוספות לפי הגדלה מס' 2
ש' 10,300.-	5. עבודות נוספות לפי הגדלה מס' 5
ש' 29,752.-	6. עבודות נוספות לפי הגדלה מס' 9 (השלום חד פעמי)
1.38 × 21,280.-	7. אספקה והחזקה 2 ארבעי חול לג ילדים (הגדלה מס' 9)
2.42 × 23,130.-	8. פעלות טח (הגדלה מס' 9)
ψ 1,529,479 + 442,718.-	9. חוטמת 6 כיתוח + סקלט חיצוני (הגדלה מס' 11)
ψ 469,375.-	10. חוטמת יוקר למעשה 31.3.81
ψ 290,020.-	11. הקצבה ע"ח חוטמת ה יוקר
	12. עבודות פיתוח שטרם בוצעו (לפי הגדלה מס' 8 כולל עדכון
ψ 3,274,214.-	עד 2.81) - (2,750,499 + 523,715)

~~ריון לענין בעים~~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

~~CONFIDENTIAL~~

מס. השינוי	13
------------	----

40/64231/78
מספר החוזה / הזמנה

אל: הגזברות (2)
מאת: אגף הכנון והנדסה

א. פרטי זהוי:

ירושלים	גילה	דיוור לעולה	מס. מחוז	מס. ישוב	מס. אוביקס	מס. ביה
שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהוי			

השנוי בל"ג ש	החוזה	
	הקיים בל"ג	המתוקן בל"ג
1,031,876	9,747,830	8,715,954

ב. הרכב החוזה/הזמנה הקיים:

בית ספר 12 כיתות

ג. מהות השינוי:

הגדלה בגין תוספת יוקר למעטה עד תאריכי גמר העבודות והקצבה על הטובין תוספת יוקר בסכום של 290,020 שקל לעבודות: 6 כיתות נוספות ומקלט חנוכי.

ד. הרכב החוזה/הזמנה החדש: בהתאם לנ"ל המאירים יהיו:

ראה דף רכז רצ"ב.

ה. שינויים ביעוד:

שם היעוד הקודם	שם היעוד החדש	מספר הכבנה	מס. יחידה	השינוי בסעיף התקציבי		הסכום בל"ג
				מס. סעיף קודם	מס. סעיף חדש	

ו. שינוי בתנאי התשלום:

הערות	מספרים		קוד השלב	שנוי הנאי השלום לפי שלבים
	קיים	שונה ל:		
1. תשלום תוספת יוקר לסעיפים 10, 11 שבדף הריכוז בהתאם לחשבוניות חלקיים מאושרים במחוז.				
2. ליתר הפעמים - ללא שינוי				

הערות וחתימה עורך השינוי:

החתימה

החתימה סגן הכנהל הכללי

חתימת כנהל האגף להכנון והנדסה

העתיקים

- אגף האכלוס
- אגף להכנון והנדסה
- אגף פרוגרמות
- ההכחוז הנובע
- הכחוז הכבצע
- ה"ה לכחקר כלכלי אבות-וסנסיסטי

7. חיק התחזית

דיוור לעולה בע"מ

החתימה חשב המשרד

ש' 2,872,220.-	1. בית ספר, אולם התעמלות
ש' 358,710.-	2. גן ילדים
ש' 456,333.-	3. עבודות פיתוח שבוצעו עד 29.9.80
ש' 16,227.-	4. עבודות נוספות לפי הגדלה מס' 2
ש' 10,300.-	5. עבודות נוספות לפי הגדלה מס' 5
ש' 29,752.-	6. עבודות נוספות לפי הגדלה מס' 9 (השלום חד פעמי)
1.38 × 21,280.-	7. אספקה והחקנת 2 ארגזי חול לב ילדים (הגדלה מס' 9)
2.42 × 23,130.-	8. תעלות פח (הגדלה מס' 9)
↙ 1,529,479 + 442,718.-	9. חוספת 6 כיתוח + טקסט היצוני (הגדלה מס' 11)
↙ 469,375.-	10. חוספת יוקר למעשה 31.3.81
↙ 290,020.-	11. הקצבה ע"ח חוספת ה יוקר
	12. עבודות פיתוח שטרם בוצעו (לפי הגדלה מס' 8 כולל עדכון
↙ 3,274,214.-	עד 2.81) - (2,750,499 + 523,715)

~~ריון יסולת בעים~~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

~~CONFIDENTIAL~~

תאריך 18.5.81

טופס שנוי חוזה / הזמנה

מס. השינוי	15
------------	----

מספר החוזה / הזמנה	40/64231/78
--------------------	-------------

אל: הגזרות (2)
מאת: אגף הכנון והנדסה

א. פרטי זהו:

ירושלים	בילה	דיוור לעולה	מס. מחוז	מס. ישוב	מס. אוביקס	מס. בית
שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מספר	מספר	מספר	מספר

השנוי בל"י ש	ה ח ו ז ה	
	המתוקן בל"י ש	הקיים בל"י ש
434,990	10,237,612	9,802,622

ב. הרכב החוזה/הזמנה הקיים:

בי"ס 12 כיתות + עכ" פתוח

ג. מהות השינוי: כתב כסויות ומחירים לעבודות גומחה לפי טרוט מצורף.

הכסויות למדידה

תקומת הביצוע מתאריך חתימת ההגדלה עד סוף תקומת הביצוע לעבודות פתוח 15.8.81

ד. הרכב החוזה/הזמנה החדש: הגדלה זו לא תלר"ם לארכת זמן ביצוע

ה. שינויים ביעוד:

שם היעוד הקודם	שם היעוד החדש	כספר המבנה	כס. יחידה	השינוי בסעיף התקציבי		הסכום בל"י
				מס. סעיף קודם	מס. סעיף חדש	

ו. שינוי כתנאי התשלום:

הע ת ק י מ

- אגף האכלוס
- אגף להכנון והנדסה
- אגף פרוגרמות
- ההכחוז הנוגע
- הכתוז הכבצע
- ה"ה לחקקר כלכלי חברתי- וסטטיסטי

ה ע ר ו ת	כ ס פ י מ		שנוי הנאי השלום לפי שלבים	קוד השלב
	שונה ל:	קיים		
			משלום לפי התקדמות העבודה 100% כנגד ערובה בנקאית	
			בהורות קרן ביטוח.	

7. חיק החוזה

הערות וחתימה עורך השינוי: אסמכתאו סכתב המחוז מ 13.5.81

חתימה

חתימת חשב המשרד

חתימת סגן הכנהל הכללי

חתימת כנהל האגף להכנון והנדסה

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

3322/ד

ירושלים ר' בניסן תשמ"א
10.4.1981

לכבוד
מר אורי ורון
משרד אשר אולניק
רוזמרין 240, גילה
ירושלים.

משרד ראשי:
החשמונאים 91
תל-אביב
טל. 264251-4
ת.ד. 982

הנדון: ביט גן-ילדים ועב" הפתוח בגילה
חוזה מס' 40/64231/78

עפ"י זוכניות הפתוח שקבלנו מכם לבצוע לאחר השנוי בעב" הפתוח ובעקבות חוספה
הקומה והמקלט החצוני בדקנו ומצאנו כי הכמיות לסעיפי חוזה כפי המצויין בכתב-
הכמיות המצורף לבסכם יגדלו.

אנו מבקשים מכם להוציא כדחיות הגדלה הקציבית עפ"י הכמיות בהערכה כדלקמן:
סכום מלי"ק 9/78 1000 ש"ח ק"מ = 284,7 שק"ל

סעיף	חומר העבודה	יח"	כמות	מחיר יח"	סה"כ
4002-1	עבודות חפירה ו/או חציבה בשטח.	מ"ק	2500.00	11,40	28.500.-
4002-3	יישור והידוק צורת הדרך החניות.	מ"ר	350.00	1,10	385.-
4004-8	אספקה ובניה כרכוב סאבן.	מ"א	470.00	45,60	21432 9.644
4005-18	אספקה וריצוף באבן בדגם שורות בגן-ילדים.	מ"ר	75.00	60,00	4.500.-
4005-20	אספקה והנחת אבני שפה סרום בחניות מ"א	מ"ר	70.00	21,60	1.512.-
4006-24	אספקה, פיזור, יישור והידוק השתיה אבו"מ בעובי שכבה 15 ס"מ בחניות.	מ"ר	350.00	3,00	1.050.-
4006-27	אספקה וריסוס על גבי השתיה אבו"מ בכמות 1 ק"ג/מ"ר. (3/9 ח"ג)	מ"ר	350.00	1,20 4,40	420 490
4006-28	אספקה, פיזור יישור והידוק שכבה בסוף אספלט גם בעובי 5 ס"מ בחניות.	מ"ר	350.00	7,20	2.520.-
סה"כ במחירי חוזה					48.601.-

374674
901.889.-
434.990
שקל 350.484.-

דרכון המחירים מ-9/78 ב.ש.ק. עד 3/81
621,15/ x 60319 = 60319 48.601 x (2053.1 - 284,7)

העתיקו: מר - א. גדלביץ - משהב"ש.
מר - מ. שניאור - סמנכ"ל.
מר - מ. לוי - מנהל מחוז י-ם.

נימוס:
תל-אביב
חוב לילינבלום 40
טל. 56731
50846
חופה
דרכ הבנקים 3
טל. 524003-4
511962

צפת
דרכ הפלמ"ח 99
טל. 31383-4

טבריה
דרכ ית"ב בן זכאי
מרכז מלאכה
טל. 22323

באר שבע
רחוב העצמאות
בנין הסנה
טל. 77786

אפעליוס:
פרדיסה
טל. 98406-7-8

משרד לעולה ב"ש

מס. השינוי	14
------------	----

40/64231/78
מספר החוזה / הזמנה

אל: הגזברות (2)
מאת: **אגף הכנון והנדסה**

א. פרטי זהוי:

פרטים	גילת	מיוך לקולה
שם המחז	שם המקום	שם הקבלן
מס. מחז	מס. ישוב	מס. אוניקס
מס. בית	מס. בית	

ב. הרכב החרזה/הזמנה הקיים:

ב"מ 12 כמות + עבודות פחות

השנוי מס' ש	ה ח ו ז ה	
	המתוקן בל"מ	הקיים בל"מ
54,792	9,802,622	9,747,830

ג. מהות השינוי: **עבודות נוספות לכי סרזם מזורף**

הכמויות והמחירים הם סופיים

אין ארבה תקומה הביצוע בגין הגדלה

ד. הרכב החרזה/הזמנה החדש:

ה. שינויים ביעוד:

שם היעוד הקודם	שם היעוד החדש	מספר הכבנה	מס. יחידה	השינוי בסעיף התקציבי		הסכום בל"י
				מס. סעיף קודם	מס. סעיף חדש	

מיוך לקולה

ו. שינוי בתנאי התשלום:

הע ת ק י מ

- אגף האכלוס
- אגף להכנון והנדסה
- אגף פרוגרמות
- ההכחוז הנוגע
- הכחוז הכבצע
- ה"ה למחקר כלכלי חברתי- וסטטיסטי
- חיק החזמה

ה ע ר ו ת	כ ס פ י מ		שנוי הנאי השלום לפי שלבים	קוד השרב
	קיים	שונה ל:		

מסמכיו מכתב המזוז מ 7.5.81

הערות וחתימה עורך השינוי:

חתימה

חתימת סגן הכנהל הכללי

חתימת כנהל האגף להכנון והנדסה

חתימת חשב המשרד

1917

מס' 302

כ"ט בניסן תשמ"א
3 במאי 1981

55.81

לכבוד:
מ. ס. מרחב
ס/מנהל אגף הכנוף והנדסה
משרד השיכון והבינוי
הקרזה - חל-אביב

331

השלום הר פטמ

א.נ.2.

ההגדלה הזו לא תגדום להארכת זמן ביצוע

הנדון: הגדלת חרזה מס. 40/64231/78
?יה"ס חרובי "ד" בגילה - הקבלן - דיור לעולה.

אבקש להגדיל את התוצה הנ"ל בסכום של 48,214 שקל בהתאם לפרוט הבא:

עבודה נוספת - ביצוע קטע קרו כיוו עירוני לחיבור ביה"ס וגן הילדים,
בהתאם למחירון משהב"ש ס-9/80

מס. סידורי	סעיף	יה"ד	כמות	מחיר ליחידה מה"כ שקל
1	הספקה והנחה צינור $\phi 6$ לעומק 1,75 מ' כולל חוספת חציבה 50%	א"א	22	300
2	הספקה והרכבה צינור $\phi 6$ לעומק עד 2,25 מ', כולל חוספת חציבה 50%	ס"א	22	345
3	הא ביקורה $\phi 100$ בעומק עד 1,75 מ'	יה"ד	1	2400
4	הא ביקורה $\phi 100$ בעומק עד 2,25 מ'	יה"ד	2	2900
5	מפל חיצוני עד 1,75 מ'	יה"ד	2	1200
6	חוספת מכסה לכביש	יה"ד	2	350
7	ה'שקל עמא ק"מ	יה"ד	1	600

סה"כ חוספת ירושלים 10% 26,090

2,609 חוספת 5% קבלן ראשי סה"כ 28,699

1,435 סה"כ 30,134

סקל 54,792.-

דרכון מחודש 9/80 ללא שעוה קיץ לחודש 1981
30134 x 2334.3 1981
1283,8

יש לעדכן את הסכום הנ"ל לחובש הכינוע שזה חודש אפריל 1981 (המרו של חודש אפריל 1981 עוד לא מורמס).

2/..
דיור לעולה בנים
23

תאריך 18.5.81

טופס שנוי תחזה / הזמנה

מס. השינוי	15
------------	----

40/64231/78
מספר החוזה / הזמנה

אל: הגזברות (2)
מאת: אגף הכנון והנדסה

א. פרטי זהו:

ירושלים	גילה	דיוור לעולה	מס. מחוז	מס. ישוב	מס. אוביקט	מס. בית
שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מספר	זהו		

השנוי בל"י ש	החוזה	
	המתוקן בל"י ש	הקיים בל"י ש
434,990	10,237,612	9,802,622

ב. הרכב החוזה/הזמנה הקיים:

בי"ס 12 כיתות + עב' פתוח

ג. מהות השינוי: כתב כמויות ומחירים לעבודות נוספות לפי פרוט מצורף.

הכמויות למדידה

קופת הביצוע שתאריך חתימת ההגדלה עד סוף תקופת הביצוע לעבודות פתוח 15.8.81

ד. הרכב החוזה/הזמנה החדש: הגדלה זו לא תגריס לארכת זמן ביצוע

11625 - 12 יוני 1981

ה. שינויים ביעוד:

שם היעוד הקודם	שם היעוד החדש	כספר הכבנה	כס. יחידה	השינוי בסעיף התקציבי		הסכום בל"י
				כס. סעיף חדש	כס. סעיף קודם	

דיוור לעולה פנימי

ו. שינוי כתנאי התשלום:

הערות	כספים		שנוי הנאי השלום לפי שלבים	קוד השלב
	קיים	שונה ל:		
	100%	כנגד ערובה בנקאית	השלום לפי התקדמות העבודה	
			בהודעה קודם ביטוח.	

הערות וחתימת עורך השינוי: אסמכתאו סכתב המחוז מ 13.5.81

ז. העתקים

- אגף האכלוס
- אגף להכנון והנדסה
- אגף פרוגרמות
- ההכחוז הנוגע
- הכחוז הכבצע
- ה"ה לכתקר כלכלי חבלתי- וסטטיסטי

7. חיק החוזה

החתימה

החתימה חשב המשרד

החתימה סגן הכנהל הכללי

החתימה כנהל האגף להכנון והנדסה

3322/ד

ירושלים ו' בניסן תשמ"א
10.4.1981

לכבוד
מר אורי ורון
משרד אשר אולניק
רוזמריץ 240, גילה
ירושלים

א.נ.,

הנדון: ביט גן-ילדים ועב' פתוח בגילה
חוזה מס' 40/64231/78

עפ"י זכויות הפתוח שקבלנו מכס לכצוע לאחר השנתי בעב' הפתוח ובעקבות חוספת
הקומה והמקלט החצוני בדקנו ומצאנו כי הכמיות לסעיפי חוזה כפי המצויין בכחב-
הכמיות המצורף למסכם יגדלו.

אנו מבקשים מכס להוציא כדחיימות הגדלה. הקציבית עפ"י הכמיות בהערכה כדלקמן:
קט"ס מיל"ק 1088 אלא ק"ס = 284,7 שק"ל

סעיף	תאור העבודה	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
4002-1	עבודות חפירה ו/או חציבה בשטח.	מ"ק	2500,00	11,40	28.500.-
4002-3	יישור והידוק גנרת הדרך החניוה.	מ"ר	350,00	1,10	385.-
4004-8	אספקה ובניה כרכוב מאבן.	מ"א	470,00	45,60	21432
4005-18	אספקה וריצוף באבן בדגם שורות בגן-ילדים.	מ"ר	75,00	60,00	4.500.-
4005-20	אספקה והנחה אבני שפה שרום בחניוה מ"א	מ"א	70,00	21,60	1.512.-
4006-24	אספקה, פיזור, יישור והידוק חשית אבו"מ בעובי שכבה 15 ס"מ בחניוה.	מ"ר	350,00	3,00	1.050.-
4006-27	אספקה וריסוס על גבי חשית אבו"מ בכסומן 1 ק"ג/מ"ר. (83 ק"ג)	מ"ר	350,00	1,20	420
4006-28	אספקה, פיזור יישור והידוק שכבה בטון אספלט גס בעובי 5 ס"מ בחניוה.	מ"ר	350,00	7,20	2.520.-
סה"כ במחירי חוזה					

374674
901.889.-
434.990
350.484.-
שקל

דרכון המחירים מ-9/78 ב.ש.ק. עד 3/81
621,15/ x 60319 = 60319 48.604 x (2053.1 - 284,7)
סה"כ להגדלה 284.7

מכבוד רב,
ש. שביב

העתיקים: מר - א. גדלביץ - משהב"ש.
מר - מ. שניאור - סמנכ"ל.
מר - מ. לוי - מנהל מחוז י-ם.

משרד לעולות ופליטים

משרד ראשי:
תל-אביב
טל. 264251*4
ת.ד. 983
נימוס:
תל-אביב
ד"ר לילינבלום 40
טל. 56731
50846
חופה
ד"ר חבנקים 3
טל. 524003*4
511962
צפת
ד"ר הפלמיח 99
טל. 31383*4
טבריה
ד"ר יוחנן זכאי
מרכז מלאכה
טל. 22323
באר שבע
רחוב העצמאות
בנין הסנה
טל. 77786
מפעלים:
פרדסיה
טל. 98406*7*8

Handwritten signature and initials.

ירושלים, 9.6.1981

או/612

פרוטוקול סיוך ביקורת שנח אחריות
גן ילדים 918 (ליד בנין 304) בגילה (גן/11/ג)
הקבלן: חברת אשטרום חוזה מס': 40/63516/77

גן ילדים זה לא הופעל בשנת הלימודים 1980/81, ובנוסף לנ"ל נגרמו
חבלות בחצרות ובמבנה, ומח' ההינוך של עיריית ירושלים מטפלת בתיקונים.
באשר לעבודה קבלן הבניין:
כיתה 1 - לא היו מפתחות לכניסה. בחצר - יש צורך לתקן שקיעות בריצוף
סביב הבניין ולסחוס חריץ בין המבנה לבין הריצוף בחצר.
כמו כן יש להרכיב זרנוק לכיבוי אש חקני בגלגלון.

- כיתה 2 - § 1. סתימה מסביב לחלון בכניסה ותיקון סיוך
2. תיקוני סדקים בקירות הכיתה כללי כולל תיקוני סיוך
3. תיקונים בסתימות מסביב לחלונות
4. תיקון סיה מחקלף בחקרה מול הטטבחון
5. תיקון פנלים במרפסת
6. תיקון שקיעה ריצוף בכניסה לכיתה זו.

תמוצת: למשתתפי הסיוך - ה"ה י. סורוקו וי. קאלק - מדור פקוח עליון
עיריית ירושלים

חברת אשטרום

כמו כן העתק למר א. גדלביץ - ס/מנהל המח' הסכנית משהב"ש מחוז י-ם
לגב' ס. כרוור - אחראית מוס"צ - משהב"ש "

ירושלים, 9.6.1981

או/611

פרוטוקול סיור ביקורת שנת אחריות
גילה - גן ילדים שילוני- הקבלן: אשטרום - חוזה: 40/65389/79

ביחה עליונה:

1. שקיעה ריצוף מדרכת ליד המרזם.
2. יש לסתום סדקים בהיקף הבניין בחיבור עם הריצוף החיצוני.
3. לסתום חור להשמל לא מנוצל במרפסת.
4. יש לתקן חדירה המים במרפסת הכניסה.
5. יש לתקן פנלים שנפלו בכניסה לכיתה.
6. בכניסה יש לתקן סדקים בקיר.
7. יש לתקן קערה במטבח, לסתום את חיבור הקערה לשיש ולסתום סביב לרוזטות.
8. יש להרכיב זרנוק תקני לגלגלון כיבוי האש.
9. יש לתקן את תקרת המקלט שיה צימנס וסיוד מתקלף.
10. בדלת השרותים יש לתקן צביעה
11. יש לסתום משקוף בדלת המפרידה בין שתי הכיתות בתוך המקלט.

ביחה תחתונה :

1. תיקוני סיוד סביב לוח החשמל במקלט כולל תיקון הקיר
2. יש להזק שקע כוח מתחת ללוח החשמל באמצעות חושבת עץ
3. יש לתקן צבע שמן ליד הקערה במקלט
4. יש להרכיב זרנוק תקני לגלגלון כיבוי אש
5. יש לתקן סדקים בכניסה לכיתה ולתקן את הסיוד
6. יש לתקן את קערת המטבח, לסתום סביב לשיש וסביב לרוזטות
7. יש לסתום חריץ בהיקף הבניין בחיבור הבניין עם הריצוף של החצר
8. יש להוסיף אדמת גן ולתקן אבן שפה ששקעה במינה צפונית מזרחית בחצר
9. יש לסתום חור חשמל לא שימושי במרפסת.

רשם : אורי ורון

חפוצה: למשתתפים בסיור: א. פישר - אשטרום
ה"ה י. סורוקו וי. קאלק - מדור פיקוח עליון בעירייה י-ם

למר א. גדלביץ - ס/מנהל המח' הטכניה משהב"ש מחוז י-ם

לגב' מ. ברוור - אחראית מוס"צ, משהב"ש מחוז י-ם

1000 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 100, SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 1T7

1000 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 100, SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 1T7

1000 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 100, SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 1T7

10.0.0001, 01/11/11

11/11

10/0000/00 - 10/0000/00 - 10/0000/00 - 10/0000/00

1. 10/0000/00

- 1. 10/0000/00
- 2. 10/0000/00
- 3. 10/0000/00
- 4. 10/0000/00
- 5. 10/0000/00
- 6. 10/0000/00
- 7. 10/0000/00
- 8. 10/0000/00
- 9. 10/0000/00
- 10. 10/0000/00
- 11. 10/0000/00



2. 10/0000/00

- 1. 10/0000/00
- 2. 10/0000/00
- 3. 10/0000/00
- 4. 10/0000/00
- 5. 10/0000/00
- 6. 10/0000/00
- 7. 10/0000/00
- 8. 10/0000/00
- 9. 10/0000/00

10/0000/00

10/0000/00 - 10/0000/00 - 10/0000/00 - 10/0000/00

10/0000/00 - 10/0000/00 - 10/0000/00 - 10/0000/00

10/0000/00 - 10/0000/00 - 10/0000/00 - 10/0000/00

10/0000/00

10/0000/00

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ז' בסיון תשמ"א
9 ביוני 1981

מספר:

סכום דברים משיבה שהתקימה בחאריך 2.6.81

בנושא: גן-ילדים בגילה שלב ד' המתבצע ע"י יובל גד.
משתתפים: אינג' פהר ארנסט- מח' החינוך עיריית ירושלים
אינג' יעקב דרור- מטעם יובל גד
אינג' אדי סורזקו ומר יחזקאל קאלק- שרותי הנדסה עיריית י-ם
אינג' אברמוביץ ומר פטל יעקב- מטעם משב"ש ירושלים.

לאחר שנציגי העירייה עיינו בחוכנית גן הילדים העלו את ההערות הבאות:

1. לכיור מטבח צריך להיות קו הזנה של מים חמים וקרים וכן קו הזנה חשמלי לבוילר.
 2. ליד כל מיני-קונבקטור חייבת להיות נקודת חשמל להתחברות.
 3. לבטל גוף חימום בחדר שירותים.
 4. ניקוז גבוה יש לקבע ע"י 2 צינורות מי גשם לכל פיגה ובהתאם לכך להתאים גם את השיפועים בגבוה.
 5. הגבהה לארונות מטבח נשארת לפי הפרט המוצע אך יש לבצע ריצוף מתחת לשטח ההגבהה דהיינו לכל שטח החדר.
 6. יש לבצע סורגים לכל החלונות.
 7. דלת יציאה לחדר חתיה כדוגמה דלת הכניסה מטיפוס 85 א' ולא 85.
 8. להעביר גוף האורה בגגות מפינה דרומית לפינה מזרחית.
- כל ההערות והדרישות הנ"ל נחקבלו ע"י נציג יובל גד והן יבוצעו במסגרת החוזה הקיים ללא כל תביעה.

רשם: י. פטל
תפוצה: לנוחכים
ל. קוקוש
מירי ברור

ירושלים, 15.2.81

כא/220

לכבוד
מר ל. קוקוש
מנהל המח' הטכנית
משרד הכנוי והשכון
מחוז ירושלים

א.ג.

הנדון: - גילה ר' - גן ילדים שלוש כיתות
אדריכל דרוקמן - תומר להוצאת מכרז

לצורך הוצאת מכרז לגן הילדים הנ"ל, פועבר אליך רצ"ב
המסמכים הבאים: -

- 2 סטים חכניות (אדריכלות, קונסטרוקציה, אינסטלציה
סניטרית וחשמל) כולל כתבי כסויות, *אמצע חומס*.

- אומדן תקציבי

- דף כחול

- חכניות מדידה, מצב קיים

- חכנית הקצאה

אנו נעביר עותקים נוספים של חיקי החכניות ישירות לאגף
ובהתאם להוראותיכם.

בכבוד רב,

[Signature]
מ. אלנברג

העמק: גב' מירי ברדור - ✓
אחראית מוס"צ, משהב"ש

15, LONDON ROAD, TEL AVIV 6100, ISRAEL

15.12.61

200/12

ASHER OLNIK ENGINEERING LTD
15, LONDON ROAD, TEL AVIV 6100, ISRAEL

15.12.61

Handwritten signature and initials

ASHER OLNIK ENGINEERING LTD

ASHER OLNIK ENGINEERING LTD

- ASHER OLNIK ENGINEERING LTD
- ASHER OLNIK ENGINEERING LTD
- ASHER OLNIK ENGINEERING LTD
- ASHER OLNIK ENGINEERING LTD
- ASHER OLNIK ENGINEERING LTD
- ASHER OLNIK ENGINEERING LTD

ASHER OLNIK ENGINEERING LTD

ASHER OLNIK

ASHER OLNIK

ASHER OLNIK ENGINEERING LTD

סיכום דברים בנושא פרוגרמה 81 - גילה

השחפזו: ל. קוקוש, ב. דביר, א. אולניק, א. כרוזר, ע. אברמסקו

בנייה

גלישה מ-80 ל-81

- * 1. רסקו - 102 יח"ר
- * 2. שכ"ע - 90 יח"ר

פרוגרמה 81

- * 1. 111 יח"ר - ז'ק אלון - מציע להזמין חכנון.
- * 2. 46 יח"ר - ז'ק אלון - כנ"ל.
- * 3. 112 יח"ר - סלו הרשמן - אל רם.
- * 4. 56 יח"ר - ספקטור עמישר - רמט.
- * 5. 85 יח"ר - אלכסנדרוני - חברה?
- * 6. 100 יח"ר - ריסקין - מכ"ט
- * 7. 350 יח"ר - רם כרמי - לחלק לחברות

865 יח"ר

פיתוח מראש

מוס"צ

- 1. גן - 3 כחות דרוקמן
- 2. גן - 2 כחות - מכרז חכנון ביצוע (כרמי לשעבר)
- 3. גן - 2 כחות - חכנון ביצוע - ליד חל רענן.
- 4. בית כנסת - שור.
- 5. כ"ס 18 כחות + 2 כחות גן - 1ה.
- 6. 6 כחות גן - הסכם עם חברות שזכו במכרזי חכנון ביצוע.
- 7. חטיבה ביניים - מכרז לביצוע - להתחלה שנת החקציב 81.
- 8. כ"ס קאסוטו

Faint header text at the top of the page, possibly including a date or reference number.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Faint text block below the header, possibly a title or introductory sentence.

CHAPTER I
Faint text block, likely the beginning of a chapter or section.

Faint text block, possibly a paragraph or a list of items.

SECTION 1
Faint text block, possibly a section header or the start of a section.

Faint text block, possibly a paragraph or a list of items.

SECTION 2
Faint text block, possibly a section header or the start of a section.

SECTION 3
Faint text block, possibly a section header or the start of a section.

Faint text block, possibly a paragraph or a list of items.

Faint text block, possibly a paragraph or a list of items.

Faint text block at the bottom of the page, possibly a conclusion or a reference.

אשר אולניק חברה להנדסה נעים ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב ז'בוטינסקי 119, תל-אביב • טל. 03-454901 • על 93758
רחוב רוזמין, בית 240, גילה, ירושלים • טל. 02-717919

ירושלים, 12.1.1981

פא/45

לכבוד
מר ל. קוקש
מ"מ מנהל המחלקה הטכנית
משרד הבנוי והשכון
מחוז ירושלים

א. נ. ,

הנדון: גילה ד' - בן ילדים 2 כיחות
בגרות מס' 3 - מכרז חכנון בצוע

רצ"ב המסמכים הכאיס:-

1. הנחיות ביסוס
2. חכנית סופוגרפיה (5 עותקים)
3. חכנית הקצאה (סמי אורגינל)
4. דף כחול

ב ב ר כ ה ,

מ. אלנברג

העתק:

גב' מירי כרוור - אחראית מוס"צ ✓

14.1.81

לכבוד
הגב' זיוה ויינשל
יו"ר ועדת החינוך
בגילה

ג.ב.ג.

הנדון: תחזית אכלוס של ילדים ג' ו-ד' בגילה

חאם לבמסחר, רצ"ב תחזית ראשונית.

1. בשלב ג' התגוררו בסוף שנת 1980 כ-350 משפחות.
2. מאז ועד לחודש יולי 1981 במסרו וימסרו לאכלוס, בשלבים ג' ו-ד' 700-800 יח"ד.
3. כמספר הזה של דירות ימסרו לאכלוס במחצית החנייה של שנת 1981.
4. כזהו אף מספר הדירות שתמסרנה לאכלוס רק בשנת 1982.

יש לקחת בחשבון כי לא כל הדירות הנמסרות לאכלוס אכן מתאכלסות מיד.

ב ב ר כ ה,

דינה זמיר
סגן מנהל המחוז

העתיק: א. אולניק
א. סימן טוב
ב. דביר
ט. ברור ✓

THE
OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE
NAVY

REGULATIONS

CHAPTER I
GENERAL REGULATIONS
SECTION 1. The Secretary of the Navy shall have the honor and respect due his office.
SECTION 2. The Secretary of the Navy shall be the chief executive officer of the Department of the Navy.
SECTION 3. The Secretary of the Navy shall be the representative of the Department of the Navy in all public and official functions.
SECTION 4. The Secretary of the Navy shall be the representative of the Department of the Navy in all international relations.
SECTION 5. The Secretary of the Navy shall be the representative of the Department of the Navy in all relations with the other departments of the Government.

THE
OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE
NAVY

1891

ס' בשבט תשמ"א
14 בינואר 1981

לכבוד
אינג' מלומד
מנהל חטיבת הבינוי
עיריית ירושלים

א.ג.,

הנדון: בית ספר 24 כיחות בגילה

מצ"כ סט חכניות ארכיטקטורה וחשמל לביצוע הפרוייקט
הנ"ל.

חכניות קונסטרוקציה, אינסטלציה ופיתוח חצרישלו
לכם בחקדם האפשרי.

בכבוד רב

ס. אברמוביץ

ראש צוות חכנון ופיקוח ירושלים

העחק:
גב ס. מרוור, כאן
מר ע. לויץ, יובל גד
מר סורוקה
חיק חוזה

1941
1942

1943
1944
1945
1946

1947
1948

1949
1950

1951
1952

1953
1954
1955

1956

1957
1958
1959
1960
1961

אשר אולניק חנוה להנדסה בע"מ. ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב זיבוטינסקי 119 • תל-אביב • טל. 03-4549801
רחוב רוזמרין, בית 240, גילו, ירושלים • טל. 02-717919

ירושלים, 12.1.1981

פא/45

לכבוד
מר ל. קוקוש
מ"מ מנהל המחלקה הטכנית
משרד הבנוי והשכון
מחוז ירושלים

א. ג.,

הנדון: - גילה ד' - גן ילדים 2 כיחוח
במגרש מס' 3 - מכרז הכנון בצוע

רצ"ב המסמכים הבאים:-

1. הנחיות ביטוס
2. תכנית סופוגרפיה (5 עותקים)
3. תכנית הקצאה (סמי אורגינל)
4. דף כחול

ב ב ר כ ה ,


מ. אלנברג

העתק:
גב' מירי ברנדר - אחראית מס"ב

מדינת ישראל

מינהל מקרקעי ישראל
מחוז ירושלים

יחידה: מחלקת עסקות

ירושלים

תאריך: ט"ו סבת תשס"א
22.12.80
מספר: 16558

ש"ק אל"ר ד"ר

לכבוד
מר אברהם חי
מחלקת הנכסים
יפו 22
ירושלים

א.ב.י.

הנדון: ירושלים - גילה - תב"ע 2073
מגרש 2 - גן ילדים

במשרדנו התקבלה בקשת משרד השיכון להקצאת השטח הנדון
למסרת גן ילדים.

עפ"י דו"ח פיקוח שלנו הגן בנוי.

מכיוון שמדובר בשטח להפרשות צבור, על העירייה להפקיע
הקרקע הנדונה, לפיכך הפסקנו הטיפול בתיק.

בכבוד רב
חנה ת"י
ג' אנו
ב/מנהל המחלקה

העתק: גב' צביה אפרתי,
משרד השכון, מחוז ירושלים.

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

ס"ד בארז טא"ם
4 בסרץ 1980

לכבוד
אנדרסן דם ברמי

א"ג,

מסרן: גילת ארז 01 סבבן 04 - מרגרמה

רצ"ב מרגרמה ברמי קמיה סבבן, למכנן זה מרגרמה
בהחלה ממרז, אכען לסבן בהחמה,
כל סבבן במרגרמה ימיה עם ימיה מרגרמה טראט,

ב ב ר ב

בנימין דביר

מסרן: מר ט. ס. סבבן - מרגרמה ברמי
גב' ר. זמיר - מרגרמה ברמי
מר א. זמיר
גב' א. ברמי
מר א. ברמי
גב' ב. ארז
גב' ס. ברמי ✓

1947 FEB 11

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ב' באדר תש"ם
19 בפברואר 1980
מספר:

פרוגרמה אחר 01 מכנן 04

המכנן נמצא בכניסה הצפונית והראשית לשכונה ליד כביש פח ונצפה פמעט מכל אחר אחר בירושלים.

שטחו כ-50 דונם, לפי מדידה פלנמטרית.

יעודו - "אזור מגורים 2" בחכנית מחאר גילה 1905 המאושרת. שיעור הבניה המותר באזורים כאלה לפי חכנית מחאר ירושלים עד 120%.

קיכולת - לפי טבלת חכנית המיתאר מותר לכנות בו 370 יח"ד.

טופוגרפיה - השפוע באחר בשעור של 25% - 20% יורד לכוון בית צפפה וירושלים. הטופוגרפיה כיום שונה בשל שפכים של כביש פח ואין לנו נתונים מדויקים של מצב השטח.

הנושא נמצא בבדיקה - הוזמן מפוי חדש של השטח וכן בבדיקה קרקע אין להתהיל בחכנון לפני קבלת הוצאות בבדיקה מצב הקרקע ואפשרויות הבניה בשל השפך.

הנחיות מחכנן מחאר - בהתאם להנחיות מחכנן חכנית המחאר - יסקי - חכנית בשולי השכונה בקטעים הניצפים מירושלים וסמוך לוודיות תהיה בשורות מקבילות לטופוגרפיה ומדורגות כעין טרסות הרריות הצופות לעיר.

החכורה - בחכנית מחאר לתחבורה עובר כביש ברוחב של 18 מ' המקשר את דרום מערב ירושלים (המרכז המשני) עם כביש הרכבת - דרך מכנן זה.

לצורך בדיקה מוסדות הצבור נלקחו בחשבון כל יחידות הדיור הקיימות והמוותרות לכניה באחר 01 - 4624 יח"ד (כולל כ-400 יח"ד במכנן זה) אם כי מבחינת שרותים התיחסנו לגבולות מצומצמים יותר רק שלב א' + ב' באחר 01 שהם כ-2893 יח"ד.

להלן פירוט מוסדות הציבור הדרושים:

1.	2 גני ילדים צמודים - מגרש אחד ל-4 כחות - 2.4 ד'
	מגרש אחד ל-3 כחות - 1.8 ד'
2.	מעונות יום - מגרש אחד - 1.0 ד'
3.	מועדון נוער - מגרש אחד - 1.0 ד'
4.	בית כנסת - מגרש אחד - 1.5 ד'
5.	מגרש משחקים - מגרש אחד - 2.5 ד'
	<u>סה"כ - 10.2 ד'</u>

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ח"ז באדר חש"מ
4 במרץ 1980
מספר:

-2-

מסחר - יש לתכנן 4 חנויות לממכר יום יומי בשטח בניה של 40 מ"ר ברוטו כ"א בקומה קרקע של אחד הבניינים.

כמידה והכביש הצפוני ידרש ע"י תכניה אב תחבורה אזי השטח שמדרום לו ייועד למוסדות ציבור כלל עירוניים.

מאחר ולא נדרשים באחר שטחים רבים לצרכי ציבור, מוצע לבדוק אפשרות ניצול מלא אחוזי הבניה המותרים מהשטח נטו שישאר בידי משרד הבינוי ולהגיע לקבולת גדולה יותר מזו שנקבעה בטבלת תכניה המתאר. הגדלה הקבולת אפשרית בשל הפסד יח"ד באחרים אחרים בגילה (בכל מקרה לא יוכל משרד הבינוי לנצל אח מלא 10,000 יח"ד שנקבעו בתכנית המתאר). להערכתנו ניתן להגיע לכ-500 יח"ד במבנן זה.

כמידה ובעקבות בדיקות הקרקע יחכר שיש צורך בפתרונות הנדסיים ופתרונות ארכיטקטוניים מסובכים, תבוק הפרוגרמה מחדש.

התפלגות דירות ב-%

גדלי דירות

10%	2 חדרים
60%	3 חדרים
30%	4-5 חדרים

דירות נכים - כ-3% מסה"כ הדירות במבנן תהיינה דירות נכים. גולן ינוע בין 2-4 חדרים. דירות אלה תמוקמנה בקומת הקרקע של המבנים ותנחנה להן גישה ישירה מהחניה. התכנון הפנימי יאפשר חנועה כעגלת נכים כדירה.

שטחי הדירות יהיו בהתאם להנחיות הקבועות של משרד הבינוי והשיכון (הנחיות 1.17).

הכינה:

צביה אפרתי
ע/בינוי ערים

בנין ישראל

משרד השיכון

מחוז ירושלים

האריך:

מספר:

-3-

בנין

אתר 04 הינו נשוא לנתונים הבאים:

1. ממוקם בכניסה הראשית (בעתיד) לשכונה מכוון צפון על כביש פת.
 2. נצפה מירושלים ושובר את קו הבינוי העגול של הגבעה (החחום כיום ע"י בניני לופנפלד).
 3. מוגדר בהנחיות תכניה מאר לכניה בטרוסות.
 4. נמצא בשולי השכונה וקרוב לשכונת בית צפפה.
 5. חחום ע"י 2 כבישים קיימים ויוחנן ע"י כביש נוסף.
- לחמש הנקודות האלו שהינם כנתונים יש לנסות ולענות.

המבנן צריך להמשיך את שפוע הגבעה, ולתח שער כניסה לשכונה - אך כרוך הוא שהחזית לכיוון כביש פת הינה חזית צורנית בלבד. הקשר של המבנן יהא בין מוס"צ שימוקמו במבנן לבין המתנ"ס לכיוון בניני לופנפלד, כהמשך למתנ"ס ולמוס"צ שימוקמו בשטח המבנן.

צירים אלה ישרחו הנזעה שעשויה לבוא למבנן, בהתיחסות לצירים ראשיים,

במבנן לופנפלד - הקיימים כיום.

על המתכנן לברוק עם מחכננים חכנית אב לתחבורה את משמעותו של הכביש הצפוני, המחבר את דרום מערב עם כביש הרכבת, והאם אכן יש להשאיר עכוורו שטח.

במידה וכביש זה קיים, יש להתיחס בשפה אחרת לתחום הצפוני בשפולי המבנן.

היות והמבנן נמצא בשולי השכונה, וסמיכותו לבית צפפה, יש לתת לתושבים הרגשה מוגנת אך כל זאת ללא פגיעה בסקסטורה של הבניה המקיפה.

מבנן זה הינו למעשה התפר בין בניה בטרוסות ובצורה מפורזת של הכפר לבין הבניה הסגורה והמסיבית של גילה, אי לכך על המבנן להנות גם מבחינת אר:יטקטונית חוליה מקשרת בין שתי צורות בניה אלו.

במידה וכביש מזרח מערב אמנם מחלק את המבנן יש להשאיר את החלק הנוחר עכוור מוסד כלל שכונתי - א"י עירוני, ולא לצרכי המבנן.

הכיתה: אלינוער ברזקי
אדריכלית המחוז

11c

כ"ו בשבט תש"ם
14 בפברואר 1980

סכום דברים בנושא מוט"צ גילה שלב א'+ב' מיום 11.2.80

השתתפו: גב' א. ברזקי, ס. ברור, צ. אפרתי

א. מירי בדקה יחד עם עיריית ירושלים מוסדות צבור דרושים לשלב א' + ב' עבור כ-3000 יח"ד. להלן מפורטים כל המוסדות החסרים לשכונה זו:

1. בני ילדים

סה"כ דרושות 7 כתות גן.

- 4 כתות - 2 בני ילדים בני 2 כתות כל אחד (2 + 1.2 דונם).
- 3 כתות - גן ילדים אחד בן 3 כתות 1.8 דונם.

2. מעונות יום

דרושים שני מעונות יום בני 1.0 דונם כל אחד.

3. בתי כנסת

דרושים 3 בתי כנסת בני 0.75 דונם כל אחד.

4. תרכות נוער מפורט

מועדון נוער הנועחי אחד בן 1.0 דונם.

3 מגרשי משחקים בני 2.5 דונם כל אחד.

ב. במבנין זה מוצע לכלול את המוסדות המפורטים להלן מתוך המוסדות החסרים:

- 1. בני ילדים - מגרש אחד ל-4 כתות 2.4 דונם
מגרש אחד ל-3 כתות 1.8 דונם
- 2. מעונות יום - מעון יום אחד בלבד 1.0 דונם
מעון נוסף יאוחר במגרש 28 המיועד כש.פ.צ. בת.ב.ע. 1985 צמוד למגרש גן ילדים מגרש 34 או לחלופין במגרש המיוחד בת.ב.ע. 1985 א' מחתה לבתי רובינשטיין.
- 3. בתי כנסת - יאוחר מגרש אחד בן 1.5 דונם
- 4. מועדון נוער - יאוחר שטח למועדון נוער 1.0 דונם
אחד צמוד לשטח הירוק
- 5. מגרש משחקים - יאוחר מגרש משחקים אחד 2.8 דונם
לשרות אזור זה בשטח של

ר ש מ ה:
צביה אפרתי
ע/בנוי/צרים
2/...

Handwritten signature

Handwritten text at the top of the page, possibly including a date or reference number.

Handwritten text in the middle section, possibly a list or notes.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a list or notes.

Handwritten text in the lower section, possibly a list or notes.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a list or notes.

6.1.81

לכבוד
הרב שלזינגר
גילה רח' לבונה 5
ירושלים

א.ג.א.

הגדרון: בתי כנסת - גילה

משהב"ש מודע למצב החמור הקיים בשכונה של חוסר מקומות תפילה.

לצערי וכפי שנמסר לך כבר בעבר אין משהב"ש אחד-אי לבנית בתי הכנסת בשכונה.

ע"ס התחיבות שבין משרד הפנים, הרחוק והשכון, חייב משהב"ש לבנות בית כנסת אחד לכל 2000 יח"ד ואכן בית הכנסת היחיד בשכונה נבנה על ידנו.

בשלב ג' מתוכנן להבנות בית כנסת נוסף על ידנו, ובמידה ויאושר תקציב לבנית בתי כנסת הוא ייבנה בשנת הכספים 1981-2.

לצערי אין באפשרותנו למצוא כל פתרון זמני שהוא שלא במסגרת בנית בתי כנסת במבני קבע.

בברכה,

א. מיר
עו"ל מחוז ירושלים

העתיקים: מירי ברוד
א. אולביק
ד. זמיר

SECRET
TOP SECRET
GROUP 1
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION

SECRET - TOP SECRET

1. The information in this document is classified "Secret - Top Secret" because it contains information the disclosure of which would be injurious to the national defense.

2. This information is classified "Secret - Top Secret" because it contains information the disclosure of which would be injurious to the national defense.

3. This information is classified "Secret - Top Secret" because it contains information the disclosure of which would be injurious to the national defense.

4. This information is classified "Secret - Top Secret" because it contains information the disclosure of which would be injurious to the national defense.

5. This information is classified "Secret - Top Secret" because it contains information the disclosure of which would be injurious to the national defense.

SECRET
TOP SECRET
GROUP 1
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION

SECRET
TOP SECRET
GROUP 1
EXCLUDED FROM AUTOMATIC
DOWNGRADING AND
DECLASSIFICATION

ה'תש"ח

ה'תש"ח

ה'תש"ח

ה'תש"ח

ה'תש"ח

ה'תש"ח

ה'תש"ח

ה'תש"ח

ה'תש"ח

ה'תש"ח

ה'תש"ח

ה'תש"ח

ה'תש"ח

כנס דברים בנושא מוס"צ גילה שלב א'+ב' מיום 11.2.80

השתתפו: גב' א. כרוזקי, ס. ברנר, צ. אפרתי

א. מירי בדקה יחד עם עיריית ירושלים מוסדות צבור דרושים לשלב א' + ב' עבור כ-3000 יח"ד. להלן מפורטים כל המוסדות החסרים לשכונה זו:

1. בני ילדים

סה"כ דרושה 7 כחות גן.

4 כחות - 2 בני ילדים בני 2 כחות כל אחד (2 + 1.2 דונם).
3 כחות - גן ילדים אחד בגן 3 כחות 1.8 דונם.

2. מעונות יום

דרושים שני מעונות יום בני 1.0 דונם כל אחד.

3. בתי כנסת

דרושים 3 בתי כנסת בני 0.75 דונם כל אחד.

4. חרכות נוער ספורט

מועדון נוער חנועתי אחד בגן 1.0 דונם.

3 מגרשי משחקים בני 2.5 דונם כל אחד.

ב. כמכונן זה מוצע לכלול את המוסדות המפורטים להלן מחוץ המוסדות החסרים:

1. בני ילדים - מגרש אחד ל-4 כחות 2.4 דונם
מגרש אחד ל-3 כחות 1.8 דונם

2. מעונות יום - מעון יום אחד בלבד 1.0 דונם
מעון נוסף יאוחר במגרש 28 המיועד כש.פ.צ.
בח.ב.ע. 1985 צמוד למגרש גן ילדים מגרש
34 או לחלופין במגרש המיועד בח.ב.ע.
1985 א' סתחת לבתי רובינשטיין.

3. בתי כנסת - יאוחר מגרש אחד בגן 1.5 דונם

4. מועדון נוער - יאוחר שטח למועדון נוער
אחד צמוד לשטח הירוק 1.0 דונם

5. מגרש משחקים - יאוחר מגרש משחקים אחד
לשרות אזור זה בשטח של 2.5 דונם

ר ש מ ה:
צביה אפרתי
ע/בנוי צריס
2/...

כרוזקי, א. כ. 1980

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS

Know all men by these presents, that

the undersigned, of the County of Dallas, State of Texas, do hereby certify that

1. The following

is a true and correct copy of

the original of the same, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

2. The following

is a true and correct copy of the same, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

3. The following

is a true and correct copy of the same, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

4. The following

is a true and correct copy of the same, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

Witness my hand and seal of office this 1st day of January, 1951.

Notary Public in and for the County of Dallas, State of Texas.

1. The following is a true and correct copy of the original of the same, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

2. The following is a true and correct copy of the original of the same, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

3. The following is a true and correct copy of the original of the same, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

4. The following is a true and correct copy of the original of the same, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

5. The following is a true and correct copy of the original of the same, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

6. The following is a true and correct copy of the original of the same, as the same appears from the records of the County of Dallas, State of Texas.

Notary Public
My Commission Expires

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ד' בתשרי תש"ם
14 בספטמבר 1980

מספר:

לכבוד

ועד דיירי שלב ג'

גילה

א,נ,

הנדון: בית כנסת בשלב ג' - גילה
מכתבכם לשר השיכון מיום 27.7.80

הריני לאשר כי באזור מגורייכם ישנה חכניה להקים בית
כנסת. תשנון המכנה עומד להסתיים אך עקב מגבלות
הקציביות לא נתחיל בכניחו עוד בשנת התקציב הנוכחית.

כב רכה שנה טובה

בנימין זלמן

מנהל יחידת פרוגרמה

העתק: מר ע. לכל - עוזר שר השיכון
מר א. הייר - מ"מ מנהל מחוז י-ם
גב' ס. ברור - מסונה על מוס"צ ✓

כ"ב בסיון תשמ"א
30 בנובמבר 1990

לכבוד
ח"כ חנה אמל
הממונה על היה החינוך
עיריית ירושלים.

גברת בכורה,

הבריון ב"מ בחכנון האסוסי (יובל גד) בעילה.
מחברת מ-19 בנובמבר 1990

חברה יובל גד שומעת לסיוע בתיבות אלו את מה חכמות
העבודה, כשהחייבות החברה למסור לאשת"מ את זה עד
15 בנובמבר 1990.

לאחר שתאריך זה ימסר את מושלם למנהל האגף לחכנון
מ"מ בעירייה לפיכך יאשרר.

ב ב ר כ ה ,



אהרן חילד

מנהל מחוז במדעל

העתק: יר י. טקסט עיריית י-ם
גב' ל. גרנז עיריית י-ם
✓ גב' י. ברנז
מר מ. אברמוביץ



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

חבר מועצת העירייה
عضو المجلس البلدي

בכסלו השמ"א
18.11.80

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23
24-11-1980
דואר נכנס

15.12

לכבוד
מר אהוד חייך
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים

א.נ.א

הנדון: בית ספר בתכנון קאסוטו בגילה

אודה לך אם תדאג כי התוכניות של בניה ביה"ס קאסוטו בגילה שהוסבו בשיטה הטרומית יועברו לעיונו של הארכיטקט זבי ברנדס - מנהל אגף תכנון מבנים בעירייה על מנת שיוכל להעיר הערותיו וזאת בהתאם להסכם שלנו עם משרד השיכון.

הסתבר לי במקרה שהדבר לא נעשה עד כה ומוטב מאוחר ...

כן אבקש לדעת באיזה שלב נמצא פרויקט זה, האם פורסם מכרז?

ב ב ר כ ה,

חמר אשל
הממונה על תיק החינוך

העמק: מר י. שיפטן - מנהל המחלקה לחינוך
גב' ל. גובן - מתכננת מערכת החינוך.

Handwritten notes in Hebrew:
בית ספר
ארכיטקט
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
24.11.80
א.נ.א

מ"מ מס' 08.11.81

מס' תעודת זהות	
שם	
תאריך לידה	
מס' תעודת זהות	

מס' תעודת זהות
 שם
 תאריך לידה
 מס' תעודת זהות

מ.ל.

הודעה על פיקודת המבחן

הודעה על פיקודת המבחן
 המבחן יתקיים ביום שבת 10.11.81 בשעה 08:00
 בבית המדרש "תורת משה" רחוב המלך 100 ירושלים
 המבחן יתקיים בשפה עברית.

המבחן יתקיים ביום שבת 10.11.81 בשעה 08:00

בבית המדרש "תורת משה" רחוב המלך 100 ירושלים

מ.ל.

מס' תעודת זהות
 שם

מס' תעודת זהות - שם
 מס' תעודת זהות - שם

119, JABOTINSKY STREET · TEL-AVIV
ROSMARIN ST., HOUSE 240, GILO, JERUSALEM

טל. 03-45 49 01
טל. 02-71 79 19

רחוב זבוטינסקי 119 · תל-אביב
רחוב רוזמרין, בית 240, גילה, ירושלים

ירושלים, 9.12.80

או/880

לכבוד
מר מ. קיסנר
משרד הבנוי והשכון
מחוז ירושלים

א. ג.

הנדון: - גילה - גן ילדים שילוני - הקבלן אשטרום
חוזה מס' 40/65389/79

בחשבון הסומי שהגיש לנו הקבלן, בנוסף לתביעותיו אשר להם הוצאנו המלצה במכתבנו מס' או/847 מיום 27.11.80, נכללת גם תביעה בקשר לדחיית מועד הביצוע כבנין. להלן העובדות בקשר לחוזה זה :-

- א. מסירת השטח לקבלן הייתה ב-3.8.79.
- ב. תאריך הגשת החשבון הראשון על גמר הרכבת הכתוח - 25.11.79.
- ג. תאריך הגשת החשבון השני עבור בצוע רצוף בגן הילדים היה ב- 25.4.80.
- ד. תאריך החתימה על החוזה - 24.12.79.
- ה. מבחינת ביצוע הקבודה, הקבלן סיים את היסודות שלב 08 אי.בי.אמ. בחודש ספטמבר 1980. את יציקת המקלטים וכל עבודות הבטונים הקונבנציונליים סיים הקבלן בחודש אוקטובר 1980, הרכבת גן הילדים בוצעה בנובמבר 1980 ולאחר מכן השלים הקבלן את עבודות הריצוף שלב 26 אי.בי.אמ. בחודש אפריל 1980.
- ו. הקבלן חובע לעדכן את מחירי החוזה לתאריך 1.1.80, שבוע לאחר חתימת החוזה ולקבוע את משך הביצוע ל-8 חודשים וזאת לצורך חישוב התייקרויות.
- ז. המדד הקובע בחוזה הוא מדד ספטמבר 1979 575.1 בעיקור שעות קיץ, ומחיר החוזה פאושלי למעט התייקרויות לתקופה של 11 חודשים מיום מסירת השטח.
- ח. אנו מעבירים להכרעתכם את התביעה הנ"ל.

ב ב ר כ ה ,


א. אולניק

העתק:
מר א. גדלביץ - ס/מנהל המח' הטכנית
גב' נדיה הרשקוביץ ✓

והסינוי

ה' בטבת תשמ"א
16 בדצמבר 1980

לכבוד
סר ד. בן אלדל
מסנה מוס"צ
משהב"ש

א, ג,

הנדון: הגדלה להור"ב 54701 - 2 כחות בן נוספות בגילה ע"י ביה"ס שלב ד'

כאוגוסט 1980 הוציא מחוז ירושלים הוראת ביצוע לבן ילדים בגילה שלב ב' כרמי
סס' הור"ב 54703 ע"ס 11.117.290 ל"י.

החברר כי בן הילדים שהוכנו ע"י אר" כרמי אינו הוא למרוגרתה לכן הוחלט לא
לבנות בן זה.

במקביל הוצאה הוראת ביצוע סס' 54701 לבן ילדים 2 כחות ע"י ביה"ס 24 כחות בגילה
שלב ד' (יובל גד).

היות וליד ביה"ס מתוכננות להכנות 4 כחות בן, אנו מקשים להשתמש בכסף שלא נוצל
לבן כרמי לבנות בן זה.

הבקשה תבה על דעת עיריית ירושלים ומשרד החנוך.

ב/כ ר כ ה

מירי ברזור
ע/ר למוס"צ

העמק: סר א. תייר - מנהל מחוז ירושלים
סר כ. דביר - מנהל יחידת מרוגרות
סר ס. אברמוביץ - ראש צוות
סר א. אולניק - מנהל מרויקט גילה

SECRET

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

SECRET

... ..
... ..
... ..
... ..

מכון ווינגייט לחינוך גופני ולספורט

ליד משרד החינוך והתנועה

WINGATE INSTITUTE FOR PHYSICAL EDUCATION & SPORT

ASSOCIATED WITH THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE



הפדור למיתקני ספורט.

תל-אביב, י"ט בכסלו תשמ"א

27 בנובמבר 1980

פס' שופא: 106

לכבוד

מב' אליהו בנק

מנהל מחנה

מחנה הספורט, תל-אביב 23 י.א.

פנורם פנימה בנושא בריכה - השחיה במחנה גילית.

הנוכחים: אדריכל מ. לופנפלד, ד, סגב, אדריכל א. לויטין, ג'וס.

אדריכל לופנפלד הציג את הפניה בריכה השחיה המתוכננת במחנה גילית. להלן טקסט הדיון שנערך לאחר מכן:

1. עומק הבריכה - הבריכה תהיה בעומקים 1.10 - 2.20 מ'.
2. העלה בליטה - תוכנן העלה בליטה "קלאסית" המכוסה בלה ע"י המפזן, כך שלמעשה יוגדל הריב האפקטיבי של המפזנים.
3. שרובים - יש לשאף לתכנון חדרים במפלס הבריכה כדי למנוע שטות במדרגות "רשומות" שהדרים לבריכה. יש לקרב את בתי-השטות והמפזנים עד כמה שהמטר לשטח הבריכה.
4. מלחה - יש לבדוק בטול או אמצעים שטח המלחה (54 מ²). בשטח זה נהן לתכנן קמטריה הצומח על הבריכה.
5. מנהרות וחדים - יש לשאף למצב שטח המנהרות מוחה לבריכה, והתקנת חדר - מכונית במפלס מוחה לפני המים.
- ספקות - בכל מקרה של מדרגות "רשומות" יש לתכנן מעקות בהתאם.

גרשם ע"י
איתמר לויטין
אדריכל רשות הספורט.

והכינוי

ד' בטבת תשמ"א
14 בדצמבר 1980

אל: מר א. אברמוביץ - ראש צוות

הנדון: 2 כחות גן נוספות למי"ס יובל גר שלב ד' גילה

ברצוני להביא לידיעתך כי בנוסף ל-2 כחות שעל חברה יובל גר להקים בצמוד
למית הספר האפשר מיטון 2 הכחות הנוספות המוזכרות לביצוע לפי ההכנון.

נא שיפולק הדרור עם חברה יובל גר ועם המהנדסים כדי להביא גם גן זה לביצוע
עוד בשנה הקציבה זו.

מס' הור"ב 54701.
ס.ח. 90187/310/07.

נכר כ ה



בני דביר

מנהל יחידת פרוגרמות

העמק: מר א. אולביץ - מנהל פרויקט גילה
גב' ס. ברור - ע"ר למוס"צ
מר א. הניג - סנכ"ל יובל גר

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1950

1950

זקם ראשון

מא

נני

23

י משרד השכון יר

י ממשיכון תא

14.11.80

נא העבירו הטלפס למחוז ירושלים

אל : מר קוקוש, מנהל מחי טכנית ירושלים
מאת: מ. מרחב

הנדון : חוזה סוכל בונה 40/62392/76 גילה.

נא להמציא לנו הוראת ביצוע חתומה לשנוי החנויות למועדון קשישים
כדי שנוכל להוציא שנוי חוזה.

ב ב ר כ ה

מ. מרחב

העתק:

4, 49

מר ערד

מר לוור

נא לאשר

219-231

החחהמאשרת 9....

173 יחז + 2 חנויות
193 + חנויות קטנות - א.פ. - חז

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF JUSTICE

WASHINGTON, D. C.

INVESTIGATION OF THE ACTS OF

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES
AND VICE PRESIDENT

AND THE MEMBERS OF THE EXECUTIVE
BRANCH OF THE GOVERNMENT

IN CONNECTION WITH THE INVESTIGATION
OF THE ACTS OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES

AND VICE PRESIDENT

AND

THE

MEMBERS

OF THE

EXECUTIVE

BRANCH OF THE GOVERNMENT

והפינרי

ל' ככסלו תשמ"א
8 בדצמבר 1980

לכבוד
אור' צבי ברנדיס
מח' שרותי הנדסה
עיריית ירושלים

א,נ,

הנדון: כ"ס 24 כחוח + 4 כחוח גן שלב ד' - גילה

מ"כ חכניות הגשה של ביה"ס וגן הילדים כגילה (חכנון "יובל גד") מאושרוח
ע"י משרד החנוך.

אנא אשורך.

כ ב ר כה

מירי ברזור
ע/ר למוס"צ

1917

1917

1917

1917

1917

1917

מדינת ישראל

2/1/80

משרד החינוך והתרבות
האגף לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

27 בדצמבר 1980

לכבוד

גב' מירי ברנר
משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

שלום רב,

הנדון: אישור תכנית ב"ס 24 כחות בגילה שלב ד' (3117 מ"ר) (תכנית שיכון 13-78)

בתשובה למכתבך מיום _____ מוחזרת התכנית הנ"ל כשהיא
מאושרת על ידינו.

מספר האישור 396 מיום 23.10.80.

אין לראות באישור זה כל החייבות תקציבית.

בכבוד רב,

י"ו
קיצחק גנור
מנהל המחלקה

מצורפת התכנית המאושרת.

העחק: מר ר. ירון - מנהל המח' למיפוי

1
The first of these is the
fact that the government
has a monopoly on the
production of money.

It is also true that the
government has a monopoly
on the production of
the legal tender.

It is also true that the
government has a monopoly
on the production of
the legal tender.

It is also true that the
government has a monopoly
on the production of
the legal tender.

It is also true that the
government has a monopoly
on the production of
the legal tender.

It is also true that the
government has a monopoly
on the production of
the legal tender.

It is also true that the
government has a monopoly
on the production of
the legal tender.

It is also true that the
government has a monopoly
on the production of
the legal tender.

It is also true that the
government has a monopoly
on the production of
the legal tender.

It is also true that the
government has a monopoly
on the production of
the legal tender.

It is also true that the
government has a monopoly
on the production of
the legal tender.

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
האגף לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

24-8/1

27 בנובמבר 1980

לכבוד

גב' מירי ברור

משרד הבינוי והשיכון

מחוז ירושלים

שלום רב,

הנדון: אישור תכנית 4 כחות גן ילדים בגילה שלב ד' (486 מ"ר) תכנית שיכון מס'

בתשובה למכתבך מיום _____ מוחזרת התכנית הנ"ל כשהיא
מאושרת על ידינו.

מספר האישור 397 מיום 23.10.80

אין לראות באישור זה כל התחייבות תקציבית.

בכבוד רב,
רינה אלרס
יצחק גנור
מנהל המחלקה

מצורפת התכנית המאושרת.

העתק: מר ר. ירון - מנהל המח' למיפוי

מבחן ישיבה בנושאי מוס"צ גילה

בהשתייכות: אשר אולציק, סרדי, מירי, אהוד, עליזה אברמסקו.

1. ביה"ס בשלב ה' - יוצא ממרכז חכרון - בצופ. מירי הפעיר לאחד אולציק ורוג'רסה לבי"ס 18 כחוד המוסכמת על דעת משרד החינוך ועיריית ירושלים.
 2. גן כרמי - השתו גדול מהשתו גן ילדים מחובל גן הילדים לא יבוצע בחכרון הנוכחי (כרמי).
- משרד אולציק ידאג לשכני חב"פ - גן הילדים יוצא למרכז חכרון בצופ.
- במקום גן הילדים כרמי יבוצע בשנת הקציר הנוכחית גן ילדים נוסף ש"י ביה"ס בשלב ב' גילה (יובל גד).

רשמה: מירי ברור

הפקו: למשתתפים
גב' א. ברזמי
מר אברמביץ

1911

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ל"ז בחשוון תשמ"א
27 באוקטובר 1980

אל"ז אריז
פ' אבנר

הנדון: מיקום חתנות מגן דוד אהום בשכונת

רצ"ב פרוטוקול בהנדון.

אבקשה לשותף פעולה עם אדריכל ברוצקוס.

בבכ"ה

בני דביר

מנהל יחידת פרוגרמה

מנהל יחידת פרוגרמה

השתתפו: מר ט. לייטרסדורף

מר ד. שומדיה

גב' א. ברזקי

גב' ת. ברנרד ✓

י"ז בחשוון תשמ"א
27 באוקטובר 1980

אל: 37 ע ע

הנדון: מינום תחנות מגן דוד אדום בשכונות

רצ"ב פרוטוקול בהנדון.

אבקש לשתף פעולה עם אדריכל ברוצקוס.

נ ב ר כ ה

בני דביר

מנהל יחידת פרוגהמות

העסק: מר א. אולנצק
גב' א. בויסקי
גב' ת. ברודר ✓

RECEIVED
MAY 19 1901

100

100

100

100

100

100

100

1870
1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

י"ז בחשוון תשמ"א
27 באוקטובר 1980

אל: 701

הבדון: פיקוס תחנות מגן דוד אדום בשכונות

רצ"ב פרוטוקול בבדון.

אבקשת לשתף פעולה עם אדריכל ברוצקוס.

ב ב ר כ ה

בני דניר

מנהל יחידת פרוגרמות

מנהל יחידת פרוגרמות

העתק: מר. ש. לרמן

גב' א. ברזקי

גב' מ. ברור ✓

סכום דבריות - חתנות סגן דוד אדום 22.10.80

הסתתרו אדר' ברזקוס		נציגי סגן דוד אדום
מר ו. גוליק		
מר הרביץ צבי		
מר ב. דביר		נציגי משרד הביטוי והשיכון
גב' א. ברזקי		
גב' א. זביה		

גילת - בשטח המיועד למרפאה מר ברזקוס יכין ת.ב.פ. לחלוקת השטח לשתי פרבקינות
ס.ד.א.4-מרפאה.

רמות - המגרש המיועד בת.ב.פ. על המרכז מתאים למטרה.

חלפיות מזרזה - השטח שאותר לא מתאים למטרות, מבחינים שטח קרוב למרכז כיוון שהתחבנות
מבוססות על עבודה המבדבותית.


מופע ומאדר' ברזקוס יתגש עם אדר' אודיובספן במטרה לבנות לשלב את
התחבנה עם המרק המתוכנן בין המרכז המסחרי לכביש הרכס

מעלה אדומים - יש אזור שטח במרכז.
ליתא ל עם אדר' פרבצור.

קריה ארבע - בני פציע ליד המרכז. תכנון ע"י סו"פ על המתכנן לתאם עם אדר' סקר.

רשמת: זביה אפרתי

הפקה: גב' סירי ברור

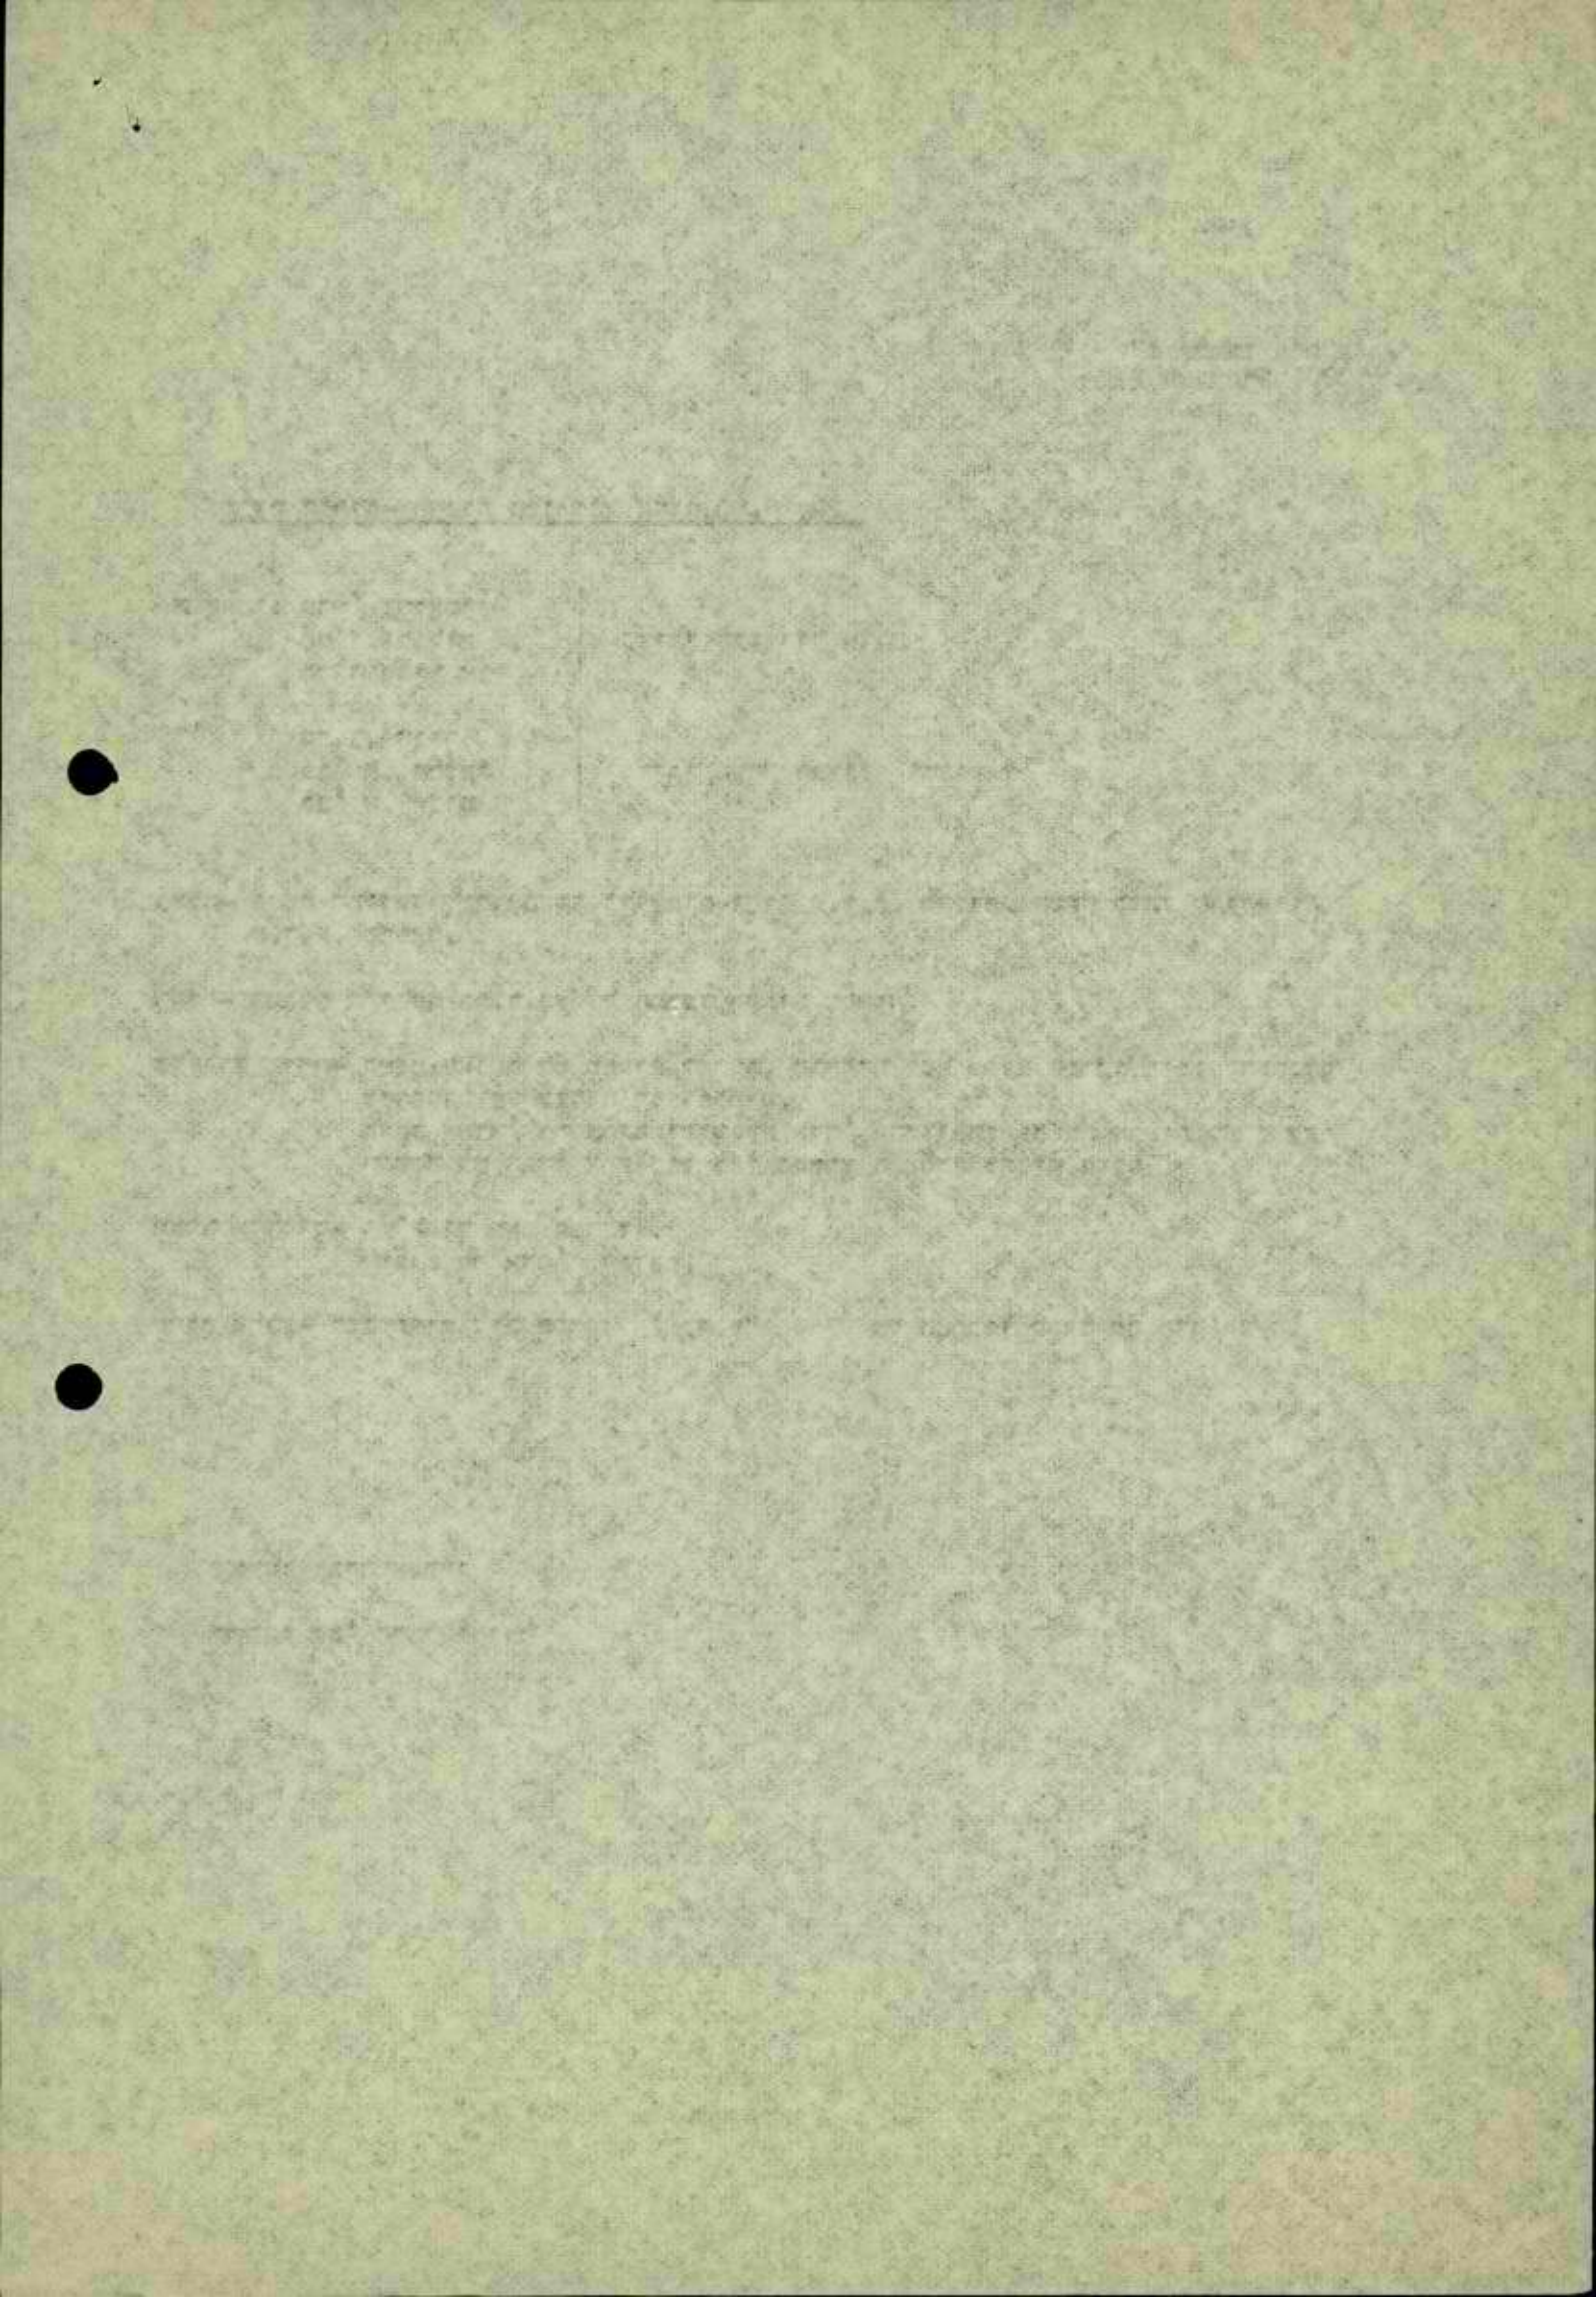

מס' תיק המחלקה 531	תאריך 17.10.82	מטמך לקבלת בנין / כביש	עיריית ירושלים המחלקה לשירותי הנדסה
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--

פירוט העבודה אן ילצ'ה - 2 כביש - 304 בנין	מס' תיק המחלקה 531
שם הקבלן מטמ'ים יונק'ים	תאריך התחלת העבודה
	תאריך סיום העבודה

שמות הנוכחים:

ב"כ מנהל המחלקה דניאל יונק'ים	ב"כ נכסי העירייה
ב"כ מנכ"ל העירייה דניאל יונק'ים	ב"כ הקבלן: 1. מ. ש. ש.
ב"כ הרשות המזמינה פריד אינסט	2.
ב"כ המחלקה המקבלת לאחזקה פריד אינסט	3.

אנו החתומים מטה ביקרנו ובדקנו את העבודה הנ"ל ומצאנו שהקבלן סיים את העבודה לפי התכניות, בהתאם לתנאי חוזה קבלנים ובטיב הדרוש, פרט לתיקונים המפורטים להלן שעליו להשלים
 תד ~~21227~~ **21227**

מס' סדר	המקום	תיאור התיקון
1	היציג וניקי היציג	
2	נציג היציג דוויג	כניק להחליף כביש
3	כביש סוגיה כביש	
4	מיציק סדר	
5	מזרז מוליק מרבית לקבוע ממש	לפיכא
6	מכביש פלורס	מכביש
7	מכביש סדר	מכביש
8	מכביש סדר	מכביש
9	מכביש סדר	מכביש

ב"כ מנהל המחלקה
[Signature]

ב"כ מנכ"ל העירייה
[Signature]

המזמין
[Signature]

ב"כ המחלקה המקבלת לאחזקה
[Signature]

ב"כ נכסי העירייה

הובא לידיעת הקבלן:

חתימת ב"כ הקבלן: **1. [Signature]**

2.

3.

מאחר והקבלן ביצע את כל התיקונים הניזכרים לעיל, הנני מאשר כי הקבלן השלים את העבודה בהתאם לתנאי החוזה וקיבלתי את הבנין/הכביש הנ"ל.

אחריות הקבלן על החזקת הבנין/הכביש הנ"ל בהתאם לסעיפים 55, 56, 57 של תנאי החוזה מסתיימת בתאריך _____

תפוצה: **12.10.82** תאריך

שם המפקח **[Signature]**

חתימה **[Signature]**

1. קבלן
2. מנהל המחלקה לשירותי הנדסה
3. מנהל המחלקה המתחזקת
4. מנהל האגף המבצע
5. העוזר לכספים
6. הממונה על נכסי העירייה

חתימת מנהל האגף

חתימת מנהל המחלקה

UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

STATE OF _____ COUNTY OF _____
PLANTER'S NAME _____
ADDRESS _____

PLANTER'S NAME _____
ADDRESS _____
CITY _____

PLANTER'S NAME _____
ADDRESS _____

NO.	CULTURE	PLANTER'S NAME	ADDRESS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

PLANTER'S NAME _____
ADDRESS _____
CITY _____

PLANTER'S NAME _____
ADDRESS _____
CITY _____

תאריך 17.10.80	מטמך לקבלת בנין / כביש	עיריית ירושלים המחלקה לשירותי הנדסה
-------------------	---------------------------	--

מס' תיק המחלקה 513	תאריך סיום העבודה	פירוט העבודה סן שילוני - 2-2-80
תאריך התחלת העבודה	שם הקבלן זשטייב	

שמות הנוכחים:

ב"כ מנהל המחלקה	ב"כ נכסי העירייה	ב"כ העירייה
ב"כ הרשות המזמינה	ב"כ המחלקה המקבלת לאחזקה	

Handwritten notes:
 1. ב"כ הקבלן: ז. כ"מ
 2. פהר זינס
 3. פהר זינס

אנו החתומים מטה ביקרנו ובדקנו את העבודה הנ"ל ומצאנו שהקבלן סיים את העבודה לפי התכניות, בהתאם לתנאי חוזה קבלנים ובטיב הדרוש, פרט לתיקונים המפורטים להלן שעליו להשלים

עד 10/10/80

מ"מ	המקום	תיאור התיקון
1	ס"ב סילטי גולקט צלפס	
2	לסני א"ה מקויל במצב	
3	לסני א"ה א"ה טלפון במצב	
4	קני' הס'ה קני' א' לתיקון	כ"מ ז' טלפון
5	להנכי' ש"ר א"ה א"ה א"ה	
6	א"ה א"ה א"ה א"ה א"ה	
7	ה"ה א"ה א"ה א"ה א"ה	

ב"כ מנהל המחלקה
 ב"כ מנכ"ל העירייה
 המזמין
 ב"כ המחלקה המקבלת לאחזקה
 ב"כ נכסי העירייה

הובא לידיעת הקבלן:

חתימת ב"כ הקבלן: 1, 2, 3

מאחר והקבלן ביצע את כל התיקונים הניזכרים לעיל, הנני מאשר כי הקבלן השלים את העבודה בהתאם לתנאי החוזה וקיבלתי את הבנין/הכביש הנ"ל.

אחריות הקבלן על החזקה הבנין/הכביש הנ"ל בהתאם לסעיפים 55, 56, 57 של תנאי החוזה מסתיימת בתאריך _____

תפוצה: _____
 תאריך: 17.10.80
 שם המפקח: _____
 חתימה: _____

1. קבלן
2. מנהל המחלקה לשירותי הנדסה
3. מנהל המחלקה המתחזקת
4. מנהל האגף המבצע
5. העוזר לכספים
6. הממונה על נכסי העירייה

חתימת מנהל המחלקה חתימת מנהל האגף

2 בנובמבר 1980

אל: מר ב. דביר, מחוז ירושלים

מאח: ד. בן אלול

הנדון: תוספת 6 כיתות לבי"ס בגילה
מכתבך: מ-22.10.80

אין כל מקום לחקן טעות (כפי שהנך מציע), כי לא
נמלה כל טעות.

מכיון שמדובר בתוספת לכנין (שנמצא בשלבי בניה) ולא
בהתחלה בבניה הדישה - התוספת הנ"ל אינה כלולה בפרוגרמה מינימום
1980.

ההגדלה לחוזה הקבלני הופעלה, לכן, בהוראת ביצוע מתקציב
שנים קודמות (כפי שניתן ללמוד גם מהוראת הביצוע ההתומה,
שהעמקה הועבר למחוזכם).

ב ב ר כ ה,



ד. בן אלול

הממונה על מוסדות ציבור

הפק: מר ז. ברקאי

מר א. חייך

גב' מירי ברור

1. The first part of the document

is a list of names

MEMORANDUM FOR THE RECORD

2. The second part of the document

is a list of names

3. The third part of the document is a list of names

4. The fourth part of the document is a list of names

5. The fifth part of the document

6. The sixth part of the document is a list of names

7. The seventh part of the document

is a list of names

פירוט העבודה: אן תלמידים (פיקר) תיקון כביש
 שם הקבלן: א.מ.א - 17
 מס' תיק המחלקה
 תאריך סיום העבודה

- שמות הנוכחים:
 ב"כ מנהל המחלקה: מרדכי גורן
 ב"כ מנכ"ל העיריה: מרדכי גורן
 ב"כ הרשות המזמינה: מרדכי גורן
 ב"כ המחלקה-המקבלת לאחזקה: מרדכי גורן

אנו החתומים מטה ביקרנו ובדקנו את העבודה הנ"ל ומצאנו שהקבלן סיים את העבודה לפי התכניות, בהתאם לתנאי חוזה קבלנים ובטיב הדרוש, פרט לתיקונים המפורטים להלן שעליו להשלים עד 2/10/80

מס'	המקום	תיאור התיקון
1	הכביש אלפי חומה קניון	
2	קניון - גישה קניון	
3	מסוף תלמי	
4	גישה לתחנת	
5	קניון כחול	
6	גישה לתחנת	
7	קניון סיום	
8	גישה לתחנת	
9	קניון סיום	
10	גישה לתחנת	

ב"כ מנהל המחלקה

ב"כ מנכ"ל העיריה

המזמין

ב"כ המחלקה המקבלת לאחזקה

ב"כ נכסי העיריה

הובא לידיעת הקבלן:
 חתימת ב"כ הקבלן: 2
 3

מאחר והקבלן ביצע את כל התיקונים הניזכרים לעיל, הנני מאשר כי הקבלן השלים את העבודה בהתאם לתנאי החוזה וקיבלתי את הבנין/הכביש הנ"ל.

אחריות הקבלן על החזקת הבנין/הכביש הנ"ל בהתאם לסעיפים 55, 56, 57 של תנאי החוזה מסתיימת בתאריך _____

תפוצה:
 תאריך _____
 שם המפקח _____
 חתימה _____

- קבלן
- מנהל המחלקה לשירותי הנדסה
- מנהל המחלקה המתחזקת
- מנהל האגף המבצע
- העוזר לכספים
- הממונה על נכסי העיריה

חתימת מנהל האגף _____
 חתימת מנהל המחלקה _____



יובל גד בע"מ

המכעל: אזור התעשייה, אשקלון, ת.ד. 12, טלפון: 25141-051
המשרד: כן יהודה 99, ת.ד. 3035 תל-אביב, טלפון: 238221

מס' 234/80

תל-אביב, 17 ביוני 1980

לכבוד

משרד הבנוי והשכון

מחוז ירושלים

לידי מר בני דביר
הממונה על הפרוגרמות

א.נ.,

הנדון: בי"ס בגיליה.

1. אנו מגישים בזאת דף ריכוז, לביצוע בי"ס 24 כיתות כולל אולם-התעמלות ומקלט בגיליה. (שטח יסקי).
2. המחירים מבוססים על הוצה ביה"ס רמות 01.
3. ביה"ס מתוכנן לבניה בשלבים, ל- 12 כיתות ו- 18 כיתות.
4. התוכניות הועברו לאישור משרד-החינוך.

ב כ ב ו ד ר ב ,

ע. לויך

מהנדס שווק



1944-1945

Department of the Interior
Bureau of Land Management

June 1945

Washington, D.C.

Dear Sir:

Very much interested

in your

letter of the 15th
dated at

re: the

subject of the land

1. The above land is being held by the State of California and is being offered for sale to the public.

2. The above land is being offered for sale to the public.

3. The above land is being offered for sale to the public.

4. The above land is being offered for sale to the public.

Sincerely,
Very truly yours,

W. H. ...
Director

בי"ס 24 כחות - בגילה
כולל אולם - התעמלות ומקלט

דף רכוז

			1. מבנה הכיתות והמנהלה בשטח 2829 מ"ר
46,743,140	=	16,522.85	2829 מ"ר x ל"י/מ"ר
			חוספת עבור הסקה מרכזית
5,812,550	=		(בכיתות ואולם התעמלות)
<u>52,555,690</u>			<u>סה"כ למבנה הכיתות</u>
			2. אולם - התעמלות ומקלט
16,528,360	=		חוספת עבור הגדלת המקלט ל- 24 כיתות
			כ- 90 מ"ר
<u>2,125,075</u>	=		<u>סה"כ לאולם התעמלות ומקלט</u>
18,653,435			
			3. עבודות עפר וחציבות למקלט ויסודות (בהערכה)
4,000,000	=		
<u>75,209,125</u>			<u>סה"כ (לא כולל מ.ע.מ.)</u>

הערות:

- א. המחירים צמודים למדד התשומה בבניה, לחודש מאי 1980 - 1002.6 נק'.
- ב. ההצעה כוללת הסקה מרכזית וציפוי אבן במבנה הכיתות ואולם - התעמלות.
- ג. ההצעה אינה כוללת עבודות פיתוח כלשהן.

1940 זכר
2280 א"ח

2660 ז"י
3220 א"ח

92890

1980 - 1981 - 1982

1983 - 1984 - 1985

1986 - 1987

1. 1986 - 1987 - 1988

1986 - 1987 - 1988 = 101,747,440

1989 - 1990 - 1991 = 2,812,220

1986 - 1987 - 1988 = 104,559,660

2. 1989 - 1990 - 1991

= 16,757,400

1992 - 1993 - 1994

= 2,757,075

1989 - 1990 - 1991
1992 - 1993 - 1994 = 19,514,475

3. 1995 - 1996 - 1997

(amount) = 4,000,000

1986 - 1987 - 1988
(1989 - 1990 - 1991)

1986 - 1987

1. 1986 - 1987 - 1988 = 101,747,440

2. 1989 - 1990 - 1991 = 2,812,220

3. 1992 - 1993 - 1994 = 2,757,075

כ"ב באלול תש"מ
3 בספטמבר 1980

לכבוד
גב' חמר אמל
הממונה על חיק החיבור
עיריית ירושלים.

גברת בכבוד,

הנדון: גילה, בניית ביה"ס קטור.
מסמך מ-14.9.80

בכבודת משרדנו לכבודת את ביה"ס הנ"ל במסגרת שנת הפרוגרמה 1980. התחלת הבניה מתעכבת בגלל קבלת אשר במצא במגרש ללא רשות ומסרב לפנותו. אנו עושים מאמצים לפנות את המגרש, אך עלי לציין שהמגרש בבעלותכם, המיבנים עליו בלתי חוקיים ומיפולכם בפיגוי המגרש והדיסת המבנים היה מקדם את התחלת הבניה באופן משמעותי.

בכבודת שנה טובה

אהרן חייך
מ"מ מנהל מחוז ירושלים

התקופה ב. הביר - מנהל יח' פרוגרמה
גב' מ. ברור - ע/ר למוסדות חיבור
מר א. אולביק - מנהל הפרוייקט

1912

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Faint, illegible text at the bottom of the page.

אשר אולניק חברה להנדסה נעים ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב ז'בוטינסקי 119 • תל-אביב • טל. 03-45 49 01
רחוב רוזמרין, בית 240, גילה, ירושלים • טל. 02-71 79 19

ירושלים, 28.8.80

או/673

לכבוד
עיריית ירושלים
המחלקה לאספקת מים
ירושלים

א. ג.

הנדון: - גילה ג' - גן ילדים מס' 6 ובי"ס חרובי
הקבלן: מ. אביב - חוזה 40/62805/76
וחוזה 40/62807/76

מחלקת החינוך של העירייה קבלה את המוסדות הנ"ל
לאחזקתם, וזאת ללא חיבורי מים קבועים וסופיים. המוסדות
משתמשים בינתיים במים מחיבור זמני של הקבלן.

אולם מצב זה לא יוכל להמשך זמן רב, הקבלן יבחן את
השעון הזמני, ובנוסף לזאת - החוזה של הקו הזמני מפריע
לביצוע הפיחות הצמוד לבניינים השכנים.

אי לכך אנו מבקשים לבצע את החיבורים הסופיים
למוסדות הנ"ל.

בכבוד רב,

אורי ורון.

העתק:

מר דוג'ה - מהנדס אינסטלציה מחוזי, משהב"ש
גב' ברור - אחראית למוס"ג, משהב"ש ✓

ASHER OLENIK ENGINEERING LTD. D.M.S. BUILDING GROUP LTD. 1701

110, LABORATORY STREET, TEL AVIV, TEL. 03-421 10 00, ISRAEL. 110, LABORATORY STREET, TEL AVIV, TEL. 03-421 10 00, ISRAEL.

00. 100. 1000000
000000

000000
000000
000000
000000

000000

000000
000000
000000

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly "M. Olenik".

000000
000000
000000

000000
000000
000000

000000
000000

000000

000000

000000
000000
000000

ירושלים, 25.8.80

א/665

פרוטוקול קבלה - גן ילדים פייר - הקבלן: כחילה
ס' חוזה 40/64161/78

נוכחים בקבלה ביום 25.8.80:

- מר א. פהר - מח' ההינוך עיריית ירושלים
- מר י. רמז - המח' לבטיחות, עיריית ירושלים
- מר י. קאלק - שרותי הנדסה, עיריית ירושלים
- מר כחילה שלום - הקבלן
- א. ורון - נציג משרד אולניק

בסיום הקבלה נהגלו הליקויים הבאים:-

- | | |
|---|----------|
| 1. עדיין לא בוצעה בקרת השמל | <u>א</u> |
| 2. יש להוסיף רוזטות לידידות בדלתות המחסנים | |
| 3. אגרי החום עדיין לא מורכבים | |
| 4. יש לסגור מעקב בחדר הכיתה המערבית | |
| 5. יש לנקות את הקיר בחזית הכתם המזרחית | |
| 6. יש להתאים דלת לבוילר בכתה המזרחית | |
| 7. יש לסמן מקלטים וארזד כיבוי אש בשלטים זוהרים | |
| 8. יש להשלים קירות הכיתה + מעקה בחזית הכניסה לגן הילדים | |

בנוסף לנ"ל דורשים נציגי העירייה:

- | | |
|---|----------|
| 1. החקנת סורגים סביב כל החלונות וחדלתות בגן הילדים, לא כולל דלת כניסה. | <u>ב</u> |
| 2. החלפת זכוכית בדלת הכניסה לזכוכית משוריינת. | |
| 3. טיב הביצוע של הפוליטורישן בגג גרוק, חגג מלא גליט ולא מוחלק. | |
| כעת חגג נמצאת בדיון, ובהוס שנת האחריות יוחלט כיצד למחור את הבעיה. | |
| נציגי העירייה הודיעו שיקבלו את הגן עם השלמת העבודות במעיימים א. 1 - 8, ועם בצוע הסורגים והזכוכית המשוריינת. | |

רשמו א. ורון

העתקים
לנוכחים
למר ל. קוקוש - מ"מ מנהל המח' הטכנית משהב"ש
מר א. גדלביץ - ס/מנהל המח' הטכנית משהב"ש
גב' ס. ברורי - אחראית מוס"א, משהב"ש ✓

1000 WEST 10TH AVENUE
CALGARY, ALBERTA, CANADA T2P 0K1

TEL: 262-1111
FAX: 262-1111

1000 WEST 10TH AVENUE
CALGARY, ALBERTA, CANADA T2P 0K1

Handwritten: N.C. 2/11/00
Signature: [Signature]

PROPOSAL FOR THE SUPPLY OF...

1. PROJECT TITLE

2. PROJECT DESCRIPTION

3. SCOPE OF WORK

- 1. [Item 1]
- 2. [Item 2]
- 3. [Item 3]
- 4. [Item 4]
- 5. [Item 5]
- 6. [Item 6]
- 7. [Item 7]
- 8. [Item 8]

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 1. [Item 1]
- 2. [Item 2]
- 3. [Item 3]

5. TERMS AND CONDITIONS

6. CONTACT INFORMATION

7. DATE

ירושלים, 21.8.80
מא/654



פרטי כל קבלה לבן ילדים מס' 8 (14) בגילה
מקבלו: מ. אביב מונה מס' 40/62805/76

שחתפיתו: י. סורוקו, א. פאר, א. גבאי, י. רמז -
עיריית ירושלים

מ. לוי - נציג הקבלן
מ. אלנברג - משרד אולניק

1. העירייה מקבלת את הסכמה ובמסגרת המפתחות (טרם למתקן החשמל ואוגרי המים), למרות שהקבלן לא ביצע את המיקונים לפי רשימת שנקיבה בזמן הקבלה הראשונה. סערכת מפתחות חוטאך בידי הקבלן להשלמת המיקונים. המיקונים יושלמו עד 28.8.80. יושלמו כל הנורות הפלואורסצנט החסרות ואריונות תקשורת.
2. הקבלן נשאר אחראי לכל הנזקים שיגרמו למבנה ולרכוש העירייה, וזאת בעקבות העובדה שבניגוד להבטחותיו לא התקין סורגים על דלתות הכניסה.
3. יש להשלים התקנת מתקני חצר.
4. אוגרי חום טרם נחקלו - חסרים חלקים. יש להפעיל אותם למסירה.

מ. אלנברג מ. לוי י. סורוקו א. פאר א. גבאי י. רמז (-) (-) (-) (-) (-) (-)

הערות:

לנוכחים

חסימת חבזים - עיריית ירושלים
מחלקת המינון - " "
היחידה לתרום ובטחון - "

11/11/2003

11/11/2003

STATE OF THE ART REPORT

PROJECT: [Illegible]
CLIENT: [Illegible]
DATE: [Illegible]

1. [Illegible text]
2. [Illegible text]
3. [Illegible text]
4. [Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

Handwritten: 25.11.2003

אשר אולניק חנוה להנדסה בע"מ ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב ז'בוטינסקי 119, תל אביב • על. 03-45 49 01 • TEL. 119, JABOTINSKY STREET • TEL. AVIV
רחוב רוזמרין, בית 240, גילה, ירושלים • על. 02-71 79 19 • TEL. ROSMARIN ST., HOUSE 240, GILO, JERUSALEM

ירושלים, 25.8.80

או/653

נמטר ביד

לכבוד
מ. אביב מפעלי בניה בע"מ
רחוב כורש 10
ירושלים

א.נ.,

הנדון:- גילה - בגן ילדים מס' 6
חרזה מס' 40/62805/76

בקבלת המפתחות שנערכה בגן ילדים מס' 6 ביום 21.8.80 נתגלו מספר ליקויים חמורים, אשר צוינו בפרוטוקול ועדיין לא שפלה בהם, למרות הבטחותיך הקודמות.

אבקשך לדאוג לתיקון הליקויים הנ"ל עד לפחות שנת הלימודים, כלומר עד לתאריך 28.8.80.

עד להשלמת כל התיקונים לשביעות רצוננו, אנו משעים את כל הטיפול בהשכונות ובתביעות שלכם עבור גן זה.

מצורף פרוטוקול הקבלה מיום 21.8.80, שנחתם ע"י נציגך מר מ. לוי.

בכבוד רב,

אורי אורי

העתק:

- מר ל. קוקוש - מ"מ מנהל המח' הסכנית
- גב' מ. ברזור - אחראית על מוס"צ
- מר י. שיפטן - מח' החנוך עיריית ירושלים
- מר י. סורוקו - מנהל מדור פקוח עליון, עיריית י-ם
- מר י. רמז - עיריית ירושלים

ASHER OLENIK ENGINEERING LTD. 191 LAMONT STREET, TEL AVIV 6150000

ROMANISH HOUSE AND JERUSALEM TEL 02 522 1000

025221000

025221000

025221000
025221000
025221000

025221000

025221000
025221000

025221000
025221000
025221000

025221000
025221000

025221000
025221000

025221000
025221000

025221000
025221000
025221000
025221000

Handwritten: Mr. Olenik
Handwritten: HC

אשר אולניק

חברה להנדסה ב"מ

אתר גילת ירושלים

ירושלים, 20.7.80

או/573

פרוטוקול קבלה - בן ילדים 6 - גילה
לפני קבלת המתחום - ביום 20.7.80
הוצה מס' 40/62807/77, הקבלן: מ. אביב

נוכחים: ה"ה י. קאלק, א. פהר - נציגי העירייה
סר נ. סזרחי - נציג הקבלן
סר א. ורון - נציג הטיקוח

נציגי העירייה הודיעו שיקבלו את הממתחות עם השלמת
העבודה הבאה :

- א. אקרישז על בטונים גלויים
- ב. חיזוק מעקה ליו הכניסה לכיתה 1
- ג. הרכבת מחקני משחקים וטכנות
- ד. צביעה מתיצות בשדרות
- ה. ניקוי זמח ברצפות
- ו. תיקון בארונות המטבח
- ז. ביצוע סף מיט על הדלתות ליציאה לתצר
- ח. החלפת מנעול דלת יציאה לתצר
- ט. טכנות בדלתות כניסה
- י. סיוד
- יא. גרודרים לפתחי סילוט

ללא השלמת עבודות אלה לא יתקבלו הממתחות.
קבלה נקבעה לתאריך 5.8.80 שעה 11.00.

רשם : אורי ורון

הפתקים:

לנוכחים

לסר א. חיידי - מנהל המח' הטכנית משהב"מ
סר שימטן - מחלקתהחינוך, עיריית ירושלים

1944

1944

1944

1944

1944

1944

- 1. 1944
- 2. 1944
- 3. 1944
- 4. 1944
- 5. 1944
- 6. 1944
- 7. 1944
- 8. 1944
- 9. 1944
- 10. 1944

1944

1944

1944

ירושלים, 28.5.80

או/417

סיור ליקויי טיב בגן-ילדים 34, גילה שנערך ביום 28.5.80
- סיום שנת אודיטה -

נוכחים:- נציגי העיריה ה"ה י. טורוק, א. פהר, י. קלק

- י. חזקי - בשוחות

- מ. אביב

- א. ורון

קבלן

הפיקוח

א. כחה עליונה

- (1) רטיבות בחזית מערבית (חלונות) ובחזית מזרחית מאדן החלון.
- (2) אוגר חוס ליד הקיר לא מועל.
- (3) נזילה מפתחי התאורה בכיפת התאורה.
- (4) חסרים מהקני החצר - מבלטת, אריז חול וסככה. יש לצבוע המתקנים הקיימים.
- (5) כחא המונים יש להוריד את הידיה הבולטת ולבטן מטביב.

ב. כחה אמצעית

- (1) יש להגביה אסלה בבית השימוש
- (2) רטיבות בחלון חזית מערבית וחלון חזית דרומית
- (3) יש נזילה מפתחי התאורה בכיפת התאורה
- (4) יש לתקן פנלים שנפלו.

ג. כחה התחתונה

- (1) יש לחזק אסלה בבית השימוש
- (2) רטיבות בחלונות בחזית מערבית ובחזית דרומית.
- (3) יש נזילה מפתחי התאורה בכיפת התאורה.
- (4) יש לתקן פנלים שנפלו.

בנוסף לנ"ל, בבדיקה חזותית של הגג שבוצע מצימוי פוליאוריטן עם קרום הגנה נחגלו מקומות שבהם הקרום פגוע ומפורק.
נציג העיריה יודע על התאריך המוקדם ביותר כדי לאפשר לקבלן ביצוע החיפונים.

רשם : אורי ורון.

המוצא:

למשתחמי הסיור

מר א. הייר - מנהל הכח' הטכנית מטחב"ש

גב' מ. ברוור - מטחב"ש

מר י. שפטן - מחלקת החינוך, עיריית ירושלים

מר מלומד - " " "

1152

1152

1152

1152

1152

1152

- 1) 1152
- 2) 1152
- 3) 1152
- 4) 1152
- 5) 1152

1152

- 1) 1152
- 2) 1152
- 3) 1152
- 4) 1152

1152

- 1) 1152
- 2) 1152
- 3) 1152
- 4) 1152

1152

1152

1152

1152

ירושלים, 20.7.1980

או/574

פרוטוקול מטירה סופית של המבנה והפתוח, לפני קבלת מפתחות
בית ספר ידובי, גילה ג', הקבלן: מרדכי אביב
חווה מס' 40/62807/77 הסיור נערך ביום 20.7.80

נוכחים:- ח"ה י. קאלק, א. א. פהר - נציגי עיריית ירושלים
מר נ. מזרחי - נציג הקבלן
מר א. ורון - נציג הפיקוח

1. נציגי העירייה הודיעו שעם השלמת הליקויים המפורטים בהמשך, יתקבלו המפתחות של המבנה.
 2. הקבלן התחייב להכין 3 סטים של מפתחות עבור כל דלת ו/או ארונות מורים ולוחות השמל בעולים.
 3. הקבלן מתחייב להשלים את העבודה לפי הפרוט הבא:
פתוח: (1) השלמת גדר רשת בחצר המשחקים תוך שבוע ימים.
(2) השלמת גדר רשת וקיר חומך בחזית צפונית עד ה-10 באוגוסט.
(3) השלמת התיקונים בפיתוח תוך שבוע ימים.
- מבנה: מטירת המפתחות ביום 1.8.80 שעה 11.00, כולל מקלט וכולל פיתוח.
יש לציין שבתקופה מ-29.6.80 התקדם הקבלן בצורה משמעותית בהשלמת התיקונים והפיתוח.

להלן רשימת התיקונים:

פ י ת ו ת

1. השלמת גדר רשת חזית דרומית
2. השלמת גדר רשת וקיר חומך חזית צפונית
3. סימוני מגרש כדורסל ומסלול ריצה
4. הרכבת לוחות לסלים
5. תיקון משטח אספלט
6. השלמת פיזור אדמה גן
7. תיקון עמוד האורה לא ישר
8. תוספת קרש מקפצה לבור הקפיצה
9. ניקוי קירות תומכים משרידי יציקוח
10. להשלים 2 אבנים חסרות בקירות תומכים
11. תיקון מדרגות כניסה
12. השלמת הנחת כבלים בחזית מערבית
13. תיקוני אבן בחזית זו
14. השלמת אספלטים בחזית מערבית ותיקון אבן שפה
15. בחצר הפנימית יש לתקן בנצ'יק
16. קטע קיר הבניין ליד הכניסה יש לנקות משרידי יציקה ותיקון הכניסה
17. יש לצבוע את גגון הכניסה
18. יש לסחוט ולתקן הלונות קטנים

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

1. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
 2. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
 3. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
- UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
2. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
3. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
4. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
5. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
6. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
7. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
8. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
9. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
10. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
11. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
12. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
13. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
14. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
15. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
16. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
17. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
18. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
19. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
20. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

מ י ב נ ה

- 1. סתימת סף כניסה לבית
- 2. חיזוק פעמון שבור
- 3. החלפת זכוכית בגלריה
- 4. הרכבה ארונות טלפון במנהלה
- 5. תקוני סיוד וטיח
- 6. להחליף סכמות השמל לכל לוח השמל
- 7. בחדר מזכירות לתקן סדקים וטיח
- 8. בחדר מנהל - תקון סדק וסיוד
- 9. חסר מכסה לקופפתא השמל
- 10. תיקון סדרים בחדר המזכירה וסיוד
- 11. תיקון ידית לחלון בשרותים
- 12. נקוי רצפה
- 13. תוספת ברגים לברזים
- 14. חדר המורים לא נבדק
- 15. בחדר המכונות יש לסייד ולהקן סדקים, תוספת סבכה ולוח אטבסט לסגירת חלל
- 16. בחדר אחות תיקון טיח בפרוזדור
- 17. סתימת רוזטה בכיור
- 18. תיקון סדקים וסיוד
- 19. נקוי כיורים ואמלות
- 20. תיקוני צבע בדלת לחדר סיפולים
- 21. תיקון חלונות ואיסומם בחדר סיפולים
- 22. בארונות יש ללצבוע קנטיים.

כיתות קומה עליונה

- 1. מכסה ניאגרה שבור
- 2. חסרים ברגים לברזים
- 3. בכחה 1 יש לתקן משקוף אלומיניום ולנקות
- 4. בכחה 2 תיקון סיוד מתחת לחלונות
- 5. תיקון צבע בארונות מורים
- 6. הדבקה לוח כיתה בכחה מס' 2
- 7. סתימת חלונות
- 8. חסרה זכוכית בדלת יציאה לגב
- 9. נקיין רוחלה בדלת הכניסה לגב
- 10. צביעה קנטיים בארונות מורים
- 11.

Содержание

- 1. Введение
- 2. Глава I. Общие сведения
- 3. Глава II. Описание
- 4. Глава III. Технические характеристики
- 5. Глава IV. Методы исследования
- 6. Глава V. Результаты и их обсуждение
- 7. Глава VI. Заключение
- 8. Глава VII. Литература
- 9. Глава VIII. Приложение
- 10. Глава IX. Справочные данные
- 11. Глава X. Заключение
- 12. Глава XI. Литература
- 13. Глава XII. Приложение
- 14. Глава XIII. Справочные данные
- 15. Глава XIV. Заключение
- 16. Глава XV. Литература
- 17. Глава XVI. Приложение
- 18. Глава XVII. Справочные данные
- 19. Глава XVIII. Заключение
- 20. Глава XIX. Литература
- 21. Глава XX. Приложение
- 22. Глава XXI. Справочные данные
- 23. Глава XXII. Заключение
- 24. Глава XXIII. Литература
- 25. Глава XXIV. Приложение
- 26. Глава XXV. Справочные данные
- 27. Глава XXVI. Заключение
- 28. Глава XXVII. Литература
- 29. Глава XXVIII. Приложение
- 30. Глава XXIX. Справочные данные
- 31. Глава XXX. Заключение
- 32. Глава XXXI. Литература
- 33. Глава XXXII. Приложение
- 34. Глава XXXIII. Справочные данные
- 35. Глава XXXIV. Заключение
- 36. Глава XXXV. Литература
- 37. Глава XXXVI. Приложение
- 38. Глава XXXVII. Справочные данные
- 39. Глава XXXVIII. Заключение
- 40. Глава XXXIX. Литература
- 41. Глава XL. Приложение
- 42. Глава XLI. Справочные данные
- 43. Глава XLII. Заключение
- 44. Глава XLIII. Литература
- 45. Глава XLIV. Приложение
- 46. Глава XLV. Справочные данные
- 47. Глава XLVI. Заключение
- 48. Глава XLVII. Литература
- 49. Глава XLVIII. Приложение
- 50. Глава XLIX. Справочные данные
- 51. Глава L. Заключение

Содержание

- 1. Введение
- 2. Глава I. Общие сведения
- 3. Глава II. Описание
- 4. Глава III. Технические характеристики
- 5. Глава IV. Методы исследования
- 6. Глава V. Результаты и их обсуждение
- 7. Глава VI. Заключение
- 8. Глава VII. Литература
- 9. Глава VIII. Приложение
- 10. Глава IX. Справочные данные
- 11. Глава X. Заключение
- 12. Глава XI. Литература
- 13. Глава XII. Приложение
- 14. Глава XIII. Справочные данные
- 15. Глава XIV. Заключение
- 16. Глава XV. Литература
- 17. Глава XVI. Приложение
- 18. Глава XVII. Справочные данные
- 19. Глава XVIII. Заключение
- 20. Глава XIX. Литература
- 21. Глава XX. Приложение
- 22. Глава XXI. Справочные данные
- 23. Глава XXII. Заключение
- 24. Глава XXIII. Литература
- 25. Глава XXIV. Приложение
- 26. Глава XXV. Справочные данные
- 27. Глава XXVI. Заключение
- 28. Глава XXVII. Литература
- 29. Глава XXVIII. Приложение
- 30. Глава XXIX. Справочные данные
- 31. Глава XXX. Заключение
- 32. Глава XXXI. Литература
- 33. Глава XXXII. Приложение
- 34. Глава XXXIII. Справочные данные
- 35. Глава XXXIV. Заключение
- 36. Глава XXXV. Литература
- 37. Глава XXXVI. Приложение
- 38. Глава XXXVII. Справочные данные
- 39. Глава XXXVIII. Заключение
- 40. Глава XXXIX. Литература
- 41. Глава XL. Приложение
- 42. Глава XLI. Справочные данные
- 43. Глава XLII. Заключение
- 44. Глава XLIII. Литература
- 45. Глава XLIV. Приложение
- 46. Глава XLV. Справочные данные
- 47. Глава XLVI. Заключение
- 48. Глава XLVII. Литература
- 49. Глава XLVIII. Приложение
- 50. Глава XLIX. Справочные данные
- 51. Глава L. Заключение

קומה ג'

- 1) נקוי כחם סיד בכחה 1
- 2) ניקוי אלומיניום
- 3. סתימת חלונות בקרמופלקס
- 4. תקון כסון גלוי בפרוזדור
- 5. סיוד השרותים מחדש
- 6. תקון מדרגה
- 7. תקון רוב החרסינה

הקבלן לא השלים את העבודות ביותר שתי הקומות. יש לתקן את הלקויים שהוזכרו.

אולם התעמלות

- 1. זכוכית דלת כניסה להרכיב
- 2. חסרה ידיה לארון חדר הסקה
- 3. תקון סדקים במבנה
- 4. ישור גרילים
- 5. הזקקי צירים בדלתות הבמה
- 6. צביעת משקוף דלת כניסה
- 7. תקוני סיוד וריצוף

בנוסף לג"ל - אאא הערות כלליות לכל הטיבנה :

- 1. חיזוק שקעים
- 2. סתימת חלונות אלומיניום ונקוי מסיד
- 3. תקון רצפות פגומות ונקוי סכחמי סיד
- 4. נקוי אסלות כיוורים ומשקופים

אא

כמו כן דורשים נציגי העירייה:

- 1. להחליף את הזכוכית בגלריה לזכוכית עם צפוי הגנה
- 2. לתכנון ולבצוע ניקוז סביב מגוש כדורסל
- 3. לבצע סורגים בכל החלונות בהם קיימת סכנה נפילת ילדים או טפוס לגגות.

רשם: אורי ורון

העתקים:

לנוכחים

למר א. תייר - מנהל המח' הטכנית משהב"ש
למר שיפטן - מחלקת התכנון בעיריית ירושלים

1954

- 1) 1954-1955
- 2) 1955-1956
- 3) 1956-1957
- 4) 1957-1958
- 5) 1958-1959
- 6) 1959-1960
- 7) 1960-1961

1955

- 1. 1955-1956
- 2. 1956-1957
- 3. 1957-1958
- 4. 1958-1959
- 5. 1959-1960
- 6. 1960-1961
- 7. 1961-1962

1956

- 1. 1956-1957
- 2. 1957-1958
- 3. 1958-1959
- 4. 1959-1960

1957

- 1. 1957-1958
- 2. 1958-1959
- 3. 1959-1960
- 4. 1960-1961

M.C. 20116

1958

- 1. 1958-1959
- 2. 1959-1960
- 3. 1960-1961

אשר אולניק חברה להנדסה בע"מ ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב זיבוטינסקי 119, JABOTINSKY STREET · TEL-AVIV · TEL. 03-45 49 01 על. תל אביב · על.
רחוב רוזמרין, בית 240, GILO, JERUSALEM · TEL. 02-79 79 19 על. ירושלים · על.

ירושלים, 10.8.80

מא/631

לכבוד
מר י. דסקל
חברה אשורוס
רחוב הנביאים 60
ירושלים

א. ג.

הנדון: - גילה - בני ילדים 918, ג-11 ושילוני
חוזים 40/63516/77, 40/653390/76
ג-79/65389/40 - גורות בשחון.

1. לפי דרישה העירייה יש להגביה את הגדרות מגובה 80 ס"מ עד לגובה 150 ס"מ.
2. נא הצעכם לכיצוע העבודה.

ב כ ר כ ה ,

מ. אלנברג

העק: מר ל. קוקוש - ס"מ מנהל המח' הטכנית משהב"ש
מב' מ. ברודר - מוס"צ, משהב"ש ✓



עירית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

כ"ד באב תשמ"ב
6 באוגוסט 80

ירושלים

המחלקה לחינוך
דائرة المعارف

לכבוד
מר יצחק גנור
מנהל סח" הבינוי
משרד החינוך והתרבות
רח' שכטי ישראל 34
ירושלים

א.ג.ג.

הנדון - גילה - בניה של 4 חדרי לימוד זמניים.
מכתבך למר בן-אלול מ- 22.7.80

בהתאם להחזיות של גב' עדה בן-דור ושלי, לא יחסרו חדרי לימוד בגילה לשנח"ל השמ"א, ולכן אין צורך בבניה זמנית נוספת לוחמ"א. ראה גם מכתבו של מר גדעון בן-דרור למר שמריהו כהן מתאריך 27.6.80 סעיף אחרון.

כימים אלו הגיע משרד השכון להסכם עם חברת "דיוור לעולה" להקטת הקומה הנוספת בה 6 כמות בניה"ס בגילה שלב ד', (חרובי ב'), ואני חוששת שהבקשה שלך תביא לעכוב נוסף בבניה החוספת. לקראת שנה"ל השמ"ב נבדוק מחדש הצורך בבניה זמנית נוספת בגילה.

בכבוד רב

לאה גונן
לאה גונן

מחננת מערכת החינוך

העקב: מר י' שיפטן, מנהל הסח" לחינוך
מר ש' כהן, משהב"ש, מנהל מחוז ירושלים
מר ד' בן-אלול, משהב"ש, הממונה על מוסדות ציבור
מר ז' ברקאי, משהב"ש, מנהל אגף הפרוגרמות
גב' מ' ברוור, משהב"ש, ע/ר מוסדות ציבור ✓
גב' ע' בן-דור, משה"ח, סח" המיטוי



GOVERNMENT OF WEST BENGAL
SECRETARY - PUBLIC RELATIONS

নামসংখ্যা: ১০০০
১৯৬৬

১৯৬৬

শ্রী
শ্রী
শ্রী
শ্রী
শ্রী

সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য
সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য

সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য
সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য
সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য
সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য
সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য

১৯৬৬

১৯৬৬

১৯৬৬

সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য

সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য
সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য
সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য
সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য
সংসদে উপস্থিত হওয়ার জন্য

מדינת ישראל

משרד השיכון והבינוי
נחוז ירושלים

תאריך: א' באלול חש"ס
13 באוגוסט 1980
מספר:

לכבוד
מר דוד מלמד
מנהל חטיבת הבינוי
עיריית ירושלים

א, נ,

הנדון: בי"ס אשקוביץ גילה - קבלת תקוני שנה אחריות
מכתב מר א. שורצר למר סרוקו מ-3.8.80

אבקש לדאוג לכך שנציג ביה"ס יחקר כדחייפות למשרדנו בגילה על סנה לקבוע פגישה לקבלת תקוני שנה האחריות.

אם כחוך שבוע ימים לא התקיים פגישה זאת אנו מסירים סאתנו האחריות לתקונים הרושים.

נ כ ר כ ה

א. חייך
נ"מ מנהל מחוז ירושלים

העתק: ח"כ חמר אשל - עיריית ירושלים
מר י. שיפטן - עיריית ירושלים
מר א. שביא - עיריית ירושלים
מר י. סרוקו - עיריית ירושלים
מר פ. שמעוני - מש"מ גילה
מר ק. ללוס - יו"ר ועד השכונה
מר ל. קוקוש - מ"מ מנהל המחלקה הטכנית, משהב"ש
מר א. אולניק - מנהל פרויקט גילה
גב' ס. כרוור - ע/ר למוס"צ

119, JABOTINSKY STREET · TEL·AVIV
ROSMARIN ST., HOUSE 240, GILO, JERUSALEM

טל. 03-45 49 01
טל. 02-71 79 19

רחוב זיבוטנסקי 119 תל-אביב
רחוב רוזמרין, בית 240, גילה, ירושלים

ירושלים, 3.8.80

אש/580

משרד הנדסה ואדריכלות ירושלים תאריך: 23.7.80
1980-8-7
דואר נכנס

לכבוד
מר י. שורוקר
מנהל מדור פיקוח עליון
המחלקה לשרותי הנדסה
עיריית ירושלים

א. ג.

הנדון: - בית ספר אשקוביט בגילה - קבלת תקוני שנת אחמיות
מכתבנו אש/580 מ-23.7.80

ביום ד' 30.7.80 היחה אמורה להתקיים קבלה של תיקוני שנת אחמיות, אך עקב אי-נוכחות נציגי בית הספר, הקבלה לא התקיימה, כמו כן עד היום לא הצליחה חברה אשקוביט לבצע את הצפת הגבות, בגלל אוחח סיבה.

יש לציין שלמרות מאמציו של מנהל מס"מ גילה, מר פרץ שמעוני, גם בפגישה שנקבעה להיום 3.8.80 בפתח בית הספר, עם "בעל מפתח" - לא נוכח איש.

אנו רואים בחומרה רבה את אי-נוכחותו של נציג בית הספר, ומבקשים להביא לידיעתכם שאין אנו אחראים לדחיות אלה.

בכבוד רב,

ארנסטו שורוקר
צוות גילה.

העתק:

- מר א. תייר - מ"מ מנהל משהב"ש מחוז י-ם
- מר ל. קוקוש - מ"מ מנהל מח' סכניה משהב"ש
- גב' ת. אשל - הממונה על תיק חינוך, עיריית י-ם.
- מר י. שיפטן - מנהל מח' החינוך,
- מר א. שביא - מנהל המח' לשרותי הנדסה,
- מר ד. מלומד - מנהל חטיבת הבינוי,
- מר פ. שמעוני - מנהל מס"מ גילה
- מר ק. ללוס - יו"ר ועד שכונת גילה

[Handwritten signature]
14.8.80

[Handwritten notes in margin: אי-נוכחות, אש/580, 8/8]



עירית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

כ"ד באב תש"ט
6 באוגוסט 80 ירושלים

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

לכבוד
מר יצחק גנור
מנהל סה" המינוי
משרד החינוך והתרבות
רח' שכני ישראל 34
ירושלים

א.ג.ג.

הנדון: - בגילה - בנייה של 4 חדרי לימוד זמניים.
מכתב לטר בן-אלול ט- 23.7.80

במסגרת לתחזוקה של גב' עדה בן-דור זש"י, לא יחסרו חדרי לימוד בבגילה לטנח"ל השט"א, ולכן אין צורך בבנייה זמנית נוספת להשט"א. ראה גם מכתבו של מר גדעון בן-דוד לטר סטריחו כחן מתאריך 27.6.80 סעיף אחרון.

בימים אלו הגיע משרד השכונות להסכם עם חברת "דיוור לעולה" להקמת הקומה הנוספת בה 6 כחות בניה"ס בבגילה שלב ד', (חרוגי ב'). אל" חושש שבקטגוריית אל" חוששית. לקראת שנה"ל השט"ב נבדוק מחדש הצורך בבנייה זמנית נוספת בבגילה.

בכבוד רב

למא גונן

מחכנתה משרכת החינוך

העקב: מר י' סימון, מנהל הסה" לחינוך
מר ש' כהן, מנהל סחוז ירושלים
מר ר' בן-אלול, מנהל"ש, הממונה על מוסדות ציבור
מר ז' ברקאי, מנהל"ש, מנהל אגף המרוגרות
גב' מ' ברודר, מנהל"ש, ק/ר מוסדות ציבור
גב' ע' בן-דור, מנהל"א, סה" המינוי



मध्य प्रदेश सरकार
राज्य - शिक्षा विभाग

राज्य शिक्षा विभाग
भारत

दिनांक: 15/05/2024

श्री. राजेश कुमार
राज्य शिक्षा विभाग
मध्य प्रदेश सरकार
भारत

विषय: शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार

आज्ञा है कि आपका आवेदन प्राप्त हुआ है।

आपका आवेदन संख्या: 123456789

दिनांक: 15/05/2024

श्री. राजेश कुमार

राज्य शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश सरकार

आज्ञा है कि आपका आवेदन प्राप्त हुआ है।

מזכר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

אל:	התאריך
מאת:	30.7.80
המסמך:	תיק מס.

אלהרין, אילנבר, קולאס.
הייג

~~קולאס ואלהרין - ארבעה חודשים אחרים~~

722

1. ארבעה חודשים אחרים (קולאס ואלהרין)

2. ארבעה חודשים אחרים (קולאס ואלהרין)

א. ארבעה חודשים

15.8.80 - 28.8.80

3. ארבעה חודשים אחרים, ארבעה חודשים אחרים

(ארבעה חודשים אחרים, ארבעה חודשים אחרים)

ארבעה חודשים אחרים (ארבעה חודשים אחרים)

ארבעה חודשים אחרים (ארבעה חודשים אחרים)

א. ארבעה חודשים
ב. ארבעה חודשים

1.8.80

האגף לפיהור מערכת החנוך
המחלקה לבינוי

ט' באב תש"ט
22 ביולי 1980

משרד
אזור
1980

1/1/1
א"י

אל: מר ד. בן אלול, הממונה על מוסדות צבור, משב"ט

גילוח - בניית 4 חדרי למוד זמניים

לשנה הלימודים תשמ"א יחסרו בגילה 4 חדרי למוד

אנו מבקשים לאשר בדהיסוח חקמה 4 חדרי לימוד
זמניים בחצר של אחד משני בתי הספר הפועלים
כיום בשכונה.


ב ב ר כ ה

יצחק גנור
מנהל המחלקה

העתיקים: מר ז. ברקאי, מנהל אגף הפרוגרמות, משב"ט
מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משב"ט
גב' מ. ברור, מוסדות צבור, משב"ט
גב' ע. בן דור, המחלקה למיפוי, משב"ט
גב' ל. גונן, עיריית ירושלים

מ"כ
אלט דאס שפיל י"ן גנבן חייב זיין געווארן
עס זאל זיין גענוג
סקולאטיב י"ט דאס
אויסער כ' אלול
אויסער

30/7/80



האגף לפיתוח מערכת החנוך
המחלקה לבינוי

ס' באב תש"ם
22 ביולי 1980

אלו מר ד. בן אלול, הממונה על מוסדות צבור, משב"ש

בילה - בניית 4 חדרי למוד זמניים

לשנה הלימודים תשמ"א יחסרו כבילה 4 חדרי למוד

אנו מבקשים לאשר בדהיפות הקמת 4 חדרי לימוד
זמניים בחצר של אחד משני כתי הספר הפועלים
כיום בשכונה,

ב ב ר כ ה
י צ ח ק ג נ ו ר
מ נ ה ל המ ח ל ק ה

ע"מ
פ. ח. ז.
מ. ח. ז.
מ. ח. ז.
מ. ח. ז.

העסקים: מר ז. ברקאי, מנהל אגף הפרוגרמה, משב"ש
מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משב"ש
גב' מ. ברור, מוסדות צבור, משב"ש
גב' ע. בן דור, המחלקה למיפוי, משב"ש
גב' ל. גונן, עיריית ירושלים

א. ג. ז.

30.7

מ
מ

2124
10/10/54



TRANS
STATE

...

...

...

...

...

1-c
31

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
אגף פרוגרמות

תאריך: 27 ביולי 1980

אל: גב' מירי ברור, מחוז ירושלים

מאת: ד. בן אלול

הנדון: 4 כיתות זמניות לבי"ס יסודי בגילה
מכתב מר י. גנור: מ-22.7.80

הנני מתייחס להעק המכתב הנ"ל (לנוחותכם, רצ"ב העתק
נוסף) ומבקש שתקיימו בדיקה מהירה ותמציאו לנו חוות-דעה
הצעה מעשית (כולל חכנית העמדה ואומדן עלות) לפתרון הבעיה.

ב ב ר כ ה,



ד. בן אלול

הממונה על מוסדות ציבור

לוטת: העתק מכתב.

העתק: מר ז. ברקאי
מר י. גנור

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION
WASHINGTON, D. C.

WATER RESOURCES DIVISION
WASHINGTON, D. C.

WATER RESOURCES DIVISION
WASHINGTON, D. C.

WATER RESOURCES DIVISION
WASHINGTON, D. C.

WATER RESOURCES DIVISION

WATER RESOURCES DIVISION
WASHINGTON, D. C.

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
האגף לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

אגף הפיתוח

תאריך: ט' באב תש"ם
22 ביולי 1980

מספר:

אל: מר ד. בן אלול, הממונה על מוסדות צבור, משב"ש

גילה - בניית 4 חדרי למוד זמניים

לשנת הלימודים תשמ"א יחסרו בגילה 4 חדרי למוד

אנו מבקשים לאשר כדחיפות הקמת 4 חדרי לימוד
זמניים בחצר של אחד משני בתי הספר הפועלים
כיום בשכונה.

ב ב ר כ ה
יצחק בנור
מנהל המחלקה

העתקים: מר ז. ברקאי, מנהל אגף הפרוגרמה, משב"ש
מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים, משב"ש
גב' מ. ברור, מוסדות צבור, משב"ש
גב' ע. בן דור, המחלקה למיפוי, משה"ח
גב' ל. גונן, עיריית ירושלים

אגף הפיתוח

27.7.1980

22/7/80

רהבינוי

כ"א באב תש"ס
3 באוגוסט 1980

לכבוד
מר יואל שיפמן
סגל המחלקה לחנוך
קריית ירושלים

א,ג,

הנדון: החלת כנייה מסודרת חנוך - ספר ירושלים

הריני להודיעך כי בדלף אלו נחת חובה בין משה"ש ובין "יובל גד" להקמת
בית"ס בן 12 כחות + 2 כחות בן כרפוח.

כמו כן הגענו להסכם עם חברה "דיוור לעולה" להקמת קומה נוספת בה 6 כחות
בבנין בגילת אילב ב'.

ס. כ. רבה

סירי כרוזר
ע/ר למוס"צ

הקמק: מר א. חסיה
מר ל. קוקוש
מר ד. גרין
מר א. אולניק
גב' ל. גרין

לכבוד
מר ויגוליק
מרכז מגן דוד אדום
רוממה
ירושלים.
א.ג.,

הנדון: מיקום תחנת מד"א בגילה.

בהמשך לפניית המתכנן אדרי' ברוצקוס למשרדנו, הננו להעביר אליך בזאת את הצעתנו
למיקום התחנה הנ"ל כפי שסוכם עם אדרי' ברזקי והגבי' מ. ברוור ממשהב"ש.
המגרש המוצע ממוקם בקרבת מרכז השכונתי מספרו 41 ב-ת.ב.ע מס' 2415, שטחו כ-2.5
דונם והנו מיועד למרפאה מרכזית.
נראה לנו כי ניתן לשלב במגרש זה גם את המבנה לתחנת מד"א ברור תוך התחשבות
בתכנון ובניית המרפאה בשלב מאוחר יותר.

בכבוד רב,

י. סיון, אדריכל.

העתקים : מר א. אולניק
מר א. ברזקי
גבי' מ. ברוור ✓
אדרי' ברוצקוס.

פ' אויס' 3' ג' 1980

אשר אולניק חברה להנדסה בע"מ ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב ז'בוטינסקי 119 • תל-אביב • טל. 03-45 49 01 • על. 03-71 79 19
רחוב רוזמרין, בית 240, גילה, ירושלים • על. 02-71 79 19

ירושלים, 16.7.80

או/555



אשר אולניק
מנהל
ל

לכבוד
מר י. סורוקו
מנהל מדור פקוח עליון
המחלקה לשרותי הנדסה
עיריית ירושלים

א. נ.,

הנדון: - בי"ס מס' 915 בגילה ג' הקבלן: מ. אביב
חוזת מס' 40/62807/77
מכתב מס': 515 מיום 29.6.80
בחשובה למכתבך הנ"ל בענין הפרעות בזמן הלימודים,
הנני להזכיר את שיחתנו הנוגעתתלנושא זה.

א. בית הספר נמצא באחר בניה, ואין שום אפשרות
למנוע רעשים הנובעים ממהלך העבודות בבניינים
הסמוכים.

ב. לגבי רעשים חריגים של קומפרסורים ומכונות
קידוח, נאמר לנו שלפי המצב בשטח יש להניח
שהעבודות הנ"ל הסתיימנה לפני תחילת שנת הלימודים.

לאור האסור לעיל, אין באפשרותנו להתחייב למניעת
רעשים חוץ כדי שנת הלימודים חשמ"א.

כ ב ר כ ה ,

אורי גרון

העתיקים:
מר ד. מלומד - מנהל חטיבת הבנוי
מר י. שיפטן - מנהל המחלקה לחינוך
מר ש. כהן - מנהל משהב"ש מחוז י-ם
מר א. תייר - מנהל המח' הטכנית משהב"ש
מר י. קאלק - מהנדס מפקח, עיריית ירושלים

1

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בו יודה 23
21-7-1980
ד"ר זכאי

ירושלים, ג' באב, תשי"ח
16 ביולי, 1980

לכבוד
הרב אליהו שלזינגר
רב שכונת גילה
רח' לבונה 5
ירושלים

א.נ.,

הנדון: 2 דירות לבת הכנסת - גילה
מכתב מיום ג' בסיון תשי"ח

משרד הבינוי והשיכון מודע למחסור בבתי הכנסת בגילה, בשלבים הראשונים של השכונה, המאוכלסים מזה מספר שנים ובהם קיים בית כנסת שנבנה ע"י משרדנו ובית כנסת נוסף הנמצא בבניה ע"י עיריית ירושלים בשלב ג' המתאכלס בקרוב אכן עדיין לא נבנה כל בית כנסת.

עפ"י הסכם בין משרד הדתות ומשרד הבינוי הוחלט כי משרדנו יבנה בית כנסת אחד לכל 2000 יח"ד, בשכונות החדשות. שאר בתי הכנסת חייבים להיבנות ע"י המועצה הדתית בעזרת משרד הדתות.

להצעתכם להקצות שתי דירות לשימוש כבית כנסת לצערי אין כל אפשרות להיענות. משרד הבינוי אינו מאשר אף לא דירה נוספת אחת לשימוש למוס"צ, מה גם שהדבר נוגד את חוק המכר לפיו נמכרו הדירות לדיירים.

בכבוד רב
עמוס לבל
עוזר השר

העתק: מר א. וינר - מנכ"ל המשרד
מר ט. כהן - מנמל מחוז ירושלים.

התאריך
18.7.80

תיק מס'

מאת:

הנדון:

103



1000
1000
1000
1000
1000



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים 2.6.80

האגף להסברה וליחסי ציבור
قسم الارشاد والعلاقات العامة

לכבוד
ה"ה מנכ"ל משרד השכון
מנהל משרד הקליטה
מנהל סניף עמידר ירושלים

נכבדי,

הנדון: הקצאת מבנה לבית כנסת בשכונה גילה

בבנייני ה-300 בשכונה גילה אוכלסו עשרות דירות בעולים חדשים ומשתכנים אחרים, וקצב האיכלוס גובר והולך.


בנינים אלו מצויים בקצה הדרום מערבי של השכונה. בריחוק של למעלה מ-2 ק"מ מהמרכז השכונתי הקיים.

מלבד הסבל הממשי הנגרם לחושבים אלו בגין חוסר שרותים מינימליים באזורם, חמור בעיקר הסבל הרוחני מהעדר מקום תפילה.

מסתבר שרוב המשתכנים באזור זה הינם סומרי מסורת שלדבריהם הקפידו מאוד בארצות מוצאם על קיום מצוות היהדות ודווקא כאן במדינת ישראל אין להם אפשרות לעשות כן.

אני פונה איפוא בבקשה לראות בנושא כדחוף ולמצוא אפשרות להקצות מבנה, או אולי אחת הדירות שהשמש בינתיים כביח כנסת.

נכבוד רב,


שמעוני פרץ
מנהל מש"מ - גילה
מבוא בושטח 5/1, י-ם

העחק: מר ליפמן, מנהל אגף ההסברה ויחסי ציבור
מר קלווד לאלות, יו"ר ועד השכונה
גב' דבורה קישניובסקי, עובדת קליטה, עולים

17000
P.M.C.

אליהו שלזינגר

שכונת גילה ומקור חיים
ע"ה ק ירושלים ת"ו

כס"ד, יום... **סיב טיון הסיב**
גילה, רחוב לבוזה 5
טלפון ~~6167~~ 714-792

לכבוד

סר הבינוי והטיבון

מר דוד לוי

ירושלים

לבערי אני גאלץ להגיש אליך לאחר שנענתי בטלילה ע"י הגב' מירי ברזור -
 ע/ראשיה לפוסרות ביבור.
 בטכונה גילה כידוע אלטי הוטכנים, הטכונה גדולה ורחבת ממדים, ומ"מ לא
 קיימים בטכונה כחי כנסת.
 עם איכלוסה של הטכונה, קיבלו הוטכנים 2 דירות קטנות למטרה זו, אחת
 מהדירות כבר הוחזרה לפני מספר שנים אחרי שנבנה בהכנס"ס הראשון והיחיד
 הכנוי בטכונה.
 בימים אלה מאכלסים את חלקה העליון של הטכונה, וגם שם רבים מאד אלה
 המבקשים להתגלל חתה קורה גב ולא ברהובת של עיר, כאמור, ההליכה מהחלק
 העליון של הטכונה לחלק החתון, היא הליכה קשה וארוכה, ואין כל הצדקה
 להשאיר טכונה ללא שירות מיפנמלי כמו "בית כנסת".
 אני הייב לביין, כי ההתמרות השוררת בטכונה הינה גדולה וקשה, זאת
 מאחר ואחרי שנים כה רבות של בנין ופיתוח בטכונה, עדיין אין כחי כנסת
 בטכונה, וגם בהכנס"ס הנמצא בשלבי בנייה יהא רחוק מאד מלענות על הצרכים
 ולו המינימליים.
 אי לכך, אודה לך מקרב לב באם תסדיר לפחות מסירות של 2 דירות למטרה
 קדושה אלו, ולחקל כמעט על מצוקתם של הוטכני הטכונה.
 לחשובתך אצפה בחקדט.

בכרכה

הרב אליהו שלזינגר

העמק: מר ט.כהן/מנהל המחוז
מר ג.שדיבר/יו"ר המועצה"ד
גב' מירי ברזור/ מטרה"ט

24.4.80

צבא
א. ג. שנית
השופט
ל
ל

לכבוד
אלינוער ברזאקי
אדריכליה מחוז ירושלים
ירושלים

נ.ג.נ.

בחושה למכתבך מיום 19.4.80, שבו קבלה על חוסר טחן שרותי ויעוצי
ההנדסי, הנני להסב את השומה לבך לכמה עובדות:

א. מבנה בית הכנסה האמור תוכנן פעם ראשונה לפני כשנה. במבנה זה הגשתי
יעוץ הנדסי והועברו אלי חכניות עבודה של האדריכל עם הוראת האדריכל להתחלת
חכניות עבודה.

חכניות העבודה נמצאו בשלב כמעט סופי כשהאדריכל הודיעני שהמבנה אינו מאושר
מסיבות של מיקום בשטח.

ב. לפני כחדשיים פנה אלי האדריכל שנית ובקש את יעוצי לביה כנסת חדש במקום
בית הכנסה הראשון. כמו כן, נחקבל מכתב מאדריכליה מחוז ירושלים, א. ברזאקי,
המאשר תכנון מחדש לביה הכנסה.

ג. חוזה חדש לתכנון בית הכנסה לא החקבל במשרדי. ובהתאם למצב שבו לא קיים
חריף תכנון למהנדסים אינני יודעה מהי החקבל.

הנני מוכנה לעזור לאדריכל שור וליעץ לו בתכנון בית הכנסה במשרדי -
בירושלים, ולהכין חכניות עבודה עם קבלת החוזה ממשרד השכון.

בכבוד רב
ג. שנית

ד. ברזאקי
א. ג. שנית
א. ארנון

ודעי נרו

Handwritten initials or signature in blue ink.

ה' באב תש"ס
ט 17 ביולי 1980

לכבוד
אדו"כ כרמלי מלומד
משרד התיכונן
ירושלים

א.ב.ג.

הנדון: ביה"ס 24 כחות + 4 כחות בן
גילה שלב ד'

מצ"ב חכביות הנסחה לאשורך בגילה שלב ד' -
ביה"ס הוא בן 24 כחות ולידו 4 כחות בן, בחכבון
"ירבל גד".

אנא אשורך והחזר.

ב ב ר כ ה ,

מיד ברוור
עו/ר למוס"צ

הפתח: מר א. אולבית - מבוא' פרויקט גילה
מר א. חייך - מבוא' החולמה החכבית
מב' א. ברזק - אדריכלית המחוז

1917

1917

1917

1917

1917

1917

הרבנות הראשית לירושלים והמחוז

THE CHIEF RABBINATE OF JERUSALEM DISTRICT

המועצה הדתית ירושלים



יעקב בצלאל ז'ולטי

הרב הראשי וראש אבות בני הדין
לירושלים

י"ט סיון תש"מ

כ"ה

לכבוד

הגב' מירי ברוור

ע/ ראשית למוסדות צבור

משרד השיכון

איזור ירושלים

בן יהודה 23

ירושלים.

שלום וברכה,

הריני מאשר קבלת העתק מכתבך למר גדליה שרייבר יו"ר המועצה הדתית,
מיום כ"ט אייר תש"מ, בנידון דירות לבית כנסת בגילה.

מכתבך הועבר לעיונו של כב' מרן הרב הראשי שליט"א, אנו תקוה כי
אכן לאחר הבדיקה שתערכי תדונו באופן חיובי בסידור הדירות לבית
הכנסת כפי הצורך.

בכבוד רב,

הרב אברהם בקרורט
ראש לשכת הרב הראשי

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

...

...

...

101

ד/ 3322

30.6.80

משרד הביטוי והשיכון
 מחוז ירושלים
 רח' בן יהודה 23
 - 3-7-1980
 דואר נכנס

כ"ו

לכבוד
 מר אהוד תייר
 מנהל המחלקה הטכנית
 משרד - השכון
 ירושלים.

א.נ.א

הנדון: בי"ס וגן-ילדים בגילה - חוזה מס" 40/54512/64231/78

בהתאם למכתבו של מר א. אולניק מיום 26.6.80 ובהתאם להוראה ביומן העבודה,

אנו מבצעים את שנוי צנרת ההסקה והמים לפי התכנון החדש הכולל חוספת קומה. זאח על מנה שלא לפכב את בצוע עבודות הטיח והריצוף במבנה.

לאחר קבלת הזמנתכם נבצע את כל יתר העבודות הכרוכות בבניית הקומה הנוספת כגון: תנור-הסקה, מיכל דלק וכו'.

בהתאם לבקשתכם נעביר לאשורכם חוך שבוע ימים את הצעהינו לבצוע הקומה הנוספת.

בכבוד רב,

ש. שביב

העתקים: מר ש. כהן - מנהל משב ב"ש מחוז י-ם
 מר ל. קוקוש - ס/מנהל המחלקה הטכנית
 מר א. אולניק - מנהל הפרוייקט
 מר א. ירון - מפקח באתר
 מר ש. שנאור - סמנכ"ל דיור-לעולה
 מר י. יבין - מנהל בצוע ארצי ד"ל
 מר מ. לוי - מנהל מחוז י-ם ד"ל



1950
No. 10

OFFICE OF THE
DIRECTOR OF THE
BUREAU OF
INVESTIGATION

MEMORANDUM

TO : SAC, [illegible]

FROM : [illegible]

SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

DATE: [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

אשר אולניק חברה להנדסה נעים

119, JABOTINSKY STREET · TEL·AVIV · TEL. 03-45 49 01 . על . תל אביב . 119 רחוב ז'בוטינסקי
ROSMARIN ST., HOUSE 240, GILO, JERUSALEM · TEL. 02-71 79 19 . על . ירושלים . 240, גילה, ירושלים . רחוב רוזמרין, בית

ירושלים, 26.6.80

או/503

Stamp area with some faint markings and numbers like 30 and 700.

לכבוד
חברת דיור לעולה
רחוב קרן היסוד 36
ירושלים

א. נ. א.

הנדון: - חוזה מס' 40/54512/64231/78
בי"ס חרובי - גילה ד'

1. לפי הודאת מחוז ירושלים משרד הבינוי והשיכון הוחלט לבצע תוספת 6 כיתות לבית הספר הנ"ל.
2. עליכם לבצע את כל ההכנות הדרושות כולל צנרת סים והסקה, קונסטרוקציה וחשמל, לפי התכנון הכולל את התוספת הנ"ל.
3. עליכם להגיש לנו את כל החומר להגדלת החוזה בהתאם לחוזה הקיים תוך שבועיים מתאריך מכתב זה, כולל כל תביעותיכם בקשר לחוזה הקיים.

בכבוד רב,

Handwritten signature and name: א. אולניק

העמק:

- מר ש. כהן - מנהל משהב"ש מחוז י-ם
- מר א. חייך - מנהל המח' הטכנית משהב"ש
- מר ל. קוקוש - ס/מנהל המח' הטכנית

1

אשר אולניק חברה להנדסה נעים ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב ז'בוטינסקי 119, תל-אביב • טל. 02-454901 • רחוב רוזמרין בית 240, גילה, ירושלים • טל. 02-717919

ירושלים, 9.6.80

או/442

משרד הביטחון וההגנה
מס' 16
16
16

Handwritten signature and scribbles

לכבוד
מר י. לויין
משרד הביטחון וההגנה
הקריה תל אביב.
א. נ.

הנדון: פרוי פוליאוריתן על גבות - גילה ירושלים.

לאחרונה נחקלנו כתופעות של פגיעות פיסיות והתפוררות במעטה ההיפולון המבן על הפוליאוריתן המוקצף. אנו מבצעים ציפויים כאלה בעיקר בגני ילדים בגילה.

עדיין לא הופיעו בעיות של חדירת מים דרך הצפוי הנ"ל אולם נכמבט על הגבות ניתן להבחין בהתפוררות זו.

מאחר ואנו עומדים בפני סיום עם מספר גני ילדים בשטח, אבקש להציע פתרון של הגנה קשיחה לצפוי בכדי למנוע התפוררותו המוחלטת.

ב ב ר כ ה ,

אורי ורון.

העתק:

מר ש. כהן - מנהל מחוז י-ם משהב"ש
מר א. חייך - מנהל המח' הסכניה משו: "ש מחוז י-ם

והבינורי

ח' בתמוז תש"ם
24 ביוני 1980

לכבוד
מר א. אולניק
מנהל פרויקט גילה

א.נ.

הנדון: בי"ס 24 כתוב שלב ד' - גילה

כימים אלו הביעה הצעה מחיר של "יובל גר" להקמת בית הספר.

על מנת שהחווזה יוכל להיחתם עלינו לקבל בהקדם אומדן ערכני לפתוח מראש ולפתוח משלים של כיה"ס.

אנא דאג בהקדם לקבל טכוב אומדן זה ממשרד יהלום צור.

ב ב ר כ ה

סירי ברזור
ע/ר למז"צ

העתק: מר ב. רביד
מר ד. צור
מר א. חייך

ST. LOUIS, MO.
NOV 11 1900

W. C. C. C. C.
ST. LOUIS, MO.

Dear Sirs: I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the matter mentioned therein. I am sorry to hear that you are having trouble with your business. I will do all in my power to help you in this matter. I will call on you at your office on Monday next.

Yours truly,

W. C. C. C. C.

W. C. C. C. C.
ST. LOUIS, MO.

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
האגף לפיתוח מערכת החינוך

תאריך: ג' בתמוז תש"ם
17 ביוני 1980

מספר:



לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשיכון
רח' בן-יהודה 23
ירושלים

שלום רב,

צרכי הבניה הדחופים בבתי"ס היסודיים בגילה

בהמשך למכתבך אל חה"כ תמר אשל מיום י"ג בסיון תש"ם (28 במאי 1980) ולאחר בדיקה נוספת של תחזיות גידול במספר התלמידים הגענו למסקנה כי יש בכל זאת לגשת באופן מידי לבניית הקומה השלישית בבתי"ס חרובי ב' הנמצא עתה בשלב ד' של השכונה.

לאור המצב התקציבי, תחזית גידול מספר התלמידים, ולאור המחסור הצפוי בחדרי לימוד בשנים הקרובות, יש לנצל באופן מירבי את אפשרויות הבניה הריאליות. עלינו לציין כי רצוי מאד לסיים את בניית הקומה השלישית לקראת תשמ"ב כך שניתן יהיה להמנע מבניית מבנים זמניים.

הערה: לאחר שקיבלנו הערותיך בענין בניית הקומה הנוספת על מבנה האשקובית אנו מסכימים לותר עליה לפי שעה מאחר ובתשמ"א ניתן יהיה להסתדר, אמנם בקושי רב, בלעדיה. לקראת תשמ"ב יהיה צורך לבדוק הנושא שנית.

בברכה,

ד"ר גדעון בן-דרור
סמנכ"ל ומנהל האגף לפיתוח

העתק: חה"כ תמר אשל
מר זאב ברקאי
מר גרשון ברגסון
מר יואל שיפטן
מר יצחק גנור
מר רפאל ירון
מר יעקב לופו

ל-10
7.12.79

(פרוטוקול מחוזית 20.5.80) - 9 -

לאחר דיון,

הוחלט: לדחות את הבקשה.

יש לנקוט באמצעים להריסת המבנה כמקובל לגבי מבנה זמני
באתר בניה.

21. יב-8194 - בבין חדש - מסוד השכון - גוש 2 חלקות 48, 49, 264 -
רח' פייר קביג.

דו"ח הועדה המקומית מס' 59 מיום 12.3.80 תיק בנ/79/955.

לאחר דיון,

הוחלט: להחזיר את הבקשה לוועדה המקומית לטיפול כחוק
בגמר ההליכים הקשורים באישור תכנית 2824.

22. יב-7752 - תוספת קומה לבי"ס - עיריית ירוטלים - שכ' גילה.

דו"ח הועדה המקומית מס' 65 מיום 30.4.80 תיק בנ/78/90.

לאחר דיון,

הוחלט: לאשר את הבקשה בהתאם להמלצת הועדה המקומית דלעיל.

23. יב-8210 - בבין חדש - מסוד השכון - גוש 2 חלקות 50, 51, 52 -
מקור חיים.

דו"ח הועדה המקומית מס' 59 מיום 12.3.80 תיק בנ/79/956.

לאחר דיון,

הוחלט: להחזיר את הבקשה לוועדה המקומית לטיפול כחוק בגמר
ההליכים הקשורים באישור תכנית 2824.

24. יב-8083 - תוספת בניה - גבאי החל - גוש 133 חלקה 20 - רח' אבטיגורס
שכ' גובן (תיק בוועדה המקומית בנ/78/518).

המסך דיון מיום 27.11.79.

לאחר דיון,

הוחלט: לאשר את הבקשה בהתאם להמלצת הועדה המקומית מיום 15.8.79.

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
אגף פרוגרמות

Handwritten signature/initials

מס' 17
Handwritten signature
17.6.80

תאריך: ג' בסיון תשמ"מ
17 ביוני 1980

אל : מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים

הנדון: בית-ספר חרובי בגילה - בניית דיור לעולה

על פי סיכום בין משרד הבינוי והשיכון וועידת ירושלים חל שינוי בפרוגרמת הבנייה של בתי הספר בעיר ירושלים. על פי סיכום זה, יש להוסיף 6 כיתות, קומה שלישית, לסדר בבניית דיור לעולה. כמוכן אנו נדרשים לבנייה לאיכלוס בספטמבר 1981.

פעולתך בהתאם.

בברכה,

Handwritten signature
זאב בלקא
מנהל אגף פרוגרמות

העתק: מר צ. אורן, מנהל אגף תכנון והנדסה
מר ד. בן-אלול, ממרבה על מו"צ
מר א. תייר, מנהל המחלקה הטכנית, מחוז ירושלים

10

לרוב כהן/מאהר
זני, זואבאר, זואליס
אגני

ב. ינת ישראל
משרד הביטוי והשיכון
אגף פרוגרמות

משרד הביטוי והשיכון
מחוז ירושלים
11-6-1980
ד. 01

תאריך: כ"ד בסיון תש"מ

17 ביוני 1980

18-6-1980

דואר נכנס

אל : מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים

ג' א

הנדון: הפעלה נוספת של ד. מדייטס בגילה, ירושלים

ייל פי סיכום בין אגף הפיתוח במשרד החינוך והעיריה עלינו לבצע הנושאים הבאים:

א. להאיץ גמר בית הספר בבנייה על-ידי הקבלן "דיור לעולה" 12 כיתות, כפי שהוצע בזמנו על-ידי הקבלן. *זואף קוגה זואליס*

ב. להזמין אשקור דה קומה נוספת ל-4 אשקוביות הקיימות היום בגילה. *לגני זואליס זואליס*

לפעול כדחייפות להיבנוי המגרש שתפוס ע"י הקבלן הראשי. *לזולת זואליס זואליס*

כ. ב. ר. כ. ה.

[Signature]
זאב ברקאי
מנהל אגף פרוגרמות

העתק: מר א. וינר, המנהל הכללי

מר ד. בן-אלול, ממונה על מו"צ

מר ב. דביר, מנהל מחלקת פרוגרמות, מחוז ירושלים

אנינו

(להחזרת פנימית במשרדי הממשלה)

מזכר

התאריך	אל:
10.6.8	שליח
תיק מס'	מאת:
	מ"מ
	הנדון:

2 נו"מ
אליו
יבא
בנושא

ג.ל. - ק.י. - א.ל.

1. הסכמה להקמת משרד
התע"מ.

2. על פי טעם זה
בנושא משרד התע"מ.

3. שר התע"מ
הוא זה.

4. על פי
המסמך המצוי

✓

האגף לפיתוח מערכת החינוך

ח"ב בסיון תש"ס
23 במאי 1980

אגף (א) יו"ר

אגף (א) יו"ר

מחלקת
14/20

משרד החינוך
20-03-1980
ל.ד.

לכבוד
ח"ב חסר אשל
הממונה על היק החינוך
עיריית ירושלים

שלום רב,

צדדי הבניה והחנכיה עבור לה-המסר היסודיים בילה, ירושלים

בעקבות דיון נוסף באגף לפיתוח אגף מבקשים לשנות חלק מההמלצות שבגבסו
בעת האגודה הממונה עם אנשי מסד הבינוי והחיכון שהחקיקה במסדדי ביום
י"ב באייר תש"ס (23/4/1980).

עיקרו של דבר הוא, שיהי להתמקד בשני מרכיבים עיקריים: (1) מה לעשות מיד
כדי להבטיח פתיחה תקינה של מנה הלימודים תש"א (ואשר גם במהלכה ייקלטו בודאי
הלטידיה נוספים). (2) להטעים במסותף על צרכי מיניפוס חיוניים והכרחיים לשת
שנות הלימוד הבאות - תש"ב ותש"ג - ולהתארגן כדי לקדם החלטה ביצועם של אלה
בהקדם.

א. על אף שחלק מן החחציה ההינוכית שהכין ועד השכונה איננה מקובלת על מחלקת
המיפוי, הרי שלמתרון המסודר הצפוי בחדרי לימוד בשנה"ל תש"א ותש"ב אנו
מסליצים:

1. בניה מיידית של מבנה אסקוביה בן 4 חדרי לימוד ליד ביה"ס המסלכתי בשלב
א-ב.

2. ביטול ההחלטה על בניית הקומה השלישית בבנין ביה"ס הנמצא עתה בבניה בשלב
ד' (חרובי ב'), על מנה שהושלם בנייתם של 6 חדרי לימוד לחחילת שנה"ל תש"א
(ו-6 חדרי לימוד נוספים במהלך אותה שנה).
(נמסר לנו כי הקבלן הודיע כי יוכל לבצע זאת במירה ולא יידרש לבנות את הקומה
הנוספת. לדעתנו כי"ס זה יתאים לשטח את ביה"ס תש"ר, עד שהושלם בנייתו של ביה"ס
אסודר בשלב א-ב).

3. למתרון המסודר הצפוי בחדרי לימוד בשנה"ל תש"ב ותש"ג יש להחיל מיד בבנייתם
של שני ב-י-מסר יסודיים נוספים בהיקף של 12 כיתות כל אחד.

??

ג. למחרון החסור המשי בחשב"י יש להתחיל בהקדם - בנייתו של ביה"ס במכון
"לומנלד".

יש לנו יסוד איתן להמשיך, כי בינה זאת תהיה מקובלת הן על אנשי סדר
הבינוי והשיכון והן על נציגי ועד הסוכנה.

ב ב ר כ ה,

ד"ר ברעון בן-דרור
סמנכ"ל ומנהל האגף לעיתות

✓ העתק כר זאב ברקאי
מר שפריתו כהן
מר ברטון ברגסון
מר יואל טייטל
מר יצחק בנור
מר רמאל ירון

כ' בחשוון תשמ"ב
16 ביוני 1980

לכבוד
סר א. שא-נמ
סגן מנהל מחלקת החינוך
עיריית ירושלים

א, נ,

הנדון: שינוי יעוד דירת לגני ילדים בית 63 - גילה
מכתבך אלי בנוון


1. אני מתנצל על האחור כמתן תשובה למכתבך שכנדון. הדבר נבע מהרצון למצא פיתרון לכעיה.
2. לצערי הקציב מוס"צ לשנת 1980 מוקפא בשלב זה על פי הוראת משרד האוצר. כמו כן החחזירה לקבלת הקציבים למוס"צ לשנת 1980 אינן ורורות ביוחר ואין לנו כיום אפשרות להשיב בחיוב בקשה להקציב שיפוץ הדירה הנ"ל.
3. במסגרת סדר העדיפויות שחקבע על ידי משרדנו עדיפה הקמת מוס"צ חדשים וקבועים אלס בהחיעצות עם גורמי העיריה נוכל להחליט על סדר שונה.

ב ב ר כ ה

בנימין דביר

כני דביר
מנהל יחידת פרוגרמות

העתק: מר ש. כהן
גב' פ. כרוור
מר י. שיפטן

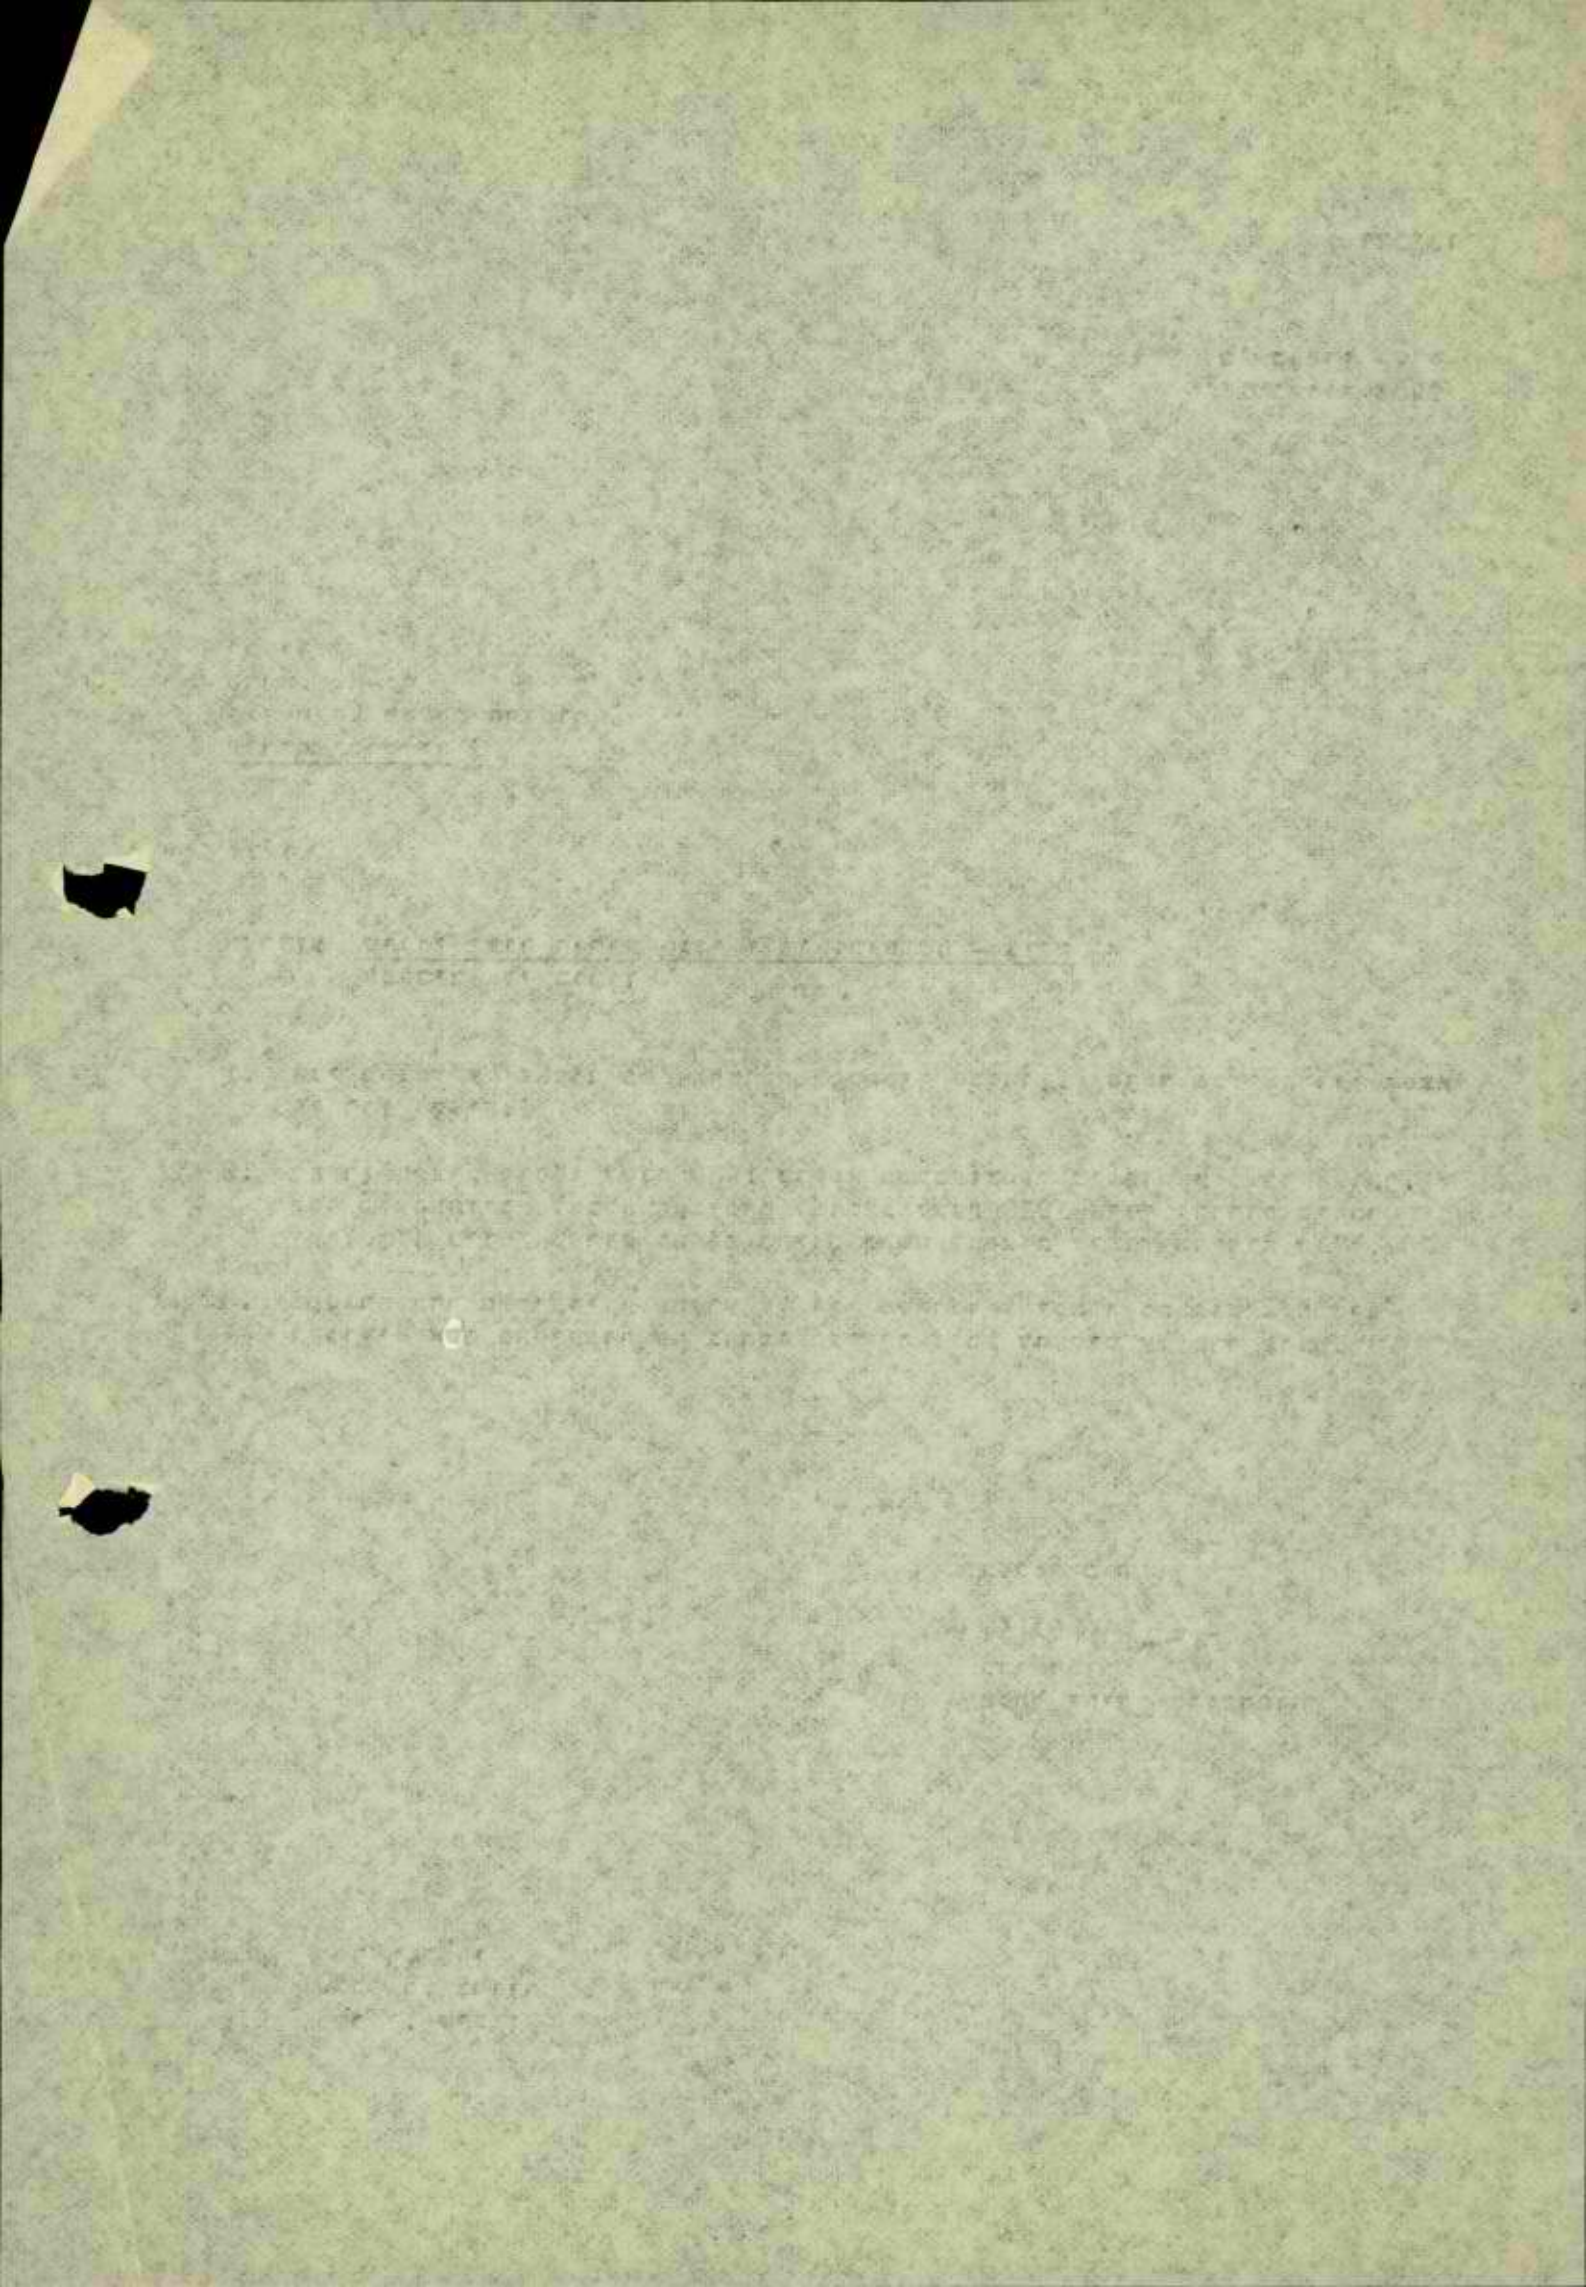

ג' בחמוז תש"ס
17 ביוני 1980

אל: מר א. אולניק, מנהל יזייקט גילה

הנדון: חוזה מס' 40/54512/64231/78 - בי"ס בתכנון חרוכי גילה
שלב ד' קבלן דיור לעולה

1. על דעה מנהל אגף פרוגרמות נא להודיע לקב"ל שיבנה קומה שלישית לביה"ס.
2. יש להכין מיד הגדלה מתאימה על בסיס מחירי החוזה הקיימים.
3. יש לוודא שביה"ס על שלוש קומותיו כולל פזוה הצר ימסר לעיריית סוף יולי 1981.

ב ב ר ר ה

א.

מנהל המחלק

העתקים: מר ז. ברקאי, מנהל אגף פרוגרמות
מר צ. אורן, מנהל אגף תכנון והנדסה
מר ש. כהן, מנהל המחוז
מר ב. דביר, מנהל יח' פרוגרמות
מר ל. קוקוש, ס/מנהל המחלקה הטכנית
גב' מ. ברזר, ע/ר למוסדות ציבור

והבינורי

א' בתמוז תש"ם
15 ביוני 1980

לפנוד
מר אורי ירון
משרד פיקוח גילה

א,נ,

הנדון: גן ילדים פיקר
מכתב אלי מה-28.5.80

הריני לאשר החקנה סורגים בגן הילדים הנ"ל.

ב ב ר כ ה

בנימין דביר

בני דביר

מנה יחידת פרוגרמות

העקב: מר ש. כהן
מר א. תייר
גב' מ. כרוור

מדינת ישראל
משרד הביטוי והשיכון
אגף פרוגרמות

אגף פרוגרמות
ישראל

תאריך: כ"ד בסיון תש"מ
7 ביוני 1980

אל : מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים

הנדון: הפעלת מוסדות חינוך מידיים בגילה, ירושלים

על פי סיכום בין אגף הפיתוח במשרד החינוך והעיריה עלינו לבצע
מידית הנושאים הבאים:

- א. לתאיץ גמר בית הספר בבנייה על-ידי הקבלן "דיור לעולה" 12 כיתות,
כפי שהוצע בזמנו על-ידי הקבלן.
- ב. להזמין 4 אשקוביות כקומה נוספת ל-4 אשקוביות הקיימות היום בגילה.
- ג. לפעול בדחיפות לפינוי המגרש שחפוס ע"י הקבלן הראשי.

ב ב ר כ ה

זאב ברקאי
מנהל אגף פרוגרמות

העתק: מר א. וינר, המנהל הכללי
מר ד. בן-אלול, ממונה על מ"צ
מר ב. דביר, מנהל מחלקת פרוגרמות, מחוז ירושלים

י"ג בסיון תש"ם
26 במאי 1980

לכבוד
גב' חסר אשל
המסונה על היק החינוך
עיריית ירושלים.

גברת נכבדה,

הודון: פוסדות חינוך בשכונת גילה.
מכתב מ-8.5.80

בישיבה שהתקיימה בסניף החינוך בהשתתפותכם ובהשתתפותינו ב-28.4.80, סוכמת חכניה מינימום להחלטה בניה למוסדות חינוך בשנת התקציב 80/81. חוססת א-יכיה לא נחבקה על ירכט ולא סוכמת, על אף העזרה שהנוסת הועלת בבקשת החושבים.

לא ברור מה השונה מ-28.4.80 עד ל-8.5.80. עם זאת כרצוני להבהיר כי אם תחיה החלטה משותפת של שלושת הגורמים - נהיה מסוכן סוכנים לבצע החוססת אך יש לעמוד קודם לכן על מספר עובדות:

1. כדי לתוסף קומה שניה לאסקוביה הקיימת יש צורך לבצע חיצוק הרוסטרקציה של האסקוביה הנוכחית.
2. בגלל נחרני השטח יש לבנות טוללה לועמדת המגוף בחוף החצר.
3. בחקוטה הבנייה בזמן משוער של חצי שנה אי אפשר יהיה לקיים לימודים סבירים כולל שימוש בחצר.
4. טרם הוסמדה התקמאה לתחיסת חודה ואינונו יודלים מהי קומטר.
5. העלות היא גבוהה במיוחד. (ל-4 כיתות).
6. המבנה לא יהיה גמור בזמן.
7. המבנה המסוקס בלב הסכונה יצטיין בכיעורו.
8. ספק אם המבנה בעל 2 הקומות יסורק אי פעם.

אני מקבל עמדתך כי אין קשר בין חוססת הא קוביה ובין בניה בי"ם קסטרו.

לאור הנ"ל אבקשן לזמן הפגישה עם מסרד החינוך ונציגינו.

ב ב ר כ ה

שמריהו כחן
מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר ז. בראאי
מר בן-דוד
מר בן-אלול
מר א. חייך
מר ג. דביר
מר א. אולניק
גב' ס. ברור

מר שימטן
גב' ל. גרונן

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1) אה אה 30



המועצה הדתית ירושלים

ב"ה, ט"ז אייר תש"ם
2.5.80

לגאון -
הגשמה של
ההחלטות
המנוגדות
לדברי
הרב



לכבוד
גב' מירי ברור
משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
כ א 1

שלום רב,

סגן אלינו רב שכונת גילה ותושביה כשכונה, בבקשה להסדיר להם 2 דירות בגילה עילית, שיממרו כבתי כנסת זמניים.

מדי יום נכנסים דיירים חדשים לאזור זה של גילה וכיניחם יהודים דתיים רבים מבית כנסת עבודת הוא צורך חיוני ביותר. ההליכה הארוכה עד לבתי הכנסת הקיימים בגילה התחמיה היא קשה במיוחד בחורף הסוער ובקיץ הלוהט.

לאור זאת אני מוד מבקש להסדיר העמדת שתי דירות לרשות התושבים בגילה עילית ולהודיענו על כך. הודעה ותורה האיבור בשכונה מראש,

ככבוד רב,

גדליה שרייבר
ראש המועצה הדתית

התקש הרבנים הראשיים לירושלים
הרב א. הלזינגר, רב האכונה.
מר שטריוו טאן, סגן אזור ירושלים, משרד הבינוי והשיכון.

כה באייר תש"ס
11 במאי 1980

סכום ישיבה שנערכה בתאריך 8.5.80

נוכחים: ד. חרובי, מ. ברנור, א. ברזקי.

האדריכל הגיש סט מלא של תוכניות לשלב ב' (קומה נוספת + מקלט לביצוע).
הכולל: אדריכלות, קונסטרוקציה, אינסטלציה וחשמל וכן שני עותקים של
כתבי כמות, החומר מוכן לביצוע, ומאושר מבחינה אדריכלית.

היועצים חייבים להבאא תוכניות אלו ליריעה המהנדסים במחוז.

האדריכל מסר לחשומח לב כל הגופים המטפלים בנושא שכל עיכוב במתן הוראות
לקבלן להמשך העבודה, עבור שלב ב' יגרוור הפסדים משמעותיים לגבי העתיד.

תמוצה:

ש. כהן - מנהל המחוז

ע. אברמסקו - כאן

א. אולניק - מנהל פרויקט

נוכחים.

1942

...

...

...

...

דרור חרוזי אדריכל בע"מ • רח' שמואל הנגיד 26 • ת.ד. 7610 • ירושלים

D. CHARUVI ARCHITECT LTD. • 26 SHMUEL HANAGID ST. • P.O.B. 7610 • JERUSALEM

מיקוד 91070 CODE

טל. 221277 TEL.

12.5.80

Handwritten signature or initials in blue ink.

לכבוד
ה' אורי וארון
משרד אולניק
כ.א.נ.

א.נ.כ.

הנדון: בי"ס גילה שלב ד", תוספת קומה.

הננו מעבירים אליך בזה 5 מערכות מושלמות לביצוע + כתבי כמיות,

עבור תוספת קומה ומקלט חיצוני לבי"ס גילה שלב ד".

לכבוד רב,

דרור חרוזי
אדריכל

העמק: אליגוער ברזקי, אדריכל המחוז, משה"ש, כאן.

מ. ברור, עוזר למנהל המחוז, משה"ש, כאן.

ירושלים, 19.5.80

אש/384

Handwritten initials and scribbles

לכבוד
מר י. סורוקו
מנהל מדור מיקוח עליון
המחלקה לשרותי הנדסה
עיריית ירושלים
רחוב הלל
ירושלים

א.נ.

הנדון: חיבור טלפון לבי"ס זמני אשקובית - גילה
מכתבן: מס' 500 מיום 29.4.80.

נבקשנו ע"י מנהל המחוז, מר ש. כהן, לענות למכתבך בנדון.

בי"ס אשקובית הוכנן כביה-סטר זמני, ולכן החכניה של משרד
יוספה-סיגליס (מכתבן של חב' אשקובית) לחיבור טלפון למבנה הינו
עילי (כפי שהבחנו במהלך העבודות).

אי לכך קיימת הכנה לחיבור ולכן עליכם לפנות לצורך חיבור
טלפון אל משרד התקשורת על בסיס החכניה שברשותכם.

לדעתנו, ניתן לנצל את חיבור הטלפון העילי אשר הוכן ע"י
משרד התקשורת לצורך חיבור לשטח התארגנות של הקבלן ש. כראשי,
הגובל עם בית הספר הזמני.

בברכה,

Handwritten signature and stamp
אריסטו שורצר
משרד גילה

העתיקים:-

- מר ש. כהן - מנהל מחוז י-ם משהב"ש
- מר א. חייך - מנהל המה' הסכנית משהב"ש
- גב' ר. זמיר - ס/מנהל מחוז י-ם משהב"ש
- גב' מ. ברוור - מוסדות צבור, משהב"ש ✓

THE ASSOCIATION OF ENGINEERS AND ARCHITECTS
P.O. BOX 1000 TEL AVIV 6100

ROMANISHVIL HOUSE 240 D.L. JERUSALEM
TEL. 02-27 29 10-10

12.10.55, 2:30 PM

Dear Sir

Dear Sir,
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. regarding the above mentioned subject.
I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time.
I will be glad to discuss this matter with you at a later date.
Yours faithfully,
A. Olenik

A. Olenik

RECEIVED - 12.10.55, 2:30 PM

12.10.55, 2:30 PM

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. regarding the above mentioned subject.

I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time. I will be glad to discuss this matter with you at a later date.

I will be glad to discuss this matter with you at a later date.

I will be glad to discuss this matter with you at a later date.

RECEIVED
AIR MAIL

RECEIVED
12.10.55

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. regarding the above mentioned subject.
I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time.
I will be glad to discuss this matter with you at a later date.
Yours faithfully,
A. Olenik

Handwritten notes and a blue arrow pointing upwards.

מו"ס 3 ג'יה (2)



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

Handwritten signature

ירושלים י"ג באייר תש"ם
29 באפריל 1980

המחלקה לשרותי הנדסה
דائرة الخدمات الهندسية

תיק מס' 500



לכבוד
מר ש. כהן
משרד השיכון
בן-יהודה 23
ירושלים.

א.ג.

Handwritten notes: ארז אורן, אילן גולן, אהרן אהרן, אהרן אהרן, אהרן אהרן

הנדון: מבני הינוך הנבנים על-ידי משה"ש בגילה, הכנה חיבור טלפון.

מסוכין: מכחי מ-23.10.79 (בי"ס מס' 15 - קבלן מ. אביב).
מכחי מ-25.10.79 (בי"ס אשקובית).

פניתי אליכם לפני כחצי שנה ובקשתי לטפל בהכנה חיבור טלפון באחרים הנ"ל.

מאז בי"ס אשקובית כבר אוכלס וסובל מחוסר טלפון, משרד התקשורת מסרב לחברו בגלל חוסר הכנה.

בדרך כלל הכנה לטלפון מתבצעת במקביל לכל עבודות בנייה, אך במקרה של בי"ס אשקובית, נבקשכם לבצע את העבודה אחרי המעשה.

כמו-כן יש לדאוג לחיבור בכל מבני הינוך שנמצאים בתהליכי בניה שונים.

Handwritten notes: ארז אורן, אילן גולן, אהרן אהרן, אהרן אהרן, אהרן אהרן

בכבוד רב

M: (Handwritten initials)

י. סורוקו

מנהל מדור פקוח עליון

העתיקים: גב' ה. אשל - ממונה על חיק הינוך.
מר א. שגיא - מנהל שרותי הנדסה
מר ד. מלומד - מנהל חטיבת הבנוי.
מר י. שיפטן - מנהל המחלקה לחינוך.

המטה הארצי/אגף המנהלה
מחלקת הבנוי והנכסים
ת"א, טד' באייר תש"ם
(2.5.80)

בק/01 - 107860

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'אריאל' (Ariel).

לכבוד
הגב' מירי ברור
ק/ר למוס"צ
משרד השכון והכינוי
רח' בן-יהודה 23
ירושלים

מר ש. כהן - מנהל מחוז י-ם, משרד השכון, רח' בן-יהודה 23, י-ם
מר א. חייר - מנהל המחלקה הטכנית, משרד השכון, רח' בן-יהודה 23, י-ם
מר ב. דביר-מנהל יחידת פרוגרמות, משרד השכון, רח' בן-יהודה 23, י-ם
גב' א. ברזקי - אדריכלית המחוז, משרד השכון, רח' בן-יהודה 23, י-ם

ג.ג.ג

הנדון: אתורים לתחנות משטרה
סמוכין: מכתב ללא מספר מיום 16.3.80

1. הננו מאשרים בתודה קבלת התיק בצרוף לתכניות של:

- 1. תלפיות מזרח
- 2. ילה
- 3. נוה יעקב
- 4. רמות
- 5. מעלה אדומים

2. החומר הועבר על-ידינו לסגן מפקד המחוז הדרומי לקבלת
התייחסותו והמלצותיו למיקום המשטרה בכל שכונה.

3. עם החזרה החומר לרשותנו - נודיעכם בהתאם.

ב ב ר כ ה ,

שולמית קובו, סנ"ץ
ראש מדור לניהול נכסים
ב/ראש מחלקת הבנוי והנכסים

אלה מירי ברונר

ממסר גרסה

מקובל להשאיר במקום

שלום

מדינת ישראל

ק.א.מ.

משרד השיכון
מחוז ירושלים

ד' בסיון
1.6.1980

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בן יהודה 23 מסמך:
4-6-1980
בתובנים לקראת סיוור השטח ביום 1.6.1980

בשנת 1970 הוחל בתכנון גילה.

1. יחידות דיר

9000 יח"ד	הקיבולת הסופית של השכונה
" 2270	דירות מאוכלסות
" 3100	דירות בבניה

עפ"י פרוגרמת הבניה לשנת 1980/81 תוחלל בגילה בביתן של כ-700 יח"ד בנכס

2. מוסדות ציבור

בתי ספר - בשכונה הוקמו עד כה - 40 כתות בי"ס. 5 חדרים נוספים במבנה אסמ"ת משמשים אף הם כחדרי לימוד. בבניה בי"ס 12 כתות (שלב ד') בהתחשב בקצב האכלוס.

יש להתחיל מיד בבנית בתי הספר כדלקמן:

- א. בי"ס (ירובל גד) 24 כתות שלב ד'
- ב. בי"ס (קסטר) 12 כתות שלב א'
- ג. בי"ס (לופנפלד) 24 כתות שלב ב'
- ד. תוספת לבי"ס (חרובי) 6 כתות שלב ד'

גני ילדים - בשכונה הוקמו 23 כתות גן. לקראת שנת הלימודים הבאה תמסרנה 6 כתות נוספות.

יש להתחיל מיד בבנית 14 כתות גני ילדים.

מרכז מסחרי - חברת שיכון ופיתוח עומדת להתחיל בבנית ומרכז המסחרי חדש יודל 1980.

3. פיתוח

בפרוגרמה לשנת 1980 בתבקש:

- א. תקציב של 105 מליון ל"י להמשך ביצוע כביש פת.
- ב. תקציב של 150 מליון ל"י לפיתוח מראש.
- ג. תקציב של 50 מליון ל"י להשלמות פיתוח.

119, JABOTINSKY ST. - TEL-AVIV
15, HAMOR ST., GILO, JERUSALEM

טל. 45 49 01. 23 53 49
טל. 7 1 2 1 6 2
X X X X
טל. 717919

רחוב ז'בוטינסקי 119 תל-אביב
רחוב המור 15, גילה, ירושלים
X X X X
רוזטריין 240, גילה ירושלים

ירושלים, 11.5.80

או/349

סיכום פגישה ביום 11.5.80

בנושא ביח ספר גילה ד'

נוכחים:- ד"ר הרובי	- האדריכל
ר. שור	- סחכנן הקונסטרוקציה
ש. שביב	- נציג הקבלן - דיור לעולה
א. כספי	- מנהל העבודה - דיור לעולה
א. ורון	- משרד המיקוח

בהתאם להוראות מנהל מחוז ירושלים מר שטריהו כהן לביצוע כל ההכנות הדרושות להקמת קומה נוספת (6 כיתוח) למבנה הנ"ל, קוימה פגישה בשעה, וסוכסו:-

א. לבצע מדידה במסגרת הגדלה לחוזה הקיימ:

- 1) פרוק טפטנות תקרה מעל חדרי המדרגות כ-50 מ"ר
- 2) הכנת כל הקוצים לעמודים לצורך קומה נוספת, כולל חיזוקי קורות בהתאם להוראות הקונסטרוקטור.
- 3) פרוק חבניות בלוקים וברזל בשטח של כ-10 מ"ר בצדי חדרי המדרגות.
- 4) סיתוח חורים בקירות אבן בנויים לקבלת התקרה החדשה לפי התכניות האדשיות. בהתאם לתכנית של קומה התונה, החורים בגובה התקרה 28 ס"מ, ברוחב הצלע 15 ס"מ ובעומק מינמום 15 ס"מ, כמו כן סיתוח חריץ לכל האורך בעובי 6 ס"מ לקבלת פלטה עליונה מעל האיטונג.
- 5) הכנת מרט זיון החלונות בהתאם לקומה התחתונה ללא פרוק הכרזל המונח בהתאם לתכנית.

ב. דיור לעולה ימשיך בביצוע התקרה האחרונה עד למקומות אשר בהם יבצע המסקה יציקה לפי הנחית הקונסטרוקטור.

ג. דיור לעולה תקבל במסך היום סט חכניות מושלם, כולל כתב כמויות ותכניות היועצים להגשת הצעת מחיר לביצוע התוספת של 6 כיתוח.

ד. הצעת מחיר לביצוע המיקונים שהוזכרו בסעיף א' תוגש ע"י דיור לעולה תוך יומיים.

ה. עד לאישור הביצוע של הקומה הנוספת, הקבלן יסיים יציקה התקרה עד למקומות המאושרים, ימשיך לעבוד בעבודות הפנים, לא יתחיל שוט עבודה (למעט השנויים שהוזכרו) הקטורה בבניית הקומה הנוספת לפני אישור תקציבי או הוראה ממשרד השיכון לביצוע.

רשט: אורי ורון.

התקיים:-

- ש. כהן - משהב"ש
- א. תייר - "
- ל. קוקוש - "
- ס. ברונר
- ד. הרובי
- ר. שור
- א. שניאור - סמנכ"ל דיור לעולה
- ש. שביב

והבינורי

ז' בניסן תשמ"ט
24 במרץ 1980

לכבוד
אריכל צ. ברנרס
המח' לשרותי הנדסה
עיריית ירושלים

א,נ,

הנדון: חוספת 6 כמות - גילת שלב ד'

מצ"ב חכמייה אריכל חרובייה לחוספת 6 כמות לכייה"ס הנכנה בשלב ד'.
(כייה"ס סכנייה הוא טפוס חוזר של שלב ד').
אנא אשורך.

בברכה

מירי ברנר
ע/ר למוס"צ

העמק: גב' א. ברזקי - אריכליית המחוז
מר א. חיייר - מנהל המח' הטכנייה
מר א. אולניק - מנהל פרויקט גילת

Handwritten notes in the top left corner, including the number 14.4 and some illegible scribbles.

מס' 39



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים

המחלקה לשרותי הנדסה
دائرة الخدمات الهندسية

כ"ב בניסן ה'ש"ס
8 באפריל 1980

תיק מס' 539

לכבוד
מר א. ורון
(משרד אוליניק)
רח' רוזמרין 240 גילה
ירושלים.

א.נ.א.

הנדון: בי"ס וג"י מס' 39 בגילה - קבלן "דיוור-לעולה"
חוספת 6 כחות.
סימוכין: מכחבך מ-9.3.80.

קבלנו ידיעה על חוספת 6 כחות ל-12 כחות הנבנות בביה"ס.
עיריית ירושלים הצטרך את ביה"ס (אחרי חוספת 6 כחות) לשנה
הלימודים השמ"א. אך לאור נסיון של קבלת ביה-סמר מס' 9
בנוה-יעקב ומס' 15 בגילה (קבלן מ. אביב). נבקשם לקבוע
האריך סיום ביוני 1981 ולתח לנו לוח זמנים מפורט בכדי
שנוכל לעקוב אחר ההתקדמות.

בכבוד רב

Handwritten signature

י. טורוקו

מנהל מדור מקוה עליון.

- העוזקים: מר ד. מלומד - מנהל חטיבת הבנוי.
- מר י. שיפטן - מנהל המח' לחינוך.
- מר ש. כהן - משרד השכון. ✓

ימ/נג

כ"ד בניסן תש"מ
10 באפריל 1980

לכבוד
אדר' ארדריין
מח' הנבוי
משרד החבון.

אדון בכבוד,

הנדון: תוספת 6 כתות - גילה שלב ד'.

מצ"ב תכניות אדר' חרובי לתוספת 6 כתות לבניה"ס הנבנה
בשלב ד' גילה. (בניה"ס הוא טפוס חוזר למבנה בשלב ג'
בשכרבה).

אנא אשורך.

ב ב ר כ ה ,

מירי ברוך
ע/ר למוס"צ

העתק: גב' א. ברזקי
מר א. תייר
מר א. אולביק

1945
10-10-45

UNIT
NO. 10000
ON 10-10-45
UNIT NO. 10000

UNIT NO. 10000

UNIT NO. 10000 - UNIT NO. 10000

UNIT NO. 10000 (UNIT NO. 10000 UNIT NO. 10000)
UNIT NO. 10000 (UNIT NO. 10000 UNIT NO. 10000)
UNIT NO. 10000

UNIT NO. 10000

UNIT NO. 10000

UNIT NO. 10000
UNIT NO. 10000

UNIT NO. 10000
UNIT NO. 10000
UNIT NO. 10000

מדינת ישראל

משרד השיכון והבינוי
מחוז ירושלים

תאריך: ז' בניסן תשמ"מ
מספר: 24 במרץ 1980



לכבוד
אדריכל צ. ברנדיס
המח' לשרותי הנדסה
עיריית ירושלים

א, נ,

הנדון: תוספת 6 כחות - גילה שלב ד'

מצ"ב חכניות אדריכל חרובי לתוספת 6 כחות לביה"ס הנכנה בשלב ד'.
(ביה"ס שבכנייה הוא טפוס חוזר של שלב ג').

אנא אשורך.

אישיותי - אלויה
במהלך ההליכה
אשר
27.3.80

בכח ה

מירי ברזור
ע/ר למוס"צ

העתק: גב' א. ברזקי - אדריכלית המחוז
מר א. חייר - מנהל המח' הטכנייה
מר א. אולניק - מנהל פרויקט גילה

SECRET 10/17/25
SECRET 10/17/25

SECRET 10/17/25
SECRET 10/17/25

SECRET

SECRET
SECRET 10/17/25
SECRET 10/17/25
SECRET 10/17/25

SECRET

SECRET 10/17/25 - 10/17/25

SECRET 10/17/25 - 10/17/25
SECRET 10/17/25 - 10/17/25

SECRET

SECRET
SECRET 10/17/25

SECRET 10/17/25 - 10/17/25
SECRET 10/17/25 - 10/17/25
SECRET 10/17/25 - 10/17/25

מדינת ישראל

משרד החינוך והתרבות
האגף לפיחוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

16.3.80

לכבוד

גב' מירי ברוור

משרד השיכון ירושלים

שלום רב,

הנדון: גילה שלב ד' תוספה 6 כתות (606 מ"ר)

בחשובה למכתבך מיום 6.3.80 מוחזרה התכנית הנ"ל כשהיא
מאושרת על ידינו.

מספר האישור 372 מיום 24.2.80

אין לדאוג באישור זה כל התחייבות תקציבית.

בכבוד רב,

יצחק גנור
מנהל המחלקה

מצורפת התכנית המאושרת.

העמק: מר ר. ירון - מנהל המח' למיפוי
מר צ' ברנדס - מח' מהנדס העיר י-ם
אדר' חרובי, רח' שמואל הנגיד, ירושלים

כ"ג בניסן תש"ם
9 באפריל 1980

לכבוד
גב' תמר אמל
המטובה על תיק החינוך
עיריית ירושלים.

גברת בכבדה,

הגדון: בי"ס קסמו בשכונת גילה

בשלב זה אין אנו מנהלים משפט בגד הקבלן. אנו מבסטים להשיג סיבוי הנטח באמצעות משא ומתן והצעת פתרון חילופי.

אין ספק, כי לחץ מצד גורמים ציבוריים נוספים על אותו קבלן עשוי לזרז התואיר.

רק לאחר הנלמתו של המו"מ, אפשר יהיה להעריך, מתי ניתן יהיה להתחיל בבניית בית הספר.

בכבוד רב,

ויהי
רנה זמיר
ס/מנהל מחוז ירושלים

העתק: מר ב. דביר
מר א. אולניק
גב' מ. ברור

SECRET
22 APR 1954
COMMUNICATIONS SECTION
SECRET

SECRET

SECRET

The following information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.

This information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.

This information is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your organization.

SECRET

SECRET

SECRET
22 APR 1954
COMMUNICATIONS SECTION
SECRET



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים

מחלקת לחינוך
דائرة المعارف

ה' בניסן תשמ"ם
25 במרץ 1980
מח/3401

Handwritten notes:
א.ז.ה.
א.ז.ה.
ה.א.א.
ה.א.א.

לכבוד
גב' מירי ברנר
עוזר ראשי למוסדות ציבור
משרד השיכון
ח"ד 1462
ירושלים

הנושא: בן ילדים מס' 9 (ע"י ביה"ס)
מכתבס: י"ג בשבט (4.2.), שהגיע רק ב-7.3.

שלום רב,

בדקנו ומצאנו, שנצטרך את הגן הנ"ל בשנת תשמ"א,
לכל המאוחר באמצע השנה - בחנוכה או ב-ט"ו בשבט, לפני
האיכלוס של בחים.

בברכה רבה
[Signature]
יואל שיפטן
מנהל המחלקה לחינוך

העתיקים:

- מר מ' שרגא, משנה למנהל המחלקה;
- מר ד' מלומד, מנהל הסיכת הבינוי;
- מר ש' שפיצר, מנהל אגף גני ילדים;
- מר י' פלד, מתאם מוסדות חינוך;
- גב' לאה גונן, אחראית לחינוך.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1981

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

האגף לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה למיפוי

ו' בניסן תש"ס
23 במרץ 1980

אל גב' אלינור בחזקי, אדריכלית מחוז ירושלים, משרד הבינוי והשיכון

איתור מגרש לבי"ס מיוחד בשכונת גילה - ירושלים

ברצוננו להביא לידיעתכם שאיננו מחננדים לכך שהמגרש המיועד לביה"ס של החינוך
המיוחד בשכונת גילה יאוחר בשלב ה' של השכונה במקום בשלב ג'.

הובא לידיעתנו כי העירייה הבטיחה את המגרש שאוחר בשלב ג' לארגון נשות המזרחי
לשם הקמת מבנה חדש למוסד קיים בשם "הל-רענן" השוכן כיום בבקעה.

בנוסף לכך, נמסר לנו כי יאוחר מגרש נוסף לחינוך המיוחד בשטח "הואומים" (המחוכן
מצפון לשלב ד').

ב ב ר כ ה

1980

עדה בן דוד
מחכנת

העתקים: משה כהן, הועדה המחוזית, משרד הפנים, מחוז ירושלים
גב' מירי ברוור, משרד השיכון, מחוז ירושלים
גב' לאה גונן, עיריית ירושלים
מר יצחק גנור, המחלקה לבינוי
מר רפאל ירון, מנהל המחלקה למיפוי

WYOMING STATE UNIVERSITY
LARAMIE, WYOMING
MAY 19 1952

TO THE HONORABLE SENATE OF THE STATE OF WYOMING

REPORT OF THE STATE BOARD OF EDUCATION

FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1951

THE BOARD OF EDUCATION HAS THE HONOR TO SUBMIT TO YOU THIS REPORT OF ITS ACTIVITIES DURING THE YEAR ENDING JUNE 30, 1951.

THE BOARD OF EDUCATION HAS BEEN PRIVILEGED TO WORK WITH YOU THROUGHOUT THE YEAR AND HAS BEEN PLEASED TO REPORT TO YOU THE RESULTS OF ITS WORK.

RESPECTFULLY,
STATE BOARD OF EDUCATION

WYOMING STATE UNIVERSITY
LARAMIE, WYOMING

WYOMING STATE UNIVERSITY
LARAMIE, WYOMING
MAY 19 1952

מ ד י נ ת י ש ר א ל

משרד החינוך והתרבות
האגף לפיתוח מערכת החינוך
המחלקה לבינוי

16.3.80

לכבוד

גב' מירי ברוור

משרד השיכון ירושלים

שלום רב,

הנדון: גילה שלב ד' תוספת 6 כתות (606 מ"ר)

בתשובה למכתבך מיום 6.3.80 מוחזרת התכנית הנ"ל כשהיא
מאושרת על ידינו.

מספר האישור 372 מיום 24.2.80.

אין לראות באישור זה כל התחייבות תקציבית.

במכוד רב,

יצחק גנור
מנהל המחלקה

מצורפת התכנית המאושרת.

העתק: מר ר. ירון - מנהל המח' למיפוי
מר צ' ברנדס - מח' מהנדס העיר י-ם
אדר' חרובי, רח' שמואל הנגיד, ירושלים

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

אשר אולניק חנוה להנדסה בע"מ ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב זיבוטינסקי 119 תל-אביב . טל. 45 49 01
רחוב רוזמרין, בית 240, גילה, ירושלים . טל. 02 7179 19

ירושלים, 16.3.80

240/אש

לכבוד
חברת "אסקוביט" בע"מ
לידי המהנדס הראשי
אזור התעשייה החדש
ראשון לציון.

א. ג.

הנדון - בית ספר גילה -
חוזת מס' 40/54455/63546/78
מכתבו סיום 25.2.80.

להתקנתו, שים תוקנו סכר ליקויים שנרשמו
בקבלת החוזת של הטיבנה (ראה מכתבו שבסמוכין).

כמו כן הודענו למהנדס המבנה, מר אלי בצר, עוד
בהחילת החוץ, על הנזילות שנחבלו בטיבנה, וחובתנו לנו
שימול.

עד היום לא נקטה דבר לשיפור המצב.

אודה לך על שימול בידי לחיקון הליקויים הקיימים
בטיבנה.

בכבוד רב,

אולניק אורצו
זוה גילה

החוקן
ש. כהן - מנהל
א. חייך - " "
ד. פלומי - קריית ירושלים
מ. ברור - מנהל

also mid

והכינוי

~~א.א.~~

כ"ח באדר תש"ם
16 כספרי 1980

לכבוד
סניף שולמית קובי
מסערת ישראל
רח' סלמי 18
תל-אביב

ג, ג,

הנרדן: אחורים לחתנות מסערת
בהספך לפויטחנו

מ"כ הכניות השכונות הבאות ובהן הצעות לאחורים לחתנות מ:

- א. תלפיות מזרח.
- ב. גילה.
- ג. נוה יעקב.
- ד. רמה.

כמו כן מצורפות הכניות העיר מעלה אדומים ובה הצעה ספציפית למיקום המסערת
בצמוד לפונקציות נוספות.

אנא הוריעונו בדחיפות האזור המקובל עליכם כיגחר בכל שכונה.

כ ב ר כ ה

סירי ברנור
ע/ר למוס"צ

התקן: סר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים
סר א. חייר - מנהל המחלקה הטכנית
סר ב. רכיר - מנהל יחידה מרוגרטות
גב' א. ברזקי - אדריכלית המחוז

20.2.80

לכבוד
הגב' א. ברזקי
אדריכלית המחוז
משרד הבינוי והשיכון
כ.א.ן.

א.נ.,

הנדון: בי"ס גילה, שלב ד' - תוספת בניה
חוזה מס' 14/57843/77.

בעקבות קבלת אשורכם לתכנון תוספת קומה לבנין ביה"ס בגילה, שלב ד',
אנו מבקשים להוציא לנו הגדלה חוזה.

להלן שחי הבניה הנוספת:

מקלט תת קרקעי בשטח החצר	126.16	מ"ר
תוספת בניה בקומת קרקע (הגדלת ח" מוריס)	23.45	מ"ר
תוספת קומה ב'	583.51	מ"ר
סה"כ בניה נוספת	733.12	מ"ר

נודה לך על הוצאת הזמנה בהתאם.

בכבוד רב,

דרור חרובי
אדריכל בע"מ

העתק: גב' מירי ברור, משה"ש, כאן.

THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY, N. Y.

IN SENATE,
January 10, 1912.

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1911.

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE OF NEW YORK, 1912.

PRINTED BY THE STATE OF NEW YORK	1912
STATE OF NEW YORK	1912
ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE OF NEW YORK	1912

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE OF NEW YORK, 1912.

גילה אכלוס
③

יא' בשבט תש"ם
29 בינואר 1980

ליו"ר-מחוז
מחוז
מחוז

גילה

לכבוד
מר ז. לוי
סגן מנהל המחוז
קופת חולים
רח' בן יהודה 26
ירושלים

א.ב.,

הנדון: דירה ברח' הצוף 21 גילה

כידוע לך נעשה אכלוס הדירה על ידיכם בנגוד לסדרי מנהל תקינים. בשיחתי עם מר רובי מזרחי מנהל המחוז, הבהרתי כי אנו דורשים פיבוי לאלתר של כל הדירות שיועדו לשמש כמרפאות זמניות, ואילו אתם הסבתם השמוש בהן למגורים, הדרישה הזו חלה גם לגבי הדירה שבנידון.

הודענו על כך למר בר-אפרת מנהל המחוז של חברת שיכון ופיתוח.

ב ב ר כ ה
י ו ה ל א
ריבה זמיר
ס/מנהל המחוז

העתקים:
ש. כהן - מנהל מחוז משהב"ש
רובי מזרחי - מנהל מחוז קופת חולים
בר-אפרת - מנהל מחוז י-ם, חב' שו"פ

רהבינוי

י"ח באדר תש"ם
6 בפרץ 1980

ל

לכבוד
אד"ר ארזיאל
הסח' לבנוי
משרד החינוך

א, 2,

הדרון: חוספת 6 כחוח לכיה"ט ביולה - שלב ד'

מצ"מ 3 סטים של חכניורה הגיה לחוספת 6 כחוח לכיה"ט
בביולה שלב ד'.

אנא אסורך.

ב ב ר כ ח

סורי כרוור
ע/ר למוט"ז

החתק: מר א, אולניק - מנהל פרויקט ביולה
מר א, חייר - מנהל המחלקה הטכנית
גב' א, כרוקי - אורזכלית המחוז

אשר אולניק
חברה להנדסה בי"מ
אתר גילה ירושלים

XX XX XXXX

XX X

ירושלים 240, גילה ירושלים

ירושלים, 24.2.80

מא/195



קא/195

- לכבוד
1. חברה אשירום
רחוב הנביאים 60, ירושלים
 2. חברה סבס
אזור התעשייה, ה.ד. 1608, חולון
 3. סולל בונה כע"מ,
הפלך ג' ורג' 47, ח"ד 7118, ירושלים
 4. חברה רמס,
רחוב קרליבך 7, תל אביב

א.ב.3.

הנדון: - הרכבת אלמנטים טרומיים בגילה.

בהתאם לורישת סעיף 21044 של המפרט הכללי לבנייני בטון טרומיים מס' 21, חייב הקבלן להכין בכתב הוראות-הרכבה מפורטות לסוגי האלמנטים השונים, הכוללות תיאור מפורט של כל החליכי ההרמה, החקמה, התמיכה, הפילוס, הטיפול במסקים, המילוי בבטון ותחביבורים במקום, עיבוד ואיטום המסקים. הוראות ההרכבה מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה.

נבקשת להעביר אלינו את המפרטים המתאימים לצורך הפיקוח על עבודות שאמם מבצעים בגילה.

החומר יימסא אצלנו לא יאוחר מיום 5.3.80.

ב כ ר כ ה

מ. אלנברג

העתק:

א. חייך - משהב"ש ירושלים
י. לויין - משהב"ש הקריה ת"א

Исторический
национальный музей
и архив

№ 1000
Москва, 1925 г.

- 1. Илья Ильич
- 2. Иван Иванович
- 3. Анна Ивановна
- 4. Мария Ивановна
- 5. Петр Иванович

И
И
И

Исторический национальный музей и архив

Исторический национальный музей и архив
Москва, 1925 г.

Исторический национальный музей и архив
Москва, 1925 г.

Исторический национальный музей и архив
Москва, 1925 г.

Исторический

Исторический

Исторический национальный музей и архив
Москва, 1925 г.

אשר אולניק
חברה להנדסה בני"מ

אתר גילה ירושלים

א א א

רחוב רוזנריין 240, גילה ירושלים

ירושלים, 25.2.80

אש/196

לכבוד

מר י. סורוקו

מנהל מדור פיקוח עליון

עיריית ירושלים

א.נ.נ.

הנדון: - בית ספר אשקובית - גילה

מכתב מ-30 בינואר 1980
ומכתב מר סרי המצורף.

מר א. חייר בקש מאתנו לענוה למכתבך שבסמוכין.

1. לסעיף א' במכתבך - השקעים בגובה 40 ס"מ מיועדים לקונבקטורים המחוברים באופן תמידי לשקעים.
2. לסעיף ג' - תכניות בית הספר אושרו בלא מקלס.
3. לסעיף ה' 1 - נקוי החצר - אשקובית התחייבה לנקות החצר מהאבנים הגדולות.
4. לסעיף ה' 2 - מוצע שהיות ועיריית ירושלים קבלה את בית הספר ואישרה אותו ללא מעקה, יוחקן עתה המעקה על ידה.
5. לסעיף ה' 3 - מכסי הביוב יונמכו עד למפלס החצר ע"י חברת אשקובית.
6. לסעיף ו' - הברז חורד.
7. לסעיף ה' - ציוד כיבוי אש - בכניסה לבית הספר הותקנו מסף וצינור.
8. לסעיף י' - הבקשה היא לעיריית ירושלים.

בכבוד רב,

ארינסטו שורצר
צוות גילה

העתק:

א. חייר - משתב"ש

מ. ברוור - "

חברה אשקובית, מר דן ווקסמן (סעיפים 3, 5).

1111

התאחדות המורים
במחוז תל אביב

מס' 1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111



עירית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

כ"א בשבט תש"כ
8 בפברואר 1980

ירושלים

המחלקה לשוהתי הנדסה
דائرة الخدمات الهندسية

תיק 512

לכבוד
משרד אולייניק
רח' רוזנרין 240
בילה
ירושלים.

א.ג.ג.

הנדון: ג"י פס" 12 (34) לקוי טיב.
סימוכין: דו"חות של גננות
ומכתב לזוי כמ. שדגא מ-31.1.80.

מעביר לכם דו"חות של גננות לג"י הנ"ל לטעולכם היחודי.

בכבוד רב

י. טורוקו

מנהל מדור פקוח עליון

העתק: טר ד. מלומד - מנהל חטיבה הבנוי.
טר מ. שדגא - כה" החינוך.
טר ש. כהן (משה"ש).
גב" ס. ברזור (משה"ש). ✓

לוטת: דו"חות.



سازمان آموزش عالی و تحقیقات علمی
جمهوری اسلامی ایران

نام نهاد درخواست کننده
موسسه عالی تخصصی

شماره پرونده
۱۳۳۳۳۳

تاریخ
۱۳۳۳/۰۵/۰۱
محل صدور
تهران

۱۳۳۳/۰۵/۰۱

موضوع درخواست

تاسیس رشته تحصیلی

در مقطع کارشناسی ارشد

درخواست کننده این رشته را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته تخصصی

تاسیس رشته



تاریخ تصویب
۱۳۳۳/۰۵/۰۱

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در رشته تخصصی
تاسیس می‌گردد.

محل صدور



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים י"ז בשבט תש"מ
4 בפברואר 80

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

מח/2467

לכבוד
גב' מירי ברוור
ע/ר מוסדות ציבור
משרד הבינוי והשכון
מחוז ירושלים
רח' בן-יהודה 23
ירושלים

ג.ג.ג.

הנדון: - אישור לבניית קומה נוספת
בבית"ס בחכנון חרובי, שלב ד' בגילה.

העלינו בצוות החכנון והבניה שלנו הצעחכם להשלמתו של בית"ס, שבבניה בשלב ד' בגילה, ל- 18
כתות, והוחלט לקבלה, וזאת לאור המחסור החמור הצפוי בחדרי לימוד בשכונה גילה בשנים
הקרובות.

דברתי עם גב' עדה בן-דור ממשרד החינוך ~~אאאאא~~ והתרבות, ואף הם מקבלים בחיוב את ההצעה.
נודה לכם מאד אם תזרזו החכנון ותצאו לבנייה החופפת בהקדם האפשרי ע"מ שלא לעכב את איכלוסו
של בית"ס.

בנוסף, מאחר ובית"ס ממוקם באחר בניה, רצוי כבר עכשיו לדאוג לדרך גישה בשוחה ומגודרת
לבית"ס.

ב ב ר כ ה

לאה גונן
לאה גונן
מחכננה מערכת החינוך

העמק: גב' תמר אשל, הממונה על תיק החינוך
מר י' שיפטן, מנהל המח' לחינוך
מר מ' שרגא, המשנה למנהל המח' לחינוך
מר ש' כהן, מנהל מחוז י-ש, משהב"ש
גב' א' ברזקי, אדריכלית המחוז, משהב"ש
גב' ע' בן-דור, מחכננת, מח' המיפוי, משה"ח

אשר אולניק חנוה להנדסה בע"מ ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב זיבוטינסקי 119, תל-אביב TEL. 45 49 01 על. 119, JABOTINSKY ST., TEL-AVIV
רחוב רוזמרין, בית 240, גילה, ירושלים על. 02 71 79 19 ROSMARIN ST., HOUSE 240, GILO, JERUSALEM

ירושלים, 5.2.80

אור/141

לכבוד
מר י. סורוקו
המחלקה לשרותי הנדסה
עיריית ירושלים.

א.נ.ג.

הנדון: - ברגים לתליח ציוד טפורט - גילה
בי"ט סס' 15 (הקבלן - ס. אביב)

סאחר והשתתפת בביקורות תוך כדי הבניה, וכמו כן
בבדיקות הקבלה השונות, הריני בטוח שהנך שותף לסיכום
שנתקבל על דעה כל הנוגעים בדבר בקשר לברגי התליה.

הריני חוזת על הסיכום הנ"ל: סוכס על דעת
המתכננים להרחיב את הפתחים בתקרה האקוטטית על מנת
לאפשר הכרגת המתקנים לציוד הספורט אל התקרה.

אנו נדאג לביצוע העבודה הנ"ל בהקדם, עם השלמת
שאר העבודות והתיקונים.

בכבוד רב,

אורי ורון

העתק:
א. הייר - משהב"ש
ס. ברור - ✓

№ 2111

ASHER OLENIK
The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, on the
subject of the above named person.

ASHER OLENIK was born on [illegible] at [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

He is a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

He is a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

He is a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

He is a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

He is a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

He is a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

He is a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

רוזמרין 240, גילה ירושלים טל. 717919

ירושלים, 5.2.80
או/142

לכבוד
מר י. סורוקו
המחלקה לשרותי הנדסה
עיריית ירושלים.

א.נ.א.

הנדון: - פרוטוקול בטיחות - בי"ס הרובי ג' - הקבלן מ. אביב
גילה

הריני להזכיר את מכתבו של מר ב. דביר, מנהל היהידה לפרוגרמות של מחוז ירושלים במשרד הבינוי והשיכון, בקשר לפרוטוקול הנ"ל. אנו נפעל בהתאם להוראותיו. להלן רשימת הסעיפים:-

1. גמר סלילת המדרכה המובילה לביה"ס - העבודה במכרז - חבוצע תוך זמן קצר.
2. פינוי ערימת סלעים סביב - יבוצע עם השלמת עבודת הפיתוח
3. התקנת האורה בטחון - בביצוע
4. חיזוק גדר החיל - יבוצע עם גמר העבודה בשטח
5. גבול עם בנין שכן - יבוצע בהתאם לתכנית
6. רשת 4 מ' סביב למגוש כדור-סל - לא יבוצע
7. החלפת זכוכית - נבצע זכוכית משוריינת
8. החלפת הנורה במחסן הספורט - יבוצע בהתאם לדרישה
9. הגבהת המנורות בחצר - יבוצע
10. יציאת הגבהה בחלון החצר הפנימית - יבוצע
11. התקנת סורגים בחלונות כחה אמצעית - לא יבוצע
12. סעקה סביב לגב החתחון - לא יבוצע
13. תיקונים בגגות - בביצוע
14. תיקון סדקים - בביצוע.

בכבוד רב,

אורי ורין

העתקים:

- א. תייר - משהב"ש
- מ. ברור - ✓

אשר אולניק חברה להנדסה בע"מ ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב זיבוטינסקי 119 תל-אביב . על. 45 49 01 טל. 119, JABOTINSKY ST. · TEL-AVIV
רחוב רוזמרין, בית 240, גילה, ירושלים על. 02 7179 19 טל. ROSMARIN ST., HOUSE 240, GILO, JERUSALEM

10.2.80, תשרי תש"ל
נ. הוזה ירושלים
150/150
12-2-1980
דואר נכנס

לכבוד
חברת דיור לעולה
קרן היסוד 36
ירושלים

א.נ.,

הנדון: - בית ספר ובן ילדים - גילה ד'
חוזה מס' 40/64231/78

בחשובה לשאלתך בקשר לבידוד גג בית הספר,
הננו להודיעך כי אין צורך בכל חוספת לחכנון הקיים
ויש לבצע בדיוק לפי החכנון הנ"ל.

בברכה,

אורי ורון

העתק:
א. חייר - משהב"ש ✓
ד. חרובי, אוריכל

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
57 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

RECEIVED
UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
JAN 10 1964

RECEIVED
UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
JAN 10 1964

...

RECEIVED
UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
JAN 10 1964

...

Handwritten note:
see file

...

...

מדינת ישראל

משרד השיכון
מחוז ירושלים

חאריך: יא' כשבט תש"ם
29 בינואר 1980

מספר:

משרד הבינוי והשיכון מחוז ירושלים רח' בני יהודה 23
1980-2-4
דואר נכנס

א.ג.א.

לכבוד
מר יעקב לופו
יר"ד ועד השכונה - גילה

א.ג.א.

הנדון: בניית ביה"ס בגילה
מכתבך למנכ"ל מ"ש וחינוך מיום 6.1.80

מצ"ב הערותיו של מנהל יח' פרוגרמות בהתאם למכתבך. גם אם יש התיחסות לאי דיוק
בנתונים הרי שהמחוז מגיע למסקנה דומה והיא שיש להתחיל בתכנון ובבנייה של
2 בתי ספר ב-1980 ו-2 בוספים ב-1981.

בשלב זה אין בידינו תקציב לפרוגרמה מוס"צ לשנת התקציב 1980/81.

ב ב ר כ ה

[Signature]
שמריהו כהן
מנהל המחוז

העתקים:

- מנכ"ל מ"ש - מר א. וינר
- ראש העיר - מר טדי קולק
- גב' חמר אשל - ממונה על החינוך עיריית י-ם
- מר י. שיפטן - מנהל מח' החינוך
- מר י. גבור - מנהל משרד החינוך
- מר ז. ברקאי - מנהל מחלקת פרוגרמות
- מר בן אלול - ממונה מוסדות ציבור
- מר א. תייר - מנהל המחלקה הטכנית
- מר ב. דביד - מנהל יח' פרוגרמות
- גב' מירי ברודר
- מר א. אולניק - מנהל פרויקט גילה

כ' באדר תש"ס
19 בפברואר 1980

137
14
37

פרדורמה אחר 01 מבנין 04

המבנין נמצא בכניסת הצפונית והראשית לשכונה ליד כביש פת ונצפה פמעט מכל
אחד אחר בירושלים.

שטחו כ-50 דונם, לפי מדידה עלנסטרית.

יעודו - "אזור מגורים 2" בהכניסה סחאר גילה 1905 המאושרת. שיעור הבניה
המותר באזוריט כאלה לפי הבניה סחאר ירושלים עד 120%.

קיבולת - לפי טבלת הבניה המיוחדת סחאר לבנות כו 370 יח"ד.

סופוגרפיה - השפוע באחד בעמוד של 25% - 20% יורד לכוון בית צפנה וירושלים.
הסופוגרפיה כיום שונה בשל שפכים של כביש פת ואין לנו נתונים
מדויקים של מצב השטח.

הנושא נמצא במדיקה - הוזמן ממדי חדש של השטח וכו בדיקות קרקע
אין להתחיל בהכנון לפני קבלת הוצאה בדיקות מצב הקרקע
ואפשרויות הבניה בשל השפך.

הנהיות מהכנון סחאר - בהתאם להנחיות מהכנון הבניה המתאר - יסקי - הבניה בשולי
השכונה במקעים הנוצפים מירושלים וסמוך לואדיות תהיה
בשורות ספבילות לסופוגרפיה והדורגות כעין פרטות
הרריות הנוצפות לעיר.

החכורה - בהכניסה סחאר להתחורה עובר כביש ברוחב של 18 מ' המקשר את דרום
מערב ירושלים (המרכז המסני) עם כביש הרכבה - דרך מבנין זה.

לצורך בדיקה מוסדות הצבור נלקחו מהמבנין כל יחידות הויזור הקיימות והמוותרות
לבניה באחר 01 - 4624 יח"ד (כולל כ-400 יח"ד במבנין זה) אם כי מכתבנות
שרותים התי סנו לגבולות מנוצפים יותר רק שלב א' + ב' באחר 02 שהם כ-2893
יח"ד.

להלן פירוט מוסדות הציבור הדרוטים:

1.	2 בני ילדים צמודים -	מגרש אחד ל-4 כחות -	2.4 ד'
		מגרש אחד ל-3 כחות -	1.8 ד'
2.	ספונות יום	מגרש אחד	1.0 ד'
3.	סועדון גוער	מגרש אחד	1.0 ד'
4.	בית כנסת	מגרש אחד	1.5 ד'
5.	מגרש משחקים	מגרש אחד	2.5 ד'
			<u>סה"כ - 10.2 ד'</u>

סמך - יש לתכנן 4 חנויות למספר יום יומי בשטח בניה של 40 מ"ר כרום ב"א בקומה קרקע של אחר הכניסים.

כמידה והכביש הצמוד יורש ע"י חכניה אב החכורה אזי השטח שמדרום לו יוער למוסדות ציבור כלל עירוניים.

מאחר ולא נדרשים באחר שטחים רבים לצרכי ציבור, מוצע לברוק אסדרות ניבול מלא אחוזי הבניה הסותרים מהשטח בסך שיסאר כירי מסד הבינוני ולהביע לקבולת גדולה יותר מזו שנקבעה בטבלת חכניה המתאר. הגדלה הקבולת אפשרית בשל המסד יח"ד באחרים אחרים בנילה (בכל מקרה לא יוכל מסד הבינוני לנצל את מלא 10,000 יח"ד שנקבעו בחכניה המתאר). להערכתנו ניתן להביע לכ-500 יח"ד במבנן זה.

כמידה ובעקבות בדיקות הקרקע יחברו שיש צורך במתכונות הנדסיים ופתרונות ארכיטקטוניים מסובכים, חבוק המרוגרתה סחוט.

התפלגות דירות ב-

גדלי דירות

15%	2 חדרים
65%-70%	3 חדרים
20%-15%	4-5 חדרים

דירות נכיס - כ-3% מטה"כ הדירות במבנן תהיינה דירות נכיס. גדלן יבוע בין 2-4 חדרים. דירות אלה תמוקמנה בקומה הקרקע של המבנים ותחננה לתן גישה ישירה מהחניה. התכנון הסניסי יאמשר הנועה בעגלת נכיס כדירה.

שמי הדירות יהיו כהתאם להנחיות הקבועות של מסד הבינוני והשיכון (הנחיות 1.17).

הכיתה: צביה אפרתי
ע/בינוני ערים

כנייה

אתר 04 הינו נשוא לנתונים הבאים:

1. מחוקק בכניסה הראשית (בפתח) לשכונה הכרוך אפון על כביש פת.
 2. נצפה מירושלים ושוכר את קו הבינוי העגול של הגבעה (החודם כיום ע"י בנייה לופנפלד).
 3. מוגדר בהנהיגה הכנייה סתאר לכנייה כפרסום.
 4. נמצא בשולי השכונה וקרוב לשכונה ביה צפחה.
 5. החוט ע"י 2 כבישים קיימים ויחכן ע"י כביש נוסף.
- למשל הנקודות האלו שהינם כנתונים יש לבסוף ולענות.

המבנה אריך להסיר את שפוע הגביעה, ולתח שער כניסה לשכונה - אך ברור הוא שהחזיה לכרון כביש פת הינה חזיה צורניה בלבד. הקשר של המבנה יהא בין סוס"צ שימוקמו במבנה לבין הסתג"ס לכרון בנייה לופנפלד, וכחמשך לסתג"ס ולסוס"צ שימוקמו כשטח המבנה.

צירים אלה ישרתו חנועה שעשויה לבוא למבנה, בהתיחסות לצירים ראשיים.

לופנפלד - הקיימת כיום.

על המבנה לבדוק עם מחכונות הכנייה אם לתחבורה אם סממנותיו של הכביש הצפוני, המתבר את דרום מערב עם כביש הרמבה, והאם אכן יש להשיר עבורו שטח.

במידה וכביש זה קיים, יש להתחום כשפת אחרת לחתום הצפוני בשפולי המבנה.

היה והמבנה נמצא בשולי השכונה, וסמיכותו לבית צפחה, יש לתת לתושבים הרגשה טובה אך כל זאת ללא מביעה בסקסטורה של הכנייה המקיימת.

מבנה זה הינו למעשה התפר בין בניה כפרסומית ובצורה סגורה של הכפר לבין הכנייה הסגורה והמסיבית של גילה, אי לכך על המבנה להנוח גם מבחינה ארכיטקטונית חוליה מקשרת בין שתי צורות בניה אלו.

במידה וכביש מזרח מערב אמנם מחלק את המבנה יש להשאיר את החלק הנוחר עבור סוס"ד כלל שכונתי - א"י צירוני, ולא לצרכי המבנה.

הכנייה: אליצווער ברזקי
אדריכלית המחוז

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

war 50 2001 5 10

Small, illegible mark or stamp.

Small, illegible mark or stamp.

Faint text at the bottom right corner, possibly a date or reference number.



עירית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

המחלקה לשוואתי הנדסה
דائرة الخدمات الهندسية

כ"ז בשבט תשמ"ב
14 בפברואר 1980 ירושלים

560
תיק פס'

פרוטוקול
של סיור בגילה (טבני/ חינוך)
הנבנים על-ידי טש"ש עבור עירית
ירושלים

משתתפים: עירייה י"ם - כח' שרדתי הנדסה (י. סורוקו וא. יצחק)
טש"ש - משרד אוליניק (א. ויון).

מקום מודיע:

בי"ם פס' 15 (קבלן פ. אביב) - ביה"ט נמצא בשלבי סיום.

1. מבנה בי"ם (כולל גריקה מערכות והיקונים) ייגמר ב-1.3.80.
2. פתוח בי"ם - בגלל טחנת בחשנה הצאלות הקציביות וביצוע ב-15.4.80.
3. גישה בטוחה לבי"ם כחלק מאוכלס - ייגמר ב-15.4.80.
טש"ש דחה חלק מהערות של קצין בטיחות.
מקום מבקש טש"ש חינוך הזמין חיבור מים מכח' המים.

ג"י פס' 14 (קבלן פ. אביב). ג"י נמצא בשלבי סיום, הדבר השמל, סוסקו אנגריה, ל-17.2.80.
בקבעה קבלה ראשונה. קיימת בעייה גישה לבן מהכביש הראשי.

ג"י פס' 17 (קבלן כחילה) - תאריך סיום מאי 1980. מבנה כמעט גמור. עבודות פתוח בהחלה.
קיימת בעייה קו ניקוז שכונתי שעובר דרך הגן ונמצא בשלבי בצוע. כמו-כן יש לפונדן סלעים
בטח באופן מבוזר, מנטיבות האלה מטש"ש המסיק עבודות בגן ב-12/79, עד שבעיות אנ"ל ימצאו
מסודרן. קיימת בעייה חיבור השמל (חדר טרנספורטטור ממנו צריך להגיע זרם לא מצויד ולא
יצויד בעתיר הקרוב). נציג העירייה ביקש להטט פתרון אלטרנטיבי להיבור השמל.

ג"פ פס' 13 (אשטרום - שלוני) - תאריך סיום יולי 1980. שלר של מבנה סוכן. המקוה לא צומח
בעיות לגמירת הגן לקראת שנה ליטודים חדשה.

ג"י פס' 16 (קבלן פ. אביב). - תאריך סיום 15.4.80. הגן נמצא בשלבי סיום, נשארו עבודות
פתוח, אין השמל יש להתדיר גישה בטוחה מהכביש לבן.

בי"ם פס' 39 (קבלן דיור לעולה) - ג"י פס' א' 39 - תאריך סיום 9.80.
לפס הודעתו של המקוה בי"ם 12 כיתוח וגן ושתוכנה נוכחית יכול להגמר בזמן (לקראת שנה
ליטודים הבא). כעה גורמים שנים יזכו חוסמת 6 כיתוח. הדבר עלול לשנות טוכדי גמר.
במטר לנציג עירייה סט הוכניות ארכקטורה וקונסטרוקציה בלבד. חובמת לשלוח יתר מוקים
אחר כן. מבלי לקבל סט מלא העירייה לא חוכל לערוך רשימה הערות כוללת (מכתבו של פ. אלנברג).

ג"י פס' 31 (אשטרום) מול בי"ם 34 - תאריך סיום 15.5.80. מבנה גמור. נמשכים עבודות פתוח
אך קצב אטי מדי (אשטרום). הסר מאסף ביוב אזורי (נמצא בשלבי בצוע -אשטרום). חיבור השמל
חלוי בהפעלת חדר טרנספורטטור אזורי. יש סיכוי טוב שתצורחשמל השלים עבודה.

ג"י פס' 12 (מול מרכז עליטה) - הגן מאוכלס. מקוה קיבל דוח גננות על לקויי טיב. דברים יסופלו
במסגרת שנה טיב.

ד ש פ: י. סורוקו

העתקים: מר ד. מלוכד - מנהל הטיבת הבנוי.
מר י. שיממן - מנהל המחלקה לחינוך.
משרד אוליניק.
ש. כהן - משרד הטכני.
מב' פ. ברודר - מטש"ש.



الجمهورية العراقية
وزارة التعليم والبحث العلمي

مدرسة:
تاريخ:

رقم الملف:
التاريخ:

.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ש. 19. שו"ת, אגרות, תשובות ופסקים

מחבר: הרב שמואל רבינוביץ - ח"י. תרע"א
מקום: ח. ס. הוצאת ספרים, תל אביב - ח. ס. תרע"א

מחיר: 2000.00

הוצאת ספרים
ח. ס. הוצאת ספרים
תל אביב - יפו

הוצאת ספרים, ח. ס. הוצאת ספרים, תל אביב - יפו

הוצאת ספרים, ח. ס. הוצאת ספרים, תל אביב - יפו

הוצאת ספרים, ח. ס. הוצאת ספרים, תל אביב - יפו

הוצאת ספרים, ח. ס. הוצאת ספרים, תל אביב - יפו

הוצאת ספרים, ח. ס. הוצאת ספרים, תל אביב - יפו

ש. וי. שור, אדריכלות ועיצוב פנים

המשרד: רח' השוטר 12, רמת-גן - טל. 734815
פ.ט.י: רח' יהודה הנשיא 32, בני-ברק - טל. 775701

תאריך: 15.6.1980

לכבוד
מר אשר אולניק - מנהל הפרויקט
רח' ז'בוטינסקי
תל-אביב.

א.נ.,

הנידון: בית-כנסת מרכזי בגילה - שלב ג' .

בחדש פברואר ש.ז., הודיעו לנו על קבלת פגישת חודש (מס' 4 - ב') עבור בית הכנסת הנ"ל. כן קיבלנו מהגב' אלינוער ברזקי, אנחנו וכל היועצים, הנחיות כתב לתכנון מחדש. אנחנו גמזאים בשלב גמר של תכניות העבודה, ללא אפשרות לקבל יעוץ מהיועצים וללא אפשרות הגשה לעיריית ירושלים, היות שלא הוצאה הזמנה רשמית לנ"ל, לא לנו ולא ליועצים.

בבקש טיפולך הדחוף בנידון. כ"כ נבקשך להסדיר את האפשרות של הגשת השכונן לנ"ל.

בתודה מראש,
ובכבוד רב,
י. שור, אדרי.

העתק:

משרד השיכון י-ם, הגב' א. ברזקי,
" " " , הגב' ס. ברזקי,
" " " , הגב' אברמסקו.

פ.ד.

ב' באדר תש"ם
19 במרץ 1980

לכבוד
מר יוסי כהן
בית 64 דירה 4
גילה
ירושלים

א.נ.ג.

הנדון: גן ילדים ברח' בן אליעזר 66-64
סימוכין: מכתבכם מתאריך 21.1.80 לראש העיר.

מספרם של גני הילדים ומיקומם נקבע בתיאום בין עיריית ירושלים, משהב"ס, ומשרד החינוך וזאת מתוך התחשבות בצרכים הכוללים של השכונה וסחוך מבט מקיף על הבינוי בשכונה.

אין לטעון שבגילה אין מקום טחוק לילדים, גן ילדים זה נבנה כדי למלא צורך ילדי השכונה עצמם בגני ילדים.

הוכנית בנין ערים עברה ואושרה כחוק ע"י כל הגורמים המאשרים בעירייה.

אין באמרתו כי כיום לשנות את התוכנית. אין בנמצא מגרש הליטי, מה גם שהגן נמצא בתהליך בנייה.

אנו משוכנעים שכאשר יופעל הגן יהא זה לטובת רצונם של התורים ובעיקר ילדי השכונה.

ב ב ר כ ה

שמריהו כהן
מנהל המחוז

העתיקים

ראש העיר, מר טדי קולק
גב' מירי ברוור
מר אולניק - מנהל מרוקט גילה
מר בני דביר - מנהל יח' מרוגרטות
גב' אלינוער בבזקי - אדריכלית המחוז

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

אשר אולניק חנוה להנדסה בע"מ ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב זיבוטינסקי 119 תל-אביב טל. 45 49 01 על. 119, JABOTINSKY ST. · TEL-AVIV
רחוב רוזמרין, בית 240, גילה, ירושלים טל. 02 717919 על. ROSMARIN ST., HOUSE 240, GILO, JERUSALEM

ירושלים, 21.1.80

או/100

לכבוד
עיריית ירושלים
המחלקה לשרותי הנדסה
לידי מר סורוקו
ירושלים

א.ג.א.

הנדון:- בן ילדים מס' 17 (הקבלן כחילה)
גילה.

מכתב:- מיום 7.1.80, חיק מס' 517

מאחר והסבת השומה לבי בסיורך בשטח לנושא המעקה
הנ"ל, בדקתי את הנושא והסתבר שהקבלן לא בצע את
המעקה לפי התכנית, ועל כן נדרש לסלקו מן השטח
ולתקין במקומו מעקה בטיחות מתאים לתכנית ולדרישות.

הקבלן פרק את המעקה ושרם הרכב טעקה מתאים תחתיו.

ב ב ר כ ה ,

אורי גרון

העתק:
א. ג. א. - משתב"ש
מירי ברור - ✓

ALBERT EINSTEIN, THE THEORY OF RELATIVITY, 1905

1905

1. Introduction

2. The Special Theory of Relativity

3. The General Theory of Relativity

4. Conclusion

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ד' בשבט תשמ"ב
22 בינואר 1980

מספר:

אל: מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים

הנדון: צרכי מערכת החינוך בגילה
מכתבו של מר י. לופו, יו"ר ועד השכונה

1. כללי

ניחוח המצב כפי שבא לביטוי במכתב שבסימוכין נעשה ע"י עובד מקצועי תושב גילה ומבוסס על תחזית אכלוס שנחקבל ממשרדנו ומחברות הכניה.

2. נחון שכנראה לא נלקח בחשבון הוא תוספת של כ-400 יח"ד בשלב ב' ששח בחכנון רס כרמי מתחם 04 באתר 01. בנייה זו אמנם לא תאוכלס בשנתיים הקרובות אבל יש לחשבה בצרכים מעבר לכך.

3. נחון נוסף שלא נלקח בחשבון זה מספר הילדים בחטיבת הביניים והחטיבה העליונה שנוסעים מהוץ לשכונה וימשיכו לנסוע עד אשר ייבנה בית הספר המקיף.

4. להלן הערות לפי סעיפי המכתב:

סעיף 1 - לא כל 2000 המשפחות גרות בשלבים א' וב' מיעוטם גם בשלב ג' (קוטג'ים של גד).

סעיף 2 - זו הערכה המבוססת על ההנחה שעד ספטמבר 1981 חסתיים הבנייה ויאוכלס אחר 01 הכולל 4000 יח"ד ועד ספטמבר 1983 יושלם גם שלב ד'.

להערכה זו יש להוסיף את העובדה שחברת שכון עובדים כבר השלימה יסודות ל-150 יח"ד, מ. ליפשיץ משלים יסודות ל-180 יח"ד ורמט משלימה יסודות ל-100 יח"ד באתר 03 כאשר טרם הוחל בחכנון בית הספר המיועד לשרת יח"ד אלה ונראה הגיוני שאכלוס חלק מהנ"ל יהיה בסוף שנה 1983.

סעיף 4 - לגבי צפיפות הילדים לכחם אני מוכן להעיד אישית.

סעיף 12 - בי"ס זה ממוקם באזור בנייה כידוע לך, ולא נראה לי שבשנת תשמ"א (ספטמבר 1980) יוכל לפעול. דהיינו בשנת הלימודים תשמ"א יעמדו לרשות מערכת החינוך 40 כחות (4+18+18). אני אישית בספק אם יוכל בי"ס זה לפעול בתשמ"ב אך זה פסימי מדי.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

-2-

- סעיף 13 - הפתרון שאני מציע זה להתחיל מיד מהקמת בית ספר לופנפלד (כיהות ז' - ט'), השטח פנוי, חכניות מוכנות למכרז ולעשות את כל המאמצים לפינוי בראשי משטח בי"ס קאסוטו כדי שתוך מספר חודשים נוכל להתחיל בביצוע בי"ס יובל גד.
- סעיף 14 - זהו בי"ס יובל גד בשלב ד' בין הבניינים של פ. בן גיאת. לדעת מנהל הפרויקט אי ביצוע בית הספר בשנת 1980 יקשה בנייתו בעתיד עקב מיקומו בין בנייני מגורים.
- סעיף 15 - ראה הערתי לסעיף 13.

לסיכום אני יכול לאמר בודאות כי:

- א. יש להתחיל מיד בביצוע בי"ס לופנפלד 1979 או 1980.
- ב. לפנות ולהתחיל - 1980 את בי"ס יובל גד (קאסוטו).
- ג. להכנין ב-1980 ולהתחיל ב-1981 בי"ס יובל גד שלב ד'.
- ד. להכנין ולבצע ב-1981 בי"ס נוסף ב-ה'3 (יובל גד).

ב ב ר כ ה

בני דביר
מנהל יחידת פרוגרמות

העתיק: מר א. חייר - מנהל המחלקה הטכנית
גב' ר. זמיר - ס/מנהל מחוז ירושלים
גב' ס. טוור - ע/ר למוס"צ

CONFIDENTIAL

TOP SECRET

SECRET

-5-

1. The first part of the document is devoted to a general survey of the situation in the country. It is based on the reports of the various departments and agencies. The main points are: (a) the economic situation, (b) the political situation, (c) the social situation, and (d) the cultural situation.

- 2. The second part of the document is devoted to a detailed analysis of the economic situation. It is based on the reports of the various departments and agencies. The main points are: (a) the production of goods, (b) the distribution of goods, (c) the consumption of goods, and (d) the foreign trade.
- 3. The third part of the document is devoted to a detailed analysis of the political situation. It is based on the reports of the various departments and agencies. The main points are: (a) the government, (b) the opposition, (c) the press, and (d) the public opinion.
- 4. The fourth part of the document is devoted to a detailed analysis of the social situation. It is based on the reports of the various departments and agencies. The main points are: (a) the population, (b) the education, (c) the health, and (d) the housing.
- 5. The fifth part of the document is devoted to a detailed analysis of the cultural situation. It is based on the reports of the various departments and agencies. The main points are: (a) the arts, (b) the sciences, (c) the literature, and (d) the sports.

SECRET

CONFIDENTIAL

1350 - 80 = 1270 (1)

98	- (100) 240
193	11 219-231
452	11 301-310
70	(100) 258
69	(100) 218
200	
69	100 216
93	(30) 237
<u>64</u>	236
1244	210
<u>1308</u>	
112	

$1308 + 441 - 3 = 1747$
 $100 + 415 - 422 = 93$
 (2)

$1000 - 100 = 900$
 (3)

$1000 - 100 = 900$
 (4)

1000

שם

מס.ת.ז.

שם

מס.ת.ז.

אנא מלא את הטופס הבא:

שם

מס.ת.ז.

אנא מלא את הטופס הבא:

ת.ד.מ.מ.:

.....
.....
.....

מסלול תשלום מכלל המסוימים

יש למלא את הטופס הבא על ידי כל מי שיש לו חובות מסוימים למסלול תשלום מכלל המסוימים. המסלול יאסוף את המסוימים וישלם אותם למסלול תשלום מכלל המסוימים. המסלול יאסוף את המסוימים וישלם אותם למסלול תשלום מכלל המסוימים.

אנא מלא את הטופס הבא:

- שם המלווה,
- שם המלווה,
- שם המלווה,
- שם המלווה,

מס.ת.ז.

מסלול תשלום מכלל המסוימים

מכלל המסוימים
מסלול תשלום מכלל המסוימים

$4 \times 12 = 48$
 24
 24
 18

18
 18
 4
 12
 52
 24
 12

$6 + 3 = 9$

12

24
 24

60
 80
 12
 24
 36

52

18
 4
 18
 12
 2

69
 200
 $218-69$
 $238-70$

18
 31
 90
 54
 162
 144
 310
 193
 $240-98$
 452

1 - 10

18
4
18
12

1e
2/c
1
3

76 + 1000

52
24
12
88

711
2000
1000

18

(1981) 1 2 3 ✓

106

1000
1000

24
130

1000

מס

מס.מס

מס

מס.מס

רשמי מכתב אודות אולם הכנסה:


מס

מס.מס

רשמי מכתב אודות הכנסה:

רשמי מכתב:

11224



מסלול הכנסה אולם הכנסה:

אולם הכנסה אולם הכנסה אולם הכנסה

רשמי מכתב אודות הכנסה אולם הכנסה אולם הכנסה אולם הכנסה אולם הכנסה אולם הכנסה אולם הכנסה אולם הכנסה אולם הכנסה אולם הכנסה

רשמי מכתב אולם:

אולם הכנסה אולם

אולם הכנסה אולם

אולם הכנסה אולם

אולם הכנסה אולם

אולם הכנסה

מסלול הכנסה אולם הכנסה

אולם הכנסה אולם הכנסה
אולם הכנסה אולם הכנסה

אחת מן קו גולני
11.1
תאריך 6.1.80

מ"כ י
קובץ תש"ב
סמ"ב

אל: מר אשר וינר - מנכ"ל משרד השיכון
מר אליעזר שמואלי - מנכ"ל משרד החינוך

הנדון: בנייתם של 3 בתי ספר באופן מידי בשכונת גילה ירושלים

1. בגילה מתגוררות כיום כ- 2000 משפחות, כולן ברובע א' וב', של גילה. בחלק זה עדיין כ- 200 יחידות דיר, לפחות, שבניתן הושלמה ועומדות בפני איכלוס.
2. ברובעים ג' ד' נבנות כיום כ- 3,600 דירות (כ- 1350 מתוכם תושלמנה לקראת שנת הלימודים תשמ"א).
350 דירות נוספות תושלמנה במהלך תשמ"א כ- 400 תושלמנה לקראת שנת הלימודים תשמ"ב וכ- 1600 דירות נוספות תושלמנה בעוד שנתיים, לערך.
3. כאומדן מינימום ניתן לצפות כי עד ראשית שנת הלימודים הבאה, תשטרפנה לגילה 1000 משפחות; כ- 200 למילוי ברובע א' ב' דכ- 800 ברובע ג' ד'.
4. 2000 המשפחות המתגוררות כיום בגילה מאכלסות 31 כיתות לימוד; בחינוך היסודי בשכונה:
17 כיתות בגילה א' ממלכתי
5 " " " ממ"ד
9 כיתות בגילה ב', במתכונת הקיימת (צריך ואשקובית).
כיתות אלו מאוכלסות בצפיפות ממוצעת של 40 ילדים בכיתה.
5. עם העברתן של כיתות ב"ס גילה ב' לבנין המועד לו (ברובע ג') ניתן יהיה לפצל את כיתות ב' ו- ד' ומספר הכיתות, בשנת הלימודים הנרבחית יעלה ל - 33.
6. בחילת שנה"ל תשמ"א תתוספה לבתי הספר בשכונה 7 כיתות א' הילדים ו. לו לומדים כיום בגני החובה של גילה, (6 במספר, וכתה אחת נוספת מחוץ לשכונה. לעומת זאת חתפנה כתה ח', ולפיכך תתוספנה נטר, 6 כיתות לבי"ס, מתוך האוכלוסיה המתגוררת כיום בשכונה.
7. מספר הכיתות שיידרש לגילה, בראשית תשמ"א, ללא תוספת אוכלוסיה חיצונית יגיע, איפא - 39, כדלקמן: $39 = 1 + 7 = 39$.
8. תוספת של 1000 משפחות חדשות לשכונה עד ראשית תשמ"א, תגדיל את מספר הכיתות הנדרש ב- 50%, היינו: מ- 39 כיתות כדי 57 כיתות.
9. מספר הכיתות שיידרש לגילה, בחינוך היסודי בראשית תשמ"ב ינוע סביב 70 לפחות, שכן עד אז יוכפל מספר המשפחות שתגורנה בגילה.
10. מספר כיתות היום הקיים בחינוך היסודי בשכונה עתיד להגיע ל- 40, עם השלמת בנייתן של ביה"ס גילה ב' כדלקמן:
גילה א' 18 כיתות יום + 4 אשקובית
גילה ג' 18 כיתות יום.

80 180

31

21 (18)
49

52

Handwritten notes or scribbles in the top right corner.

Section 1 - Introduction

Section 2 - Main Body

1. This section discusses the importance of maintaining accurate records.
2. It outlines the various methods used to collect and analyze data.
3. The results of the study are presented in the following tables.
4. A detailed analysis of the data is provided in the next section.
5. The conclusions drawn from the study are summarized below.
6. Further research is suggested in the final section.
7. The author expresses their gratitude to the funding agency.
8. A list of references is provided at the end of the document.
9. The author's contact information is listed below.
10. The document is signed and dated.

Page 1 of 1

ועד שכונת גילה

מבוא בשמת 5

גילה, ירושלים

תאריך _____

אוריאל

11. כרגע נמצא בבנייה לבד מבי"ס גילה ב' בי"ס נוסף בן 12 כיתות (בתכנונו של האדריכל הרובי) ברובע 3.

12. השלמתו של בי"ס זה, לקראת שנה"ל תשמ"א קריטית, שכן מול מצוי (מקורה) בן 40 כיתות, בלעדיו, עתידות לפעול בבתי"ס היסודיים 53 כיתות.

13. על מנת לעמוד בצרכי השכונה בשעת הלימודים תשמ"ב, יש להתחיל, ללא דיחוי, בבניית בי"ס יסודי נוסף, בן 18 כיתות יום, כיון שלא נותר זמן רב, עד אחר מועד (במונחים של משך הבנייה המקובל בישראל).

14. כיון שבשנת תשמ"ג עתיד החינוך היסודי בגילה להקיף 90 כיתות א' עד ח', אין די בנזכר בטעיפים 12 ו 13 לעיל. היינו, יש לדאוג לתקציב הקמתו של בי"ס יסודי חמישי בן 18 כיתות יום, כבר בשנת הכספים 1980.

15. להילופין, יש להתחיל מיד בבנייתו של חטיבת ביניים, שחקלוט את תלמידי ז' עד ט'. העברתם של תלמידי ז' ו ח' מחטיבת היסוד לחטיבת הביניים משנת הלימודים תשמ"ג, עשויה להקטין את מספר הכיתות שיידרש אז, בחטיבת היסוד מ- 90 ל- 72 כיתות, מתוכן בדרגים ז' ו ח'.

הגבר מבקשים ממשרד השיכון והחינוך, לזרז הקמתו המידית של ביה"ס בן 12 הכיתות הנמצא בתחילת בניה ברובע 3 (אדריכל הרובי). ובמקביל לתקציב מעשירי הקמתם של 2 בתי ספר נוספים וחטיבת ביניים, ולהתחיל את בנייתם באופן מיידי על מנת שיוכלו לטפח את ארצי האיכלוס של השכונה בשנתיים הקרובות.

ניסיון העבר מלמדנו, שהבחונים המדוייקים אצל המוסדות הינם שגרתיים ובאופן רצוף מאז הקמתה של השכונה, קטן מספר הכיתות במסגרת החינוך לעומת כמות המשפחות המאכלסת. הפתרונות לאחר מעשה הן בבחינת טלאים לכיבוי שריפות, כגון צריפים אשקוביות, זירות מגורים (מצב כיום) וכד'. בנוסף ברור לכל, שמשך הבניה המעשי מפגד באופן עקבי לעומת חוזיות גמר בניה המחוכנת (האשקובית הושלמה שנה לאחר תחזית, (ביה"ס גילה ב' ירשלם שנה לאחר התחזית).

אי לכך אם לא יוחל עכשיו בבניית בתי הספר בשכונה, אנו צופים להחמרת מערכת החינוך ועמה מערכת החיים הסדירה בשכונת גילה בשנתיים הקרובות.

ב כ ר כ ה ,

יעקב לופר

יו"ר ועד השכונה

העזק: מר טדי קולק - ראש עיריית ירושלים
מר אלעד פלד - מ"מ ראש עיריית ירושלים
גב' חמר אשל - סגן ראש העיר לעיניני חינוך
מר שמריהו כהן - מנהל מחוז משרד השיכון
מר ברגסון - מנהל מחוז משרד החינוך
מר שיפטן - מנהל המחלקה לחינוך עיריית ירושלים

MEMORANDUM

TO : [Illegible]

[Handwritten note]

[Illegible typed text]

[Illegible typed text]

[Illegible typed text]

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

Handwritten signature and initials.

תאריך: ד' בשבט תשמ"ג
22 בינואר 1980

מספר:

אלו: סר ש. כהן - סנהל מחוז ירושלים

הנרון: צרכי מערכת החינוך בגילה
מכתבו של מר י. לופו, יו"ר ועד השכונה

1. כללי

ניחוח המצב כפי שבא לביטוי במכתב שבסימוכין בעשה ע"י עובר מקצועי
חושב גילה ומבוסס על תחזיה אכלוס שנתקבל ממשרדנו ומתכונת הבניה.

2. נחון שכנראה לא נלקח בחשבון הוא תוספת של כ-400 יח"ד בשלב ב' שש
בהכנון רמ כרמי מחתם 04 באחר 01. בנייה זו אמנם לא תאוכלס בשנתיים
תקרובת אבל יש לחשבה בצרכים מעבר לכך.

3. נחון נוסף שלא נלקח בחשבון זה מספר הילדים בתשיבת הביניים והחטיבה
העליונה שנוסעים מחוץ לשכונה וימשיכו לנסוע עד אשר ייבנה בית הספר
המקיף.

4. להלן הערות למי סעיפי המכתב:

סעיף 1 - לא כל 2000 המשפחות גרות בשלבים א' וב' מיעוטם גם בשלב ג'
(קוטג'ים של גר).

סעיף 2 - זו הערכה המבוססת על ההנחה שער ספטמבר 1981 תחתיים הבנייה
ויאוכלס אחר 01 הכולל 4000 יח"ד ועד ספטמבר 1983 יושלם
גם שלב ד'.

להערכה זו יש להוסיף את העובדה שהגברת שכון עובדים כבר
השלימה יסודות ל-150 יח"ד, ס. ליגשיץ משלים יסודות ל-180
יח"ד ורמט משלימה יסודות ל-100 יח"ד באחר 03 כאשר טרם הוחל
בהכנון בית הספר המיועד לשרת יח"ד אלה ונראה הגיוני שאכלוס
חלק מהנ"ל יהיה בסוף שנת 1983.

סעיף 4 - לגבי צפיפות הילדים לכתם אני מוכן להעיד אישית.

סעיף 12 - כיו"ס זה ממוקם באזור בנייה כירוע לך, ולא נראה לי שבשנת
תשמ"א (ספטמבר 1980) יוכל לפעול. דחיינו בשנה הלימודים
תשמ"א יעמדו לרשות מערכת החינוך 40 כחות (4+18+18).
אני אישית בטסק אם יוכל כיו"ס זה לפעול בתשמ"ב אך זה פסימי
מיד.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

-2-

- סעיף 13 - הפתרון שאני מציע זה להתחיל מיד בחקמה בית ספר לופנפלד (כיתה ז'-ט'), השטח סגור, תכנון מוכנה למכרז ולעשות את כל המאמצים לפינוי בראשי משטח בי"ס קאסוטו כדי שתוך מספר חודשים נוכל להתחיל בכיצוע בי"ס יובל גד.
- סעיף 14 - זהו בי"ס יובל גד בשלב ד' בין הבניינים של פ. בן גיאח. לרעה מנהל הפרויקט אי ביצוע בית הספר בשנת 1980 יקשה בנייתו בעתיד עקב מיקומו בין בנייני מגורים.
- סעיף 15 - ראה הערה לסעיף 13.

לסיכום אני יכול לאשר כוראות כיו:

- א. יש להתחיל מיד בכיצוע בי"ס לופנפלד 1979 או 1980.
- ב. לפנות ולהתחיל - 1980 את בי"ס יובל גד (קאסוטו).
- ג. להכניז ב-1980 ולהתחיל ב-1981 בי"ס יובל גד שלב ד'.
- ד. להכניז ולבצע ב-1981 בי"ס נוסף ב-ה'7 (יובל גד).

ב ב ר כ ה


בני דביר
מנהל יחידה פרוגרסות

חקמו: פר א. תייר - מנהל המחלקה הטכניקה
גב' ר. זמיר - מ/מנהל מחוז ירושלים
גב' ס. טוור - ע/ר למוס"צ

אשר אולניק חנוה להנדסה בע"מ ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב ז'בוטינסקי 119 תל-אביב . טל. 45 49 01
רחוב רוזמרין, בית 240, גילה, ירושלים . טל. 02 7179 19

S. L.

ירושלים, 21.1.80
ג' בטבת תשמ"ם
או/107

לכבוד
עיריית ירושלים
המחלקה לשרותי הנדסה
לידי מר סורוקו
ירושלים.

, .נ.א

הנדון: - בית-ספר קאסוטו - גילה ב'.

נחבקשנו על ידי מר ש. כהן, מנהל מחוז ירושלים
של משרד הבינוי והשיכון, להשיב למכתבך מיום 26.12.79
בקשר לשטח בית הספר הנ"ל.

אנו מטפלים בפינוי השטח החפוס, וכמו כן - עד
כמה שידוע לנו - אנו גם נטפל בבניין בית הספר, ולא
עיריית ירושלים.

בכבוד רב,



א. אולניק

העחק:
מירי ברוור - משהב"ש ✓

FATHER OF THE NATION
THE GREAT
THE GREAT

THE GREAT
THE GREAT
THE GREAT

THE GREAT

THE GREAT

THE GREAT
THE GREAT
THE GREAT

THE GREAT

מדינת ישראל

מכתב (2) ס.
משרד השיכון והבינוי
מחוז ירושלים - בן יהודה

משרד השיכון והתכנון
האגף לפיתוח מערכת השיכון
המחלקה לבינוי

27.6.79

מכתב

לכבוד

משרד השיכון והבינוי

מחוז ירושלים - בן יהודה

י-ם

שלום רב

הנדון: אישור הכנייה גן ילדים 2 כחות (גן שילוני) (257 מ"ר)

בחשבה על מכתבך מיום 27.5.79 מוחזרת התכנית הנ"ל כשהיא מאושרת על ידינו.

מספר האישור 373 מיום 18.6.79.

אין לראות באישור זה כל התחייבות תקציבית.

אישור זה מבטל את אישורן של 373 א - 24-12-78

בכבוד רב

נינו אלס
ה' ארדרייך
אדריכל יועץ

מצורפת התכנית המאושרת

העתק: מר ר' ירון - מנהל המח' למיפוי



Faint, illegible text in the upper left section of the page.

A large block of very faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

ב' בשבט תש"ם
20 בינואר 1980

סיכום דיון בנושא: תחנת מטרה ומד"א בגילה

השתתפו: מר י. סיון, א. ברזקי, מ. ברזקי

1. הועלה שלוש אלטרנטיבות שיועברו למטרת ישראל למיקום תחנת מטרה בגילה ע"ס הדרישות שהועברו למחוז.
 - א. ליד השב"כ (שטה תחנת הדלק לשעבר) שטה המועדף ע"י האדריכל והמחוז. מחייבת שינוי ח.ב.ע.
 - ב. אחרי שטה בתכנון אדריכל כרמי (שטה שרון לשעבר) לכוון כביש פת.
 - ג. בשטה המיועד לשרותים כלל עירוניים מתחת לבריכות המים.שטה בעל עדיפות גבוהה ביותר מבחינת האדריכל והמחוז.
2. שלוש אלטרנטיבות אלו הועברו בצרוף מפות למטרה יחד עם ההצעות למקום התחנה כסאר השכונות.
3. מד"א
מוצע ע"י המרפאה (מול המרכז המסחרי). מפה תועבר למד"א ישראל.

ר ש מ ה:
מירי ברזקי
ע/ר למוס"צ

העוקב: למשתתפים
מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים
מר ב. דביר - מנהל יחידה פרוגרמות
מר א. אולניק - מנהל פרויקט גילה

כ"ז בטבת תש"ם
16 בינואר 1980

לכבוד
מר א. אולניק
מנהל פרויקט
גילה

א, נ,

הנדון: פרוטוקול סיור ביקורה קבלה בי"ס שלב ג' - גילה

להלן הנחיה הפחוז המתואמת עם המסונה על מוס"צ באגף הפרוגרמות:

סעיף 1 - המורכה תסלל תוך זמן קצר. החומר במכרז.

סעיף 2 - בניצוע.

סעיף 3 - בניצוע.

סעיף 4 - יש לחזק הגדר עם גמר עבודות הפיחות.

סעיף 5 - לבצע כחמאם להכנון.

סעיף 6 - משהב"ש לא יבצע.

סעיף 7 - להחליף הזכוכיה בלכוכיה משוריינת.

סעיף 8 - לבצע.

סעיף 9 - לבצע.

סעיף 10 - לבצע.

סעיף 11 - לא לבצע. הנושא הוא גם עם עיריה ירושלים.

סעיף 12 - לא לבצע. הנושא הוא גם עם עיריה ירושלים.

סעיף 13 - לבצע.

סעיף 14 - לבצע.

כ ב ר כ ה

כני דביר

מנהל יחידת פרוגרמות

העמק: מר ש. כהן - מנהל מחוז י-ם
גב' ס. כרוור - ע/ר למוס"צ
מר י. לופו - יו"ר ועד השכונה
מר פ. שמעוני - מש"ס גילה

1944
1945
1946
1947
1948

1949: [Illegible Title]

[Illegible text]

Page 1 - [Illegible]

Page 2 - [Illegible]

Page 3 - [Illegible]

Page 4 - [Illegible]

Page 5 - [Illegible]

Page 6 - [Illegible]

Page 7 - [Illegible]

Page 8 - [Illegible]

Page 9 - [Illegible]

Page 10 - [Illegible]

Page 11 - [Illegible]

Page 12 - [Illegible]

Page 13 - [Illegible]

Page 14 - [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ה' בטבת תש"ס
25 בדצמבר 1979

מספר:

פינוי דברים מיום 23.12.79

הסתמון: ציפור, א. אולניק, גדי, ב. דביר, צ. אפרתי, א. ברזקי, פ. אלמכר
פ. ברזקי ✓

מר ציפור מסר את הפרוגרמה כולקסון:

93	יה"ר	3	חדרים
9	יה"ר	4	חדרים
9	יה"ר	5	חדרים
110	יה"ר		

הסתמון מתבקש למסור חוך ימים אחדים את מירוט שטחי הדירות בפרויקט.
שטחי הדירות לא יחרגו מהשטחים הסותרים בהנחית 1.7 של מסר הבינוי.

דירות נכיס - הסתמון מתבקש לאחר 3-4 דירות נכיס בנות 3 חדרים או 4 חדרים
עם גישת ישירה סחחנית.

חננויות בקומת קרקע

6 חננויות של 30 מ"ר בקצה הבית צמוד לגינה ציבורית. בכל אחד מהקצוות
של הבית.

פירי ברזור - ל-850 יה"ר דרושה כ-5 חננויות. להשאיר 3 חננויות בכל קצה.

הוכסו

1. חיבננה 3 חננויות בטטה של 30 מ"ר כלא בכל אחד מהקצוות הבית. (סג" 6 א, ר"ל)
2. הסתמון ימסור חוך ימים אחדים את מירוט שטחי הדירות במסירה ותהיה חריגת
בשטחי הדירות יערך ריון נוסף בענין.
3. הסתמון מתבקש לאחר 3-4 דירות לנכיס עם גישת ישירה סחחנית. גודל הדירה
- 4 חדרים או 3 חדרים.

ר ש ס ה

צביה אפרתי
ע/בינוי ערים

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ד' בטבת תש"ס
24 בדצמבר 1979

מספר:

התא. 100

ניכוס זכויות מייצגה שהתקיימה ב-23/12/79

הסתמרו עמיטר, אולניק, גדי, בני דביר, ז. אפרתי, א. ברזקי, ס. ברזר
פ. אלמבר, ע. אורון, אלטרד (חברת דמט)

הפרויקט כולל 180 יח"ד, מתוכם 160 יחידות 3 חדרים ו-20 יחידות 5 חדרים.
הטורגומה עונה על הצרכים אך שטחי דירות 3 חדרים חריגים.

המחנן הציג חכמה ממוקנות בהן גיסו להקטין שטחי דירות.

40% - 2 תקורות הרי-שונות - שטח דירות 3 חדרים 80 מ"ר.

60% - 3 תקורות העליונות - שטח דירות 3 חדרים 73 מ"ר.

שטח הדירות לא כולל שטח המרפסת המשותפת.

בני דביר - לא נוכל לאשר דירות 3 חדרים בשטח של 80 מ"ר (אשר ביהוד עם שטח
המרפסת יהיה 82 מ"ר לפחות).

עמיטר - כל שינוי פחייב חכנון מחדש של הכיתה כולו ולא לבנות את הסיפור הזה.

גדי - טעין לתכנון בקומה קרקע דירות 4 חדרים ו-2 חדרים.

אליגור - מציעה להכיא את הפרויקט להחלטה בהנהלת המחוז. המחנן אינו
יכול לצמצם שטחי דירות מבלי לשנות את כל הבית.

החלטות

1. החברה והמחנן ישקלו טוב את הקניין נוכח הנהיית פטרד הכינוי לבני שטחי
דירות. 40% מהדירות חריגות בשטח.

2. המחנן מתבקש לאתר בקומה קרקע 3 חנויות.

ר ש מ ה

זביה אפרתי
ע/בינוי ערים

והבינורי

ז' כסכת תש"ס
27 בדצמבר 1979

לכבוד
מר א. לויין
מנהל יחידת מימון וחקצינים
משחב"ש



א, נ,

הנדון: שיפוצים להכשרת דירות לגני ילדים

משרדנו הכיר בצורך הדחוי. בשינוי מספר דירות לגני ילדים בגילה עקב
תיגור בביצוע גניס.


לאור זאת יש צורך בהקציב של כ-90,000 ל"י לביצוע השינויים הנ"ל.

רצ"ב סכתבו של מר ארדון שרוס המבטל את האפשרות בניצול הקציב בנייה.

אודה לך על קביעתך את הסעיף המתאים.

אנא סיפולך הדחוף.

ב ב ר כ ה



כני דביר

מנהל יחידת פרוגרמות

העחק: מר ש. כהן - מנהל מחוז ירושלים
מר א. שרוס - מסונח על פיקוח הקציב
גכ' מ. ברור - ע/ר למס"צ ✓

CONFIDENTIAL
NO. 123456

SECRET
NO. 123456
CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 12/15/00 BY 123456
EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE
THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED
DATE 12/15/00 BY 123456
EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

CONFIDENTIAL
NO. 123456

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
NO. 123456

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ג' בטבת ה'ש"ס
23 בדצמבר 1979

מספר:

ישיבת צוות מה-21 בדצמבר 1979

השתתפו: ב. דביר, צ. אפרתי, מ. ברור

1. מגדל + המרכז הזוחל

יש להכין פרוגרמה למגורים ולמוס"צ על 6.800 מ"ר (5000 מגדל + 1800 מרכז הזוחל).

2. קריה מלאכי - אצטדיון

עפ"י הודעת הסועצה אין צורך בביה"ס. המועצה תשלח מכתב למשהב"ש, לאחר טכ"ן יכתוב מכתב למנהל שאנו טכנונים השטה למגורים.

3. צביה חכין פרוגרמה לשני השטחים המיועדים לכך. (לבר מהשטח המיועד לרזרבה למוס"צ עירוניים וכלל עירוניים).

3. חנויות

בעיה התשלום לחנויות (בתים 204-205 גילה) חרוץ בפגישה עם בן אלול ביום ב' הקרוב.

4. הוקרא נוהל נסיעות ביום ה' לג"א.

5. הוקרא מכתב צ. אורן על שטחי הירות פרוגרמה 1980.

6. הוקרא סכום ישיבה אצל המנכ"ל פרוגרמה בצוע 1980.

7. פינוי אשקוביח - תשובה לשיפטן תנחן רק לאחר הישיבה עם שרגא בירן שיינברג לקמיניץ.

8. המלצות קרקע לקריות דתיות - רק לאחר תכנון שהופקד. רמות, גבעת שאול חלפיות (רק מצרכי צבור).

ר ש מ ה
מירי ברור
ע/ר למוס"צ

העמק: גב' נ. הרשקוביץ

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: פ"ב בכסלו תש"מ
11 בדצמבר 1979

מספר:

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בני יהודה 23
14-12-1979
דואר נכנס

מ.י.ק. 10.7
מ.י.ק. 10.7
7

לכבוד
שר דובק
יו"ר ועדה מקומית
ירושלים

א.ג.

הנדון: בקשה לדיון חוזר ת.ג. 78/312 גילה

בדיון שהתקיים בוועדה המקומית בתאריך 12.9.79 הוחלט לדחות את הבקשה לתוספת 2 הנויות בקומת קרקע של בנין מס' 419 בגילה.

הבקשה נדחתה מאחר והועדה קבעה שסמיכות הנויות אלו למרכז המסחרי העמירי אינו מצדיק את קיומן.

מבקש להביא נושא זה לדיון חוזר וזאת מהטעמים הבאים:

א. טירת החנויות האלו הינה לשרות שכונתי לצריכה יום - יומית בלבד, - אין שירותים אלו צריכים במרכז מסחרי שהנו כלל שכונתי.

ב. הנויות אלו עמידות לשרת את כל שלב ג-ד - כ 400 יח"ד שאיכלוסן צפוי הוך השנה הקרובה, ברור שהמרכז המסחרי לא יוכל להתחיל לפעול במרץ זמן זה.

ג. לבזמן של ההכנות קיימת הפרדה מוחלטת בין שירותי החנויות והכניסה אליהן, ובין חדירות והכניסה אליהן.

ד. אנו מתחייבים בו זמנית לקבל את הסכמה מחלקת התברואה לגבי כל הפרטים הנובעים לנושא.

אודה לך מאס אוכל לזרז את הדיון מאחר ועלינו להתחיל העבודות, ואין אפשרות להתחיל מבצע ללא החלטה סופית, מאחר והחנויות נמצאות בממלס הקרקע.

מכבוד
א. בירוקי
אדריכל מחוז
ס/מנהל המחלקה הטכנית

התקין חב' אלרס
ס. הרשמן
בני דביר
א. אולניק

תאריך 12.12.79

טופס שנוי חרזה / הזמנה

מס. השינוי	6
------------	---

40/62805/76
מספר החרזה / הזמנה

אל: הגזברות (2)

מאת: אגף הכנון והנדסה

א. פרטי זהו:

ירושלים	גילה	פ. אביב	מס. מחוז	מס. ישוב	מס. אוביקט	מס. בית
שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מספר זהו			

השנוי בל"י	ה ח ר ז ה	
	המתוקן בל"י	הקיים בל"י
212,750.-	4,404,900	4,192,150
	4,584,900	4,372,150

ב. הרכב החרזה/הזמנה הקיים:

גן ילדים 3 כיתות + פתוח

ג. מהות השינוי:

הגדלה בגין חוספה יוקר למעשה עד 8.8.79 לעבודות פתוח - אגף גמר העבודה

תאריך	13
מס. חרזה	13124
מס. חרזה	25.12.79
מס. חרזה	90540
מס. חרזה	20.12.78

ד. הרכב החרזה/הזמנה החדש: גן ילדים 1,688,100

עבודות פתוח מראש 20,200 x 1,16

עבודות פתוח חצר - 1,638,496 x 1.64

ה. שינויים ביעוד:

00002,00

24.XII.79

שם היעוד הקודם	שם היעוד החדש	מספר הכבנה	מס. יחידות	השינוי בסעיף ההקציבי		הסכום בל"י
				מס. סעיף קודם	מס. סעיף חדש	

ה ע ת ק י מ

ו. שינוי בתנאי השלום:

- אגף האכלוס
- אגף להכנון והנדסה
- אגף פרוגרמות
- ההכחוז הנוגע ירושלים
- הכחוז הכבצע... מ. אביב
- ר"ה כורש ירושלים
- ה"ה למחקר כלכלי חברתי- וסטטיסטי

חיק החרזה

ה ע ר ו ת	מ ס פ י מ		שנוי הנאי השלום לפי שלבים	קוד השלב
	קיים	ישונה:		

הערות וחתימה עורך השינוי:

חתימת חשב המשרד

חתימה

חתימת סגן הכנהל הכללי

חתימת כנהל האגף להכנון והנדסה

כא/נכ

התוצר

מאופי בזה כי כיום
המספר של 453

1979 24'צ' 453

הוצג לפני העומד
הוא חיל בו

הגני האשר זה הפרטם הבאים:

1) המספר המסודר בויגל
2) המספר המסודר בויגל / כנס / כנס / כנס / כנס

3) המספר המסודר בויגל
4) המספר המסודר בויגל

הוא המספר המסודר בויגל
הוא המספר המסודר בויגל

840108-11

600.6

תאריך 3.12.79

טופס שנוי חוזה / הזמנה

מס. השינוי	6
------------	---

מספר החוזה / הזמנה	40/62806/76
--------------------	-------------

אל: הגזברות (2)

מאת: אגף. לתכנון והנדסה

א. פרטי זהוי:

ירושלים	גילח	מ. אביב	מס. מחוז	מס. ישוב	מס. אוביקט	מס. בית
שם המחוז	שם המקום	שם הקבלן	מספר	מספר	מספר	מספר

ב. הרכב החוזה/הזמנה הקיים:

בניה גן ילדים מספר 5

ג. מהות השינוי:

השנוי בל"י	ה ח ו ז ה	
	המחוקק בל"י	הקיים בל"י
288,481	3,455,281	3,166,800

עבודות נוספות לפי רשימת כמויות מאושרת על ידי תנחוץ.

האוצר	מספר	תאריך	מחיר	הערות
11.XII.79	89709			

הרכב החוזה/הזמנה החדש:

הערות:

הכמויות החדשות 89709

המחירים סופיים ועליהם לא לחול כל התייקרות.

אין האבחת מקומת ביצוע בגין הגדלה הנוכחית.

ה. שינויים ביעוד:

שם היעוד הקודם	שם היעוד החדש	כספר הכבנה	כס. יחידות	השינוי בסעיף התקציבי	
				כס. סעיף חדש	כס. סעיף קודם

חתימת הקבלן מרדכי אביב מפעל בניה בע"מ

העתיקים

ד. שינוי בתנאי התשלום:

- אגף האכלוס
- אגף לתכנון והנדסה
- אגף פרוגרמות
- המחוז הנוגע ירושלים
- המחוז הכבצע
- ה"ה לכתקר כלכלי חברתי-וסטטיסטי
- תיק חוזה.

ה ע ר ו ת	כ ס פ י ם		קוד השלב	שנוי תנאי השלום לפי שלבים
	קיים	שונה ל:		

התשלום לפי התקדמות העבודה באישור משרד הפיקוח ובחורדה לזכות קרן של פועלי בנין.

הערות וחתימה עורך השינוי:

אסמכתא: מכתב ס/מנהל מחלקה הטכנית של המחוז מ-30.11.79

ומכתב משרד הפיקוח מ-19.11.79.

חתימה

חתימה סגן הכנהל הכללי

חתימה חשב המשרד

חתימה כנהל האגף לתכנון והנדסה

חכנ-77-45 (10.000)9

1979 אדר ב' 1

מאושר כזה כי ידוע _____
המקור של המסמך זה וכי מכוח המס אשר הוא בועל בו

הוא _____ 1292. /
ס' הנני מאשר את הפרטים הבאים:

1) המסמך המיוזם בוועל בבול דבק / מוטבע / סימן _____

2) המסמך המיוזם בוועל ע"י הארץ _____

3) המסמך המיוזם המופיע לצד הבול הוא _____

4) המסמך המיוזם בוועל ע"י _____
באריך _____
5) המסמך המיוזם המופיע לצד הבול או בפנים הבול, _____
הוא _____
באריך _____
החתימה _____

11-2010243

מדינת ישראל

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: י"ט בכסלו תש"ט
9 בדצמבר 1979

מספר:

מס' 16/12
מאיו, ק"ר

לכבוד
מר א. לוי
מנהל החקציבים

א, נ,

הנרון: השתתפותנו כשיפוצים להכשרת דירות לגני ילדים
בגילה

רצ"כ התחככות בנרון.

אבקשן לטפל בקביעת הסעיף החקציבי לאורו בגזכרות
לשם הוצאת ההזמנה.

ב ב ר כ מ

בני דכיר

מנהל יחידת פרוגרמות

העחק: מר ש. כהן
מר א. טרוס

תאריך 10/4/79	מסמך לקבלת בנין / כביש	עיריית ירושלים המחלקה לשירותי הנדסה
------------------	---------------------------	--

מס' תיק המחלקה	פירוט העבודה	שם הקבלן
תאריך סיום העבודה	תאריך התחלת העבודה	

שמות הנוכחים:

ב"כ מנהל המחלקה _____
 ב"כ מנכ"ל העירייה _____
 ב"כ הרשות המזמינה _____
 ב"כ המחלקה המקבלת לאחזקה _____

אנו החתומים מטה ביקרנו ובדקנו את העבודה הנ"ל ומצאנו שהקבלן סיים את העבודה לפי התכניות, בהתאם לתנאי חוזה קבלנים ובטיב הדרוש, פרט לחיקונים המפורטים להלן שעליו להשלים

טד

מס' תיק	המקום	תיאור התיקון
		ב"כ מנהל המחלקה
		ב"כ מנכ"ל העירייה
		ב"כ המחלקה המקבלת לאחזקה
		ב"כ נכס העירייה

הובא לידיעת הקבלן:

חתימת ב"כ הקבלן: 1. _____ 2. _____ 3. _____

מאחר והקבלן ביצע את כל התיקונים הניזכרים לעיל, הנני מאשר כי הקבלן השלים את העבודה בהתאם לתנאי החוזה וקיבלתי את הבנין/הכביש הנ"ל.

אחריות הקבלן על החזקה הבנין/הכביש הנ"ל בהתאם לסעיפים 55, 56, 57 של תנאי החוזה מסתיימת בתאריך _____

תפוצה: _____ תאריך _____ שם המפקח _____ חתימה _____

1. קבלן
2. מנהל המחלקה לשירותי הנדסה
3. מנהל המחלקה המתחזקת
4. מנהל האגף המבצע
5. העוזר לכספים
6. הממונה על נכסי העירייה

חתימת מנהל המחלקה _____ חתימת מנהל האגף _____

ירושלים, 16.12.1979

מא / 27/

לכבוד
מר י. סורוקו - מנהל מדור פיקוח עליון
חטיבת הבינוי
עיריית ירושלים.

א.י.א.

הנדון: - בי"ס מס' 39 בגילה.

מכתב מ-7.11.79

1. על מנת למנוע תקלות ואי-הבנוה נבקשכם למסור לנו רשימה מפורטת של אותן דרישות וחשלמות אשר אתם מבקשים להכניס גם בבנין בית-הספר מס' 39.
2. כידוע לך, מר א. ורון משמש כמפקח גם על בי"ס זה.

בברכה,

א. א. א.
פרדי אלנברג

העמק:
מר ש. כהן - משהב"ש
גב' מ. ברוזר - ✓

מזכר

(להתכתבות פנימית במשרדי הממשלה)

אל:	מחוי ב/ח
מאת:	ד. צביה 82000.6.4
הנדון:	

התאריך
20.6.79
תיק מס'

820
6.4
3280
4920
5247.0

יש בסיסה של בן גוריון.

על אופן הוסיף הוסיף.

למספר הוסיף בן גוריון.

כמו כן אופן הוסיף הוסיף.

מספרים (אשרף על נציה) הוסיף.

הקטן אכן הוסיף.

למספר הוסיף הוסיף.

ר



100.000 58
001

058
001
002
003
004
005





עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים מ"ז בסיוון תשל"ט
11 ביוני 79

המחלקה לחינוך
دائرة المعارف

מח/4071

לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים
משרד הבינוי והשכון

א.ב.ג.

הנדון - הכשרת 3 דירות לבני-ילדים בגילה שלב ב'.

להלן אוסרן השימושים להכשרת הדירות בבנין 63 - דירות מס' 8;13;14, לשמוש כבני-ילדים, שהוכן ע"י ברוך בית של המחלקה לחינוך.

40,000	1. הריסת קירות + תיקוני טיה -
6,000	2. עבודות חשמל -
5,000	3. תיקוני רצוף -
4,000	4. טיוד וצבע רק תיקונים -
7,000	5. שינוי מערכת הסקה -
20,000	6. מורגים ומעקה -

סה"כ 82,000 ₪

אודה לך אם תעביר האסור לחלונם למר ע' וכסלר, גזבר העירייה, בהקדם האפשרי.

בברכה

אלי גונן

מ"מ מחנך מערכת החינוך

העמק: גב' חמרי אשל, הממונה על חיק החינוך
מר י' שיפטן, מנהל המח' לחינוך
מר מ' טרנא, המטנה למנהל המח' לחינוך
מר ע' קוז, מנהל אגף בני ילדים
מר בני דביר, משרד הבינוי והשכון מחוז ירושלים
גב' מירי ברור, משרד הבינוי והשכון מחוז ירושלים



मध्य प्रदेश शासन
राज्य-प्राधिकार-सचिवालय

नमो भगवते वासुदेवाय
१५/११/५५

१५/११/५५
१५/११/५५

१. १५/११/५५
२. १५/११/५५
३. १५/११/५५
४. १५/११/५५

संज्ञा-सूची

१. १५/११/५५
२. १५/११/५५
३. १५/११/५५
४. १५/११/५५

- १. १५/११/५५
- २. १५/११/५५
- ३. १५/११/५५
- ४. १५/११/५५
- ५. १५/११/५५
- ६. १५/११/५५

१५/११/५५

१५/११/५५
१५/११/५५
१५/११/५५

१५/११/५५
१५/११/५५
१५/११/५५
१५/११/५५
१५/११/५५
१५/११/५५

אל:	שמואל
מאת:	אריאל
תאריך:	2.10.79
חיק מס':	
גורן:	

המנהל הכללי של שירות המבחן

היינו מודים לך על תגובתך
באשר לסיכום המבחן

המבחן נערך ב- 1.10.79
במסגרתו נבדקו 100
משתתפים

אריאל הגיש דו"ח
המבחן, שבו הוצגו
הנתונים

אמנו

לשנת ה'תש"ג

לדברי המעלה

אשר לא ידענו

לנו

הענין וההוא

18.9

ד' בהטרי הש"מ
28 בספטמבר 1979

118

לכבוד
מר ציון חיי
סח' נכסים
עיריית ירושלים

.ג.ג

הנדון: גן ילדים גילה

רצ"ב מועבר ח"ק בקשה להיתר גן זה.

אנא חתמי כבעל הנכס כדי להעבירו לעיריית ירושלים.

~~לכבוד רב~~

י. מוסקוביץ
אודיכלית

העמק: אולגיק - מנהל מקומי

י. שריבמן - אודיכל

מ. ברזור - ע. ראשי למוסדות ציבור

ר. שלום - כאן

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C.

UNITED STATES
DEPARTMENT OF JUSTICE
ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
HAS THE HONOR TO ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF YOUR LETTER
DATED APRIL TWENTY TWO LAST.

VERY TRULY
YOURS,

J. EDGAR HOOVER
DIRECTOR

RE: [Name] - [Address]
[City, State] - [Zip]
[Phone Number]

א' בכסלו תש"מ
21 בנובמבר 1979

לכבוד
מר א. אולביק
מנהל פרויקט גילה
ירושלים.


אדון בכבוד,

הנדון: ביה"ס יובל גד - פיגוי בראשי.

הנעבר להלכב בו אי פיגוי והעבירן אל האקלון בראשי
יחבל בוזקת ביה"ס יובל גד (קסטרן לשעבר) האמוכבן
לאפייל 80.

בא להודיעני מצב והטיפול בפיגוי.

בכבוד רב,


שמעיהו כהן
מנהל מחוז ירושלים

התקן: מר א. חייך
מר ב. דביר
גב' ס. ברוד
מר ג. לביא - מו"פ
מר וילקבסקי

1944
1945
1946

1947

1948
1949
1950

1951

1952

1953
1954

1955
1956
1957
1958
1959
1960

2580

ה' קל"ה

ב"ה

(10.2 ת"ב) 18. כ"ה + כ"ה - ת"ב
 (10.2 ת"ב) 12. כ"ה + כ"ה - ת"ב
 (7.2 ת"ב) 12. כ"ה + כ"ה - ת"ב
 3 ת"ב

21 - 22 כ"ה - ת"ב
 1.2 ת"ב

ת"ב
 1.2 ת"ב

2.5 ת"ב
 ת"ב

1-75 ת"ב
 15 ת"ב
 ת"ב

10. ת"ב
 2.5 ת"ב

פרטיכל קבלה שניה בי"ס אשקובית.

הסיור נערך בבי"הס ביום 5.11.79 בנוכחות :-
מר סורוקו ומר פהר - עיריית ירושלים, מח' הנדסה
גב' מ. ברזור - משה"בש ✓
מר גלילי - חב' אשקובית
א. שוורצר - הנחלת הפרויקט.

ביום הסיור עסק קבלן משנה של אשקובית בחיקון ההסתייגויות שנרשמו בפרוטוקול
מחאריך 30.8.79 הר"מ :-

1. התקנת ארגז כיבוי אש + מט"ל בארגז.
 2. תקון ספיט מחתח לשערים.
 3. הנחת וקביעת שוקטים בקצוות של מרזבי הניקוז.
 4. בנית מגן סכיב צנרת $\phi 2$.
 5. פינוי אבן בחצר האחורית ובמגרש המשחקים הדרומי.
- טרם בוצעו הדברים הר"מ (אשר צוינו בפרוטוקול הנ"ל) -
1. איטום מחתח לשערי הכניסה (ע"י גומי או פלך)
 2. קביעת הכנית חשמל מעודכנת בתוך לוח חשמל.
 3. הוספת אדמה גן בחצר בי"הס (ליד הכניסה).
- כמו כן נרשמו בסיור ההסתייגויות הר"מ :-
1. טיה בפרוזדור של קוביט חדר מינהלה לא לוטש כפי שסעי הפרוזדור והדבר מסוכן לבטיחות הילדים.
 2. הקבלן אחדיר חוט משיכה בצנרת הטלפונים.
 3. הקבלן ידאג שכל הקשירות של החוטים הקושרים רת הרשת לעמודים - לא יבלטו.
 4. אשקובית הדאג בדהימות שקבלן החשמל שלה ימסור את המתקן לחברת החשמל, דבר שיאפשר חיבור בי"הס, לבסוף, לרשת החשמל.

רשם: ארנסטו שוורצר

תפוצה: לנוכחים

העתק: מר א. תייר - משה"בש י-ט

175 LABORATORY ST. TEL AVIV
15 HANOR ST. GULU, ISRAEL

175 LABORATORY ST. TEL AVIV
15 HANOR ST. GULU, ISRAEL

175 LABORATORY ST. TEL AVIV
15 HANOR ST. GULU, ISRAEL

1. The first part of the report.

2. The second part of the report.

3. The third part of the report.

4. The fourth part of the report.

5. The fifth part of the report.

6. The sixth part of the report.

7. The seventh part of the report.

8. The eighth part of the report.

9. The ninth part of the report.

10. The tenth part of the report.

11. The eleventh part of the report.

12. The twelfth part of the report.

13. The thirteenth part of the report.

14. The fourteenth part of the report.

15. The fifteenth part of the report.

16. The sixteenth part of the report.

17. The seventeenth part of the report.

18. The eighteenth part of the report.

19. The nineteenth part of the report.

20. The twentieth part of the report.

21. The twenty-first part of the report.

22. The twenty-second part of the report.

23. The twenty-third part of the report.

24. The twenty-fourth part of the report.

25. The twenty-fifth part of the report.

26. The twenty-sixth part of the report.

27. The twenty-seventh part of the report.

14/11/79

למקום
המחלקה לשרותי
הנדסה
עירונית י"מ

אישור מה יו"מ לחן העירייה: עבודות אבן קו"ס ואן. לקום
מ"ס 33 (ג'ו-ל'מ"ה)

א"נ

האגף והאחראים מה צ. חובבי אישה את דוגמאות
האבן בקו הירוקים. אבן אבן אישה קור סאזי כולל
בירוק הכיחור אבן סתית אבן של האבן וניקויה.
אמור זה"ש יב"ח בסדר שנתנו הדוגמאות לסתית
אבן של האבן (ניקוי הבטחנות והאבן היו אינני
מבין את מיתקן בנולו צה. רק לזרז סאזי
הכיחור ניקוי האבן וסילוקה של מטמון משמשים
ניתן לבחון באחידות הקורות. מה ד"ר שבת
האבן עזרה בוקר בקורה ופה.

במבוק חב.

אלני וילן



המפקח א. קרוני

ASHER CLINIK SPOKANE, IDAHO

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 05-10-2011 BY 60322 UCBAW/STP

11/11

1
1

X


Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the second section, including the phrase "of the ...".

Handwritten text in the third section, starting with "the ...".

Handwritten text in the fourth section, starting with "the ...".

Handwritten text in the fifth section, starting with "the ...".

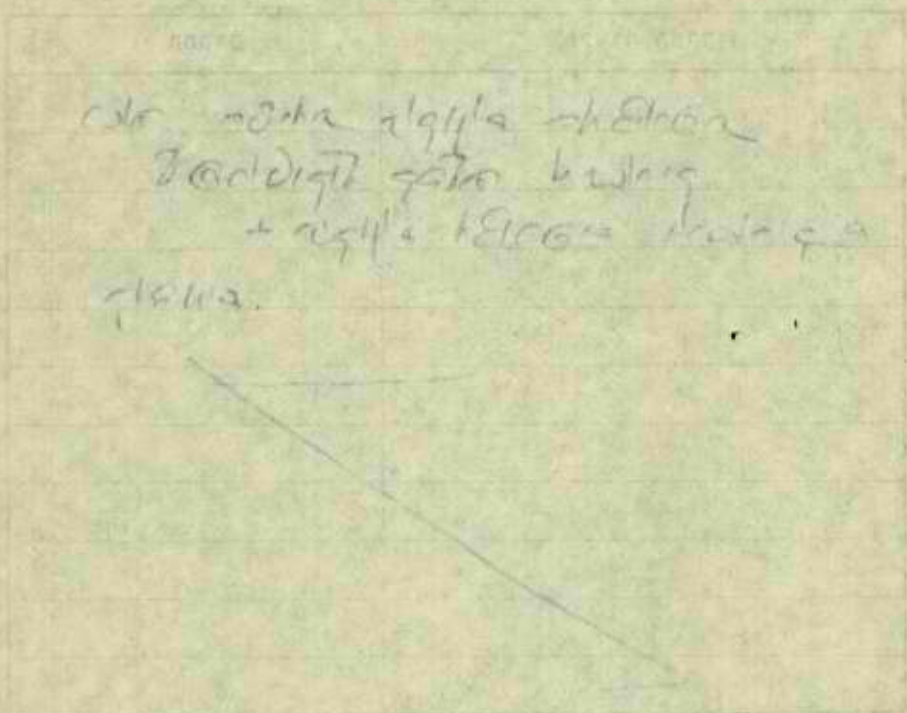

Handwritten notes and diagrams to the right of the graph. It includes a small diagram with a vertical line and a horizontal line, and some text below it. The text is written in the same cursive script as the rest of the page.

Handwritten text in the sixth section, starting with "the ...".

Handwritten text in the seventh section, starting with "the ...".

Handwritten text in the eighth section, starting with "the ...".

Handwritten text in the bottom left corner, possibly a signature or date.

A small handwritten mark or symbol at the bottom center of the page.

מודינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך: ו' בכסלו תשמ"ט
26 בנובמבר 1979

מספר:

לכבוד
סר יואל סימטון
סגן המ"ל לחנוך
עיריית ירושלים

א, 2.

הנדון: פירוק פבני"ם הכרתיה להטמ"א
מכתבך מ-28/10/79

1. לפעיק' א' במכתבך - בנייילרית טכנייית הנמנ:
א. גילת ג' 11, גילת שלב ב' - אטטרת - נמנאית בשלבי הקטת.
ב. גילת שלב ד' ע"י ביה"ט - שלב הננין + פניית גמורית.
ג. הלפידת מורת שלב ד' - ע"י ביה"ט - הקטתו הטתיית עם הקטת ביה"ט
היינו במרץ 81.
2. לפעיק' ב' במכתבך הקטת בנייילרית נוספית, מהוכנניית להקטת ברבע טיוכטר
הקציב גן הילרית ברמות 05-06.
גן הילרית ע"י ביה"ט יובל גר (דרנל) רמות וכן הילרית בגילת שלב ב'
(כרפי).
3. לפעיק' ג' במכתבך - טריון דיררת נוספית לטוסט כננייילרית, עד אשר לא
יאוכלטן היררת שנמטרו לעיריית ועד אשר לא יוברר חד טטטית כי יט צורך
טיידי ביררת נוספית לא יטריין טטת"ט אף דיררת נוספית אחת.
4. לפעיק' ד' במכתבך ביה"ט "דיררת לעולת" שלב ב' בנייתו טיוכרת להטתיית
בתוך טטת (נובמבר 80).
5. לפעיק' ה' במכתבך ביה"ט הלפידת מורת (גילת הידת) עפ"י התווה אטורת
הבנייית להטתיית במרץ 81, אין כל אטטרת לגטור חלק או אגף מהבניין
קורת לבן בשל הטיבת טחורת החטל והחלקת לאטטקת טיט בעיריית לא יחברו
החטל והטיית לפניי גמר הבניית.
6. לפעיק' ו' במכתבך - לא הוחל ערדיין בבנייית ביה"ט דרנל יובל גר או ביה"ט
הטתומנן ב-02, אי לכך אין כל סכוי טבנייתו הטתיית כאונוטט 80 וטטק אט
הטתיית הבנייית עד אונוטט 81.
עלי לגיין טעל טמך התיזרת טטרד החנוך אין צורך בניי"ט נוסף ברמות לטנת
הלפידת הטמ"א.

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים

תאריך:

מספר:

-2-

7. לענין חסינות הביניים - בית"ס לומנפלד גילה, ורטר גזה יעקב הוכנסו
לפרוגרמה כנוצ 1980 במידה ותאוצר בתקציבים יוצאו החכירות לסכרז
באפריל 1980.

ב כ ר כ ת

סמריהו כהן
סנהל מחוז ירושלים

העמק: ח"כ חבר אשל - עיריית ירושלים
מר ס. שרגא - סנהל לנהל מח' להינדון
סנהל מלוסד - עיריית ירושלים
גב' לאה גונן - עיריית ירושלים
גב' ס. ברזור - ע/ר למוט"צ

דוקימנט

ט"ו באשון תש"ט
5 בנובמבר 1979

לכבוד
מר ניטן הרפז
מזכיר מועצה פועלי ירושלים

א.נ.

הנדון: מועדון ההסתדרות באזור גילה
מכתב מ-20 בספטמבר 79

לכל הפונקציות שאהה מונה במכתבך כאו"ן פעילות קטיטים וזוער מיועד שש
ופעילות במסגרת המחנ"ט המתוכנן בשכונה, נראה שלפחות בשלב ראשון הוכלו
לשלב הפעילויות.

במקביל הועברה בקשתכם למחנ"ט גילה לאתר שש פתאים למועדון המבוקש.

ב ב ר כ ה

שמריהו כהן
מנהל מחוז ירושלים

העקב: מר א. יסקי
מר א. אולניק
גב' ס. ברודר
גב' א. ברזקי
מר א. חייך
מר ב. דביר

10/10 10/10

10/10 10/10

10/10

10/10 10/10

10/10 10/10 10/10 10/10

10/10 10/10

10/10 10/10

ד) **ג'ם ארץ ישראל**
General Federation of Labour in Eretz-Israel
JERUSALEM LABOUR COUNCIL

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל
מועצת פועלי ירושלים
לשכת המזכיר

בחסובה נא לחזויר
in reply please quote
554/ג

ירושלים ז' בתשרי תש"ם
JERUSALEM
בית ההסתדרות טל. 225361 Histadruth House
רח' שטראוס 17 Straus St. 17
ת.ד. 238 - מיקוד 10000 Mikoodo P. O. B. 238

ליטול
המזכיר

לכבוד
מר שמריהו כהן
מנהל המחוז
משרד השכון
רחוב בן יהודה 23
ירושלים

א.ב.ג.

הגדון: מועדון ההסתדרות באיזור גילה ירושלים

בשכונת גילה קיימת אוכלוסייה הקשורה לפעילות ההסתדרות
ואשר מבקשת להקים במקום מועדון הסתדרות.


מטרת המועדון היא לפעולות קשישים ובווער באגפים בפרדים.
המבנה יהיה בשטח של כ-1,000 מ"ר ושטח הקרקע הצמוד לפעולות
חוץ כדונם בוסף. מכאן השטח הדרוש לנו הוא כ-2.5 דונם.

מאחר וברצה לפתח במועדון פשולות לקשישים, עלינו לפתח
המועדון במקום בשכונה הקרוב לרשת התחבורה הצבורית.

בודה לכם נאם באמצעותכם נאתר שטח מתאים על מנת להסדיר
הקצאה עם מינהל מקרקעי ישראל.

בכבוד רב


ביסן הרפז
מזכיר המועצה

א.ב.ג.


העתק:
הח"מ. מצגר.

30.10

א.ב.ג.
מזכיר המועצה

מס' 3 ק"מ

אשר אולניק חנוה להנדסה בע"מ ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

רחוב זיבוטינסקי 119 תל-אביב טל. 45 49 01 על.
רחוב רוזמרין, בית 240, גילה, ירושלים טל. 02 7179 19 על. ROSMARIN ST., HOUSE 240, GILO, JERUSALEM

Handwritten signature and scribbles

11.11.79

מושרד הבינוי והשיכון
מחוז ירושלים
רח' בו יהודה 23
19-11-1979
דואר נכנס

לכבוד
עיריית ירושלים
המחלקה לחינוך
רח' יפו 34
ירושלים
לידי מר שרגא פ.

א.ג.

הנדון: פגשת-לגני ילדים בגילה (במרכז המסחרי)
מכתבם מח/ 525 (שהתקבל במטה"בש בתאריך 25.10.79)

הגנו רוצים להביא לתשומת לבך כי המדרכה ליד בני הילדים
היחה נקיה מכל פסולת, עד אשר נבנה בגן הילדים הנ"ל ארבוז
חול, ע"י קבלן העירייה שלא פינה את פסולת הבניה.
בשבועות הקרובים תחחיל חב" שו"פ בהשלמת סלילת רח' אריה-
בן אליעזר, ואם עד אז לא תמונה הפסולת אנו נמנה הפסולת
באמצעות שו"פ.

בברכה,
אינג' אריסטו שוורצר
צוות גילה

התקינו ה"ה-
ש.כהן - מנהל מחוז ים מטה"בש
מר י. שיפטן - עיריית י-ם
י. לומר - יו"ר ועד שכ" גילה
ש. וילקנסקי - שו"פ

ASHERKOLENIE ENGINEERING LTD. 2011-2012
12. JANUARY 2012
RESEARCH REPORT

STATE OF THE ART REVIEW

THE STATE OF THE ART REVIEW IS A CRITICAL ANALYSIS OF THE CURRENT KNOWLEDGE AND PRACTICE IN A PARTICULAR FIELD. IT IDENTIFIES THE RESEARCH GAPS AND PROVIDES A FRAMEWORK FOR FURTHER RESEARCH.

THE STATE OF THE ART REVIEW IS A CRITICAL ANALYSIS OF THE CURRENT KNOWLEDGE AND PRACTICE IN A PARTICULAR FIELD. IT IDENTIFIES THE RESEARCH GAPS AND PROVIDES A FRAMEWORK FOR FURTHER RESEARCH.

יום' בחשוון תש"מ
9 בנובמבר 1979

לכבוד
מר א. הניג - מנכ"ל
יובל גד
אשקלון

א.ג.

הודונו: הכבוד בתי ספר בירושלים

מאחר ובכוננתנו לבנות את בתי הספר הבאים באמצעותכם, אבקש
לחכנן ולטפל בדישוי לפי הרשימה הבאה:

- 1) בנות - חור 02. (בנוסף לאחד 01) מחכנן אחר - ספקטור עמיטל.
- 2) תלמידות מזרח - אחר 02 - מחכנן אחר פילטטיין.
- 3) גילה - אחר 02 - מחכנן אחר א. יסקי.
- 4) גילה - אחר 03 - מחכנן אחר רכטר.

אבקש לפנות למנהלי המרויקטים ברמות גילה ותלמידות מזרח
לתאמת החכנון, וקביעת לוחות זמנים.

בכבוד רב

א. חליר

מנהל המולקת הטכנית

- העוקב אבי אורן - מנהל אגף הכנון והנד'
ש. כהן - מנהל המחוז
א. ברזקי - אודיכלית
מ. ברזור - ע/ל למוטדות ציבור
י. גדיש - מנהל מרויקט רמות
א. אולניק - מנהל מרויקט - גילה
מ. קרנר - מנהל מרויקט - תלמידות מזרח

1911
1912

1913
1914
1915

1916

1917
1918

1919
1920

1921
1922

1923
1924

1925
1926

1927
1928

1929
1930

1931
1932

1933
1934

1935
1936

1937
1938

1939
1940

1941
1942

1943
1944

1945
1946

1947
1948

1949
1950

כ"א בחשוון תש"מ
11 בנובמבר 1969

לכבוד
מר א. בן-אשר
מח' מהנדס העיר
עיריית ירושלים
יפו 17 י"ט

א.ג.

הנדון: גילה בן ילדים - פגישת מס' 17

רצ"ב מועבר אליך טע של חכמיות להגשה היתר בניה לשטח הנ"ל.
לטיפולך.

בכבוד רב

י. מוסקוביץ
א ד ר י כ ל י ת

העמק: ו. שרייבמן - אשדוד
פ. ברוור - כאן
א. שלום - כאן

SECRET

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

SECRET

SECRET

4. [Illegible]

אל:

התאריך

12.11.73

תיק מס'

מאת:

הנדון:

התא

לשם סל 4 ק"ה -

סל ה' 1000-

ה' 1 680

ה' 2 800

ה' 3 300

ה' 4 800

סכ' 2580

מנהל תחום

תקנה מס' 3

1

ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

אשר אולניק חברה להנדסה בע"מ

119, JABOTINSKY ST. - TEL-AVIV
15, HAMOR ST., GILO, JERUSALEM

טל. 45 49 01, 23 53 49
טל. 7 1 2 1 6 2

רחוב ז'בוטינסקי 119 תל אביב
רחוב המור 15, גילה, ירושלים

16/10/79



המאקו פריסה
קום חיובי שלם ג
גובה

נכתיים: א. פרקס - מאקת החינוך בצורה - וס
י. סוריקן - שירותי הנדסה
ב. ה. א. - מתקדם קבלת מנתים ציודים
א. קוור - משיב השיכון והחינוך
א. און - משיב אולניק
א. שניידר - עניב הקבלן

ד. נדקן פנים הכיתות, פרוצדורות מנהלית ואולם התעמולה
א. ויסאה רשימת ליקויים שתואר בין התוכנים פוסט
התחילת מאת הקבלן לביצוע התקנת ה"ל"
2. ע"כ סוף חוגש אולניק מתחום הקבלן יוסט

- א. משיב חזרי מדינת
- ב. סוריקן קאה האסונה
- ג. שטר נרסה למדנת
- ד. גיאות למשיב משיב

ויהיה משיב משיב

3. לגבי חיובי ~~המשיב~~ אלפי אלפי הארה יחידה שלם
ג. עת עניב משיב אל ורה
4. עקבות משיב משיב משיב משיב
עקבות משיב משיב משיב משיב
סוף חוגש משיב

5. נציגי החברה מקלים לקבץ חלקת החלון הכניסה
ראשית למתן או לחילופין להרכיב זבלנית עם
קובי פלסטיק

6. נציגי הסוכה מקלים לקבץ סוגי הגומם עם
החלונות הנמוכים במזר הבנויים

7. קמיונה וההסעות שהזכירו בסעיף 2 ו 5 ק"מ
וקורגו ^{ה"קבלן} _{הסוכה} ואכלם את ~~ה~~ קום =

8. הקבלן מתחייב לסוּם את כל התפוזות במקום
וקבוצתם עד סוף חודש נובמבר.

גבולות

- א. ש. כהן - מנהל מטה"מ מחוז ימ
- א. תייב - מנהל מחלקת אג"מ מטה"מ
- י. שפן - מנהל מחלקת החינוך במחוז
- י. סוויקין - שירותי הנדסה
- מ. גליב - הקבלן

ד' בחשוון תש"ט
25 באוקטובר 1979

לכבוד
מר ציון חיי
מח' הנכסטים
עיריית ירושלים
יפו 17 - י"ט

א.ג.

הנדון: גילה בן ילדים - מברש מס' 17

רצ"ב פועבר אליך מט של חכניות להגשה היחף בניה לשטח הנ"ל.
לטיפולך.

מצורף צילום של ההחלטה של המנהל מקרקעי ישראל לגבי שטחים
מיועדים לצרכי ציבור.

רב בכבוד

י. מוסקוביץ

א ד ר י כ ל י ת

העמק:

ו. שרייבמן - אשטרום

מ. ברזור - כאן

ר. שלום - כאן

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

ו' באלול תשל"ט
29 באוגוסט 1979

אלו: מר אשר וינר - מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

הנידון: גן ציבורי בשטח סמכ"ח גילה

רצ"ב הערוחיו, סדר השחלשות הענינים וצלומי מכחבים הקטורים בנושא.

1. עפ"י ה.ב.ע. מס' 1690 א' לשנת 1973 יועד השטח לגן ציבורי. אין משרד הבינוי והשיכון מבקש רשיון לפיתוח גן ציבורי, כאשר השטח מיועד לכך עפ"י חב"ע מאושרת.
 2. ההחלטה להקים גן ותחילה העבודות נעשו תוך האום מלא עם מר נ. עוז, מנהל המחלקה לשיפור פני העיר בעיריה.
 3. היזמה להקים בית כנסת ומקוה בשטח הגן באה מצד העיריה - המחלקה לתאום שרותי דת ללא האום בין מחלקותיה השונות, וללא ידיעת משרד הבינוי והשיכון המתכנן והבונה את השכונה.
 4. שינוי היעוד בחב"ע וכל ההליך קבלת הרשיונות נעשה ללא אשור משהב"ש. עם השלמת העבודות ע"י הקבלן (שהועסק ע"י שו"פ), נתבקשה העיריה לקבל הגן.
- הגן לא נתקבל על אף פניות חוזרות ונשנות, עך שלא ניתן לסגור החשכונוח עם הקבלן.

בברכה
יפה
רינה זמיר
ס/מנהל מחוז ירושלים

גן צבורי - בית כנסת גילה השתלשלות הענינים

- 24.10.77 - בישיבה עם ועד השכונת, הועלתה בעיית הקמת הגן הציבורי.
- 12.1.78 - מכתב המחלקה לתלונות צבור העירייה.
"על משרד הבינוי והשיכון להוציא לפכרו הגן".
- 24.5.78 - סיור עם נחמיה עוז בגילה.
הוחל בביצוע הגן.
- 15.6.78 - מכתב מר א. אולניק למר א. ניב - "לאור בקור האזרחים חפץ-
עירוני במשרדנו, נודע לנו על כוונת העירייה להקים בית כנסת
ומקוה בשטח הגן הציבורי הנמצא בביצוע".
- 24.9.78 - מכתב פקידת תלונות הציבור למר י. מצא;
"עבודות הגן בביצוע - באופן מקרי נודע לנו כי עומדים להקים
בית כנסת על חלק משטח הגן ללא ידיעתנו ללא ידיעת מנהל הפרוייקט...
מיקומם עלול לפגוע בכל חכניית הגן".
- 10.6.79 - מכתב מר חפץ לאולניק, בו מקקש אשור משרד הבינוי והשיכון,
"אם יתברר שמהב"ש מסתב להסדיר האשורים, אז נאלץ בליית ברירה
לבנות עפ"י החכניות המאושרות".
- 21.6.79 - מכתב מר שמריהו כהן לא. אולניק: "מהב"ש לא הסכים ולא התחייב
לתאם, ... אני מחננד לתכנית. ... משמעותה חרס הגן".
- 2.7.79 - מכתב מר אולניק לחפץ: "מהב"ש מחננד לבניה".
- 2.7.79 - מכתב מר אהוד חייר לאולניק: "ראש העיר מסכים שאם נציג מיקום
אחר ישקלו".
- 19.7.79 - מכתב מר גוטסמן משו"פ לעירייה: "עבודות הקבלן בגינה הושלמה",
יש לקבלו.
- 20.7.79 - מכתב מר א. אולניק לחפץ: "לא תואם עם מהב"ש, מבררים אפשרות
לאחור שטח".
- 20.7.79 - מכתב מר חפץ לשמריהו כהן ולעירייה-המועצה הדתית. החר בניה מס'
03240 מ-22.9.79 נגשים לעבודה. מהב"ש בנה ללא רשיון את הגן.
- 26.7.79 - מכתב מר שרייבר לשמריהו כהן: "ב-1.8.79 מתחילים לבנות בתי כנסת
יש לסלק כל ציוד מהגן".
- 30.7.79 - מכתב מר חפץ לאולניק: "יש לפנות המגורש, אדריכל כרמי בעד הקמת
דומקריט".
- 23.7.79 - בסיוור הוצעו מקומות אלטרנטיביות, לא החקבלו על דעת העירייה.
- 8.8.79 - מכתב שו"פ למר טדי קולק - הגן הסתיים, יש לקבלו.

1951

- 22.1.51 - [illegible text]
- 23.1.51 - [illegible text]
- 24.1.51 - [illegible text]
- 25.1.51 - [illegible text]
- 26.1.51 - [illegible text]
- 27.1.51 - [illegible text]
- 28.1.51 - [illegible text]
- 29.1.51 - [illegible text]
- 30.1.51 - [illegible text]
- 31.1.51 - [illegible text]
- 1.2.51 - [illegible text]
- 2.2.51 - [illegible text]
- 3.2.51 - [illegible text]
- 4.2.51 - [illegible text]
- 5.2.51 - [illegible text]
- 6.2.51 - [illegible text]
- 7.2.51 - [illegible text]
- 8.2.51 - [illegible text]
- 9.2.51 - [illegible text]
- 10.2.51 - [illegible text]
- 11.2.51 - [illegible text]
- 12.2.51 - [illegible text]
- 13.2.51 - [illegible text]
- 14.2.51 - [illegible text]
- 15.2.51 - [illegible text]
- 16.2.51 - [illegible text]
- 17.2.51 - [illegible text]
- 18.2.51 - [illegible text]
- 19.2.51 - [illegible text]
- 20.2.51 - [illegible text]
- 21.2.51 - [illegible text]
- 22.2.51 - [illegible text]
- 23.2.51 - [illegible text]
- 24.2.51 - [illegible text]
- 25.2.51 - [illegible text]
- 26.2.51 - [illegible text]
- 27.2.51 - [illegible text]
- 28.2.51 - [illegible text]
- 29.2.51 - [illegible text]
- 30.2.51 - [illegible text]
- 31.2.51 - [illegible text]

ASHER OLENIK ENGINEERING LTD.

119, JABOTINSKY ST. - TEL-AVIV
15, HAMOR ST., GILO, JERUSALEM

טל. 45 49 01, 23 53 49
טל. 7 1 2 1 6 2

אשר אולניק חברה להנדסה בע"מ

רחוב זיבוטינסקי 119 תל-אביב
רחוב המוד 15, גילה, ירושלים

ו' באלול תשל"ט
29 באוגוסט 1979

לכבוד
מר גוטסמן
בית
שכון ומיתוח - גילה
לבונה 6
ירושלים


א.ג.

הנדון: קבלת גן צבורי מס' 17 ליד סמב"ת גילה

מר ש. כהן מנהל מחוז ירושלים של משהב"ש הודיעני אהמול כי מר נחמיה עוז
מנהל המחלקה לשפור פני העיר בעיריית ירושלים דיווח לו כי העירייה קבלה את
הגן.

אבקשן להודיע על האריך סיום אחזקתכם בגינה.

בכבוד רב


א. אולניק
מנהל פרוייקט

העחק:

מר ש. כהן - מנהל מחוז י-ם
מר א. תייר - מנהל מחלקה טכנית
מר נחמיה עוז - מנהל המחלקה לשיפור פני העיר



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים

י"ז בתשרי תש"ט
8 אוקטובר 1979

מח/564

המחלקה לחינוך
דائرة المعارف

לכבוד

מר אהוד חייך

מנהל המח' הטכנית במחוז י-ם

משרד השיכון

רח' בן-יהודה 23

ירושלים

הנושא: מטירת בית-הספר החדש בבילה

מכתבך ה' בתשרי (25.9.)

שלום רב ושנה טובה,

בחגובה למכתבך הנ"ל, נבקשכם לודע מיד, בין השאר, אם הדברים דלהלן:

1. גמר ביצוע של כל עבודות הפנים.
2. חיבור מים קבוע.
3. לוודא גמר הביוב.
4. חיבור הטל, כולל הגנה על החיבורים בלוח ועל הנקודות במעבדה.
5. גמר חדר הסקה.
6. חיבור חת-קרקעי לסלפון.
7. אנטנה לטלוויזיה ישראלית.
8. סידוג כל החלונות במפלטי קרקע/במפלטי גגות, עם פתח מילוט אחד בכל כיתה.
9. הקמת גדרות ומעקות בגבולות הפיתוח ובין ממלטים שונים.
10. הרכבת שער החצר.
11. טילוק ערימות העפר והסלעים בחזית ומאחור.
12. הרכבת סטופרים ככל הדרוש.
13. הכשרת שביל גישה מחומרי כבוס, מקביל לכביש, בנוח שאיגו בשימוש.
14. הצבה הגדר בשביל הכניסה משני הצדדים.
15. עניני הבטיחות למי המכתב מ-י"ד באלול (6.9.).
16. המטף הפיתוח.

נעריך את הדבר מאד, אם תחזרו לב"ל עדימות אפקטיבית.

בברכה מועדים לשמחה
יואל שיטמן
מנהל המחלקה לחינוך

העתיקים:

- מר שמריה כהן, מנהל מחוז במשרד הבינוי;
- מר ד' מלומד, מנהל חטיבת הבינוי בעירייה;
- מר א' אלניק, מנהל פרויקט גילה.
- מר מ' שרגא, משנה למנהל המחלקה לחינוך;
- מר א' אבנר, ממונה על אוזקה ושרחות.



עיריית ירושלים
بلدية اورشليم - القدس

ירושלים י"ד אלול תשל"ט
6.9.79

המינהל הכללי
الادارة العامة

אלו מר יואל שיפטן, מנהל המחלקה לחינוך
מאת: חזקיהו יוסף - קצין בטיחות
איחזן אייל - קצין כסחון.

הנדון: כסחון ובטיחות בבית ספר גילו מס' 2 (חרובי)

כביקורנו זה לפי בקשתך מצאנו את הליקויים הבאים: שמבלי שיתוקנו
יש סכנה לילדים שילמדו במוסד זה.

1. המוסד ממוקם באזור שאיננו מאוכלס, ורק במרחק של 200 מטר ממנו
גרים דיירים, לכן חובה לבטור את עבודות הגידור והשערים המקיפים
את המוסד.
2. אין סלפון ואין הכנה לסלפון.
3. אין דרכי גישה למוסד מחביש הראשי.
4. יש לסיים את עבודות הסירוג בכל הכיחות והחלונות בקומת הקרקע
ובחלונות שדרכם ניתן לצאת לגג, כמו כן יש להתקין פחח מילוס בסירוג.
5. מעקות חדר המדרגות לא הותלמו ולא חוזקו.
6. יש לבצע חציה בזכוכיות בחלונות כניסה לאמפיחאטרון, כיוון שיש
הנודות לזכוכיה.
7. בגלל ויכוח בין הקבלן למחנדס מיבנים לא עומדים לסיים את עבודות
התקנת מעקות בטיחות מעל למפלסים הגבוהים בחצרות.
8. יש להתקין סטופרים בכל הדלתות במוסד.
9. יש לסיים עבודות גמר פיתוח החצר ולסלק ערימות סלעים ענקיות בשטח
החזיחות, מדובר בערימות סלעים שלא הקבלן אחראי לסילוקם אלה משרד
השיכון.
10. יש לודא שכל הדלתות המובילות לאמפיחאטרון ינעלו עד לגמר עבודות
הבניה.
11. יש לודא שכל הדלתות המובילות למסגרת המוסד ינעלו באופן קבוע בגלל מעקה
נמוך רומף ולא-חיקני שהותקן על הגג.
12. מעקה ברזל מעל ליציע בכניסה ראשית נמוך מתחת לאקן.
13. על בג אולם החזעמלות אין כלל מעקה.
14. נקודות השמל במעבדה כצמוד לכיורים לא מוגנים.

ב ב ר כ ה.

איחזן אייל

חזקיהו יוסף

עיריית ירושלים
המחלקה לחינוך
7
- 7. 03. 79

העתק: מר מ. שרגא - משנה למנהל המח' לחינוך
מר מ. אנשמיסטר - הממונה על בדיק בית
מר עמי חובב - קצין הכסחון והממונה על הבטיחות

ח/אמ



119, JABOTINSKY ST. · TEL·AVIV
15, HAMOR ST., GILO, JERUSALEM

טל. 45 49 01, 23 53 49
טל. 7 1 2 1 6 2

רחוב דיבטינסקי 119 · תל אביב
רחוב המור 15, גילה, ירושלים

ו' באלול תשל"ט
29 באוגוסט 1979

*אשר אולניק
ויבטינסקי 119
תל אביב*

לכבוד
מר גוטסמן
ביד
שכון ופיחוח - גילה
לכונה 6
ירושלים

א.ג.א.

הנדון: קבלת גן צבורי מס' 17 ליד סמב"ת גילה

מר ש. כהן מנהל מחוז ירושלים של משהב"ש הודיעני אחמול כי מר נחמיה עוז
מנהל המחלקה לשטור פני העיר בעיריית ירושלים דיווח לו כי העירייה קבלה את
הגן.

אבקשך להודיע על האריך סיום אחזקתכם בגינה.

בכבוד רב

א.ג.א.
א. אולניק
מנהל מרזיקס

הערה:

מר ש. כהן - מנהל מחוז י-ס
מר א. חייר - מנהל מחלקה טכנית
מר נחמיה עוז - מנהל המחלקה לשיטור פני העיר
