

16

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

משרד

~~33-7~~

3-11

ש"ס

37 כ 76 חו"ן

1983

13905-54

תיק ממי

~~33-7~~

3-11

מחלקה



שם תיק: בניה כפרית - מחוז מרכז - שילת - גדר בטחון

מזהה פנימי: **גל-11/15554**

מזהה פריט: 000qllle

כתובת: 2-113-2-2-5

תאריך הדפסה: 01/01/2019

39 50

תאריך: 4.5.87

מס' חיק: 13905

19.5.87

לכבוד

קנטרובסקי

ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: שחרור ערבות לטיב עבודה

העבודה גדר בטחון

המקום שילת

הקבלן הדס - עבודות גידור בע"מ

חוזה מס' 77933/83

א"נ,

העבודה הנ"ל נסתיימה והקבלה הסופית נחקיימה בתאריך 5.11.83

אין מצדנו התנגדות לשחרר לקבלן את ה-% שעוכב ע"ח טיב העבוד כנגד ערבות.

בכבוד רב,

אינג' י. באר גרינברג
מהנדס מחוז המרכז

העמק:

1. לראש צוות, ד. זיידנפלד

2.

3.

מדינת ישראל
משרד הנינוי והשיכון

אל: הוצאות

תאריך 18.12.83

מספר
שינוי

סופס שנוי חוזה/הזמנה

83/77933/83
מספר החוזה / הזמנה

א. פרטי זהו:

המרכז	שט המחז	שט הישוב	שט הקבלן

ב. הרכב החוזה/הזמנה הקיים

השינוי	החזקה	הקיים בשקלים	המחוקן בשקלים	בשקלים
		2,700,000	3,043,640	343,640

גדר בשטח

ג. מהות השינוי: עבודות נוספות, בהתאם לסופס המצורף.

בכירה

ר. בן יחודה
חשן המשרד

י. חונקה
ראש המינהל לניווט כפרים
ויסונים חדשים

חתימת הקבלן
הדס
עבודות גידור בע"מ
חתימה
תאריך

העתיקים:

מר ר. קנטרובסקי, ממונה על חוזים ופרויקטים
הממונה על הפעילות הבנייה
מהנדס המחז

גיברות - המיון המקציב:

90.60.012/14-9040

השלמות פיתוח והשתנות

אחר ע"י הנוכח
מקור יומן

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים

אל: אגף אכלוס ופרוגרמות

5.12.83

תאריך: 83/77933/83
 מספר

הנדון: הגדלת / ~~הקטנת~~ חוזה 83/77933/83

העבודה - גדר במחון
 המקום - שילת
 הקבלן - הדס - עבודות גידור בע"מ
 מהות השינוי - עבודות בוספות

343,640
 שקל ----- בסך
 2,700,000
 שקל -----
 3,043,640
 שקל ----- ס"ה

נא להגדיל את החוזה הנדון
 ערך החוזה עתה

ההגדלה היא לצורך בצוע :-

עבודות בוספות :

1. שער כביסה בוסף

2. צביעת גדר

3. עבודות עפר

עלות העבודות הנ"ל לפי הפירוט המצ"ב במחירי החוזה 2/83 - 343,640 שקל .
 ההתיקרויות יוגדלו בנפרד .

נ ב ר כ ה,


 ר. קנטרובסקי

העתקים :

המכ"ז

מהנדס מחוז -

הדס - עבודות גידור בע"מ, כפר סבא

הקבלן -

ממונה על חוזים ומכרזים

חוזה מס. 83/77933/83

גדר בשחון ג- פילת

פירוט עבודות להגדלת החוזה

1. טער כביסה (נוסף) - 1 יח' א 55,000 ש"ח =

55,000 ש"ח

2. צביעת גדר - 3,000 מ"א א 54,01 ש"ח =

162,030 ש"ח

3. חפירת בורות עקב שינוי

פל התוראי בגלל אי הסכמת ק.ק.ל.

(אגף היעוד) - 540 מ"א גדר א 210 ש"ח

113,400 ש"ח

4. עבודה שופל 955 לצורך שיפור התוראי -

10 ש"ח א 1321 ש"ח

13,210 ש"ח

סה"כ ההגדלה לפי מחירי בסיס

החוזה 2/83 -

343,640 ש"ח

התיקויות יוגדלו כנפרד .

(א' 1807) 8
 13905
 5284
 15.1984
 תאריך: 83/1933/83
 מספר:

ד"ר השיכון
 משרד הבינוי והשיכון
 תחנת המידע
 נתקבל ב...
 29-0-...
 ...
 ...

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

המנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

אל: גזברות משרד הבינוי והשיכון

מאת: המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

הנדון: חשבון סופי של חוזה מס. 83/1933/83
הקמת גדר במחנה

העבודות:

פילת

המקום:

הקבלן: (כ"ס - עב' גידור בע"מ)

4,203,269

רצ"ב הריכו מעביר את חשבון סופי של החוזה הנדון בסך סכום לתשלום לקבלן הוא 4,119,204 לאחר גיבוי ע"ח קרן בטוחה 2%

שקלים	2,700,000	נא להקטין / להגדיל את החוזה, ש"קפו עתה -
שקלים	1,503,269	הסך -
שקלים	4,203,269	סה"כ

החשבון כולל:

חודדה ע"ח קרן בטוחה - 84,065 ש"ח .

גזברות
 ...
 ומנהל האגף לתכנון ובצוע

העתיקים:

מר י. רבינוביץ / מ. חור / ר. ל... - נא להודיע לגזברות את מקור המימון לשינויים.

ההנדס מחוז

כ"ס - עבודות גידור בע"מ

הקבלן

אגף חוזים ובטחונות

המחלקה לסטטיסטיקה

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

ימולא ב' 7 עותקים

אל: מחוז _____

משרד הבינוי והשיכון _____

תאריך _____

שם החברה/הקבלן	ח'ו'ז	מען (כולל מיקוד)	סלפון
----------------	-------	------------------	-------

שם המוח	שם הישוב
אוביקס	פרויקט

חשבון חשבוני מס' 3 לחוזה מס': 77933/83

____ / ____ / ____

מחוז העבודה _____

(חותמת קבלה
גזברות)

היקפים	חוזה מקורי	הגדלות מצטרבות ללא התייקרות	התיקרויות מצטרבות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן	2,800,000.-			
לשמוש הגזברות				

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר: -

מס' סדר	בית מס'	מס' יחידות	מצב העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצע מצטבר	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש גזברות
1			הוצאת גזר למס' 3000				2,327,705.-	2 114 010
2			התייקרות למס' 3000					1 821 467
3			חוממות				311,705.-	267 792
4								
5								4 203 269
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

משרד הבינוי והשיכון
 המנהל לבניה כפרית וישובים חדשים
 מחוז המרכז
 תאריך: 12-1-1983
 מחקל החשבון הסופי הזה
 ע"י בהנדס מחשב כמויות מחוז

עבודת מחוז _____
 התיקרות מצטרבת עד תאריך _____

תאריך _____
 (חותמת)

סה"כ	4,203,269.-
מחוז חשבונות קודמים	84.065
סה"כ לתשלום	4,119,204

(ביול מעבר לדף)

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

- סה"כ לזכות _____ שקל
 קרן בטוח _____ שקל
 סעיף תקציבי _____
 סך יומן _____
תסודה:
 (1) גזברות (4)
 (2) מחוז
 (3) אנף תכנון והנדסת יחידת חוזים
 (4) הקבלן

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתימה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	3/3/83		21.12.82
מחשב כמויות מחוז	ביצוע	150358		23-12-83
מנהל המחוז	ביצוע	3578		28.12.83
מנהל חשבונות	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונות	השלום			

דף מס' _____ מתוך _____ דפים

נספח לחשבון מס' _____ סופי חלקי סופי

שם הקבלן _____ מס' עבודות גדר בע"מ _____ מס' החוזה 77933/83

מס' סודר	סעיף החוזה	תאור העבודה	הכמות לפי חוזה	הכמות למעשה	יחידה	מחיר	הסכום
							1,646,820.-
1		גדר רשת	2800	2614 2711	מ"א	630	1.707,930.-
2		ברזל שטוח	2800	2614 2711	"	15	39210.- 40,665.-
3		קונצרטניה	2800	2922 3019	"	90	262980 271,710.-
4		שערי כניסה	2	3	יח"	55.000.-	165,000.-
		תוספות במחירי חוזה:					2,114,010.-
5		חציבת בורות בקטע שבוטל		540	יח מ"א	210	113,400.-
6		יום עבודה טרקטור		1	יח"	16,000.-	16,000.-
7		הובלת טרקטור לשטח		1		6,000.-	6,000.-
							2.320,705.-
		תוספת לא לפי חוזה					113 400
		צבע לפי קרני-סומרון		2614 2711		115	311,765.-
		יום עבודה טרקטור לפי קבלן				16 000	16 000
		הובלת				6 000	6 000
		תוספת לפי חוזה					
5		חציבת בורות טרקטור		540	יח מ"א	210	113 400.-
6		יום עבודה טרקטור		10	יח"	1321	13 210.-
7		הובלת טרקטור		2614		54,01	141 182.-
							267 792

ס"ה

בדקתי את הכמויות

חתימה

שם ותפקיד

תאריך

ה ד ס עבודות גידור בע"מ

משרד השיכון
מינהל לבנייה **פריית ויישובים חדשים**
מחוז חסרנו
דאר נכנס **נתקבל בתאריך**
1984-01-04
לטיפולו של _____
לעיונו של _____

לכבוד
משרד השכון
אגף לבניה כפרית
מחוז מרכז

~~מחוז מרכז~~

הנדון: פרוט להצעה לצביעת גדר בסחלק בשילת

צביעת גדר (לפי מחיר עבודה דומה בקרני שומרון) כדי לשפר את עמידותה.

המחיר שמופיע בקרני שומרון:-

42,5 ש"מ/א לפי מדד 10/82 - 7343,3
מדד בסיסי של חוזה הנ"ל ל-2/82 - 9334,4

$$9334,4 = 1,271 \times 42,5 = 54,01 \text{ ש"מ/א. מ"א } 3000 \quad 54,01 \quad 162,030 \text{ ש"}$$

$$7342,3$$

ב ב ר כ ה,

הדס
עבודות גידור בע"מ

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASH.

DEPT. OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

January 1, 1914

TO THE SECRETARY OF AGRICULTURE

FROM THE SECRETARY OF AGRICULTURE

TO THE SECRETARY OF AGRICULTURE

TO THE SECRETARY OF AGRICULTURE

TO THE SECRETARY OF AGRICULTURE

TO THE SECRETARY OF AGRICULTURE

RECEIVED
JAN 1 1914

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים

אל: אגף אכלוס ופרוגרמות

5.12.83

תאריך : 83/77933/83
 מספר

הנדון: הגדלת / הקטנת חוזה 83/77933/83

- העבודה - גדר בטחון
- המקום - שילת
- הקבלן - הדס - עבודות גידור בע"מ
- מהות השינוי - עבודות גוספות

343,640
 שקל ----- בסך
 2,700,000
 שקל -----
 3,043,640
 שקל ----- סייה

נא להגדיל את החוזה (הנדון) ערך החוזה עתה

א"ק 13905
ח"י
4.12.83

ההגדלה היא לצורך בצוע :-

- עבודות גוספות :
- 1. שער כביסה בוסף
- 2. צביעת גדר
- 3. עבודות עפר

עלות העבודות הנ"ל לפי הפירוט המצ"ב במחירי החוזה 2/83 - 343,640 שקל .
 ההתיקרויות יוגדלו בנפרד .

משרד השיכון	
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים	
מחוז המרכז	
ד"ר נגס	נתקבל בתאריך
1001-01-3	
לטיפול של	
לעיון של	

ב ב ר כ ה

[Signature]
 ר. קנטרובסקי

העתיקים : המרכז

מהנדס מחוז - הדס - עבודות גידור בע"מ, כפר סבא
 הקבלן -

ממונה על חוזים ומכרזים

חוזה מס. 83/77933/83

גדר בטחון ב- שילת

פירוט עבודות להגדלת החוזה

שקל 55,000

1. שער כביסה (בוסף) - 1 יח' $\times$ 55,000 ש' =

ש' 162,030

2. צביעת גדר - 3,000 מ"א $\times$ 54,01 ש' =

שקל 113,400

3. חפירת בורות עקב שינוי

של התוואי בגלל אי הסכמת ק.ק.ל.

(אגף היעור) - 540 מ"א גדר $\times$ 210 ש'

4. בודה שופל 955 לצורך שיפור התוואי -

ש' 13,210

10 ש"ע $\times$ 1321 ש'

ש' 343,640

סה"כ ההגדלה לפי מחירי בסיס

החוזה 2/83 -

התיקרויות יוגדלו בנפרד .

פירוט עבודות להגדלת החוזה

1. שער כביסה (בוסף) - 1 יח' $\times$ 55,000 ש' = שקל 55,000

2. צביעת גדר - 3,000 מ"א $\times$ 54,01 ש' = ש' 162,030

3. חפירת בורות עקב שינוי של התוואי בגלל אי הסכמת ק.ק.ל. (אגף היעור) - 540 מ"א גדר $\times$ 210 ש' שקל 113,400

4. בודה שופל 955 לצורך שיפור התוואי -

10 ש"ע $\times$ 1321 ש' ש' 13,210

סה"כ ההגדלה לפי מחירי בסיס החוזה 2/83 -

ש' 343,640

סך שילת עבודות להגדלת החוזה

התיקרויות יוגדלו בנפרד .

מדינת ישראל
 משרד הביטחון והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים

8
 13905
 1983
 4.12.83

8-13905-1983

תאריך

אל : גזברות המינהל

מאח: יחידת חוזים ומכרזים

מס' שינוי להתיקרות	2 הח/.....
-----------------------	---------------

83/77933/83

הנדון: הגדלת מסגרת תקציבית - התייקרויות-לחווה מס'

העבודה:

הקבלן:

נא להגדיל את המסגרת התקציבית - התייקרויות-לחווה הנ"ל, ההתייקרות מחושבת למעשה

עד לתאריך _____

1. סכום החוזה המקורי (ללא התיקרות) - שקל 2.168.000
2. הגדלות מצטברות ללא התיקרות - שקל 343.640
3. סה"כ - שקל 2.511.640
4. התייקרויות

א. למעשה עד תאריך _____ שקל _____

ב. הקצבה להקלת החובות - שקל 1.690.000

סה"כ החוזה - שקל 4.201.640

החוזה הקיים - שקל 3871.640

הגדלה - שקל 330.000

סעיף תקציבי: _____

השינוי בשקלים	סכום התייקרויות	
	הקיים ב-ש'	המחוקן ב-ש'
330.000	1.690.000	1.360.000

אישור אגף הפרוגרמות

חתימה: _____

ממונה על חוזים ומכרזים

פקודה יומן (גזברות)

חתימה

העתיקים:

יחידת חוזים ומכרזים

מהנדס מחוז

הקבלן: חס-עמלן א'ר גר, כפס-סבא

אגף חוזים ובטחונות - הסוכנות היהודית
 לגבי חוזים בסימול 39

תאריך: 20.12.83

סיכום פגישה

העבודה: גידור שילת

עבודה מס':

שהתקיימה: במשרד הבינוי, תל-אביב

ביום: 19.12.83

בהשתתפות: פ. זיידנפלד - ראש צוות משרד הבינוי

תמונה: למשתתפים

ב. פרקש - הקבלן "הדס"

ד. רגב - תאום פיקוח

הנושא: חן סופי

כהמשך לשיבה ולפרוטוקול מיום 3.11.83 ולאור הבעיות והעיכובים שנוצרו בשטח בתוראי החדש שנקבע לאור אי הסכמת ק.ק.ל. לשימוש בפס האש, ולאחר שחלק מהגדר (כ- 330 מטר) בוצעה בחודש נובמבר, אי לכך סוכם כי תוארך תקופת הביצוע המקורית לחודש ימים (במקום שבועיים שסוכמו בפרוטוקול מיום 3.11.83) וינתן מדד חודש נובמבר 1983 לחשבון הסופי של הקבלן.

נערך על ידי

אינג' ד. רגב



Page 1

1. 1950-1955

2. 1956-1960

3. 1961-1965

4. 1966-1970

5. 1971-1975

6. 1976-1980

7. 1981-1985

8. 1986-1990

9. 1991-1995
10. 1996-2000
11. 2001-2005
12. 2006-2010
13. 2011-2015
14. 2016-2020
15. 2021-2025
16. 2026-2030
17. 2031-2035
18. 2036-2040
19. 2041-2045
20. 2046-2050
21. 2051-2055
22. 2056-2060
23. 2061-2065
24. 2066-2070
25. 2071-2075
26. 2076-2080
27. 2081-2085
28. 2086-2090
29. 2091-2095
30. 2096-2100

31. 2101-2105

32. 2106-2110

33. 2111-2115

34. 2116-2120

35. 2121-2125

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז

תאריך: 3/12/1983

עבודה מס' 13905

אל: המשרד הראשי
הממונה על חוזים ומכרזים

מאת: מהנדס מחוז המרכז
הנדון: מכרז הטחון ה-ליפת.

הקבלן: חב' "פז" בע"מ
חווה מס' 9983 / 77933 / 83

רצוף בזה חשבון מס' 3 וסופי

על סך: 4,203,269.- שקלים

פחות תשלומים קודמים 3,528,000.- שקלים
(חשבונות חלקיים)

בברכה,

אברהם יוסף רזי
מהנדס מחוז המרכז

אינג' יעקב יצחק לזרסקו
מהנדס מחשב מחוזי

הערות:

אברהם יוסף רזי
היה לוקח חלק במכרז
המכרז, 18/12/83.

מדינת ישראל
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים
מחוז מרכז

נספח לחשבון סופי:

תיק עבודה מס' 13905

הנני מאשר כי החשבון הסופי עם הקבלן: חב' "פס" 09' חצ"ח

נבדק ע"י המשרד המפקח (שם המשרד המפקח):

ד. גל, מ. גל, חצ"ח

1. מס' החוזה עם הקבלן הוא: 83, 933, 9983

2. על העבודות: לצב הטחול

3. במקום: ליסא

ב ב ר כ ה,

א. י. רזי
מהנדס מחוז המרכז

חאריך 28/12/83

לכבוד

המינהל לבניה כפרית ויטובים חדשים

מחוז המרכז, תל - אביב

א.נ.

אני / אנו מעבירים לכם בזה את החשבון הסופי

ג' אדר ב' 5743

א/ר

77933/83

030

ע"ע עבור

במושב סג' ביישוב

לפי חוזה מס'

עם הטב'

הננו לאשר בזה שהחשבון הסופי המצורף נבדק על ידי/נו בהתאם
לתוכניות הביצוע והמיפרס הסכמי - על פי הביצוע בשטח -
ואפשר להעבירו לחשלוט.

במצורף, כל האיסורים והמיסמכים הדרושים לחשבון סופי, חתומים
ע"י הגורמים המוסמכים.

בכבוד רב,

הרוב מהנדסים בע"מ

תכנון, תאום, פיקוח

הנדסת בנין

סד' מנדלסון 12 ת"א,

טל. 454805

19/12/83

התייבה והותמט משרד המפקח

תאריך

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז

עבודות של קבלנים או מ. איזוריות
ישובים חדשים

מס' העבודה: 13905

אישור על גמר העבודה

המקום: ע"א
שם העבודה: שכר קלמון
מס' החוזה: 83/24933/83
שם הקבלן: ברק - רם - אל' צור ע"א
סוג העבודה ותאורה: ע"א / מע"מ

תאריך מסירת העבודה

למשרד הבינוי והשיכון: 5.11.83

כל העבודות בוצעו ונסתיימו במסגרת החוזה, לפי התכניות ולשביעות רצוננו.

הערות: א. הקבלן והשליח לתקן במבטא - מתקן שמים, סגירת מנורות אחת אחת, אסמט / נול, אחת שם באמצעים שונים, מתקן שם, השאר קולטאים
ב. 2 נול - אמצעי שם

סכום שהתקבל יואל עז 10.12.83

מאז שנקל, האים ה' הא/א - ר"ט
19/12/83

ד. רוב מהנוסים בע"מ
תכנון, תאום, פיקוח
בהנדסת בנין
ש. וורדאו 73 ת"א,
טל. 454825

חתימות:

- | | | | |
|--------|-----|-----------------|----------------------|
| חתימה: | שם: | 1) פיקוח: | א"א 3 רם |
| חתימה: | שם: | 2) הישוב: | השליח רם / א"א |
| חתימה: | שם: | 3) הקבלן: | הדס מנדוט גידור בע"מ |
| חתימה: | שם: | 4) ראש צוות: | "א"א 3 |
| חתימה: | שם: | 5) מהנדס המחוז: | ל קל |

300-1000

THE OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C.
20530

200-1000

200-1000

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז

עבודות של קבלנים או מ. איזוריות
ישובים חדשים

13905

מס' העבודה:

אישור על גמר העבודה

המקום:

שם העבודה:

מס' החוזה:

שם הקבלן:

סוג העבודה ותאורה:

תאריך מסירת העבודה

למשרד הבינוי והשיכון:

כל העבודות בוצעו ונסתיימו במסגרת החוזה, לפי התכניות ולשביעות רצוננו.

הערות:

חתימות:

(1) פיקוח: שם:

(2) הישוב: שם:

(3) הקבלן: שם:

(4) ראש צוות: שם:

(5) מהנדס המחוז: שם:

חתימה:

חתימה:

חתימה:

חתימה:

חתימה:

ד. רנב מהנדסים בע"מ
תכנון, תאום, פיקוח
בהנדסת בנין
ש"י פרשת 77 ת"א
45425570

19/12/83

א"ש 3.78

הס' ו/חמ' הכ"ס/מ"ס

ההדס/הכ"ס/מ"ס

ההדס/הכ"ס/מ"ס

ההדס/הכ"ס/מ"ס

ההדס/הכ"ס/מ"ס

* 100% Cigarettes
 * 100% Cigarettes
 * 100% Cigarettes
 * 100% Cigarettes

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

מרכז
 תאריך: 20.12.83
 עב' מס' 13905

המחוז ממליץ לתאריך את תקופת הביצוע לעבודה
 הנ"ל בחודש ימים (עד 04/11/83 בגלל תוספת
 עבודה ועכובים שנגרמו בקטע המערכי מאי-הסכמת
 קק"ל לתוואי.

א ל : ממונה על חוזים ומכרזים

מאת : מהנדס מחוז המרכז

מס' שינוי להתייחסות	הת/2....
------------------------	----------

הנדון : הגדלת מסגרת תקציבית - התייקרות החוזה מס' 83/77933/83

העבודה : הקמת גדר בטחון בשילת

הקבלן : הדס - עב' גידור בע"מ

נא להגדיל את המסגרת התקציבית-התייקרות לחוזה הנ"ל, ההתייקרות מחושבת למעשה עד
 לתאריך 11/83

1. חוזה מקורי לתאריך הבסיס (ללא התייקרות) - 2,168,000.- ש"ח

2. הגדלות מצטרפות ללא התייקרות - 560,000.- ש"ח

לפי מכתבנו מתאריך 14/11/83

3. סכום התייקרויות מצטרפות מאושרות

למעשה עד תאריך 11/83

לחשבון מס' סופי 1,821,467.- ש"ח

4. עלות העבודות שבוצעו ללא התייקרות,

לתאריך 11/83 2,381,000.- ש"ח

הרכב התייקרויות

השינוי בשקלים	סכום התייקרויות בשקלים	
	המתקן	הקיים
460,000	1,820,000	1,360,000

לוסיה:
 חוכר תחשיב התייקרויות

העתקים:

1.

2.

מנהל מחוז המרכז



3.11.83

מאריך

סיכום בגישה

גירור שילה

העבודה:

במשרד השיכון

שהתקיימה

2.11.83

כיום

למשתתפים

תכונה

א. שקרצי - סגן מהנדס המחוז, משרד הבינוי

כהשתתפות

פ. זיידנפלד - ראש צוות משרד הבינוי

לחיק

ב. פרקש - הקבלן, הדס

ד. רגב - תאום פיקוח

עבודות נוספות, לוח זמנים

הנושא

סוכם כדלקמן:

1. סוכם שישולם לקבלן עבור ביצוע חפירה בורח לעמודי הגדר בקטע שהחבטל בקו האש של ק.ק.ל., זאת בתנאי הגשת מכתב הסבר מהקבלן וניחוח מחירים המתבסס על סעיף הגדר שבחזקה. הניחוח יוגש על ידי הקבלן תוך יומיים, יברק ויאשר תוך שבוע מקבלתו.
2. עבור צביעת הגדר ישולם לקבלן לפי המחיר של משרד הבינוי כקרני שומרון.
3. שער נוסף - ישולם עבורו לפי מחירי חוזה.
4. על הקבלן לבצע קונצרטיונה כלבוד על גבי גדר קיימת ישנה אשר חשמש כגדר חדשה וסופית, בקטע הצפון מזרחי.
5. סוכם על תשלום 2 י"ע טרקטור שופל 950, עבור הפריצה הראשונית באיזור הוואדי, לפי מחיר משרד השיכון לק.ק.ל.
6. סוכם על בדיקת אפשרות ביצוע פריצת חוראי לגדר באיזור המערבי המיועד על ידי קבלן אחר (גסר נעים), באם לא יתאפשר הדבר, יבצע הקבלן הדס העבודה על ידי טרקטור, על חשבון עבודה זו ישולם כחשבון עבודות חודש אוקטובר 1 י"ע טרקטור שופל 950. עם התחלת העבודה יוזמן המפקח לקביעת החוראי.
7. מוסכם על הארכת תקופת הביצוע ~~השבועיים~~ ימים. ההתייקרויות לחשבון הסופי תהיה לפי מדר ~~אוקטובר~~ 83, זאת בשל תוספות עבודה ועיכובים שנגרמו בקטע המערבי מאי הסכמת ק.ק.ל. לחוראי. נערך על ידי

אנו, ד.רגב

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

מחוז: _____

תאריך: 7.12.83

משרד הבינוי והשיכון

13905.8.N

052 3259	44372	2/7	מפן (כולל מיקוד)	חור	שם החברה/הקבלן
טלפון					

שם המוח	שם הישוב
מכני	שילה
אוביקס	פרויקס

חשבון חלקי מס' לחוזה מס' 77933/83

_____ / _____ / _____

מאות העכודה _____

(חותמת קבלה
 גזברות)

היקפים	חוזה מקורי	הגדלות מצטרבות ללא התייקרות	התייקרויות מצטרבות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן				
לשמוש הגזברות	2.800,000.-			

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר: -

מס' סדר	בית מס'	מס' יחידות	מצב העכודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצוע מצטבר	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש גזברות
1			בצוע בוד לפי חוזה				2.320,705.-	2 114 010 ✓
2			התייקרות לפי מצ"ב					1 821 467 ✓
3			הוספות				211,765.-	267 792 ✓
4								
5								4 203 269 ✓
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים
 מחוז המרכז
 בתאריך: 21-12-1983
 נתקבל החשבון המסומן הזה
 ע"י מתקדם מחשב כמויות מחוזי

עכודת פתוח

תאריך

המיקרות מצטרבת עד תאריך
 19.12.83
 חכנון. תאום. פיקוח
 בהנדסת בנין
 שד' גורדאן ז"ל ת"א.
 טל. 454823

(חותמת)

סה"כ
 פחות חשבונות קודמים
 סה"כ לתשלום

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

4,203,269.-	

(ביול מעבר לדף)

סה"כ לזכות _____ שקל
 קרן בטוח _____ שקל
 סעיף תקציבי _____
 סך יומן _____

תסוזה:

- (1) גזברות (4)
- (2) מחוז
- (3) אגף חכנון והנדסת יחידת חורים
- (4) הקבלן

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתימה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	ר"ס/3		21.12.83
מחשב כמויות מחוזי	ביצוע	1/15/84		23-12-83
מהנדס המחוז	ביצוע	3078		28.12.83
פנהל חשבונות	תשלום			
מרכז בדיקת חשבונות	תשלום			

דף מס' _____ מתוך _____ דפים

נספח לחשבון מס' _____ חשבוני סופי _____ (סופי)

שם הקבלן _____ מס' החוזה 77933/83

מס' סודר	סעיף החוזה	תאור העבודה	הכמות לפי חוזה	הכמות למעשה	יחידה	מחיר	הסכום
1		בדר רשת	2800	2614 2711	מ"א	630	1.707,930.-
2		ברזל שטוח	2800	2614 2711	"	15	40,665.-
3		קונצרטניה	2800	2922 3019	"	90	271,710.-
4		שערי כניסה	2	3	יח'	55.000.-	165,000.-
		חוספות במחירי חוזה:					
5		חציבת בורות בקטע שבוטל		540	יח' מ"א	210	113,400.-
6		יום עבודת טרקטור + מ/ו/י		10	יח' ע"פ	1321	16,000.-
7		הובלת טרקטור לשטח		1			6,000.-
		הוספת לא לפי חוזה					2,320,705.-
7		צבע לפי קרני-אומרון		2614 2711		54,011.5	341,765.-
		סוף ע"פ נ/ס/מ - במחיר מוסכם					267,792
סכום במחירי מוסכם 6,5,7, נאם וסכומן המצויק 14/11/83 (פאבלס מח'מ)							
2,114,010 + 267,792 = 2,381,802.-							
סיה							

ד. רוב מהנדסים בע"מ
תכנון, תאום, פיקוח
בהנדסת בנין
סד' גורדאו נד"מ"א
טל. 454525

19/12/83
בדקתי את הכמויות

חתימה

שם ותפקיד

תאריך

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the middle of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located below the middle of the page.

Printed text at the bottom of the page, likely a footer or page number.

מחוז מרכז
לינקולן 3 ת"א
03/627611

גדר בטחון ✓
1. ע ב ו ר ה :
77933/83 ✓
2. חוזה מס' :
שילת ✓
1. מ ק ו ס :
13905 ✓
1. מ . ע . : 1

- | | | |
|------------|---------------------------|----|
| 2.83 ✓ | מחירי החוזה צמודים לחודש: | 5. |
| 9334.4 ✓ | מדד בסיסי | 6. |
| 4.9.83 ✓ | תאריך החלח עבודה | 7. |
| 2 חודש'ם ✓ | קופה כצו מאושר | 8. |

כצוץ מאושרת

2 חודשים

אם ס'בוק פ'טל מ'א'ת

4-11-83

אחוז היקרוה

סכום החיקרוה

חשבון חלקי מספר	חודשי ביצוע	היקף מצטבר של הביצוע (סעיפי חוזה בלבד)	היקף הביצוע להל חודש (סעיפי ביצוע בלבד)	מדר ידוע	אחוז החיקרום לכל חודש ביחס למדר בסיסי	סכום החיקרום
1 ✓	9.83 ✓	1.286,000 ✓	1.286,000 ✓	15031.4 ✓	61.03 ✓	784,846 ✓
2 ✓	10.83 ✓	2 097 150 ✓	811 150 ✓	17 651.2 ✓	89.10 ✓	722,735 ✓
3 ע'פ'	11.83 ✓ 4/	2 381 802 ✓	284 652 ✓	19 628.1 ✓	110.27 ✓	313,886 ✓
						1,821,467 ✓
				סה"כ החיקרום		

להנחית פיקוח
בנין, תאום, פיקוח
הנדסת בנין
101 נורדאו 73 ת"א,
טל. 454825

19/12/83

חח'מח המפקח

חתימה ראש הצוות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

19.12.83

לכבוד
 משרד השכון
 אגף לבניה כפרית
 מחוז מרכז
ת ל - א ב י ב

הנדון: ריכוז מדידה - גדר בשחון בשילת

השטח חולק לקטעים לפי א - ב. הפרוט נמצא במפה המצ"ב. המדידה
 בוצעה ברושטקה 50 מ"א וסומנה בפס אדום.

קטע א'	=	619 מ"א
" ב'	=	106 "
" ג' 1'	=	305 "
" ג' 2'	=	23 "
" ד'	=	542 "
" ה'	=	656 "
" ו'	=	363 "

סה"כ 2614 מ"א גדר רשת + קונצרטיונה

קטע ז'	=	183 מ"א
" ח'	=	125 "

סה"כ 308 מ"א קונצרטיונה ע"ג גדר ישנה

סכום:

שערים 3 יח' מ"א

גדר רשת 2614 מ"א

קונצרטיונה 2922 מ"א

הד"ס
 עבודות גידור בע"מ

לא/א/המ/א/ה/ה
 חתום מרצה בשלח

ד. רגב מהנדסים בע"מ
 תכנון, תאום, פיקוח
 בהנדסת בנין
 שדי נורמן דז ת"א,
 טל. 434828

5 1 0

RECEIVED - 1971 10 10

10 10 1971

FROM:

TO:

CC:

INFO:

DATE:

Subject: 1971 10 10 - 1971 10 10 - 1971 10 10

1. The following information is being provided for your information. It is being provided for your information.

1. 10 10 1971
2. 10 10 1971
3. 10 10 1971
4. 10 10 1971
5. 10 10 1971
6. 10 10 1971
7. 10 10 1971

2. The following information is being provided for your information.

1. 10 10 1971
2. 10 10 1971

3. The following information is being provided for your information.

1. 10 10 1971
2. 10 10 1971
3. 10 10 1971

10 10 1971

1. 10 10 1971
2. 10 10 1971
3. 10 10 1971
4. 10 10 1971
5. 10 10 1971

1. 10 10 1971

ה ד ס עבודות גידור בע"מ

לכבוד
משרד השכון
אגף לבניה כפרית
מחוז מרכז
ת ל - א ב י ב

הנדון: נתוח מחירים לחפירת בורות לקטע הגדר שבוסל

חפירת בורות (לפי מחיר מבוסס על מחיר החוזה).
היה צורך בחפירות אלו בגלל אי-הסכמת קק"ל, אגף היעור לחוואי.

מ"א 540 לפי 210 ש" = 113,400 שקל

במחירי חוזה!

מאשר מאמציה (ה')

ר. רוב מהנרסים בע"מ
תכנון. תאום. פיקוח
נהנדסת בנין
סד' גורדון 11 ת"א

נ.ב. מצ"ב נתוח מחירים מאשר 9.8.83

ה ד ס
עבודות גידור בע"מ

ב ב ר כ ה,

PTO

RECEIVED 1975 12 10

1975

1975 12 10

1975 12 10

1975 12 10

1975 12 10

1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10

1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10
1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10

1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10

1975 12 10

1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10
1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10

1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10

PTO
RECEIVED 1975 12 10

1975 12 10

1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10 1975 12 10

רד
ודות גידור בע"מ

נספח

ניתוח מחירים לחפירת בורות
למחירי חוזה

ארקע וזגג של 161

מחיר גדר רשת - 630 שקל/מ"ר	
1. רשת + תייל + עבל	= 80.- למ"א
2. עמוד + תמיכה	= 82.- "
3. בסון + הובלה	= 50.- "
4. עבודה בשטח סלע	= 360.- "
א4. מתוך זה חציבה בסלע	= 300.- 20

מחירי חפירת בורות
מחירי חפירת בורות
מחירי חפירת בורות

הרס
עבודות גידור בע"מ

מחירי חפירת בורות
מחירי חפירת בורות
מחירי חפירת בורות

תאריך: 11.12.83

סיכום פגישה

העבודה: גידור - שילח

עבודה מס':

בהתקיימה: באתר

כיום: 11.12.83

פ. זיידנפלד - משרד הבינוי

למשתתפים תכופה:

א. פרקש - נציג הקבלן

לתיק

יוחנן - נציג שילח

ד. רגב - תאום פיקוח

משרד השיכון

מינהל לגביית שירות ויישומים חדשים

מחוז המרכז

נחקבל בתאריך

ד"ר ג. ג. ג.

25-12-1983

לטיפולו של

לעיונו של

הנושא: בדיקות קבלה

לאחר סיום שנערך בחוואי הגדר סוכמו ההשלמות והתיקונים הבאים כתנאי לקבלה סופית כמפורט:

1. שיפור נעילת השערים על ידי ביצוע מחלה לפנעול בצד שני, הורדת שרורל העגינה לבריה בקרקע.
 2. סגירת המרווחים בין תחתית הגדר לקרקע במקומות שהמרווח עולה על 5 ס"מ, כולל השלמת פס מתכת תחתון במקומות שחסר וריחוכו מחדש במקומות שאינו מחובר.
 3. למלא בורות שנחפרו ונשארו ללא שימוש.
 4. צביעה מחדש של עמודי הגדר במקומות שהצבע פגום.
 5. מתיחת הגדר וסידור מרווחי חוט התיל העליון במקומות שונים.
- סוכם שכל התיקונים הנ"ל יושלמו עד 15.12.83.

מאשר: *הא"מ הנחל"מ ה"ל*
19/12/83

נערך על ידי

אינג' ד. רגב

1. 1000

2. 1000

3. 1000

4. 1000

5. 1000

6. 1000

7. 1000

8. 1000

9. 1000

10. 1000

11. 1000

12. 1000

13. 1000

14. 1000

15. 1000

16. 1000

17. 1000

תאריך: 3.11.83

סיכום פגישה

העבודה: גירור שילח

עבודה מס':

שהתקיימה: במשרד השיכון

2.11.83

כיום:

למשתתפים

תפוצה:

א. שקרצי - סגן מהנדס המחוז, משרד הבינוי

פ. זיידנפלד - ראש צוות משרד הבינוי

לתיק

ב. פרקש - הקבלן, הדס

ד. רגב - תאום פיקוח

הנושא: עבודות נוספות, לוח זמנים

סוכם כדלקמן:

1. סוכם שישולם לקבלן עבור ביצוע חפירת בורות לעמודי הגדר בקטע שהחבטל בקו האש של ק.ק.ל., זאת בתנאי הגשת מכתב הסבר מהקבלן וניתוח מחירים המתבסס על סעיף הגדר שבחווה. הניתוח יוגש על ידי הקבלן תוך יומיים, יבדק ויאושר תוך שבוע מקבלתו.
2. עבור צביעת הגדר ישולם לקבלן לפי המחיר של משרד הבינוי בקרני שומרון.
3. שער נוסף - ישולם עבורו לפי מחירי הרוה.
4. על הקבלן לבצע קונצרטניה בלבד על גבי גדר קיימת ישנה אשר חשמש כגדר חדשה וסופית, בקטע הצפון מזרחי.
5. סוכם על תשלום 1 י"ע טרקטור שופל 950, עבור הפריצה הראשונית באיזור הואדי, לפי מחיר משרד השיכון לק.ק.ל.
6. סוכם על בדיקת אפשרות ביצוע פריצה תוואי לגדר באיזור המערבי המיועד על ידי קבלן אחר (גסר נעים), באם לא יתאפשר הדבר, יבצע הקבלן הדס העבודה על ידי טרקטור, על חשבון עבודה זו ישולם בחשבון עבודות חודש אוקטובר 1 י"ע טרקטור שופל 950. עם התחלת העבודה יוזמן המפקח לקביעת התוואי.
7. מוסכם על הארכת תקופת הביצוע ~~המבוצעת~~ ימים. ההתייחסויות לחשבון הסופי תהיה לפי מדד אוקטובר 83, זאת בשל תוספות עבודה ועיכובים שנגרמו בקטע המערבי מאי הסכמת ק.ק.ל. לתוואי.

ד.רגב מהנדסים בע"מ
תכנון, תאום, פיקוח

ח' בכסלו תשמ"ד
14 נובמ' 1983
13905

א ל: אינג' ר. קנטרובסקי, ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: שילת - גדר בטחון
הקבלן: "חדש" - עבודות גידור בע"מ
הוצה מס': 9983/77933/83

טא להגדיל את החוזה שבנדון בסך - 560,000 שקל. ההגדלה נובעת מהצורך ליצור קשר בין הישוב הזמני עם ישוב הקבע, שיפור סביב הגדר, שפוח תוואי וגישה במקומות הקשים, לפי הפירוט הבא: -

(1) טער כניסה נוסף (לפי מחירי החוזה הנ"ל) בכדי ליצור קשר עם הישוב הזמני
יח' 1 55,000 55,000 שקל

(2) צביעה גדר (לפי מחיר עבודה דומה בקרני שומרון) בכדי לשפר את עמידותה המחיר שמופיע בקרני שומרון:-

42,5 ש"מ/מ"א לפי מדד 10/82 - 7348,3
מדד בסיסי של חוזה הנ"ל ל-2/82 - 9334,4

$$\frac{9334.4}{7348.3} = 1.271 \times 42,5 = 54,01 \text{ ש"מ/מ"א}$$

" 162,030 54,01 3000 שקל

(3) חפירת בורות (לפי מחיר מבוסס על מחיר החוזה הנ"ל). היה צורך בחפירות אלה בגלל אי הסכמת קק"ל, אגף היעור, לתוואי.

מ"א 540 210 113,400 שקל

(4) שופל 955 כולל הובלה (לפי מחיר של קק"ל) לצורך שיפור התוואי.
מחיר של קק"ל - 1194 ש"ש/ש"ע לפי מדד 3/83 - 9572,4
מדד בסיסי של החוזה הנ"ל 2/82 - 9334,4

$$\frac{9334.4}{9572.4} = 0.975 \times 1194 = 1164.1 \text{ ש"ש/ש"ע}$$

הובלה 156.9 ש"ש/ש"ע

סה"כ מחיר 1321.0 ש"ע

ולכן: ש"ע 10 1321 13,210 שקל

סה"כ 343,640 שקל

209,614 שקל

התיקרות התחלית
מדד 9/83 = $\frac{15031.4}{9334.4} \times 343,640 = 553,254$

553,254 שקל

6,746 שקל

סה"כ
ב.נ.מ.

560,000 שקל

סה"כ הגדלה

STATION 100+00 TO 100+50, 100+50 TO 101+00

STATION 100+00 TO 100+50
STATION 100+50 TO 101+00
STATION 101+00 TO 101+50

STATION 100+00 TO 100+50
STATION 100+50 TO 101+00
STATION 101+00 TO 101+50

STATION 100+00 TO 100+50, 100+50 TO 101+00, 101+00 TO 101+50
STATION 100+00 TO 100+50, 100+50 TO 101+00, 101+00 TO 101+50
STATION 100+00 TO 100+50, 100+50 TO 101+00, 101+00 TO 101+50

STATION 100+00 TO 100+50 (100+00 TO 100+50)
STATION 100+50 TO 101+00 (100+50 TO 101+00)

STATION 100+00 TO 100+50 (100+00 TO 100+50)
STATION 100+50 TO 101+00 (100+50 TO 101+00)

STATION 100+00 TO 100+50 (100+00 TO 100+50)
STATION 100+50 TO 101+00 (100+50 TO 101+00)

STATION 100+00 TO 100+50 (100+00 TO 100+50)
STATION 100+50 TO 101+00 (100+50 TO 101+00)

STATION 100+00 TO 100+50 (100+00 TO 100+50)
STATION 100+50 TO 101+00 (100+50 TO 101+00)

STATION 100+00 TO 100+50	100+00	100+50	100+00	100+50
STATION 100+50 TO 101+00	100+50	101+00	100+50	101+00
STATION 101+00 TO 101+50	101+00	101+50	101+00	101+50
STATION 100+00 TO 100+50	100+00	100+50	100+00	100+50
STATION 100+50 TO 101+00	100+50	101+00	100+50	101+00
STATION 101+00 TO 101+50	101+00	101+50	101+00	101+50
STATION 100+00 TO 100+50	100+00	100+50	100+00	100+50
STATION 100+50 TO 101+00	100+50	101+00	100+50	101+00
STATION 101+00 TO 101+50	101+00	101+50	101+00	101+50
STATION 100+00 TO 100+50	100+00	100+50	100+00	100+50
STATION 100+50 TO 101+00	100+50	101+00	100+50	101+00
STATION 101+00 TO 101+50	101+00	101+50	101+00	101+50

ב ב ר כ ה,

ח

אינג' י. רזי
מהנדס מחוז מרכז

10/3/80

העמק:
אינג' ש. רודניק, מנהל חאגף
מר ד. יצחקי, מנהל אגף פרוגרמות
אינג' א. שקרצי, ס/מהנדס המחוז לכצור
אינג' ס. זינזמלד, ראש צוות
אינג' ד. רגב, מפקח
חב' הדט, הקבלן

2 X 15 1/2

1000 1. 11
1000 1. 11

1000 1. 11
1000 1. 11
1000 1. 11
1000 1. 11
1000 1. 11
1000 1. 11

ח' בכסלו תשמ"ד
14 נובמ' 1983
13905

א ל: אינג' ר. קנטרובסקי, ממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: שילת - גדר בטחון
הקבלן: "הדס" - עבודות גידור בע"מ
חוזת מס': 9983/77933/83

מא להגדיל את החוזה שבנדון בסך 560,000 שקל. ההגדלה נובעת מהצורך ליצור קשר בין הישוב הזמני עם ישוב הקבע, שיפור טיב הגדר, שיפור תוואי וגישה במקומות הקשים, לפי הפירוט הבא: -

(1) שער כניסה נוסף (לפי מחירי החוזה הנ"ל) בכדי ליצור קשר עם הישוב הזמני יח' 1 55,000 55,000 שקל

(2) צביעת גדר (לפי מחיר עבודה דומה בקרני שומרון) בכדי לשפר את עמידותה המחיר שמופיע בקרני שומרון: -

42,5 ש"י/מ"א לפי מדד 10/82 - 7342,3
מדד בסיסי של חוזה הנ"ל ל-2/83 9334,4

162,030 " 54,01 3000 מ"א. מ"א 54,01 = 42,5 * 1.271 = $\frac{9334.4}{7342.3}$

(3) חפירת בורות (לפי מחיר מבוסס על מחיר החוזה הנ"ל). היה צורך בחפירות אלה בגלל אי הסכמת קק"ל, אגף היעור, לתוואי.

113,400 שקל 210 540 מ"א

(4) שופל 955 כולל הובלה (לפי מחיר של קק"ל) לצורך שיפור התוואי. מחיר של קק"ל - 1194 ש"ש/ש לפי מדד 3/83 9572,4
מדד בסיסי של החוזה הנ"ל ל-2/83 9334,4

$\frac{9334.4}{9572.4} = 0,975$ * 1194 = 1164.1 ש"ש/ש"ע

156.9 ש"ש/ש"ע הובלה

1321.0 ש"ע סה"כ מחיר

13,210 שקל 1321 10 ש"ע ולכן :

343,640 שקל סה"כ

209,614 שקל

התייקרות התחלית
מדד 9/83 $\frac{15031.4}{9334.4} = 343,640 \times 0.61 =$

553,254 שקל סה"כ

6,746 שקל ב.נ.מ.

560,000 שקל סה"כ הגדלה

=====

и др. работи по теоретически, практички и педагошки проблеми

of 1998

10000 : 10000 = 10000 : 10000

непр. "кто" - *какого цвета* "кто"

01/16/01: 23/22 77/2822

[illegible][illegible]

Q. Again, the fact that there were
cards sent to the card shop in connection

7-11-1944 - 10-11-1944 - 12-11-1944

10. nama orang yang akan datang ke
tempat kita akan. dia juga membawa
dan akan ke rumah kita, dan akan
datang.

4) What are the main types of...
...
...
...

$$\frac{0.250}{0.250} = 0.975 + 0.025 = 1.000 = 100\%$$

re der:

774 01 1951 015.71 650

TABLE 1. *Continued*

$$\text{arr } 2810 \frac{1.18081}{1.180} = 10.0 \times 0.242 =$$

6.8.4. 2005.3 2005

1998年12月15日

ב ב ר כ ה ,

אינג' י. ל. הזי
מהנדס מחוז / מרכז

העתק:
אינג' ש. דודניק, מנהל האגף
מר ד. יצחקי, מנהל אגף פרוגרמות
אינג' א. שקרצי, ס/מהנדס המחוז לבצוע
אינג' פ. זיידנפלד, ראש צוות
אינג' ד. רגב, מפקח
חב' הדט, הקבלן

SECRET

EXHIBIT 1
ORIGIN: [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]

8.11.83

א"כ.
אי"כ פ"י ז"צנפ"כ
ראש צוות - זני"ה כפ"ר
משרד הביטחון /השיטון

הנחיה: איצור ש"ח

כ"ח

בהתאם לצו"ש/ה ז"ח, ארזון פירוק הוצאה התקציבית
הנחיה לפעילות הנ"ל:

1. תמיכה ש"ח - לקשר עם הי"ש"ח המ"מ

ר"מ מחיר חו"ש: 55000 ש"ח

מ"מ 33 02 ס"ס חו"ש 9334.4

מ"מ 33 אוקטובר (מחש) 16173.8

95 150.-

מקצב צ"כ חו"ש = $\frac{1.73}{1.73 \times 55000}$

2. א"י ש"ח ש"ח כ"ח הוצאה - אישור מ"מ/ה"ש
ר"מ מחירון קיק"ה 1194.- ש"ח $\times 10 = 11940.-$

מ"מ 1983

צ"כ חו"ש (מחש) 16173.8 / 9572.4 = 1.69

22 000.-

$\begin{cases} 20179 = 11940 \times 1.69 \\ 1821 \end{cases}$ הוצאה

3. צ"ח ש"ח - אישור הש"ח, צו"ש/ה הפיק"ה.
ר"מ קר"י ש"ח/ח 42.50 ש"ח אוקטובר 82

מקצב צ"כ חו"ש = $\frac{2.20}{16173.8 / 73423}$

אוק"ה הוצ"ה 2450 מ"מ
= $42.50 \times 2.20 \times 2450$

230 000.-

4. חסימה ב/נ"ה בקטע של 200 מ' עקב אי היכרות
קיקי אמואלי.

אפי ניתנה מחירים של 100 מ' ע"י הקבלן
ולאחר שנסקצו 200 מ' - 210 מ' א"א. מחירי חו"ל
מקדם ערבון המצא א"א/ק"א (תמשי)

$$1.73 = 16173.8 / 9334.4$$

אורך הקטע כ 550 מטר

$$= 550 \times 210 \times 1.73$$

200000.- ש"ח

5. המיקרואיג א"א אומדן, בהערכה

1379000 אלפי מ"מ אחרון

1400000 תמשי 300 מ' א"א/מ"מ

1519000

1360000

אומדן

150000.-

2022/3/22

א"א ד.רגב

כ.כ.

א"מ פ. זימבליט

8.11.83

ראל בלוי - זניה כפרי

מלגת חינוך

הכנסות: ג'מור מלגה

א.י.

200000/200000 זכא
התקבלה הוצאה לפדיון ח"ל -

1. מסיבת שחר - לקראת חג המנוחות 96000

2. 1 י"ט שופר סוף חול, ראשון

ממלאי/ג'מור 22000

3. צעדה ג'מור - ראשון ליל, צעדה הפסח 22000

4. חגיגת חול/בלוי בקטל שולחן עקב או היסטרי

קיקי/ממלאי 200000

5. חגיגות חול/ממלאי, 200000

סה"כ: 688000

200000/200000
א"מ פ. זימבליט

172

173 2 27 1904

174 11 10 1904

175

176 12 10 1904

177 13 10 1904

178 14 10 1904

179 15 10 1904

180 16 10 1904

181 17 10 1904

182 18 10 1904

183 19 10 1904

184 20 10 1904

185 21 10 1904

186 22 10 1904

187 23 10 1904

188 24 10 1904

189 25 10 1904

190 26 10 1904

191 27 10 1904

192 28 10 1904

לכבוד

לר כני רחב

וויקווא 73 ת"ו

לואי דני צור האגודה איגוד אבאן אהמבאר האגודה
 9983/7933/83 אגודה בשאר כמכיל

סוי קאפאל 55555 ס' אגודה אגודה

אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה

2. יור זלדא אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה
 אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה

3. אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה

אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה
 אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה

4. אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה
 אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה

5. אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה



הדפוס. אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה אגודה

ה ד ס עבודות גידור בע"מ

נספח

ניתוח מחירים לחפירת בורות למחירי חוזה

מחיר גדר רשת - 630 שקל *ע"פ חוזה המקורי*

1. רשת + חייל + עגל = 80.- למ"א

2. עמוד + חמיכה = 82.- "

3. בסון + הובלה = 50.- "

4. עבודה בשטח סלע = 360.- "

4. מחוך זה חציבה בסלע = ~~380.-~~ " *2 10*

~~מחירי חפירת בורות~~
~~למחירי חוזה~~

ה ד ס
עבודות גידור בע"מ

*מחירי חפירת
סיכום שיחה*

*210 שקל/מ"א
2 מחירי חוזה*

9/11/85

נח ער

כפר סבא, רח' בוסל 3, טל. 052-32594

9-11-85

HTO

SECRET STATE DEPT

SECRET STATE DEPT

HTO

SECRET STATE DEPT

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז

תאריך: 13/11/1983

13905

עבודה מס'

אל: המשרד הראשי
הממונה על חוזים ומכרזים

מאת: מהנדס מחוז המרכז

הנדון: אגד בטחון ה-לילית

הקבלו: חב' "בצס" ח"א N

חווה מס' 83, 44933, 9983

רצוף בזה חשבון מס' 2 חלק' / 1001

על סך: 3,528,000.- שקלים

פחות תשלומים קודמים 2,321,850.- -

(חשבונות חלקיים)

ב ב ר כ ה ,

אינג' יוסף רוזי
מהנדס מחוז המרכז

אינג' מאורי ציו לזרסקו
מהנדס מחשב מחוזי

הערות:

תאריך 4.11.83

אל: מחוז

משרד הבינוי והשיכון

13905.8.N

הרס	עבודות גידור בע"מ	סמ התברה/הקבלן	חריז	מען (כולל סיקר)	טלפון
-----	-------------------	----------------	------	-----------------	-------

שם המחז	שם הישוב
מרכי	שיל"ת
אוביקס	פרויקט

לחווה מס': 9983/77933/83

חשבון חלקי מס' 2

/	/	/
---	---	---

מאות העברה דבר בשחור

היקפים	חווה מקורי	הגדלות מצטברות ללא התייקרות	התיקרויות מצטברות מאשרות	סה"כ	לשמוש הקבלן
לשמוש הגוברות				2,000,000	

להלן פירוט החשבון החלקי המצטבר: -

מס' סדר	בית מס'	מס' יחידות	מצב העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצוע מצטבר	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש גוברות
1			בצוע בדר לפי מערכת חוזת				2,097,150	
2			המייקרויות לפי מע"ב				1379,176	
3			חוממות:				452,000	
4							222,000	
5			לתשלום:					
6							3,698,326	
7								
8			לתשלום לפי סכום המוצא				3,528,000	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

--	--

--	--

(ביול מעבר לרף)

עבודת סתוח

התיקרות מצטברת עד תאריך

סה"כ

הרוב מהנזקים בע"מ
תכנון. תאום. פיקוח
נהנדסת בנין
סד' גורדאו נד"א
סל. 454825

סה"כ לתשלום

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

(חותמת)

הרס
עבודות גידור בע"מ
חתמת הקבלן

סה"כ לזכות שקל

קרן בסח שקל

סעיף תקציבי

סך יומן

תסוזה:

(1) גוברות (4)

(2) סחור

(3) אגף תכנון והנדסת יחידת חורים

(4) הקבלן

תפקיד	סוג האישור	שם המאשר	חתמה	תאריך
ראש צוות	ביצוע	11.11.83		
מחשב כמויות מחוז	ביצוע	13-11-83		
מהנדס המחוז	ביצוע	13/4/83		
פנהל חשבוניות	תשלום			
מרכז בדיקת חשבוניות	השלום			

1110
1110 1110 1110

1110
1110 1110 1110

1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110
1110 1110 1110

דף מס' _____ מתוך _____ דפים

נספח לחשבון מס' _____

שם הקבלן _____ הדס עבודות גור בע"מ מס' החוזה 9983/77933/83

מס' סודר	סעיף החוזה	תאור העבודה	הנחות לפי חוזה	הנחות למעשה	יחידה	מחיר	הסכום
1	1	גדר רשת	2800	2450	מ"א	630.-	1543,500.- 1,732,500.- 36,750.-
2	2	ברזל שטוח	2800	2450	"	15.-	41,250.- 238,500.- 265,500.-
3	3	קונצרטניה	2800	2450	"	90.-	265,500.-
4	4	שערי כניסה	2	3	יח'	55,000.-	165,000.- 113,400.- 2,204,350.-
		חציבה זווית בקטע שחור (א) (אם נמצא מח'ו אדום) (אם מח'ו חלף)		540	מ"א	210	2,097,150.-
		תוספות					
5		יום עבודת טרקטור שופל				22,000.-	22,000.-
6		חפירת בורות לפי פרט מצ"ב			מ"א	300.-	22,000.- 22,000.- 22,000.-
7		צבע מחיר קרני-פוטון (א) 42.5 x 2.2028			"	100.-	200,000.- 275,000.- 459,000.-
		סה"כ תוספות:					222,000.-

סה

בדקתי את הכמויות

6.11.83

חתימה

שם ותפקיד

תאריך

משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

מחוז מרכז
לינקולן 3 ת"א
03/627611

דף חישוב החיקרות

5. מחירי החוזה צמודים לחודש: 2.83 ✓
6. מדד בסיסי: 9334.4 ✓
7. תאריך החלח עבודה: 4.9.83 ✓
8. חקופת כצוע מאושרת: 2301/45 ✓

1. עבודת: גדר בטחון
2. חוזה מס': 77933/83
3. מקום: שילת
4. ס.ע.ס.: 13905

4-10-83 : נח

חשבון חלקי מספר	חודשי כיצוע	היקף מצטבר של הביצוע (סעיפי חוזה כלכר)	היקף הביצוע להל חודש (סעיפי ביצוע כלכר)	מדר ירוע	אחוז החיקרות לכל חודש ביחס למדר בסיסי	סכום החיקרות
1 ✓	9.83 ✓	1 286 000 ✓	1286 000 ✓	15 031.4 ✓	61.03 ✓	784 846 ✓
2	10.83	2 097 150 ✓	811 150 ✓	16 173.8 ✓	73.27 ✓	594 330 ✓
			(תחלית)			
						1,379,176 ✓

סה"כ החיקרות
13-11-83
2

חתימת המפקח
חתימת ראש הצוות

1

1888

1889

1890

1891

1892

1893

ה'ד ס עבודות גידור בע"מ

נספח

ניתוח מחירים לחפירת בורות
למחירי חוזה

ארקע העגג שלטל

מחיר גדר רשת - 630 שקל / מ"ר

- | | | | |
|-----|--------------------|---|----------------------|
| 1. | רשת + תייל + עבל | = | 80.- ש"ל מ"א |
| 2. | עמוד + תמיכה | = | 82.- " |
| 3. | בסון + הובלה | = | 50.- " |
| 4. | עבודה בשטח סלע | = | 360.- " |
| 4א. | מתוך זה חציבה בסלע | = | 300.- 210 |

מחירי ארץ סימל
שיעור 210,- ש"ל / מ"ר
2 מחירי מוסג

מחירי 210 ש"ל / מ"ר ארץ סימל

ה'ד ס
עבודות גידור בע"מ

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
מחוז המרכז

תאריך: 11/10/1983

13905

עבודה מס'

אל: המשרד הראשי
הממונה על חוזים ומכרזים

מאת: מהנדס מחוז המרכז

הנדון: אצטטטון ב-ל'ח'ת

הקבלו: חב' פכס "ח"ח"

חווה מס' 83 / 77933 / 9983

רצוף בזה חשבון מס' 1 / ח'ח'ת / פכס

על סך: 2,321,850 - שקלים

פחות תשלומים קודמים

(חשבונות חלקיים)

ב ב ר כ ה ,

אינג' יוסף רוז
מהנדס מחוז המרכז

אינג' מאורי ציו לזרסקו
מהנדס מחוזי

הערות:

3.10.83

תאריך

אל: מחוז

משרד הבינוי והשיכון

13905.8.נ

הדס עבודות גרור בע"מ	רח" בוסל 3, כפר-סבא, 44352	052/32594
שם החברה/הקבלן	חריז	מלפון
מען (כולל פיקוח)		

שם המכח	שם הישוב
מרכז	שילת
אוביקס	פרויקט

9983/77933/83 לחוזה מס' 1

חשבון חלקי מס' 1

/ /

גרר בסה"כ

מהות העבודה

(חותמת קבלה
גוברות)

היקפים	חוזה מקורי	הגדלות מצטרבות ללא התייקרות	התייקרות מצטרבות מאושרות	סה"כ
לשמוש הקבלן	2.700,000.-			
לשמוש הגוברות				

להלן פירוט החשבון החלקי המצטרב:

מס' סדר	בית מס'	מס' יחידות	מצב העבודה לפי סדר התשלומים	שלב י.ב.מ.	אחוז בצוע מצטרב	מחיר יחידה	סה"כ לבית	לשמוש גוברות
1			ביצוע גרר בסה"כ		✓	1 286 000	1.341,000.-	
2			התייקרויות		✓	945 853	#2	
3			תוספות		✓	90 000	178,880.-	
4					✓	2,321,853		
5						סה"כ:		
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12			ד. רור מהנדסים בע"מ					
13			תכנון, תאום, פיקוח נהנדסת בנין					
14			שד' גורדאור גז ת"א, 454825					
15								
16								

עבודת סתוח

התיקרות מצטרבת עד תאריך

תאריך

(חותמת)

הדס
עבודות גרור בע"מ
חתימה הקבלן

סה"כ

סחוט חשבונות קודמים
סה"כ לתשלום

לשימוש משרד הבינוי והשיכון

(ביול מעבר לדף)

סה"כ לזכות שקל

קרן בסח שקל

סעיף תקציבי

סך יומן

תסוזה:

(1) גוברות (4)

(2) סחוט

(3) אגף תכנון והנדסת יחידות חומים

(4) הקבלן

תאריך	חתימה	שם המאשר	סוג האישור	תסקיר
10.10.83		ל.ל.	ביצוע	ראש צוות
11-10-83		15058	ביצוע	מחשב כסויות מחוז
12/10/83			ביצוע	מהנדס המחוז
			תשלום	פנהל חשבונות
			תשלום	מרכז בדיקת חשבונות

U.S. 7000

UNCLASSIFIED INFO

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

RECEIVED

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

NAVY DEPT. C, DEPT. OF NAVY, SECRET

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

דף מס' מתוך דפים

נספח לחשבון מס' 9983/77933/83 חלקי סופי

9983/77933/83

הדס כבודות גדרו בע"מ

שם הקבלן

מס' החוזה

מס' סודר	סעיף החוזה	תאור העבודה	הנמכות לפי חוזה	הנמכות למעשה	יחידה	מחיר	הסכום
1	1	גדר רשת	2800	1600	מ"א	630.-	1,008,000.-
2	2	ברזל שטוח	2800	1600	"	15.-	24,000.-
3	3	קורצנטינה	2800	1600	"	90.-	144,000.-
4	4	שער כניסה	2	2	יח"	55,000.-	110,000.-
						סה"כ	1,341,000.-
		תוספות:				10,000.-	1,286,000.-
5		יום עבודה טרקטור + הובלה.			יח"	20,000.-	20,000.-
						סה"כ	1,528,880.-
6		צביעת הגדר לפי חוזה קובי שומרון.		1600	מ"א	99.3	158,880.-
		10/82 פ.א.א. 42.5				סה"כ כללי	1,528,880.-

ד. רגב מהנדסים בע"מ
תכנון, תאום, פיקוח
בהנדסת בנין
ש"ר מורדור 12 ת"א
טל. 454825

ס"ה

בדקתי את הכמויות

3.10.83

חתימה

שם ותפקיד

תאריך

THE UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF JUSTICE

1	1	and	and	and	and	and	and
2	2	and	and	and	and	and	and
3	3	and	and	and	and	and	and
4	4	and	and	and	and	and	and

and

5	5	and	and	and	and	and	and
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6	6	and	and	and	and	and	and
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D. C.

מחוז מרכז
לינקולן 3 ת"א
03/627611

✓ 2.83 ✓	5. מחירי החוזה צמודים לחודש:	✓ עבד ה:	✓ בדר בטחון
9334.4 ✓	6. מדר בסיסי	2. חוזה מס':	שילית
4.9.83 ✓	7. תאריך התחלת עבודה	3. מסקו:	ל' 8
1 ח' 30 ✓	8. תקופת כצוץ מאושרת	4. מסע:	13905

חשבון חלקי מספר	חודשי ביצוע	היקף מצטבר של הביצוע (סעיפי חוזה בלבד)	היקף הביצוע להל חודש (סעיפי ביצוע בלבד)	מדד ירוע	אחוז החייקרום לכל חודש כיחס למדר במסי	מכוס החייקרום
1 ✓	9/83 ✓	1,286,000.- ✓	1,286,000.- ✓	16199.9 ✓ <i>(תשלום)</i>	73.55 ✓	945853.-
						סה"כ החייקרום
						945853.- ✓

ד. רגב מהנרסים בע"מ
תכנון, תאום, פיקוח
בהנדסת בנין
סד' נורדאו 73 ת"א,
טל. 454825

חתימת המפקח

חתימת ראש הצוות

1947-48

1948-49

1949-50

1950-51

1947-48

1948-49

1949-50

1950-51

1951-52

1952-53

1953-54

1954-55

1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60

1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65

15/11/13

פרטי עבודה:

חלק ד

חומרים ופריטים שהוכאו לשטח					
סוג החומר/הפריט		מידה	כמות	סוג החומר/הפריט	

הערות המפקח

16-4.01 DDPO

לשבוע המסתחיל בתאריך

31/10/83

16/10/83

א פלח

מסטי עבודה: מנצח קולות, מנצח'ה מילר

מלך

ח ל ק ד

א פלח

— 454 —

1. **מסמך**

הקצון חמש מאות ושלשים אלף ושלשים מאות ושלשים אלף
(א' אלפים ב' אלפים ו' אלפים)

חלק ב

УДК 62-50

יומן עבודה

מדינת ישראל

משרד השיכון

15/10/83

ונגמר בתאריך

2/10/83

לשבוע המבחיל בתאריך

מספר חוות/החנה	שם החווה	שם המקום	שם הקבלן	מספר זמני	כס' מחוזות 'שוב' אוב'	מספרי המבנים:	מס' המפקח

פרטי עבודה: מצי כוללון מכלית מילון

יום בשבוע	מספר העובדים בשטח													סוגי עובדים				
	מנהל עבודה	חובב	מסנן	כוסף כרול	בנאי	טיח	רצף	נגר	מסנן	שרר	חשמל	צנע	ס"ה (13-2)	מנהל עבודה	ביוב	נקוי בני	נקוי המב' רש	עורן
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
א																		
ב																		
ג																		
ד																		
ה																		
ו																		

עבודות יומיות (רג"י) - סוגים ציוד וחומרים										חומרים ופריטים שהובאו לשטח									
יום בשבוע	מהות העבודה	מספר העובדים	מקצוע העובד	שעות העבודה	ס"ה	חומרים שהשתמשו	מידה	כמות	מחיר	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	מחיר	סוג החומר/הפריט	מידה	כמות	מחיר	סוג החומר/הפריט	מידה
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

הוראות לשכונת				הערות הקבלן				הערות ראש הצוות			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
15/10/83	16/10/83	17/10/83	18/10/83	15/10/83	16/10/83	17/10/83	18/10/83	15/10/83	16/10/83	17/10/83	18/10/83

הערות המפקח: אישור/הערה על העבודות הנעשות על ידי הקבלן, וכן על כל העבודות הנעשות על ידי הקבלן.

שם החותם	שם החותם	שם החותם	שם החותם
המפקח	המפקח	המפקח	המפקח
המפקח	המפקח	המפקח	המפקח
המפקח	המפקח	המפקח	המפקח

30/9/83

16/9/83

מ

פרטי עבודה: לדני בלמן מטבאמ וילאד מילאד

ה'תש"ח

חלק ד

Исход

Wed

used

used in

114

מדינת ישראל

משרד השיכון

לשכנע המתחיל בתאריך

ונגמר בתאריך

5/9/83

15/9/23

מספר חרזה/הזמנה	שם המהוו	שם הכקום	שם הקבלן	מספר חרזה	כס' מהזמס' ישוב כס' אוב'	מספר הסכמים
					כס' מהזמס' ישוב כס' אוב'	מספר הסכמים

פרטי עבודה: ארז קמחן מסמך ה'שלם שלם

[illegible]

ח ל ק ה

חלק ד

[illegible][illegible]

חומרים ופריטים שהובאו לשטח					
סוג החומר/הפריט	מידת	כמות	סוג החומר/הפריט	מידת	כמות

הערת ראש הצוות	הערות הקבלן	גיתן עיי ובתאריך	הוראות לשכנויים
4	3	2	1
	אצ'יטת בן/בית לשכנו בן/בית ולא/ליק הנכנס הבא/לי עברית ביום צ"י לוי/לי אליק הנכנס ובצד המזרחי		סוף על תלום וי"ץ שום חשבוני הנכנס/לכניס שום חשבוני באמצע -

הערות המפקח

[illegible]

שם החותם	שם החותם	שם החותם
הפקיד	הפקיד	הפקיד
האריך	האריך	האריך
החתימה כ"כ הקבלה	החתימה ראש הצוות	החתימה מפקד משטרת הסיכון

ה ד ס

עבודות גידור בע"מ

10.10.83
משרד השיכון
מחוז לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז תמז 3
תחנה גבול
10-10-83
למחלקת על
למחלקת על

לכבוד

משרד השכון

אגף לבניה כפרית

מחוז המרכז

לינקולן 3

ח ל - א ב י ב

הנדון: גדר בטחון בשילת. תקופת בצוע

בחווה הנ"ל תקופת הבצוע היא 30 יום. נבקשכם להגדיל תקופת הבצוע בעוד 45 יום וזאת מהנימוקים הבאים:

א. דומני שבטעות נקבעה תקופת בצוע של 30 יום, היות ובקרני-שומרון קיימת מחצית כמות הגדר לאותו מפרט ותקופת הבצוע היא 45 יום.

ב. בקטע מערבי ודרום מערבי הופסקנו בעבודה על-ידכם לאחר יותר משבועיים חציבה בשטח קשה וזאת בשל חלוקי דעות ביניכם ובין קק"ל ולא יכולנו להתקדם לפי תכנית עבודה רגילה.

ג. נחקלנו בשטח זה בסלע בלתי חדיר והתפוקה של צוות קומפרסור היא עשרה אחוז מאשר בסלע רגיל בשומרון.

ד. חודש ספטמבר היה רובו ככולו חודש חגים ולכן ימי העבודה היו מעטים.

נבקשכם להתחשב בכל הנ"ל ולהענות לבקשתנו.

בחורה ובכבוד רב,

100
100
100
100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

11.10.83

לכבוד
אינג' פ. ציידנפלד
משרד השיכון והבינוי
בניה כפרית
רחוב לינקולן 3
תל-אביב 65220

א.נ.י.

הנדון: גידור שילח.

אבקש להודיעך כי יש צורך להגדיל חוזה עבודות
הגידור לעבודות הבאות:

1. עבודת סרקטור
2. שער כניסה נוסף
3. צביעה הגדר
4. כ-250 מ.א. גדר

להערכת אומדן ההגדלה מסתכם בכ-450.000 שקל.

בכבוד רב,

אינג' ד. רגב

העחק:

אינג' י. רזי

THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
THE ARMY
WASHINGTON, D. C.

FOR THE RECORD

1. NAME
2. GRADE
3. POSITION
4. DATE

5. SIGNATURE

6. DATE

7. SIGNATURE

8. DATE

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

11.10.83

28/10/83

לכבוד
הוס - עבודות גידור בע"מ
רחוב בוסל 3
כפר סבא 44352

א.נ.,

הנדון: גידור שילת.

כהמשך לשיחתנו הטלפונית:

- א. אודיעך כי ק.ל. אינה מאשרת הצבת גור בחחום הפס נגד שריפות, ולאור הנ"ל ובהתאם למחואם עם מהנדס המחוז מר רזי, יש לבצע הגדר בהתאם לתוואי המקורי, כלומר בתוך האיזור המיועד.
- ב. לאור שיחתי עם מר רזי ולאחר שהסכמת עקרונית לפלס החוואי ולהכיננו לביצוע הגידור, נבקשך להגיש למשרד השיכון הצעתך לביצוע.

בכבוד רב,

אינג' ד. רגב

העתק:

אינג' י. רזי ✓

אינג' פ. זיידנפלד

23.10.83

לכב

גשר השיכון
י"ל. כפרית
מאז גרנו.הנני: הצדקת מאיר לפידת-זיך בשלם.
ג'צה - 933מאיר קוגלן אל פידת-זיך אל כ שמה
כיל חקירות חצים מניגון כ- סטאףמאיר קוגלן אל - ס - 555.555
אל כיל פידותיו.

F T W

EX-100 1957 1957

17

1957

הדס עבודות גידור בע"מ

11.10.83

לכבוד

משרד השכון

אגף לבניה כפרית

מחוז המרכז

לינוקלן 3

ח ל - א ב י ב

משרד העיכון

מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים

מחוז המרכז

נחקבל בתאריך

דאד נכנס

לשירות של

לשירות של

23/10/83

לשירות של

הנדון: גדר בטחון בשילת, חוזה מס. 9983/77933/83

עד היום טרם קבלנו אשור המשך עבודה בקטע הדרום מערבי.
להזכירכם כי עברו למעלה משלושה שבועות מהיום בו הוריתם
לנו להפסיק העבודות בקטע הנ"ל עקב ברורים עם קק"ל.

ב ב ר כ ה,

העתק: אינב" דני רגב, נורדאו 73, ח"א

הדס

~~עבודות גידור בע"מ~~

1997-1998

670

25716 2700 6200

DOI: 10.1002/eqe.1304

11.10.83

לכבוד
אינג' פ. זיידנפלד
משרד השיכון והכינוי
בניה כפריח
רחוב לינקולן 3
תל-אביב 65220

א.נ.,

הנדון: גידור שילת.

אבקש להודיעך כי יש צורך להגדיל חוזה עבודות
הגידור לעבודות הבאות:

1. עבודת סרקטור
2. שער כניסה נוסף
3. צביעת הגדר
4. כ-250 מ.א. גדר

להערכתך אמדן ההגדלה מסתכם בכ-450.000 שקל.

בכבוד רב,

אינג' ד. רגב

העתק:

אינג' י. רזי

28.01.77

SECRET
REF: G. 100-1000
REF: 100-1000
REF: 100-1000
REF: 100-1000
REF: 100-1000

U.S.

REF: 100-1000

REF: 100-1000
REF: 100-1000

1. 100-1000
2. 100-1000
3. 100-1000
4. 100-1000

REF: 100-1000

SECRET

REF: G. 100-1000

SECRET
REF: G. 100-1000

11.10.83

לשם
לעיון
של

לכבוד

הדס - עבודות גידור בע"מ

רחוב בוסל 3

כפר סבא 44352

א.נ.נ.

הנדון: גידור שילח.

כהמשך לשיחתנו הטלפונית:

א. אודיעך כי ק.ק.ל. אינה מאשרת הצכת גדר בחתום הפס נגד שריפות, ולאור הנ"ל ובהתאם למחואם עם מהנדס המחוז מר רזי, יש לבצע הגדר בהתאם לתוראי המקורי, כלומר בחוף האיזור המיוער.

ב. לאור שיחתי עם מר רזי ולאחר שהסכמת עקרונית לפלס התוראי ולהכיננו לביצוע הגידור, נבקש להגיש למשרד השיכון הצעתך לביצוע.

במכור רב,

אינג' ד. רגב

העחק:

אינג' י. רזי

אינג' פ. זיידנפלד ✓

ה ד ס

עבודות גידור בע"מ

לכבוד

משרד השכון

אגף לבניה כפרית

לינקולן 3

ח ל - א ב י ב

הנדון: חוזה מס. 9983/77933/83 - גדר בסחון

בשילת

נבקשכם לדאוב להגדלת החוזה הנ"ל:

א. כ- 320 מ"א גדר

ב. שער כניסה נוסף

ג. עבודת טרקטור

ד. צביעת הגדר

ה. עדכון המדד

נודה לכם באם תטפלו בעניין בהקדם על -מנת שנוכל לקבל את
מלוא תמורת החשבון החלקי הבא ובכלל.

ב ב ר כ ה,

העמק: אינג' ד. רגב, נורדאו 73, ת"א

ה ד ס

עבודות גידור בע"מ

קרן קימת לישראל

מינהל פיתוח הקרקע

אגף היעור, חבל המרכז אשכול, ד. נ. שמשון - טל. בית שמש 4-02913961 מיקוד 99775

3100/831

ה' חשוון תשמ"ד

12/10/1983

לכבוד

א. נג', פ. זיידנפלד

ראש צוות משרד השכון

רח' לינקולן 3

ח.ל. - א.ב.ב.

א.נ.;

הנדן: גידור בשילח

למען הסדר הטוב ולשמירה היעור שלנו בלי בעיות של גידור, העלול להפריע בעתיד לשמירה ולטיפול ביעור, אני מבקש שהגדר חוקם בגבול הישוב כמתוכנן ולא 100 מטר מערבית להוואי המתוכנן.

בכבוד רב,

מרדכי יוח

מנהל חבל המרכז.

המשרד הראשי

קרן קימת לישראל
בית הקהיל, רחביה
ת. ד. 265 - ירושלים
טלפון 02-635261
מיקוד 91002

הסניפים:

מפרץ-חיפה

קרית-חי
ת. ד. 45
טל. 04-729171
מיקוד 20103

חיפה

רחוב אלנבי 22
ת. ד. 1547
טל. 04-527096
מיקוד 31014

צ.פ.ת

בית הקהיל
ת. ד. 1157
טל. 067-71958
מיקוד 13111

י.ק.נ.ע.ם

בית הקהיל
ת. ד. 04-993118
מיקוד 20600

ג.י.ל.ת

בית הקהיל
דאר נע הנגב
טל. 057-23070
מיקוד 85410

באר-שבע

רח' המסתדרות 112
ת. ד. 057-77890
טלפון 84209
מיקוד

יכוד

מקבל בתאריך

24-10-1983

לשם של

לשם של

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10017

NO. 1
100 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

100 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.
100 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.
100 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

100 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.
100 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.
100 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y.

100 FIFTH AVENUE

2002

משרד התקשורת

משרד השיכון

מנהל לבנייה פדרית וישובים חדשים
מחוז המרכז

נתקבל בתאריך

מברק

12-10-53

[illegible]

משרד התקשורת

מברק

רחוב לינקולן 3, ת"א

למכילום

מר מ. רוח, מנהל חבל-

קרו קיימח לישראל

משתלח אשתאול

ממשך לשיחתינו עם מר עמרם אלקובי ברצוננו לחזור ולהבהיר כי עקב תוואי גדר מתוכנן בישוב שילת נאלץ לעקור מספר רב של עצים בחורש בצדו המערבי של הישוב. ניתן להמנע מעקירת חלק מהחורש אם יורשה לנו לבצע את תוואי הגדר בקו-אש הנמצא כ-100 מ' מערבית לתוואי המתוכנן.

ברצוננו לחזור ולהדגיש שאין לישוב שילת ולנו כל תביעה לגבי שטח זה והק"קל יכולה לעשות בשטח זה כל מה שהיא צריכה הן מבחינה בטיחותית והן מבחינה יעריית.

כמו כן אנו מחייבים להשאיר שער שרוחבו 6 מ' לתבססת גישה מהירה בין שני חלקי היער.

בכבוד רב

ובברכת מועדים לשמחה

העתקים :

אויבג' י. רזי, מהנדס -

מחוז מרכז

אינג' פ. זיידנפלד

ראש צוות

אינג' ד. רגב - פקוח

לוטת: סקיצה של השטח

XX+

1947

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948


1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948

1947-1948



לכבוד
אינג' י. רזי
מהנדס מחוז המרכז
רחוב לינקולן 3
תל-אביב 65220

א.נ.י.

הנדון: גידור שילת.

למרות התקדמות עבודתי לתאום ופיקוח על עבודות הגידור בשילת, סרם קיבלתי הזמנתכם בכתב לעבודות הגידור, זאת למרות בקשותי החוזרות מכם במשך החודשים האחרונים.

בינתיים אישרתי חשבון מס' 1 של הקבלן על סכום כ-80% מכלל החוזה ואף הגשתי חשבוני במקביל לכך אך חוששני שבהעדר ההזמנה הפורמלית יתעכבו התשלומים המגיעים לי ואחר כך יהיה עלי לדרוש הצמדה.

אבקשכם לספל בנושא בדהיפות.

בכבוד רב,

אינג' ד. רגב

העתק:

אדריכל ב. גרינברג - אדריכל המחוז, תל-אביב
אינג' פ. זיידנפלד - משרד הבינוי, תל-אביב
מיכאל רון - משרד הבינוי, ירושלים

שילת
תכנית כללית
1:1000

גבול
חלק גבול עם ישראל



22.9.22
ד"ר יעקב יעקובסון

התכנית נכנסה לתוקף



א-1 - אזור כפר + קונצרטי
 5, 4 - קונצרטי נקבצ א גל אזור יאנה

הרס
 עבודת גילוי בעים

ד. רוב סוף סוף נעים
 תכנון חאט, מוקד
 גמרית בני
 סינרטיק 20 ביט
 2000

הערה: תכנית כללית זו היא למידע כללי
 בלבד ואין להתייחס לצורה, מידות וגבהים
 של הכבישים.

500
 1.1
 3

11.10.83

לכבוד
אינג' י. רזי
מהנדס מחוז המרכז
רחוב לינקולן 3
תל-אביב 65220

א.נ.,

הנדון: גידור שילת.

למרות התקדמות עבודתי לחאום ופיקוח על עבודות הגידור בשילת, טרם קיבלתי הזמנתכם בכחב לעבודות הגידור, זאת למרות בקשותי החוזרות מכם במשך החדשים האחרונים.

בינתיים אישרתי חשבון מס' 1 של הקבלן על סכום כ-80% מכלל החוזה ואף הגשתי חשבוני במקביל לכך אך חוששני שבהעדר ההזמנה הפורמלית יתעכבו התשלומים המגיעים לי ואחר כך יהיה עלי לדרוש הצמדה.

אבקשכם לספל בנושא כרוחפות.

בכבוד רב,

אינג' ד. רגב

הערת:

אוריכל ב. גרינברג - אוריכל המחוז, תל-אביב
אינג' פ. זיידנפלד - משרד הבינוי, תל-אביב ✓
מיכאל רון - משרד הבינוי, ירושלים

SECRET

NOV 1950

CONFIDENTIAL

NOV 1950

NOV 1950

CONFIDENTIAL

NOV 1950

CONFIDENTIAL

NOV 1950

NOV 1950

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

מדינת ישראל
משרד הביטחון והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

תאריך 1.11.1983

השרד
לשם
לכנייה
סחור
נחשב
1983-11-8

מס' שינוי להתיקרות	הח/.....1
-----------------------	-----------

83/77933/83

הנדון: הגדלת מסגרת חקציבית - התייקרויות-לחוצה מס' 83/77933/83
העבודה: שיל - 1/10/83
הקבלן: כס - 03 - צמח/א/ר/כ/ר

נא להגדיל את המסגרת החקציבית - התייקרויות-לחוצה הנ"ל, ההתייקרות מחושבת למעשה עד לתאריך 1.10.83.

1. סכום החוצה המקורי (ללא התיקרות) - שקל 2.168.000
2. הגדלות מצטברות ללא התיקרות - שקל _____
3. סה"כ - שקל _____
4. התייקרויות - שקל _____

- א. למעשה עד תאריך 1.10.83 שקל 945.850
- ב. הקצבה - שקל 414.150
- סה"כ החוצה - שקל 1.360.000

- א. למעשה עד תאריך 1.10.83 שקל 3528.000
- ב. הקצבה - שקל 2.700.000
- סה"כ החוצה - שקל 828.000

השינוי בשקלים	סכום התייקרויות	
	הקיים ב-ש'	המתוקן ב-ש'
828000	1.360.000	532.000

ממונה על חוזים ומכרזים

פקודת יומן (גזברות) _____
חתימה _____

העתיקים:
יחידת חוזים ומכרזים
מהנדס מחוז המרכז
הקבלן כס - 03 - צמח/א/ר/כ/ר כס' סכ' 317

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 ויישובים חדשים

מרכז
 תאריך: 24.10.83
 עב' מס' 13905

א ל : ממונה על חוזים ומכרזים
 מאת : מהנדס מחוז המרכז

מס' שינוי להתיקרות	הח/...1....
-----------------------	-------------

הנדון: הגדלת מסגרת תקציבית - התיקרויות לחוזה מס' 83/77933/83

העבודה: הקמת גדר בטחון בשילח
 הקבלן: הדס - עב" גידור בע"מ


נא להגדיל את המסגרת התקציבית-התיקרות לחוזה הנ"ל, ההתיקרות מחושבת למעשה עד לתאריך 10/1983.

1. חוזה מקורי לתאריך הבסיס (ללא התיקרות) - 2,168,000.- שקל
2. הגדלות מצטברות ללא התיקרות - שקל
3. סכום ההתיקרויות מצטברות מאושרות למעשה עד תאריך 10/1983 945,853.-
4. עלות העבודות שבוצעו ללא התיקרות, לחשבון מס' - שקל 1,286,000.-

הרכב התיקרויות

השינוי בשקלים	סכום התיקרויות בשקלים	
	המתקן	הקיים
414,853	945,853	532,000

לוטסה:
 חומר תחשיב התיקרויות

חתימה: 
 מהנדס מחוז המרכז

העתקים:
 1. אינג' פ. זיידנפלד, ראש צוות
 2. ד. רגב - פקוח

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים

תאריך 5.7.83

חוזת מספר
9983/77933/83

א ל: הגזברות
 מאח: ראש המינהל לבנייה כפרית וישובים חדשים
 נא להפעיל חוזת בנייה
 במקום: שילת
 ע"י חדט, עבודות גזר בע"מ

פירוט הביניה	ערך החוזת בשקלים
גדר בטחון	2.700.000
סך הכל	2.700.000

סעיף תקציבי: 90.60.012/14-9040

עבודות פיתוח ותשתיות

לוטת: הנמקה למסירת העבודה לקבלן.
 רשימת כמויות ומחירים
 מ.ב.כ/81

י. טגלית
 ראש המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים

העתיקים:

מר ר. קנטרובסקי, ממונה על חוזים ומכרזים
 הממונה על הפעלת הבנייה
 מהנדס המחוז
 אגף חוזים ובטחונות, הסוכנות היהודית חל-אביב
 לגבי חוזים בסימול 39 בלבד

חוזה מ

9983/77933/83

029158

חוזה זה נערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנה 1983

ב י ו

תמסלה ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון שחקרא להלן "הממשלה", מצד אחד

ל ב י ו

הדס, עבודות גדר בעמם שיקרא להלן "הקבלן", מצד שני.

הואיל והממשלה רוצה בביצועו של המבנה, היינו גדר בשחון בשילח

וקבלה את הצעתו של הקבלן מיום 13.3.83 לביצוע המבנה, תמורת סך 2.700.000 שקלים

(במילים

שני חלכון ושבע מאות אלף שקלים

או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן

המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה

(א) הצעתו של הקבלן.

(ב) תנאי החוזה לבצוע מבנה ע"י הקבלן

(ג) תנאים מיוחדים.

(ד) מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית

(ה) תוספות ושנויים למפרט הכללי לעבודות בנין ולאוספי המדידה והתשלום.

(ו) הצהרות הקבלן על טיב ועל אי חדירת רטיבות וקונדנסציה.

(ז) ח כ נ י ו ח.

(ח) כתב הכמויות והמחירים ו/או התיאורים הטכניים למבנים.

(ט)

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה, מחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל מחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תהיה כתובת הקבלן:

רחו בוסל 73, כפר סבא

ולראיה באו הצדדים על החתום בתיאור ודעיל, כאן

ב י ו ביום _____ לחודש _____ שנה _____

חתימת הקבלן

חתימת הממשלה

עד לחתימה

עד לחתימה: חתימתו

שמו

שמו

כתובתו

כתובתו

הדס
עבודות גידור בע"מ

1110
1110 1110 1110

גדר בטון בגובה גילת - כמב כמית

סעיף	תאור	יח' הערכת כמות	מחיר יח'	סה"כ
4	הקמת גדר רשת בכל סוגי קרקע כולל סלע ואספקת כל החומרים הדרושים. וכל לפי הפרוט בסעיף 1 של המפרט הטכני	מ"א	2,800	1.764.000
2	אספקה וריתוך ברזל שטוח 5/20 ס"מ לפי סעיף 2 מהמפרט הטכני	מ"א	2,800	42.000
	אספקה והקמת קונקרטינה מעל גדר רשת. הכל לפי סעיף 6 מהמפרט הטכני	מ"א	2,800	252.000
1	ייצור, אספקה והרכבה של שער 6 מ' רוחב+ פישטש ברוחב 1.00 מ'. המחיר כולל אספקת החומרים, יצור, דובלור, הרכבה, הפירו וביטון היסודות וכן כל הוצאות הנזכרות הדרושות לביצוע העבודה.	יח' 2	55000	110.000

2.168.000

בסיס האח"ל'ק: פברואר 1983
תקופת הבצוע - 1 חודש.

דף ריכוז

לעבודה - גדר בטחון במושב שילת

2.168.000 שקל

1. גדר בטחון - סה"כ

" 532.000

ע"ח התיקרויות

2.700.000 שקל

סה"כ

בסיס המחירים - פברואר 1983

תאריך 12.4.83

158/82
פרק 33 (מסלול) / מסלול

תנאי חשום לעבודות חשית/פתוח

עבודות
חשום מים וביוב

עבודות
פיתוח וכבישים

100%

100%

1. עם התקדמות העבודה לפי
חשונות חלקיים מאושרים

1482 1483

2. בסיס המחירים -

3. מכל החשומים יש לנכות לקרן ביטוח פועלי הבנין בהתאם לסוג העבודה:

א. לעבודות מים, ביוב, חשום - 3%.

ב. לעבודות פתוח וכבישים - 2%.

4. הוצאות בדיקות החומרים יחולו על הקבלן בסכום עד 1.5% מערך העבודות.

5. חקופת הבצוע - חודשים.

126W

5029158

9983/77933/83

חוזה מ

חוזה זה נערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנה 1983

כ י ו

הממשלה ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד השיכון סחקרא להלו "הממשלה" מצד אחד

ל ב י ו

הדס, עבודות גזר בעמם _____ סיקרא להלו "הקבלו" מצד שני.

הואיל והממשלה רוצה בניצוצו של המבנה היינו _____ גזר בשחון בשולח

וקבלה את הצעחו של הקבלו מיום 13.3.83 לביצוצ המבנה תמורת סך 2.700.000 שקלים

(במילים) _____ שני מליון ושבע מאות אלף שקלים

וא, כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה.

שני הצדדים יודי הסכם כדלהלו

וללהלו יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה

(א) הצעחו של הקבלו

(ב) תנאי החוזה לבצוע מבנה ע"י הקבלו

(ג) תנאים מיוחדים

(ד) מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית

(ה) תוספות ושנויים למפרט הכללי לעבודות בנין ולאופני המדידה והתשלום

(ו) הצהרות הקבלו על טיב ועל אי חדירת רטיבות וקונדנסציה.

(ז) ח כ נ י ו ח

(ח) כתב תכנון והמחירים ו/או התיאורים הטכניים למכנים

(ט)

2. תמורת תשלום שכר החוזה כמסכם בחוזה, מתחייב הקבלו לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.

3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלו כאמור לעיל מתחייבת הממשלה לשלם לקבלו את שכר החוזה כמסכם בחוזה.

4. לצורך חוזה זה תהיה כתובה הקבלו:

כמו כנסל דג, כפר סבא

ולראיה באו הצדדים על החתום בחארי ו לעיל, כאן

נ ב י ו ס לחודש שנה

חתימת הממשלה	חתימת הקבלו
עד לחתימה:	עד לחתימה:
שמו	שמו
כתובתו	כתובתו

גדר בטחון במו"מ - כמב כמ"מ

סעיף	תאור	יח' וערכת כמות	מחיר יח'	סה"כ
4	הקמה גדר רשת בכל סוגי קרקע כולל אלע וזספקת כל החומרים הדרושים. וכל לפי הפרוט בסעיף 1 של המפרט הטכני	מ"א 2,800	630	1.764.000
2	אספקה וריהוט ברזל שטוח 5/20 ס"מ לפי סעיף 2 מהמפרט הטכני	מ"א 2,800	15	42.000
	אספקה והקמה קונצרטיונה מעל גדר רשת. הכל לפי סעיף 6 מהמפרט הטכני	מ"א 2,800	90	252.000
1	ייצור, אספקה והרכבה של שער 6" ורוחב פישפש ברוחב 1.00 מ'. המחיר כולל אספקת החומרים, יצור, רובל, הרכבה, חפירו וביטון היסודות וכן כל הוצאות הנזכרות הדרושות לביצוע העבודה.	יח' 2	55000	110.000
				2.168.000

בסיס המחיר: פברואר 1993
תקופת הבצוע - 1 חודש

דף ריכוז

לעבודה - גדר בטחון במושב שילת

2.168.000 שקל

1. גדר בטחון - סה"כ

532.000 "

ע"ח התיקרויות

2.700.000 שקל

סה"כ

בסיס המחירים - פברואר 1983

תאריך 12.4.83

תנאי השלום לעבודות השתיח/פתוח

עבודות
חשמל מים וביוב

עבודות
פיחוח וכבישים

100%

100%

1. עם החקירות העבודה לפי
חשבונות חלקייה מאושרים

2. בסיס המחירים -

3. מכל החשלוטים יש לנכות לקרן ביטוח פועלי הבנין בהתאם לסוג העבודה:

א. לעבודות מים, ביוב, חשמל - 3%.

ב. לעבודות פתוח וכבישים - 2%.

4. הוצאות בדיקות החומרים יחולו על הקבלן בסכום עד 1.5% מערך העבודות.

5. חקופת הבצוע - חודשים.

13905
יבסולן 33 ב'א
20.9.1983
למניח
2.10.83

20.9.1983

לסאב'ל'ס

מר מ. רוח, מנהל חבל-
היעור - מרכז
קרן קיימת לישראל
משטלת אשחאול

תממשך לשיחתיו עם מר עמרם אלקובי ברצוננו לחזור ולהבהיר כי עקב תוואי גדר מתוכנן בישוב שילת נאלץ לעקור מספר רב של עצים בחורש בצדו המערבי של הישוב. ניתן להגמיע מעקירת חלק מהחורש אם יורשה לנו לבצע את תוואי הגדר בקו-אש הנמצא כ-100 מ' מערבית לתוואי המתוכנן.

ברצוננו לחזור ולהדגיש שאין לישוב שילת ולנו כל תביעה לגבי שטח זה והק"ק יכולה לעשות בשטח זה כל מה שהיא צריכה הן מבחינה בטיחותית והן מבחינה יצרנית.

כמו כן אנו מתחייבים להשאיר שער שרוחבו 6 מ' להבטחה גישה נחירה בין שני חלקי היער.

ובברכת מועדים לשמחה

העיוקים :

אינג' י. רזי, מחנך -
מחוז מרכז

אינג' פ. זיידנפלד
ראש צוות

אינ' ד. רגב - פקוח
לוטת: סקיצה של השטח

XXX-4

NO 1

THE 1st BATTALION

NO 2

THE 2nd BATTALION

NO 3

THE 3rd BATTALION

NO 4

NO 5

NO 6

NO 7

THE 1st BATTALION
THE 2nd BATTALION
THE 3rd BATTALION
THE 4th BATTALION
THE 5th BATTALION
THE 6th BATTALION
THE 7th BATTALION
THE 8th BATTALION
THE 9th BATTALION
THE 10th BATTALION

THE 11th BATTALION
THE 12th BATTALION
THE 13th BATTALION
THE 14th BATTALION
THE 15th BATTALION
THE 16th BATTALION
THE 17th BATTALION
THE 18th BATTALION
THE 19th BATTALION
THE 20th BATTALION

THE 21st BATTALION
THE 22nd BATTALION
THE 23rd BATTALION
THE 24th BATTALION
THE 25th BATTALION
THE 26th BATTALION
THE 27th BATTALION
THE 28th BATTALION
THE 29th BATTALION
THE 30th BATTALION

THE 31st BATTALION
THE 32nd BATTALION
THE 33rd BATTALION
THE 34th BATTALION
THE 35th BATTALION
THE 36th BATTALION
THE 37th BATTALION
THE 38th BATTALION
THE 39th BATTALION
THE 40th BATTALION

THE 41st BATTALION
THE 42nd BATTALION
THE 43rd BATTALION
THE 44th BATTALION
THE 45th BATTALION
THE 46th BATTALION
THE 47th BATTALION
THE 48th BATTALION
THE 49th BATTALION
THE 50th BATTALION

תאריך: 1.9.83

סיכום פגישה

העבודה: גידור שילת

כיום: 31.8.83

שהתקיימה: באתר

תכופה: י. רזי

פ. זיידנפלד - ראש צוות משרד הבינוי

למשתתפים

י. הכס - שילת

נ. שמעוני - שילת

ב. פרקש - הקבלן


ד. רגב - תאום פיקוח

הנושא: קביעת תוואי, כירורים.

1. נערך סיור רגלי לאורך התוואי ובהתאם לתנאים שנתגלו ולאפשרויות כהתחשב בגישה ובמכשולים, נקבע תוואי מוסכם, על דעת כולם כולל נציגי המושב.
2. סוכם על ביצוע עבודות הכשרה על ידי סרקטור קסן, 1 יום עבודה.
3. נציגי היישוב יתאמו עם המפקח והקבלן מיקום שערים.
4. נציגי היישוב יקבלו הסכמת הצבא (קחל"ר) לגבי התוואי לאורך הדרך בואדי מצפון ליישוב.

נערך על ידי

אינג' ד. רגב



מ. קליין, מנהל

18/9/83

1977-1978

1979

1. 1979-1980 - 1980 (1980-1981) - 1981

2. 1980 - 1981

3. 1981 - 1982

4. 1982 - 1983

5. 1983 - 1984

1985-1986, 1987-1988

1. 1985-1986 - 1986 (1986-1987) - 1987
2. 1986 - 1987
3. 1987 - 1988
4. 1988 - 1989
5. 1989 - 1990

1991-1992

1993-1994

הוסיף לוי שמק"ל

ה'תש"ג

19.9.1983
אמרי

50905
לוי
9.9.83

לכבוד

אני מדברי כוח

אשרי המבוא

המשלך למעמדי עם מי דאגה אלקיבי בבידעני אמרי
והבבית ב' אקב תמאי שני מתוכן בילע שילע נאלי
זקני מסכס ב' ב' אקב בתום בצבא האקבי ב' הילע
נמן אהמע אקביי חלק אהמיר אה וילע לני
אבצ אה תמאי פשני בקו-אט קאמצא כ' סאמי
אקביי תמאי מתוכן.
בידעני אמרי והבבית שני אילע שילע ב' וילע ל
תפא אבצ אה כ' ופקק יילא אקביי ב' סאמי
כ' אה אה אקביי ב' אהמיר ב' יילא וילע אהמיר
יילא

אני ב' אה אהמיר אהמיר אהמיר אהמיר
אבצ אה אהמיר אהמיר אהמיר אהמיר

ס' אהמיר אהמיר

אבצ אהמיר אהמיר

ה'תש"ג
נ'י
304?

ב'תש"ג
אבצ אהמיר
אבצ אהמיר
אבצ אהמיר

1225
121
8135

1225 121
6.7" 1225

מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון
 המינהל לבנייה כפרית
 וישובים חדשים
 מחוז המרכז

28-883

תאריך:

- ר ש ו ס -

מספר:

מספר:

צו התחלת עבודה

לכבוד

חל. כנס
 052-84436
 א.נ.,

נא להתחיל בעבודה : צו התחיל

ה מקום : חל
 חוזה מס' : 77933/83

תאריך התחלת העבודה נקבע ליום : 4/9/83

בדבר פרטים נוספים, נא לפנות לראש הצוות צו התחיל במשרדנו,
 בין השעות 09.00 - 14.00, ברחוב קרליבך 23, ת"א. טל' 8 - 7 - 26 32 28.

הערות נוספות:

1. חל. כנס
2. צו התחיל

בכבוד רב,

אינג' י. דזי
 מהנדס מחוז מרכז

העתק:

אינג' ר. קנטרובסקי, ממונה על חוזים ומכרזים
 אינג' א. שקרצי, ס/מהנדס המחוז לבצוע
 אינג' מ. לזרסקו, מהנדס מחשב מחוזי
 גב' ת. קליכמן, ע/טכנית למנהל האגף
 גזברות

ראש הצוות : צו התחיל
 משרד המפקח : צו התחיל

8-8-77

NY

Mr. C. J. ...
11 - 1000-410
1000-410

see also

1000-410
1000-410
1000-410

very small case ...
1000-410



...
...
...

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לבנייה כפרית
וישובים חדשים

סמך
13/4/83
2/83
מ.ב.כ.ל.
חאריד

א ל: מהנרס מחנ

מאח: הממונה על חוזים ומכרזים

הנדון: חומר סכני להפעלת חוזה

.....מקום - מ.ס.מ.

העבודה - 232... 111

בהתאם להחלטה ועדת מכרזים מחוזית/ארצית/עירונית חופעל העבודה הנ"ל

באמצעות הקבלן ד"ר יצחק אבידור

רצ"כ חומר טכני להפעלת החוזה בהתאם לפרוט שהוגש במכתבך מס'

מתאריך 5.3.2012

העבודה כוללת:

30 116.1.24.1

עלות:

(r 2.165000...

.....

.....

2.4.532000

₹. 27.00.00.0.

סה"כ

1945-1946

1. כפרט וכתב כמויות.

2. סדר רשומים

1953 7 K 1722.2. p. 2: M. S. 2.62 .3

03101 - X. 300. 1000. 1

אין להפעיל הביצוע ללא חוזה חתום ומבויל

ב ב ר כ ה.

ממונה על חוזים
ומכרזים

הערה:

1. מרידה (1949) ... הממונה על הבניה ב-

[illegible]

..... 158/82 3

גדר בטחון בנתיב אילת - כתב כמויות

סעיף	תאור	יח' כמות	מחיר יח'	סה"כ
4	הקמת גדר רשת בכל סוגי קרקע כולל סלע ואספקת כל החומרים הדרושים. הכל לפי הפרוט בסעיף 1 של המפרט הטכני	מ' א	2,800	630 1.764.000
2	אספקה וריתוך ברזל שטוח 5/20 ס"מ לפי סעיף 2 מהמפרט הטכני	מ"א	2,800	15 42.000
	אספקה והקמת קונצרטיונה מעל גדר רשת. הכל לפי סעיף 6 מהמפרט הטכני	מ"א	2,800	90 252.000
1	ייצור, אספקה והרכבה של שער 6"מ' רוחב פישפש ברוחב 1.00 מ'.	יח' 2	55000	110.000
	המחיר כולל אספקת החומרים, יצור, רובלה, הרכבה, חפירו וביטון היסודות וכן כל הוצאות הנזכרות הדרושות לביצוע העבודה.			
				2.168.000

בסיס האה"ל ק"י: פברואר 1983
תקופת הבצוע - 1 חודש.

דף ריכוז

לעבודה - גדר בטחון במושב שילת

שקל 2.168.000

סה"כ - 1. גדר בטחון

" 532.000

ע"ח התיקרויות

שקל 2.700.000

סה"כ

בסיס המחירים - פברואר 1983

תאריך 12.4.83

158/82 קדמא סור פלמין גיטל

תנאי שלום לעבודות השתייה/פתוח

עבודות
חשמל מים וביוב

עבודות
פיתוח וכבישים

100%

100%

1. עם החקדמות העבודה לפי
חשבונות חלקייה מאושרים

1482 3333

2. בסיס המחירים -

3. מכל החשלומים יש לנכות לקרן ביטוח פועלי הבנין בהתאם לסוג העבודה:

א. לעבודות מים, ביוב, חשמל - 3%.

ב. לעבודות פתוח וכבישים - 2%.

4. הוצאות בדיקות החומרים יחולו על הקבלן בסכום עד 1.5% מערך העבודות.

5. תקופת הבצוע - חודשים.

13905
 10.12.77
 י"ט בכסלו תשמ"ג
 5 בדצמבר 1982

אל : אינו ד. קנטרובסקי, ממנה על חוזים ומכרזים

הודון: מכרז לגדר בשהון בישוב שילה

אבקשך להוציא מכרז לביצוע גדר בשהון בישוב הנ"ל בהתאם לכתב הכמויות והוכניות מצ"ב.

עלות העבודה לגדר רשת בלבד - 2,000,000 שקלה נכון לנובמבר 1982.

רשתות הקבלנים המומלצים על ידינו :

- (1) חיצוב סחר ופתוח בע"מ - דה' נהפני 40 ת"א טל' 624292
- (2) אבן טל בע"מ
- (3) אחיב פרקש
- (4) חב' גדר ופתוח בע"מ -
- (5) רשת רמון בע"מ
- (6) סר' קצ'א'נ'

קבלנים נוספים נא להוסיף מרשימותיכם.

הקופה הבצוע המומלצת - 1 חודש.

בברכה,

אינו י. דני
מהנדס מחוז מרכז

4

הערות:

- מר י. מרוליה, ראש המינהל
- אינו ש. רודניק, מ"מ מנהל האופ
- מר ד. יצחקי, מנהל אופ אכלוס ופרוגרמות
- אינו ד. בלכר, ממנה על עבודות בטחוניות = בהתאם לסך וס' בע"מ איתן י"א
- אינו א. שקרצי, ס/מהנדס המחוז לבצוע
- אינו פ. זיידנפלד, ראש צוות
- אינו רוב, נורדאו 73 ת"א 62381

לוסר: 7 סטים של תוכניות + כתב כמויות

גדר בטחון במושב שילת - כתב כמויות

סעיף	תאור	יח' הערכת כמות	מחיר יח'	סה"כ
1	הקמת גדר רשת בכל סוגי קרקע כולל סלע ואספקת כל החומרים הדרושים. הכל לפי הפרוט בסעיף 1 של המפרט הטכני	מ"א	2,800	
2	אספקה וריתוך ברזל שטוח 5/20 ס"מ לפי סעיף 2 מהמפרט הטכני	מ"א	2,800	'
3	אספקה והקמת קונצרטיונה מעל גדר רשת. הכל לפי סעיף 6 מהמפרט הטכני	מ"א	2,800	
4	ייצור, אספקה והרכבה של שער עץ רוחב+ פישפש ברוחב 1.00 מ'. המחיר כולל אספקת החומרים, ייצור, הובלה, הרכבה, הפירה וביטון היסודות וכן כל ההוצאות הנוספות הדרושות לביצוע העבודה.	יח'	2	

הקופת הבצוע -1 חודש .

Date	Time	No.	Name	Age	Sex
Date	Time	No.	Name	Age	Sex

1. 1. 1971 10.11.1971
 2. 1. 1971 10.11.1971
 3. 1. 1971 10.11.1971

1. 1. 1971 10.11.1971

4. 1. 1971 10.11.1971
 5. 1. 1971 10.11.1971

4. 1. 1971 10.11.1971

6. 1. 1971 10.11.1971
 7. 1. 1971 10.11.1971

6. 1. 1971 10.11.1971

8. 1. 1971 10.11.1971
 9. 1. 1971 10.11.1971

8. 1. 1971 10.11.1971

10. 1. 1971 10.11.1971
 11. 1. 1971 10.11.1971
 12. 1. 1971 10.11.1971

גדר בטחון במושב שילת - בתב כמיות

סעיף	תאור	יה' הסדנה כמחיר כמות יה'	סה"כ
1	הקמת גדר רשת בכל סוגי קרקע כולל סלע ואספקת כל החומרים הדרושים. הכל לפי הפרוט בסעיף 1 של המפרט הטכני	מ"א 2,800 500	1,100,000
2	אספקת וריהוט ברזל שטוח 5/20 ס"מ לפי סעיף 2 מהמפרט הטכני	מ"א 2,800 32	89,600
3	אספקת והקמת קונצרטיות מעל גדר רשת. הכל לפי סעיף 6 מהמפרט הטכני	מ"א 2,800 100	280,000
4	יצור, אספקת והרכבה של שער פח' רוחב+ פישפש ברוחב 1.00 מ'. המחיר כולל אספקת החומרים, יצור, הובלה, הרכבה, הפירה וביטון היסודות וכן כל ההוצאות הנספחות הדרושות לביצוע העבודה.	יה' 2 30,000	60,000

1,829,600

סה"כ

270,400

ע"ה המיוקרות ושונות כ- 15%

שקל 2,000,000

סה"כ

בסיס המחירים לפי אוקטובר 1982

הקופת הבצוע 1- חודש .

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

[illegible]

108

מפרט טכני לביצוע גדר ביטחון
גדר רשת + גדר דו-שיפועית יחידה

סעיף 1: גדר רשת

הקמת גדר רשת כוללת:

א. עמודים מברזל זווית $45 \times 45 \times 5$ מ"מ באורך כללי של 3.0 מ' ובמרחק 3.0 מ' זה כזה, מבוטן 55×5 מ"מ בחור כ'ונס בקוטר 30 ס"מ ועומק 60 ס"מ.

ב. 45 הס"מ העליונים מכופפים כלפי חוץ בשיפוע $1/5^0$, זווית הנוסף באורך 45 ס"מ מרוחק באותו מקום ב- 45^0 כל פי פנים.

ג. בכל עמוד שלישי ובכל סיבוב: וספות חמיכות אלכסוניות של הברזל זווית $45 \times 45 \times 5$ מ"מ באורך כללי 1.65 מ', מבוטנות בכלונס בקוטר 40 ס"מ ועומק 65 ס"מ.

ד. בין העמודים פרושה רשת מגולבנת $50 \times 50 \times 2.5$ מ"מ, המחוזקת ע"י 5 חוטים מגולבנים בקוטר 3 מ"מ, ואשר שניים מהם, העליון והתחתון, עשויים חוט דוקרני מגולבן.

ה. מעל לרשת בקצה המכופף ובקטע הנוסף, ימתחו 3 חוטי תייל דוקרני מגולבן בכל צד. 6 חוטי התייל ימתחו במרחקים המצויינים כתוכנית. את התיילים יש לקשור אל כל עמוד באמצעות חוטי קשירה אשר ילפפו את העמוד בנקודת האחיזה, ושני קצותיו ישוחרר פעמים אחדות באמצעות טבעת מתאימה, כדי ליצור חיבור חזק המבטיח את התייל הדוקרני בפני ניתוק מהעמוד או חזונו לאורכו. חוטי התייל יהיו מגולבנים ובמשקל של 90 עד 100 גרם למ"א, ועליהם יורכבו 12 עד 13 עוקצים לכל מ"א.

ו. בחלק התחתון של הרשת יש לרתך ברזל שטוח בעל חתך $5/20$ מ"מ, מושחל בכל עין בשורה שמעלהתחתונה, ומוותך לכל אחד מעמודי הגדר והתמוכות האלכסוניות לכל אורך שטחי המבוע.

ז. ברזלי הזווית והברזל השטוח יצבעו בצבע יסוד ופעמיים צבע שמן.

סעיף 3: גדר דו-שיפועית יחידה

הקמת גדר דו-שיפועית יחידה: ווללת:

א. פיזור עמודי זווית $40/40/4$ באורך 1.80 מ' כ"א, במרחקים 3.5 מ' בין עמוד לעמוד ומבוטנים 60 ס"מ בכלונס $\phi 30$, וזמק 65 ס"מ, כל עמוד שלישי.

ב. פיזור והקמת יחדות 40/40/4 ראוור 60 ס"מ כ"א במרחקים של 3.5 מ', בין יחידות, בין כל שני עמודי זווית ובמרחק 1.60 מ' לשני צידי ציר הגדר.

ג. מחיצת 5 חוסי חייל מגולבן אופקיים, בין עמודים בגבהים 10 ס"מ, 40, 75, 95 ו-120 ס"מ מעל הקרקע.

ד. מחיצת חייל מגולבן משופע מראש העמוד אל יחד לשני צידי הגדר לרל אורכה, ולפי פרטי התוכנית.

ה. מחיצת 5 חוסי חייל מגולבן אופקיים על כל שיפוע בגבהים 15 ס"מ, 40, 70, 90 ו-110 ס"מ מעל הקרקע, סה"כ 10 חוסים אופקיים על השיפועים.

ו. הכנת 4 חורים 7 ס"מ בלבד בעמודים הניתבים עבור מתקן אזעקה, מרחק החורים החל מקצה העליון הם : 50 ס"מ. את החורים יש להכין מהצד החיצוני של הזווית והקווים על העמודים חייבים להיות קווים ישרים.

ז. ~~צביעה על הנוצות בציב יסוד ופעמים צבע שמן.~~

סעיף 4 : ש ע ר

הקמת שער כולל :

א. השער יבוצע לפי פרטי תוכנית 3034, ויהיה דו כנפי ברוחב 6.0 מ' וגובה 2.3 מ' מעל לקרקע. ~~השער יבוצע בציב יסוד ופעמים צבע שמן.~~

ב. העמודים הראשיים מצינורות פלדה 6" מגורים בחלקם העליון, ומבוכנים בכלונח כעומק שלא יקטן מ-3.2 מ'.

ג. רנפי השער יהיו משלד צינורות 2" ϕ , ומוסות ברזל עגול 14 מ"מ ϕ כל 12 ס"מ המושחזים בחלקט העליון, וחוסי חייל דוקרני.

ד. צירי, בריחים ומגרים, ונקודת עיגון במרכז.

ה. התחברות לגדר הרשת.

ו. השער יצבע בצבע יסוד ופעמים צבע שמן.

טעיף 5 : קונצרטיונה

בצד הפנימי של הגדר זהו שיפועית תוכנס קונצרטיונה אחת (לפעמים גם מצד החיצוני של גדר זו שיפועית).


קונצרטיונה עשויה מחוט פלדה 5 מ"מ אורך המחיצה 15 מ' ϕ 22 - 21 ק"מ.

6840 : קונצרטיונה

קונצרטיונה אחת עשויה מחוט פלדה 5 מ"מ אורך המחיצה 15 מ' ϕ 22 - 21 ק"מ.

קונצרטיונה אחת עשויה מחוט פלדה 5 מ"מ אורך המחיצה 15 מ' ϕ 22 - 21 ק"מ.

ע 737 א + 738 13' ע 171

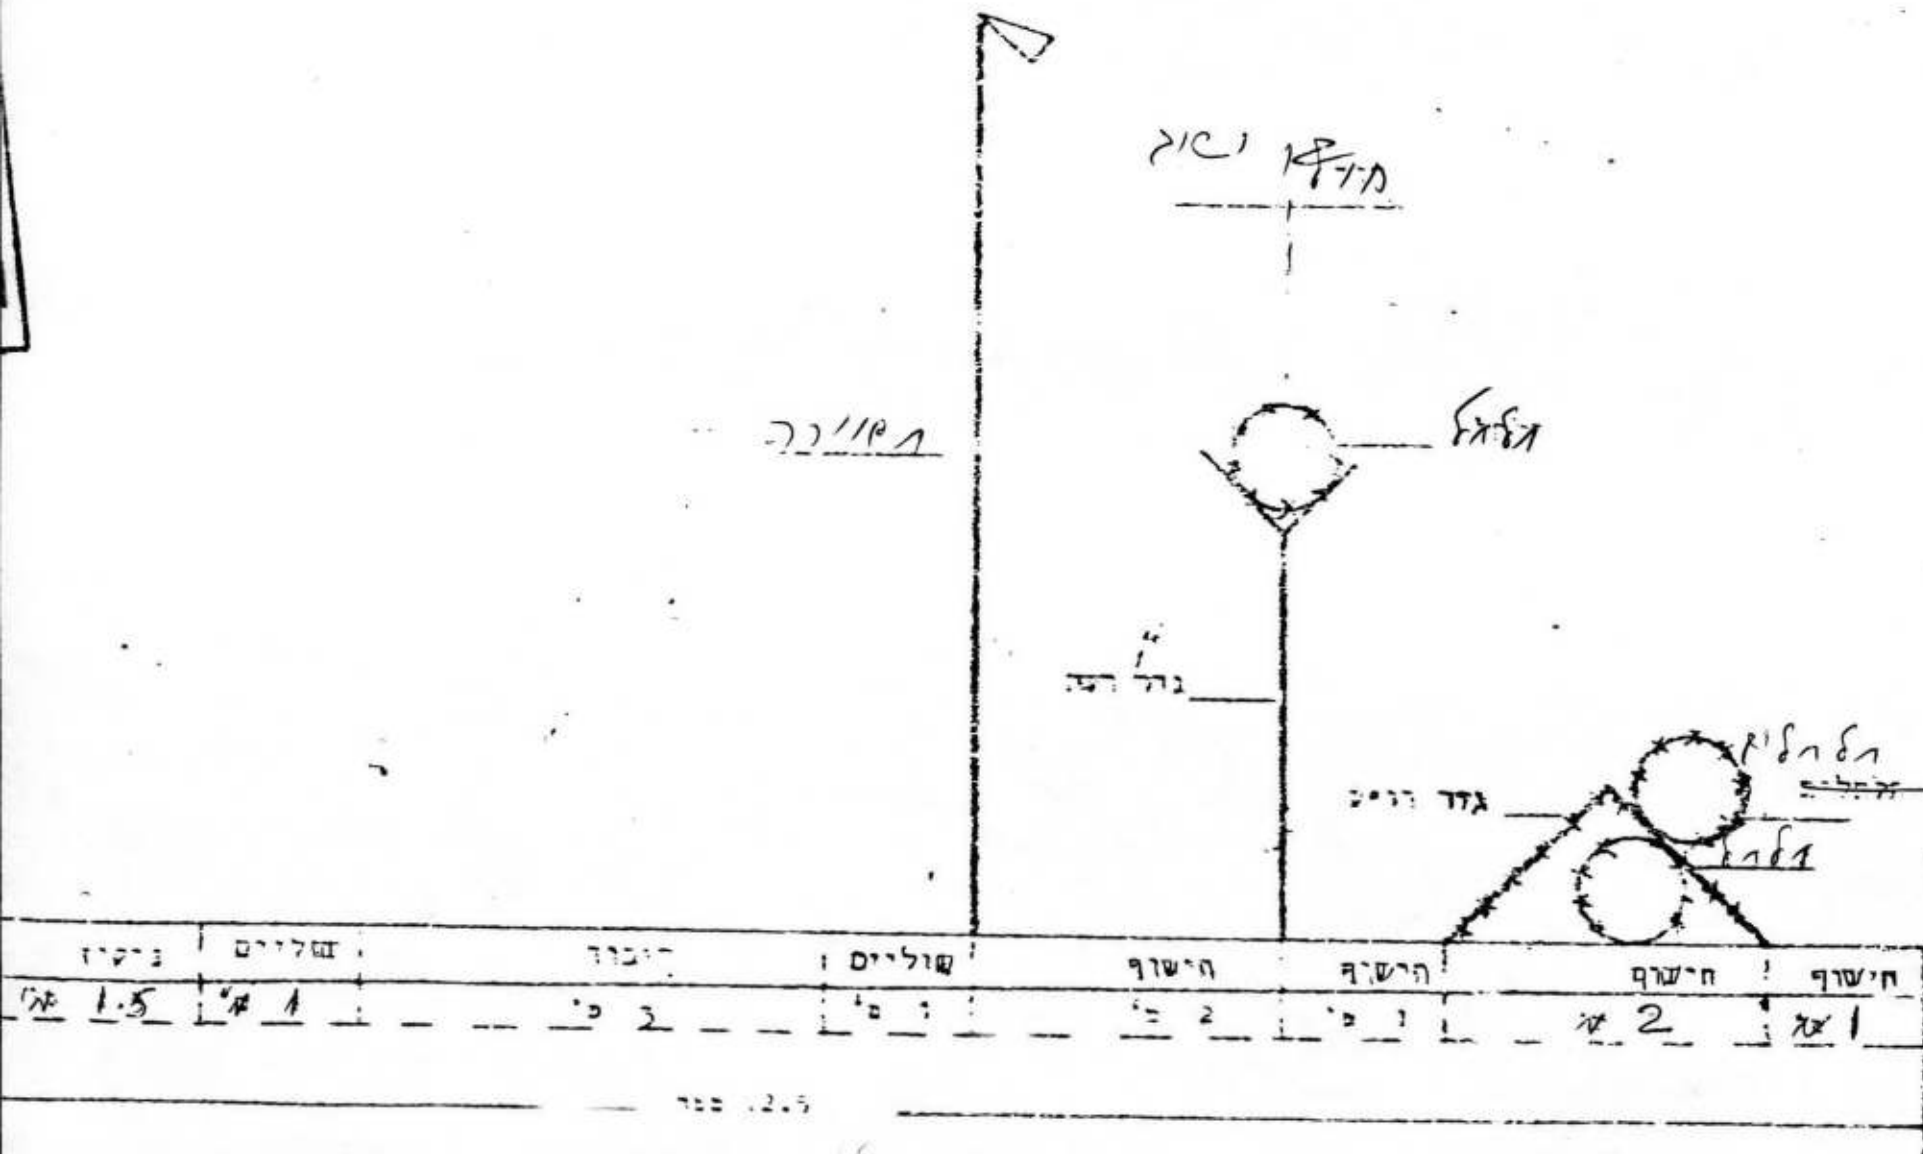

13806

ליון דגל

כ"ז באב תשמ"ב
16 באוגוסט 1982

לכבוד
ברוך רם, סא"ל
מפקדת קח"ל
רח' יהודה הימית 7
יפו

הנדון: גדר בטחון למושב שילת

לפי סיכום איתך הנני מעביר לך 4 תוכניות של הישוב
עם סימון גדר בטחון. (גדר רשת בלבד).

כמו כן מצ"ב תוכניות תאורת רחובות, כולל תאורת גדר
לאורך התוואי המוצע.

אבקש הוראותיך ואישורך לקראת הביצוע.

הערה: במידה ובעתיד תבוטל הדרך החוצה את הישוב
המתוכנן תושלם מערך הגדור עבור הישוב כולו בהתאם
להוראותיך.

בכבוד רב,

אינו' ב. גרינבא.
מ"מ מהנדס המחוז

הערות:

אינו' ש. הודניק, מ"מ מנהל האגף
מר ד. יצחקי, מנהל אגף אכלוס ופרוגרמות
אינו' ד. בלכר, יועץ מים וביוב
אינו' י. רזי, מהנדס מחוז מרכז
אינו' פ. זיידנפלד, ראש צוות

28

1067 235 1928
17 10.28

17.10.
 ת"ו
 135
 67
 17.10.

מספר רישוי פטירה 97-10-1982
תאריך נפטר 10-1982

לטיפולו של
בעון מר פייג 307

למבור
מר ד. בלכר
משרד השיכון
המנהל לבניה כפרית
רח' הילל 23
ירושלים
ב.א.

2/10/82

1

1. מצ"ב ספת המתאר של הישוב "שילת" עליה מסומן תוראי מערכת הגידור (בצבע ירוק).
חתומה ומאושרת.
2. המערכת תיכלול את המרכיבים הבאים:-
א. גידור - גדר רשת עם ראש מפוצל
ב. תאורת בטחון מיקבית
ג. חשיפת דרך עפר במקביל לגדר והתאורה.
3. בבקשתם להנחות את גורמי הביצוע להקים את המערכת לפי ההנחיות הב"ל ובתאום עם הפיקוד המרחבי.

ברוך דם , טא"ל
דע"ב התיישבות והגמ"ר
מסמ דמ"ח מיגרן והתיישבות

משרד השיכון/המנהל לבניה כפרית - מחוז המרכז
מפק' עורף מרכז/ק.הגמ"ר



1. Introduction
2. Objectives
3. Methodology
4. Results
5. Conclusion



THEORY OF THE EXPERIMENT

1. The purpose of this experiment is to determine the effect of the concentration of the solution on the rate of the reaction. The reaction is carried out in a closed system at a constant temperature. The rate of the reaction is measured by the change in the concentration of the reactants or products over time. The results are presented in the following table.

2. The reaction is carried out in a closed system at a constant temperature. The rate of the reaction is measured by the change in the concentration of the reactants or products over time. The results are presented in the following table.

3. The reaction is carried out in a closed system at a constant temperature. The rate of the reaction is measured by the change in the concentration of the reactants or products over time. The results are presented in the following table.



1. Conclusion
2. References
3. Appendix

1. Introduction
2. Objectives
3. Methodology
4. Results
5. Conclusion

THE
OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE
NAVY

WASHINGTON, D. C.

RECEIVED

THE SECRETARY OF THE NAVY
WASHINGTON, D. C.

NOV 1911

NOV 1911

THE SECRETARY OF THE NAVY
WASHINGTON, D. C.

הרס
המבצר

הרס
המבצר

3

הרס

שער

א-1 - גדר רשת קונצרט
ב, ג - קונצרט גדר אל גדר יונה

הרס
מבצר גדר בעל

הרס
מבצר גדר בעל

הרס
מבצר גדר בעל





שילת
תכנית כולית

1:1000

גבע
מא




גדר דו שפועית יחיד ס' 873/8

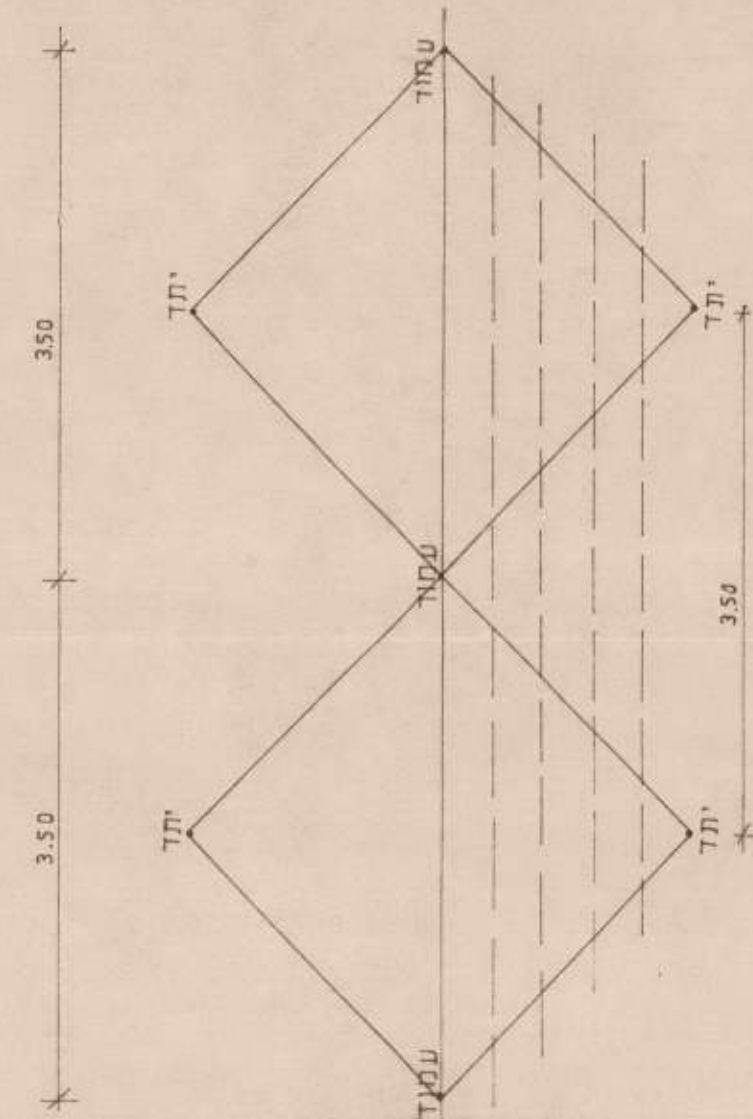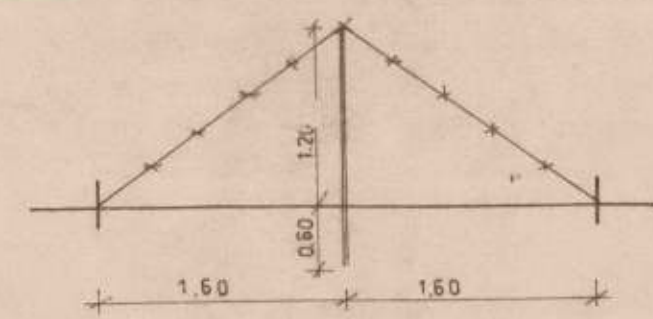


הערות

1. כל המדות נתונות בלחץ נאצל אם צריך אחת.
2. כל התנאים המופיעים בתקנית בע"י 4 חל.

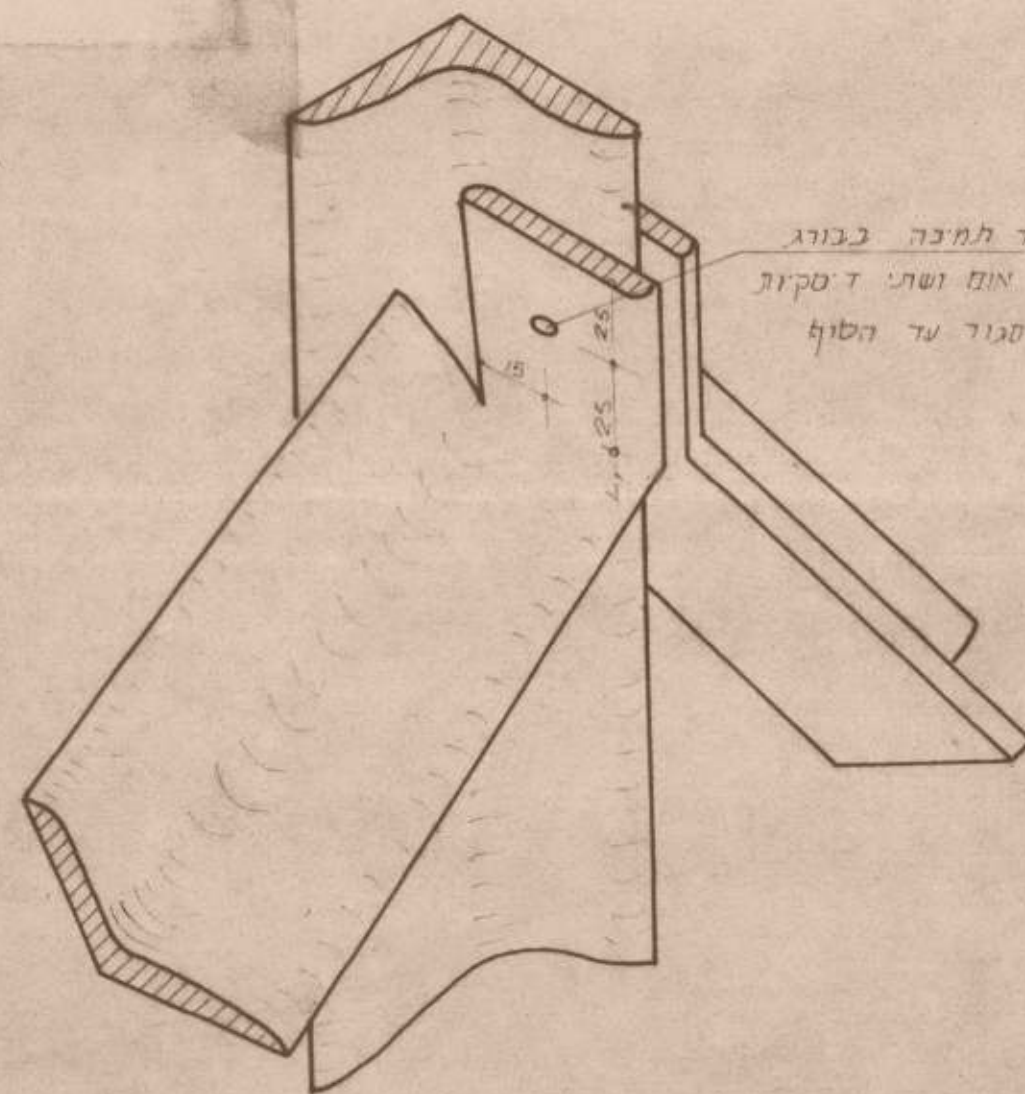


פרט י' ללא קנ"מ


דשימת כמויות לכן גדר דשת

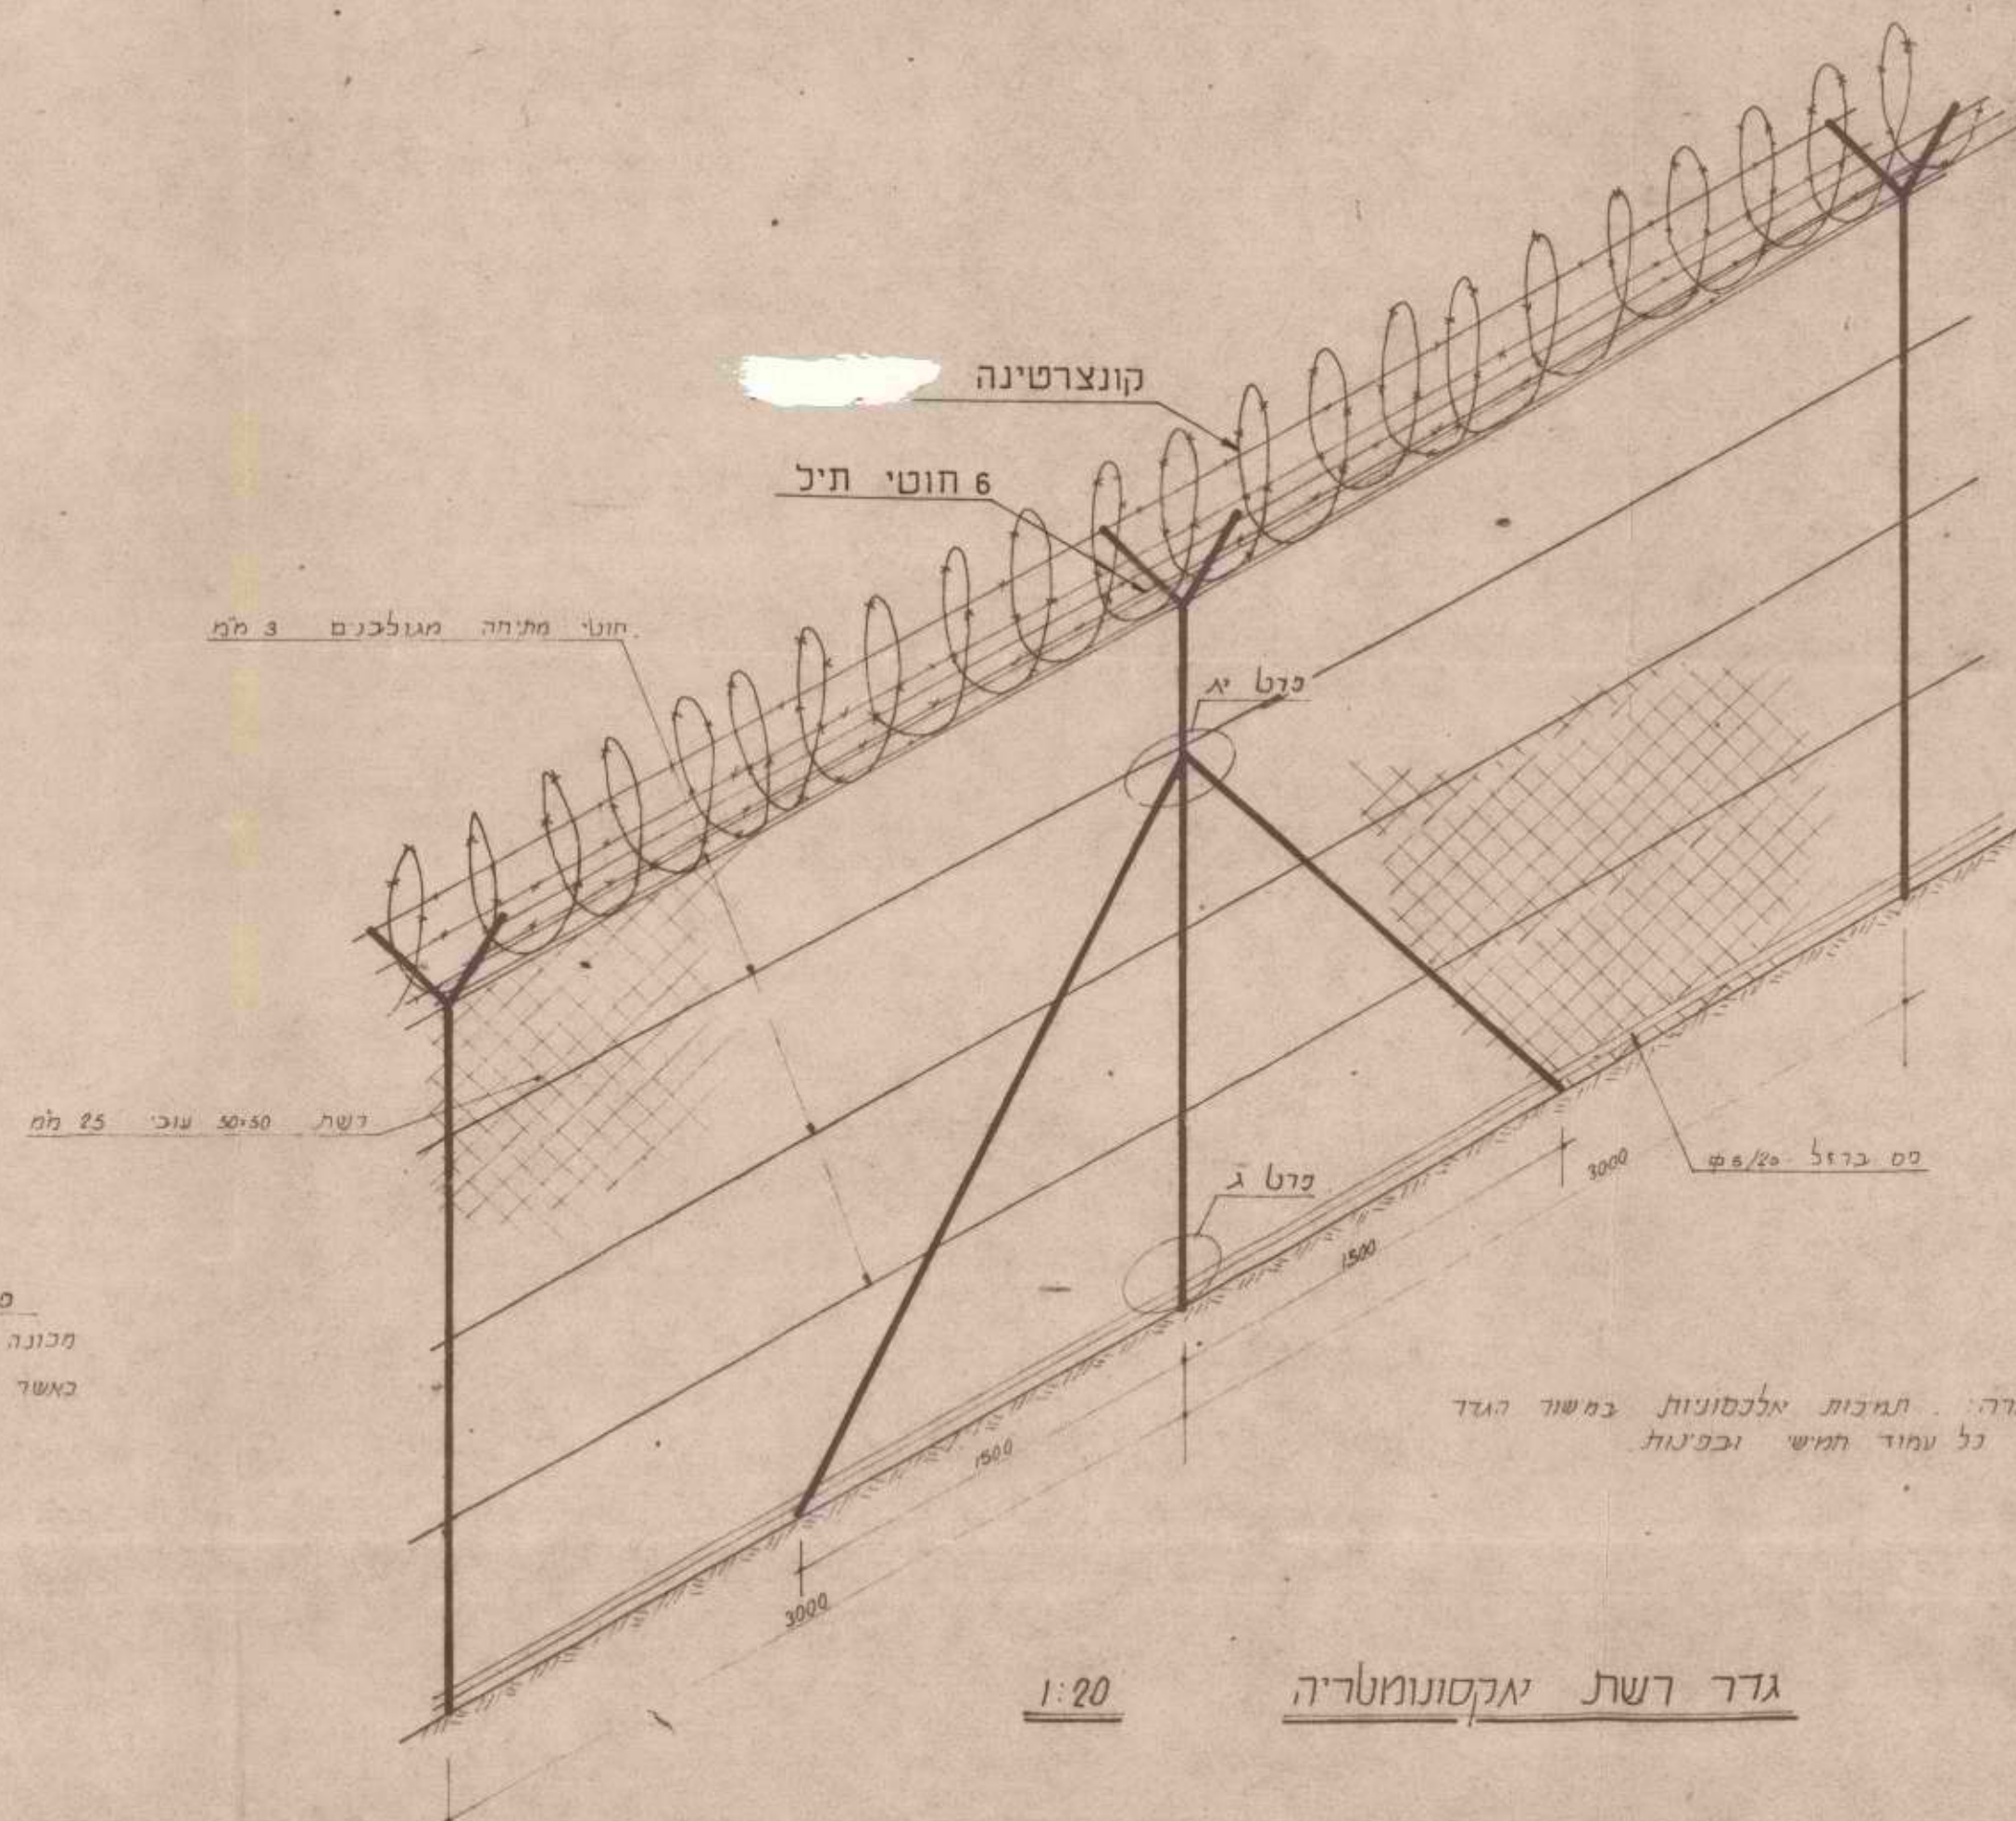[illegible][illegible]


גדר רשת יאקסונומטריה 1:20

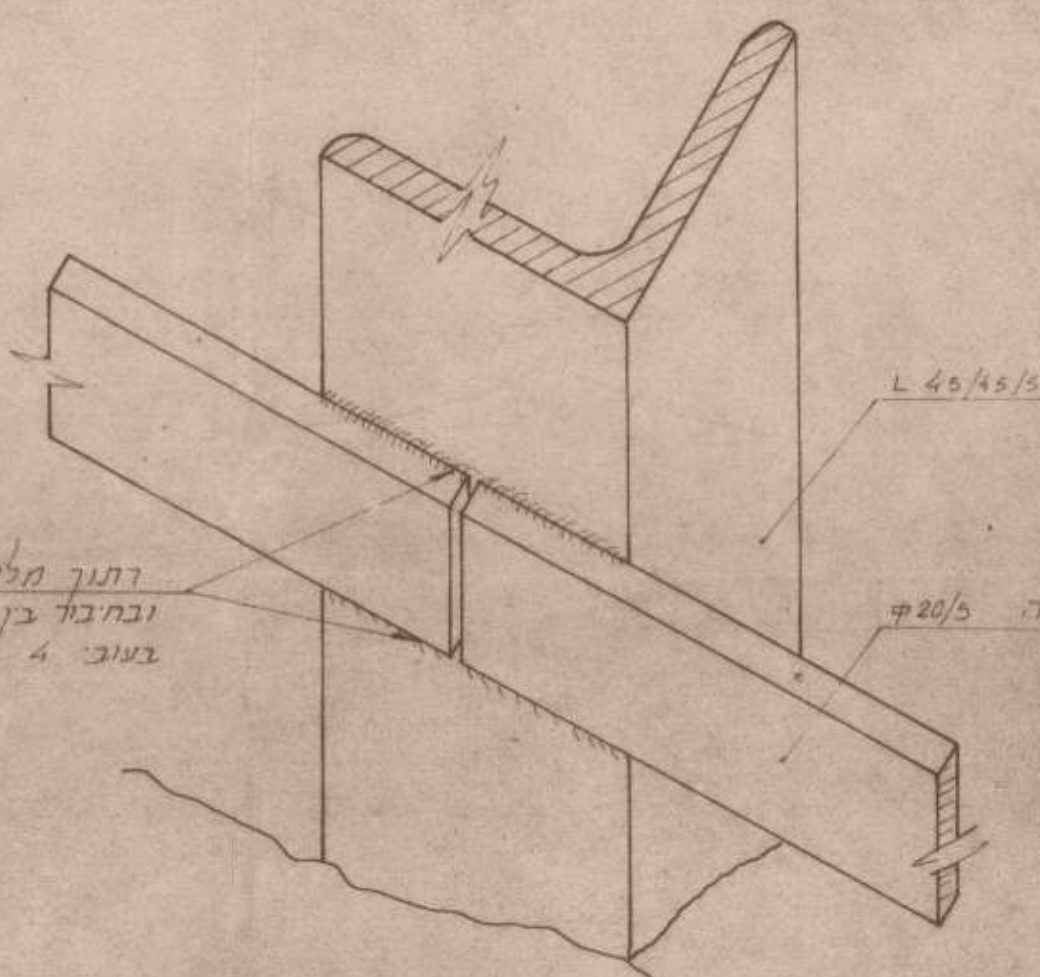


כדט ג ללא קנמ

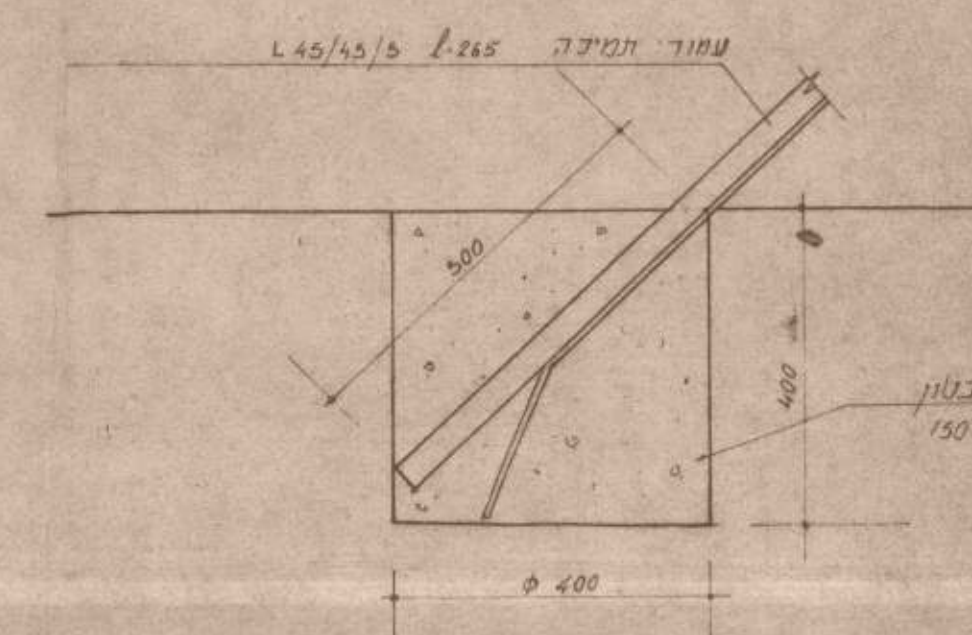


כרת ביסוס עמוד תמיכה 1:10

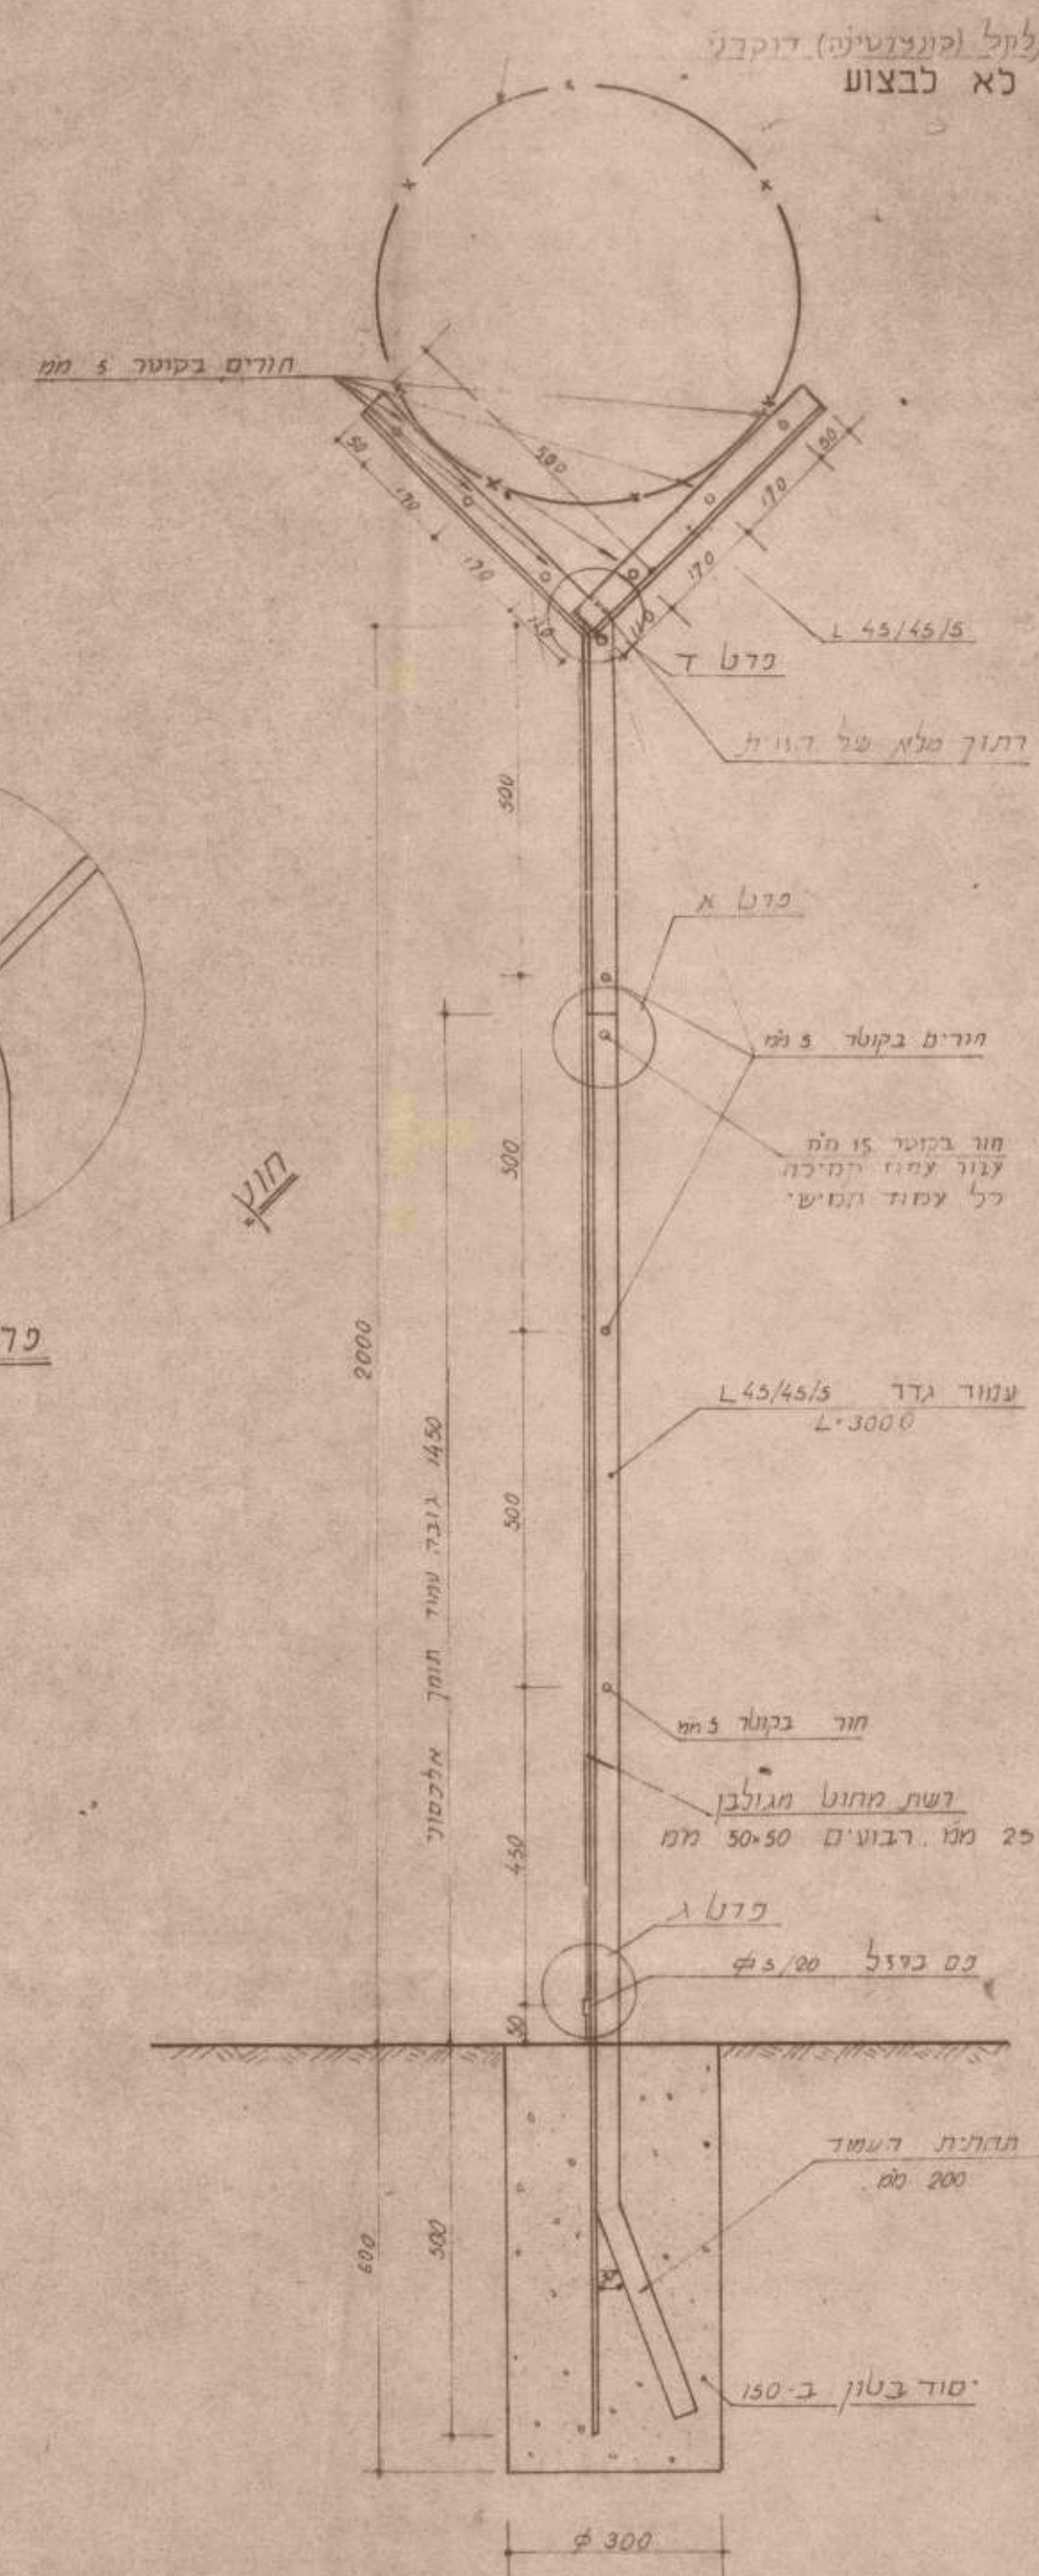

חתך אופייני - עמוד גדר דשת קנ"מ 1:10

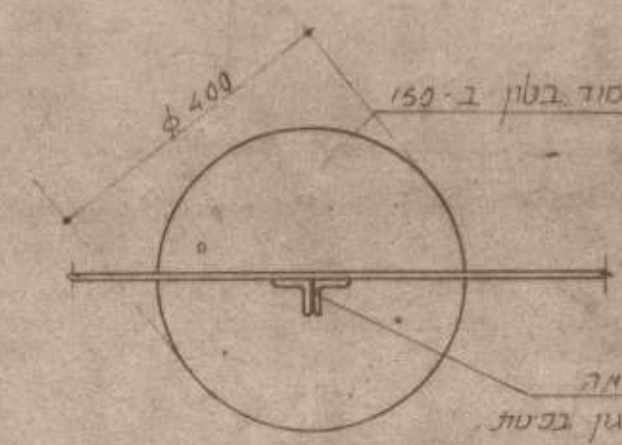

1:10 ק"מ ג-ג טדט

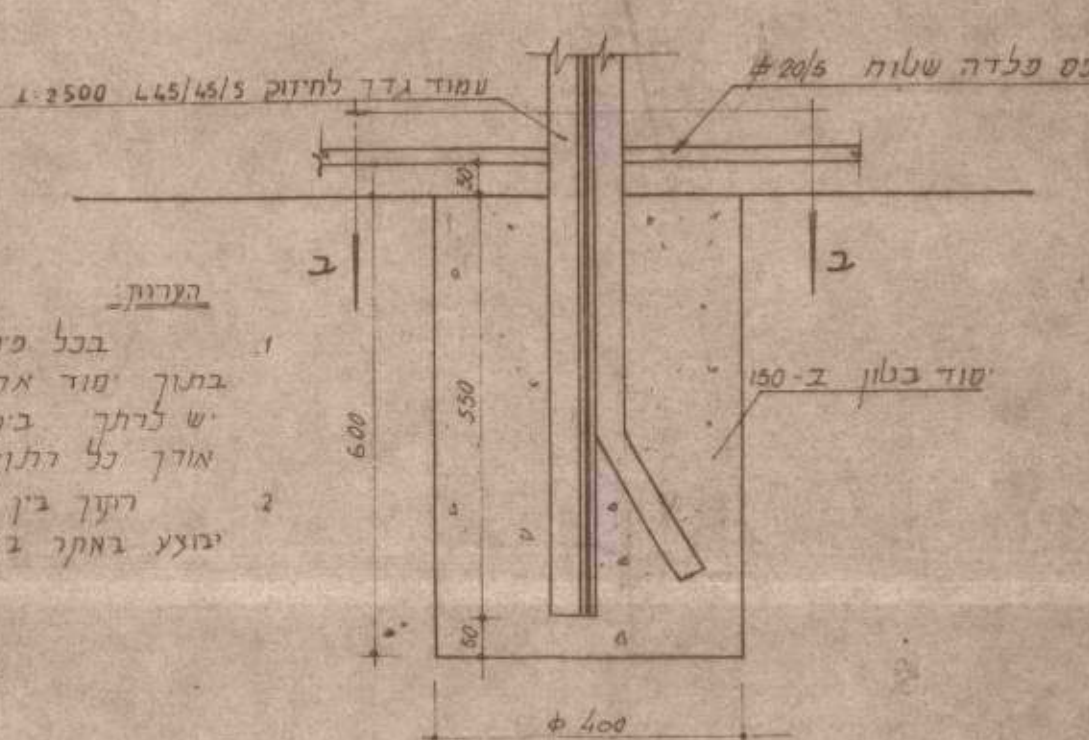

כדל מלגן בכינוות קנמ 1:10

הסכצע אחראי לבד יקח הסכצע
 ונהאמסחן בסכצע
 עד הסכצע וברקאי כח סכצע וברקאי
 סכצע או אי דמאסחן עליו לברקאי דמאסחן

ח פ ו צ ה

0020047

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי










סכצע וברקאי

סכצע וברקאי



סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

סכצע וברקאי

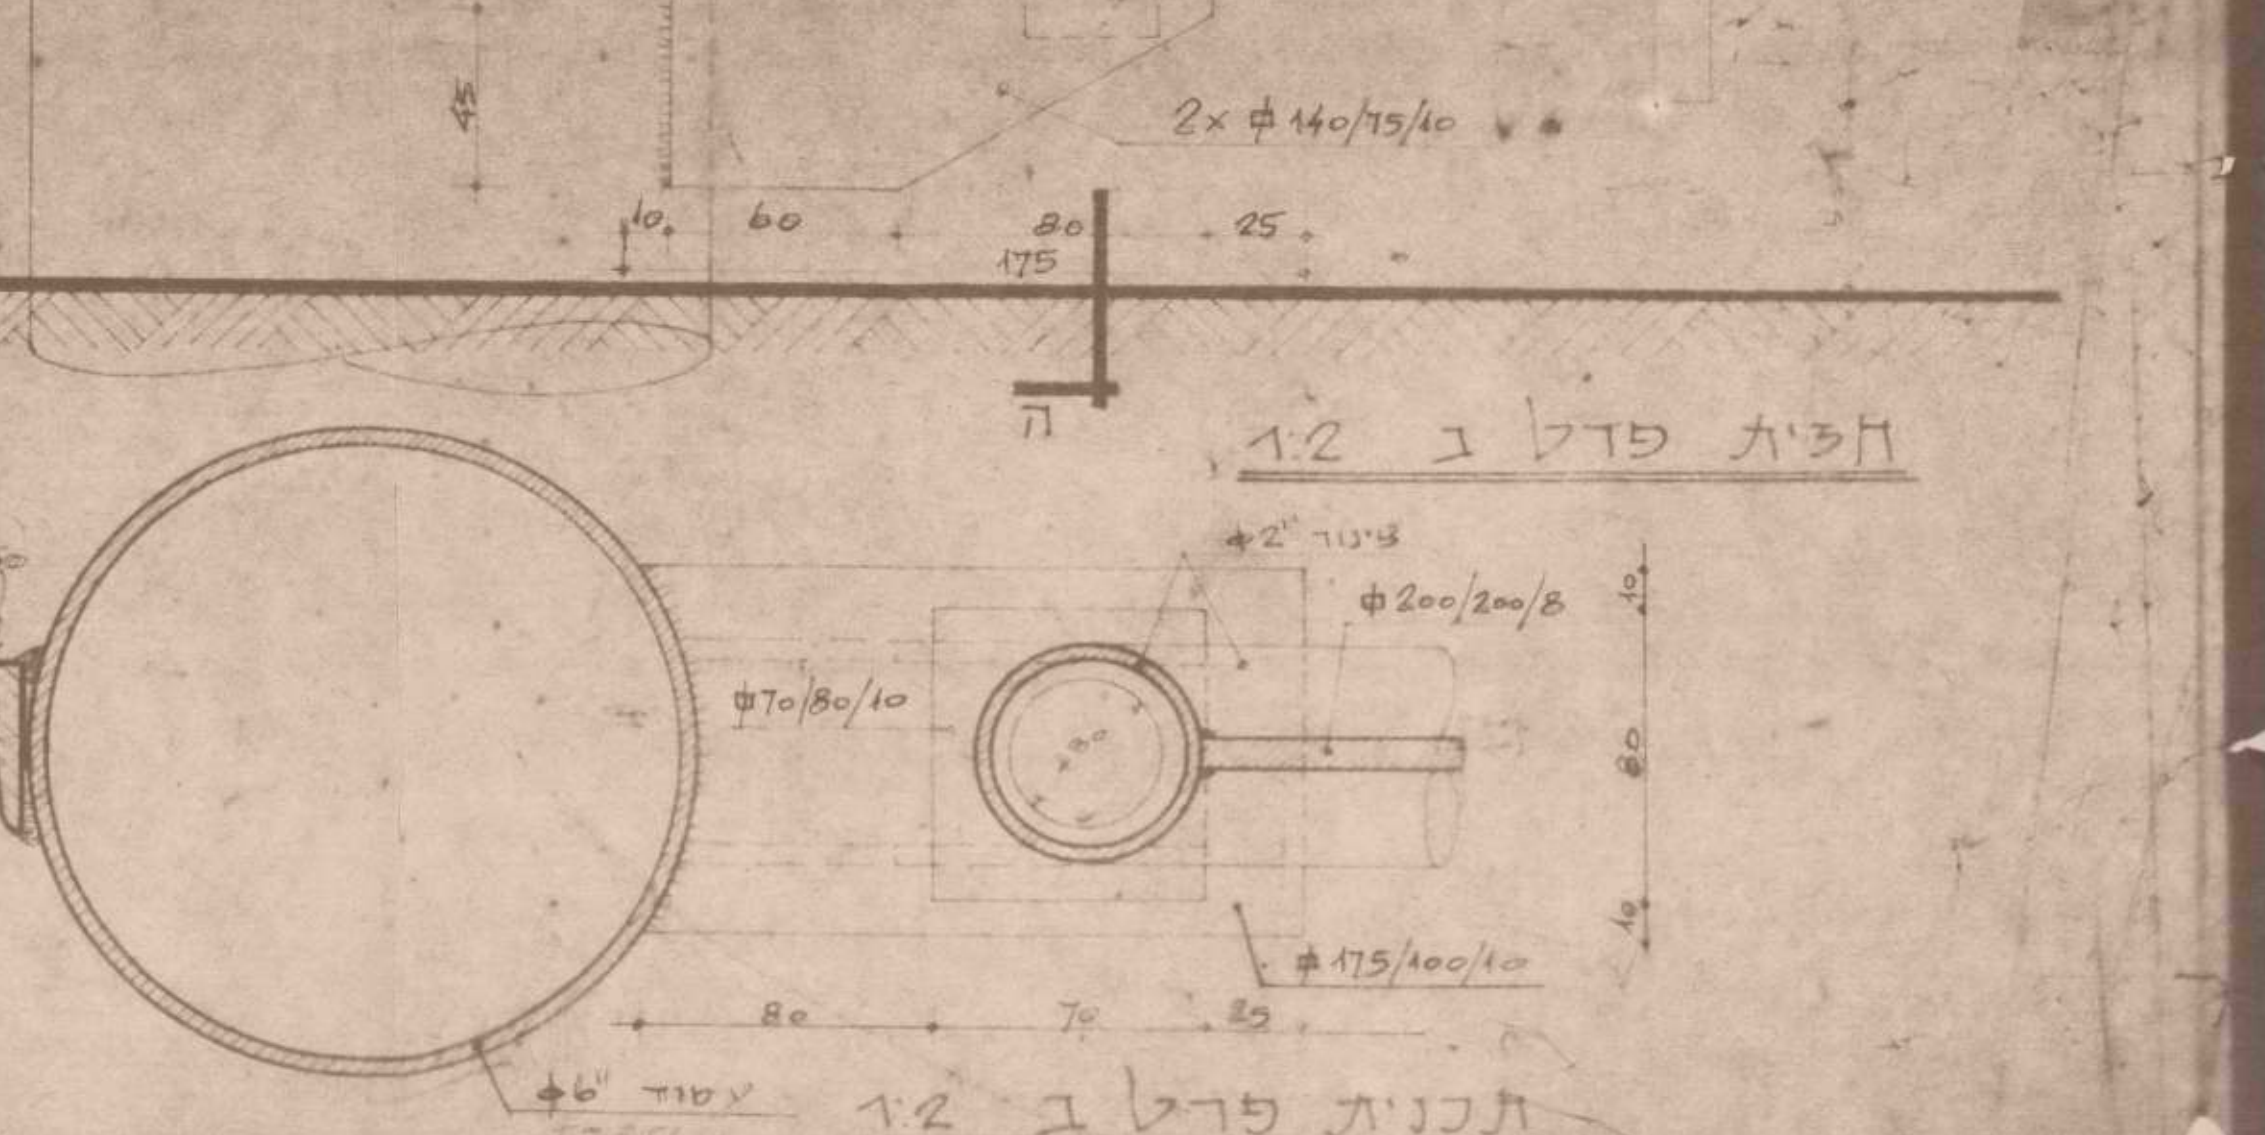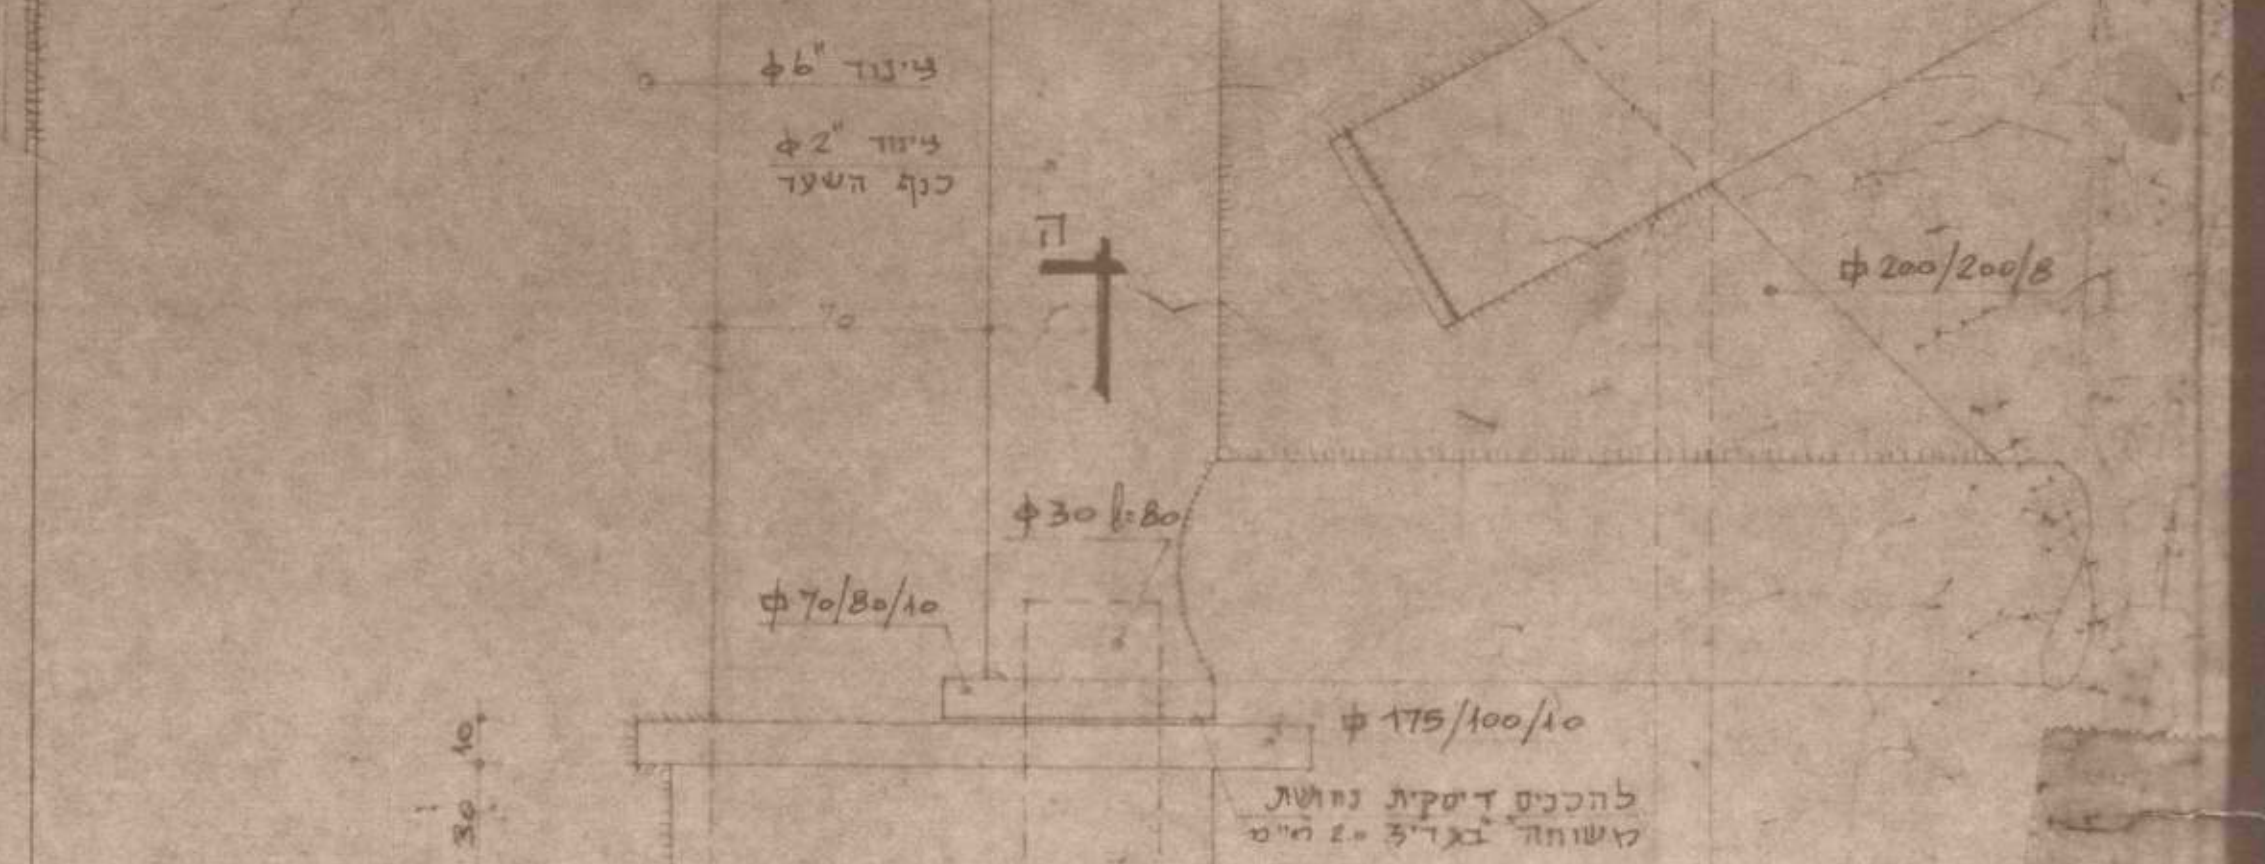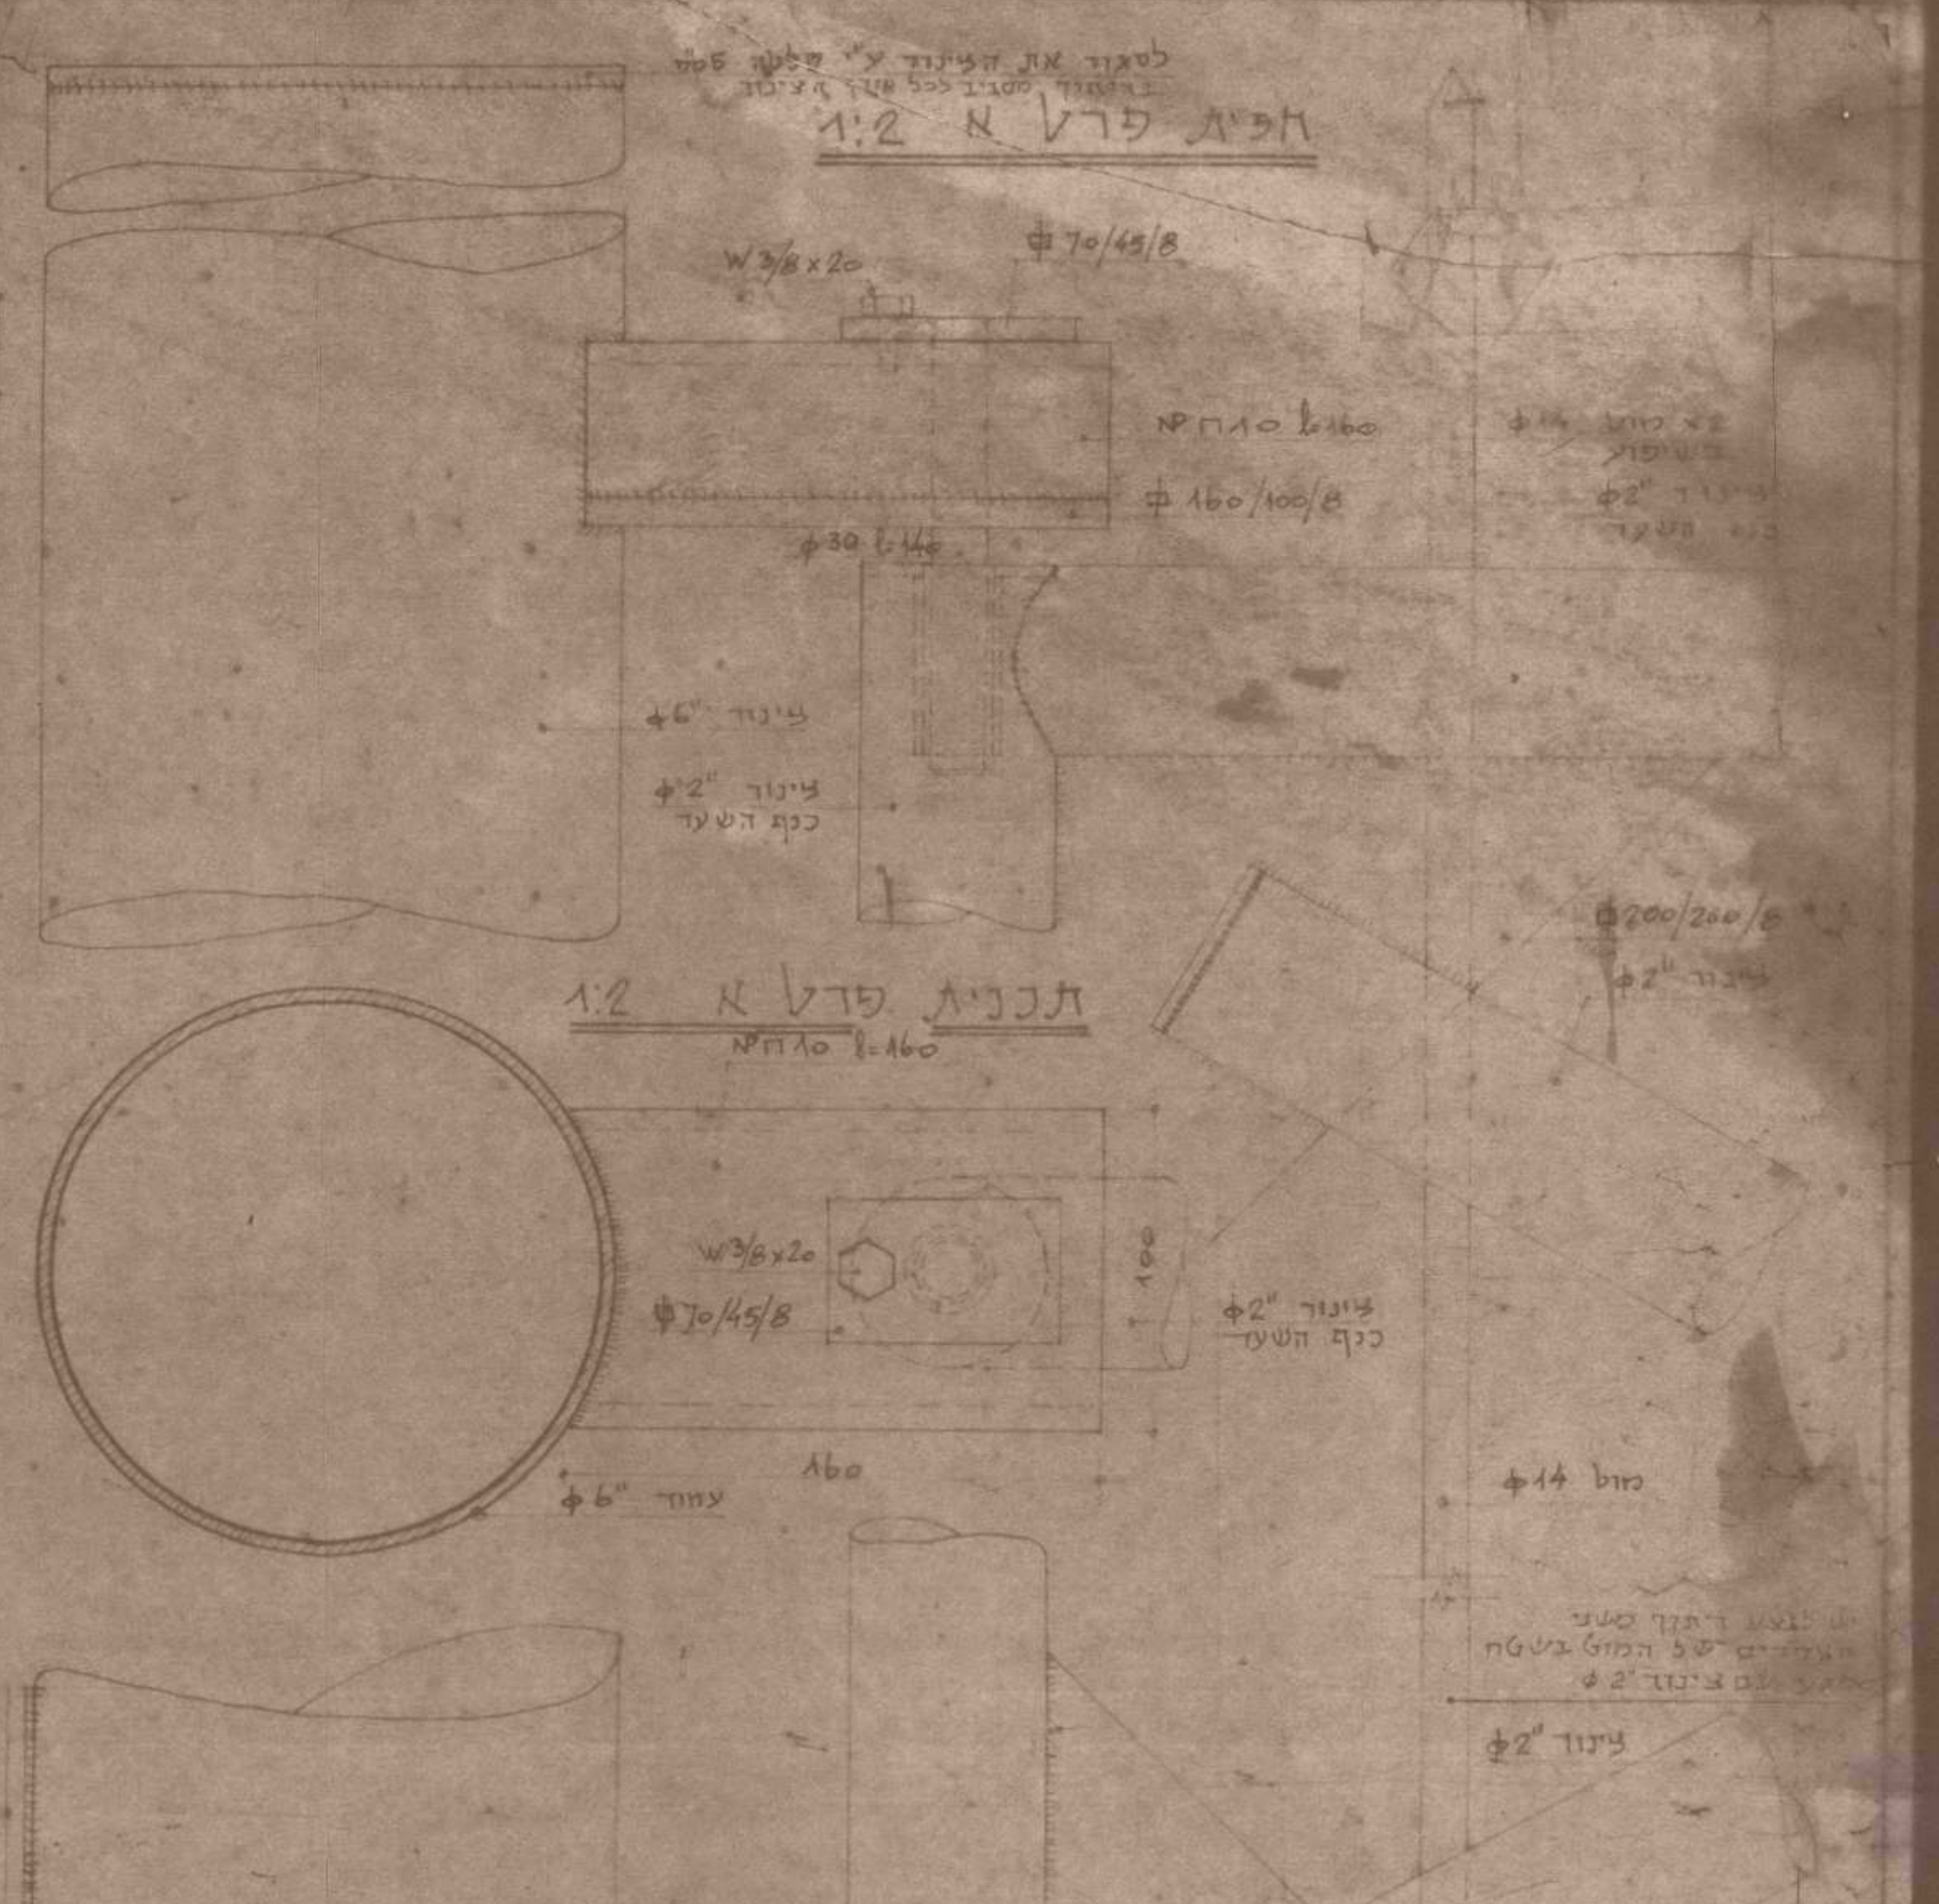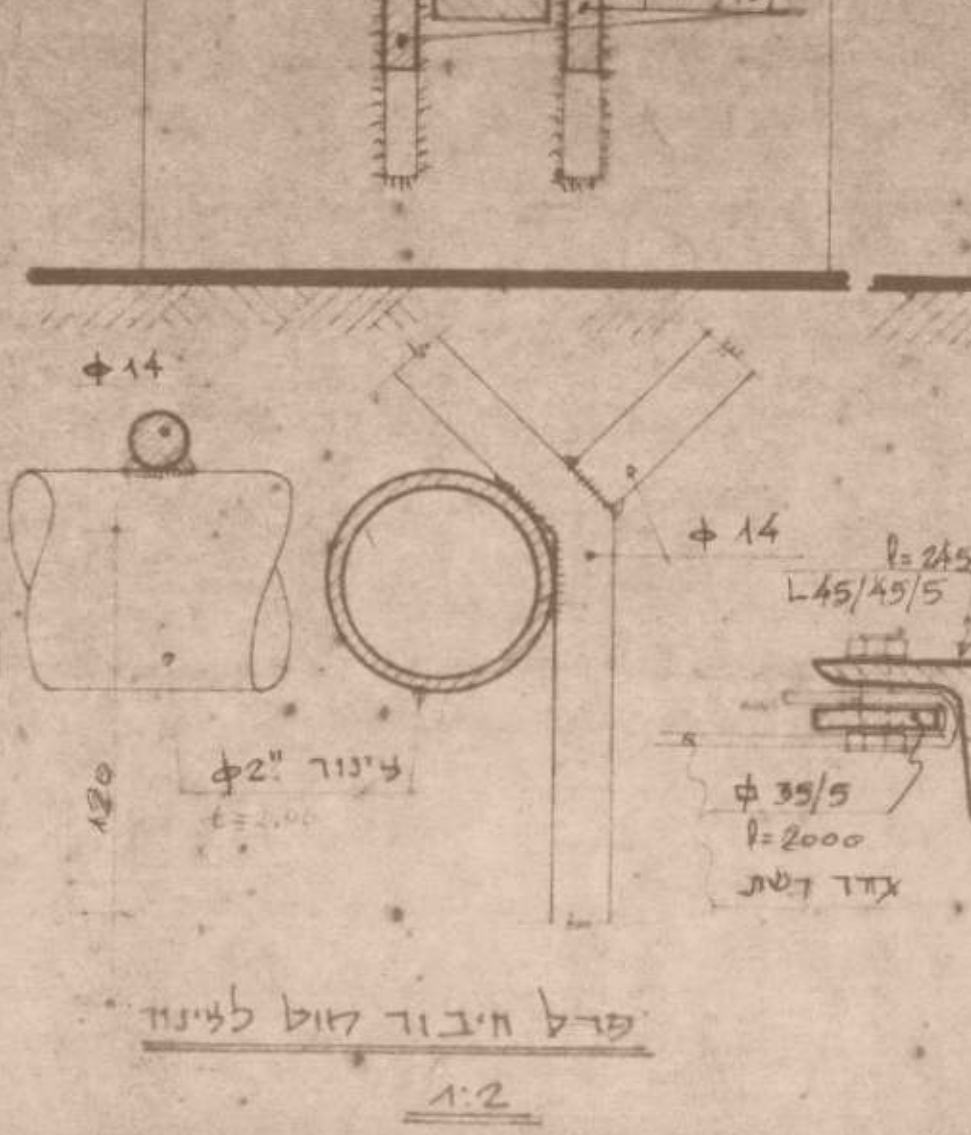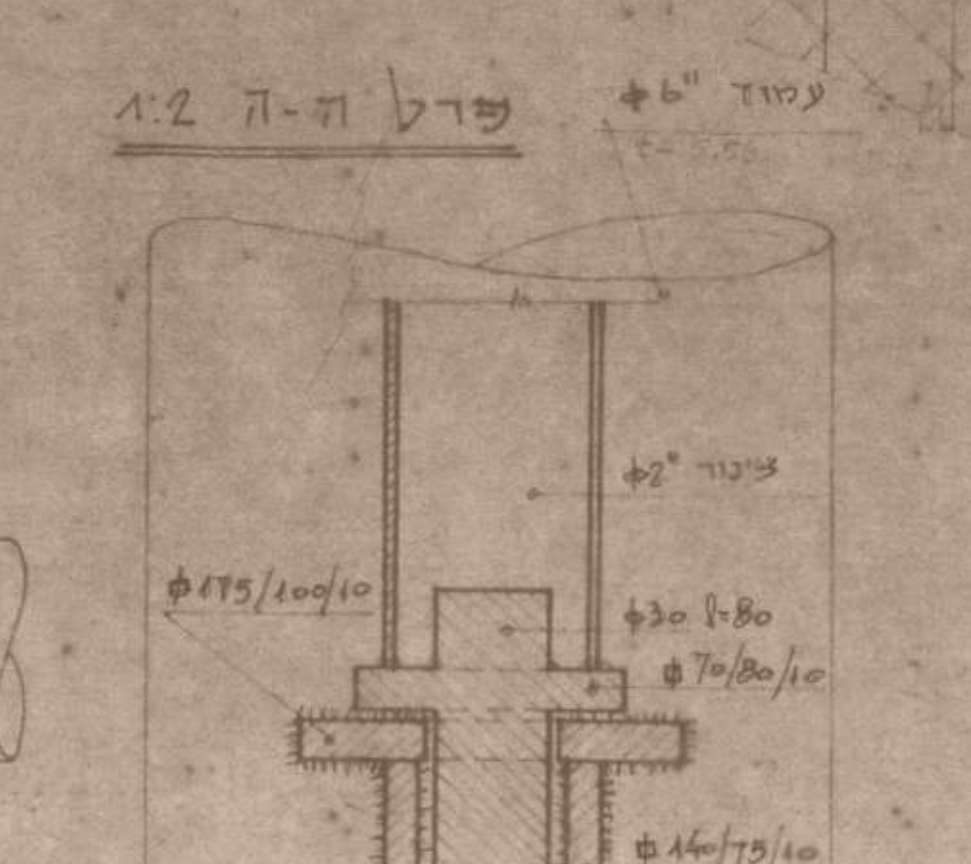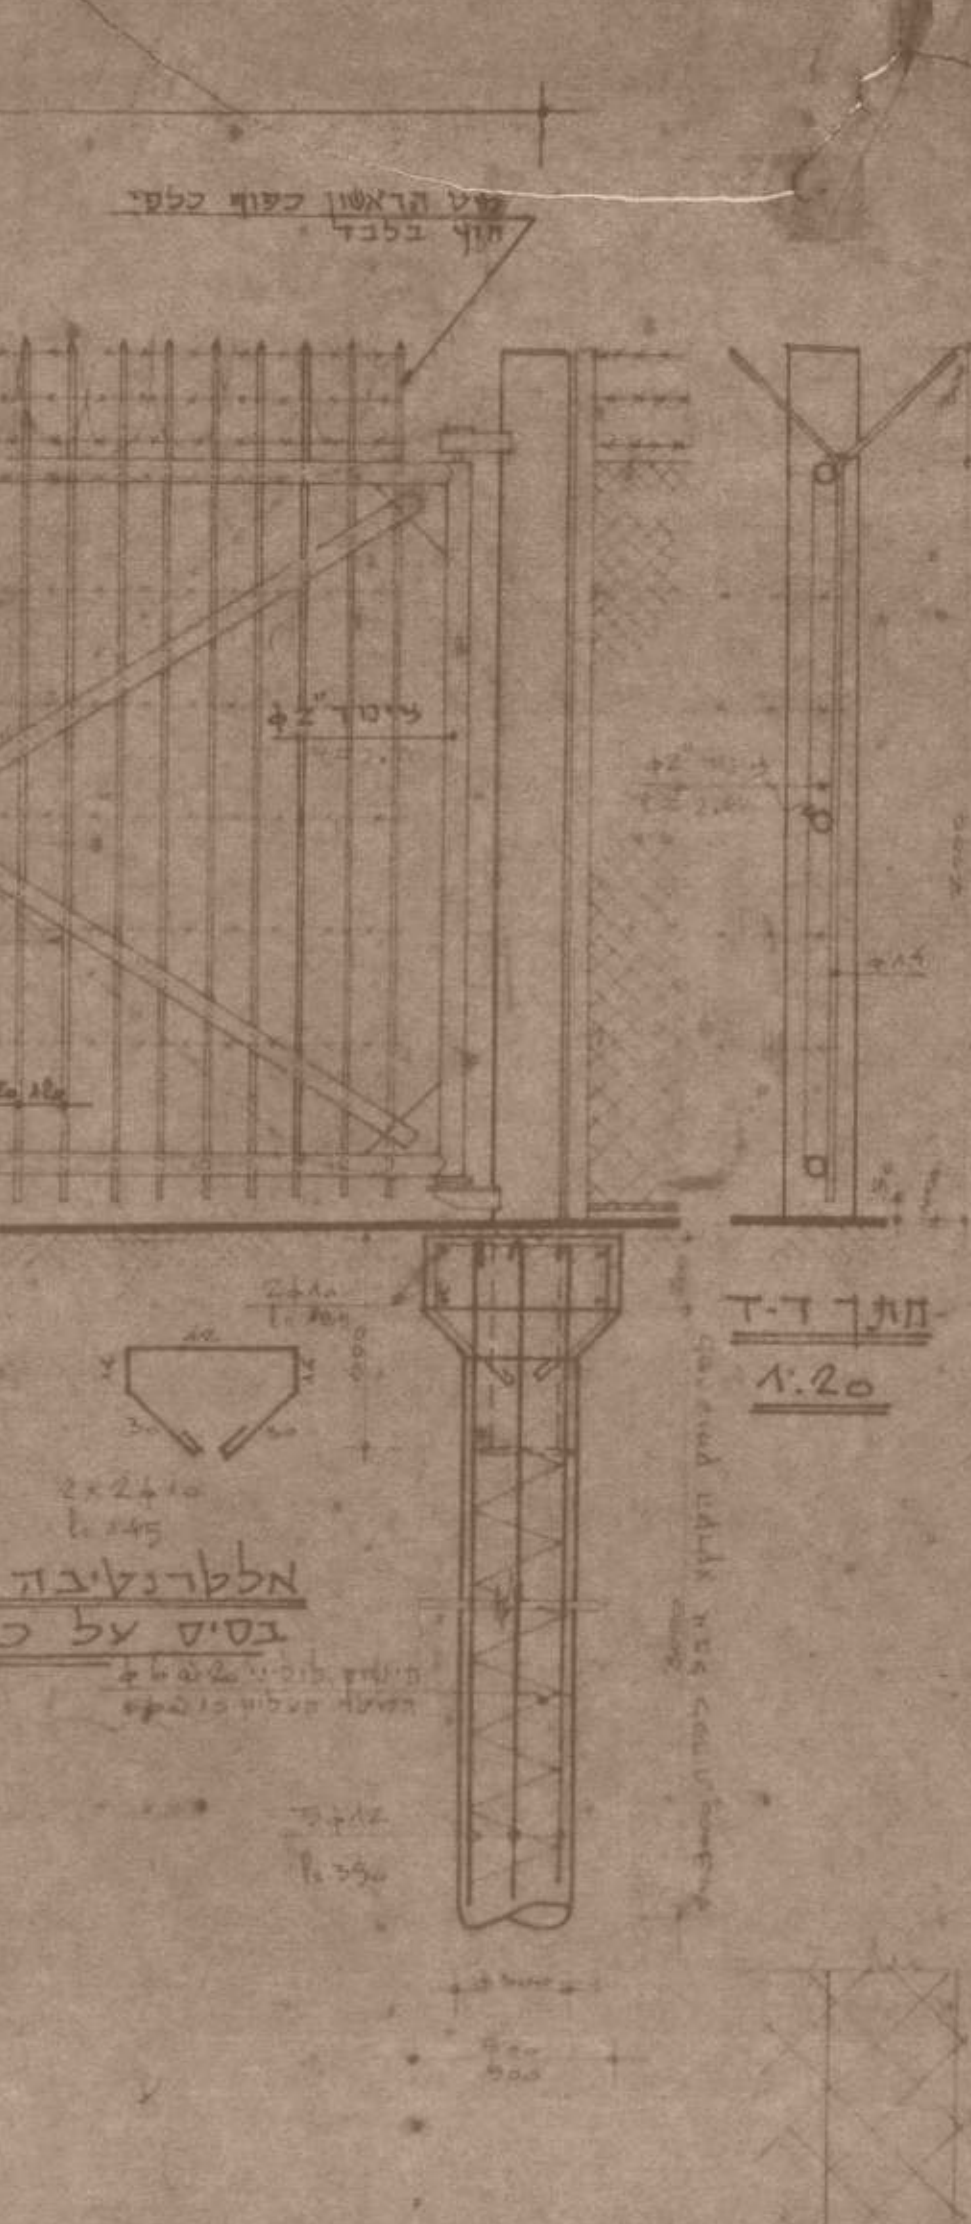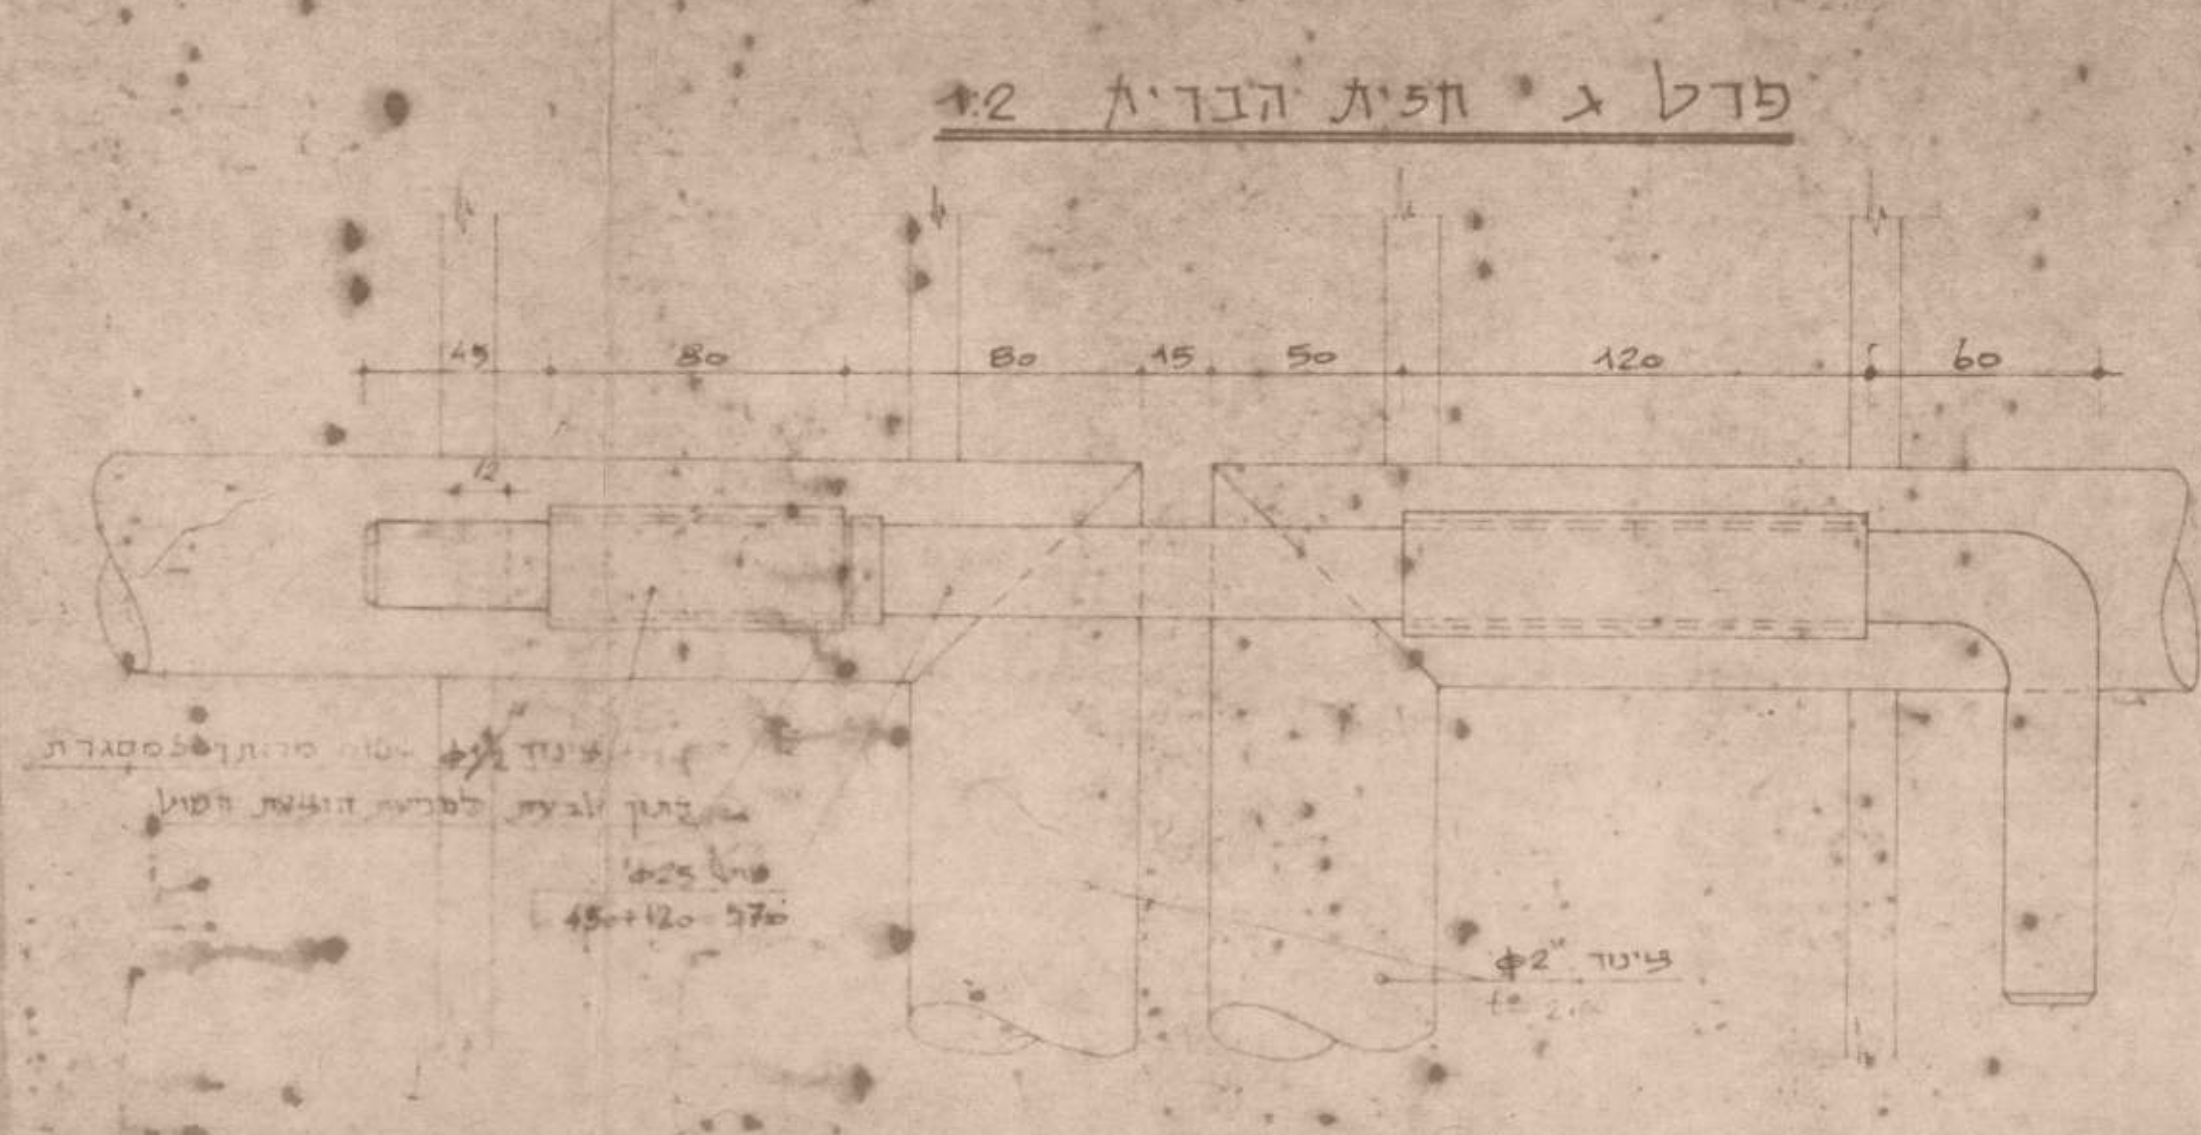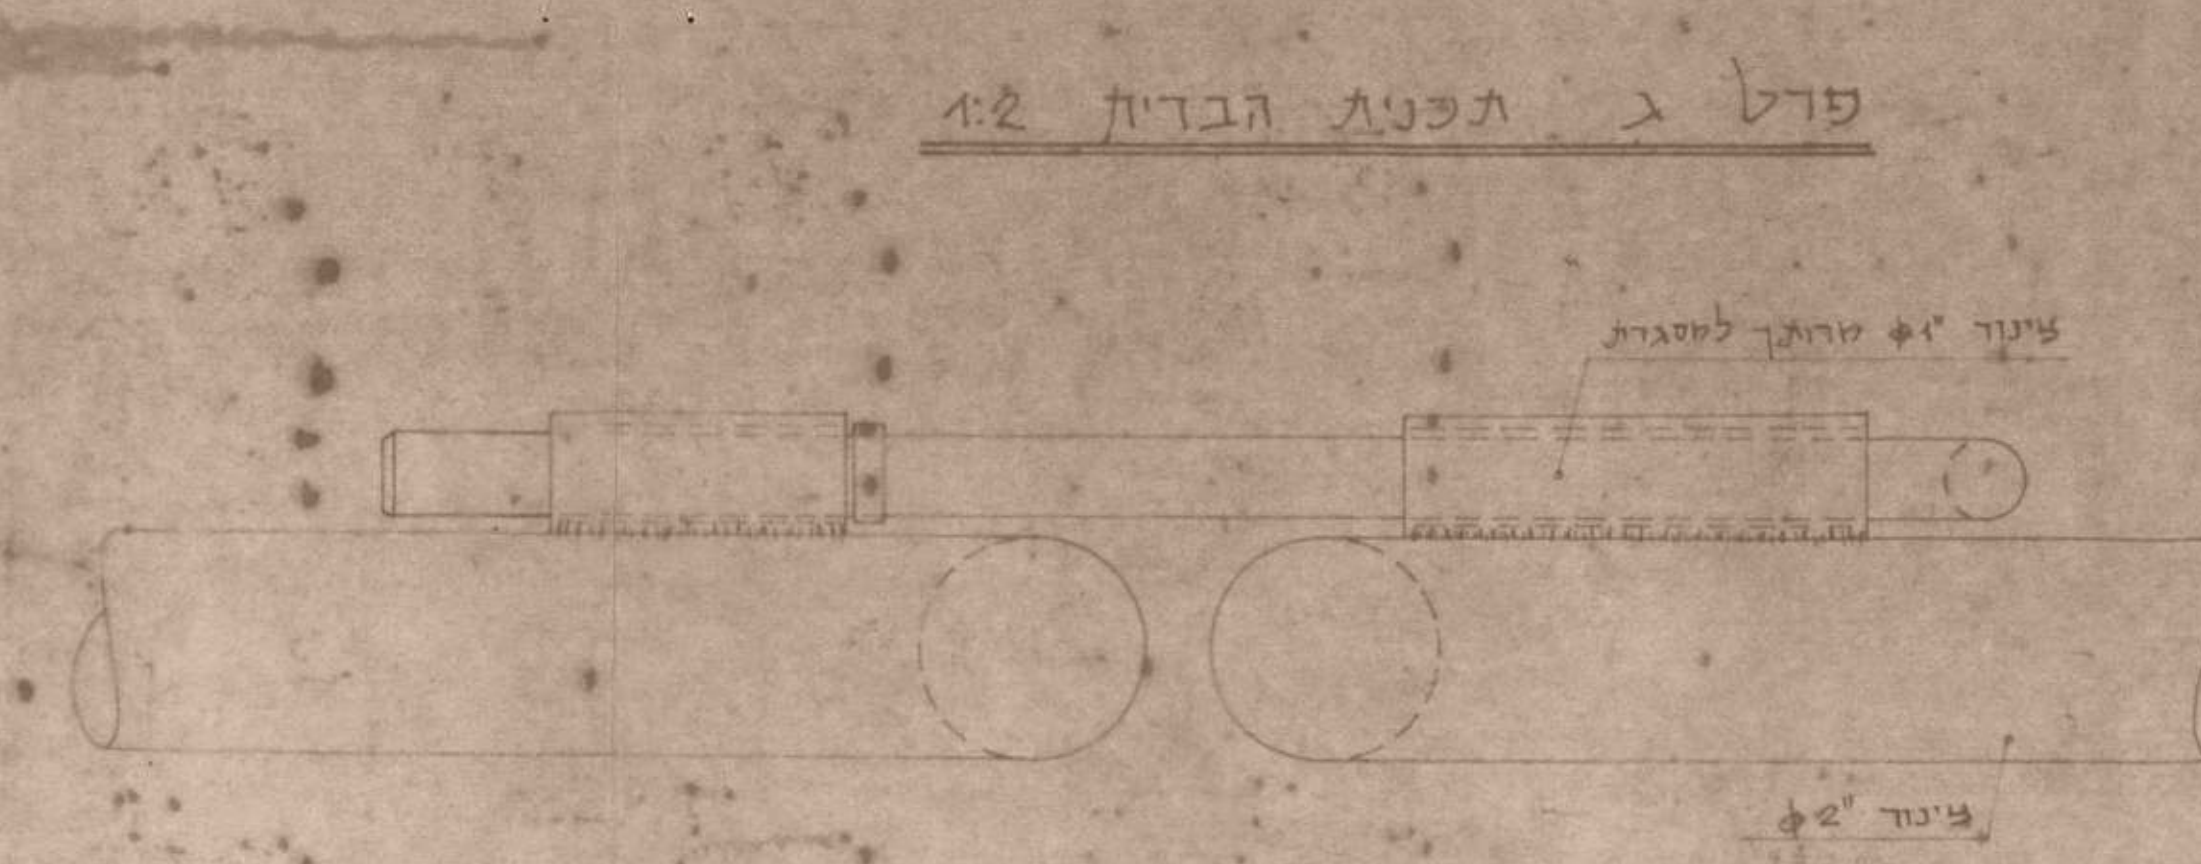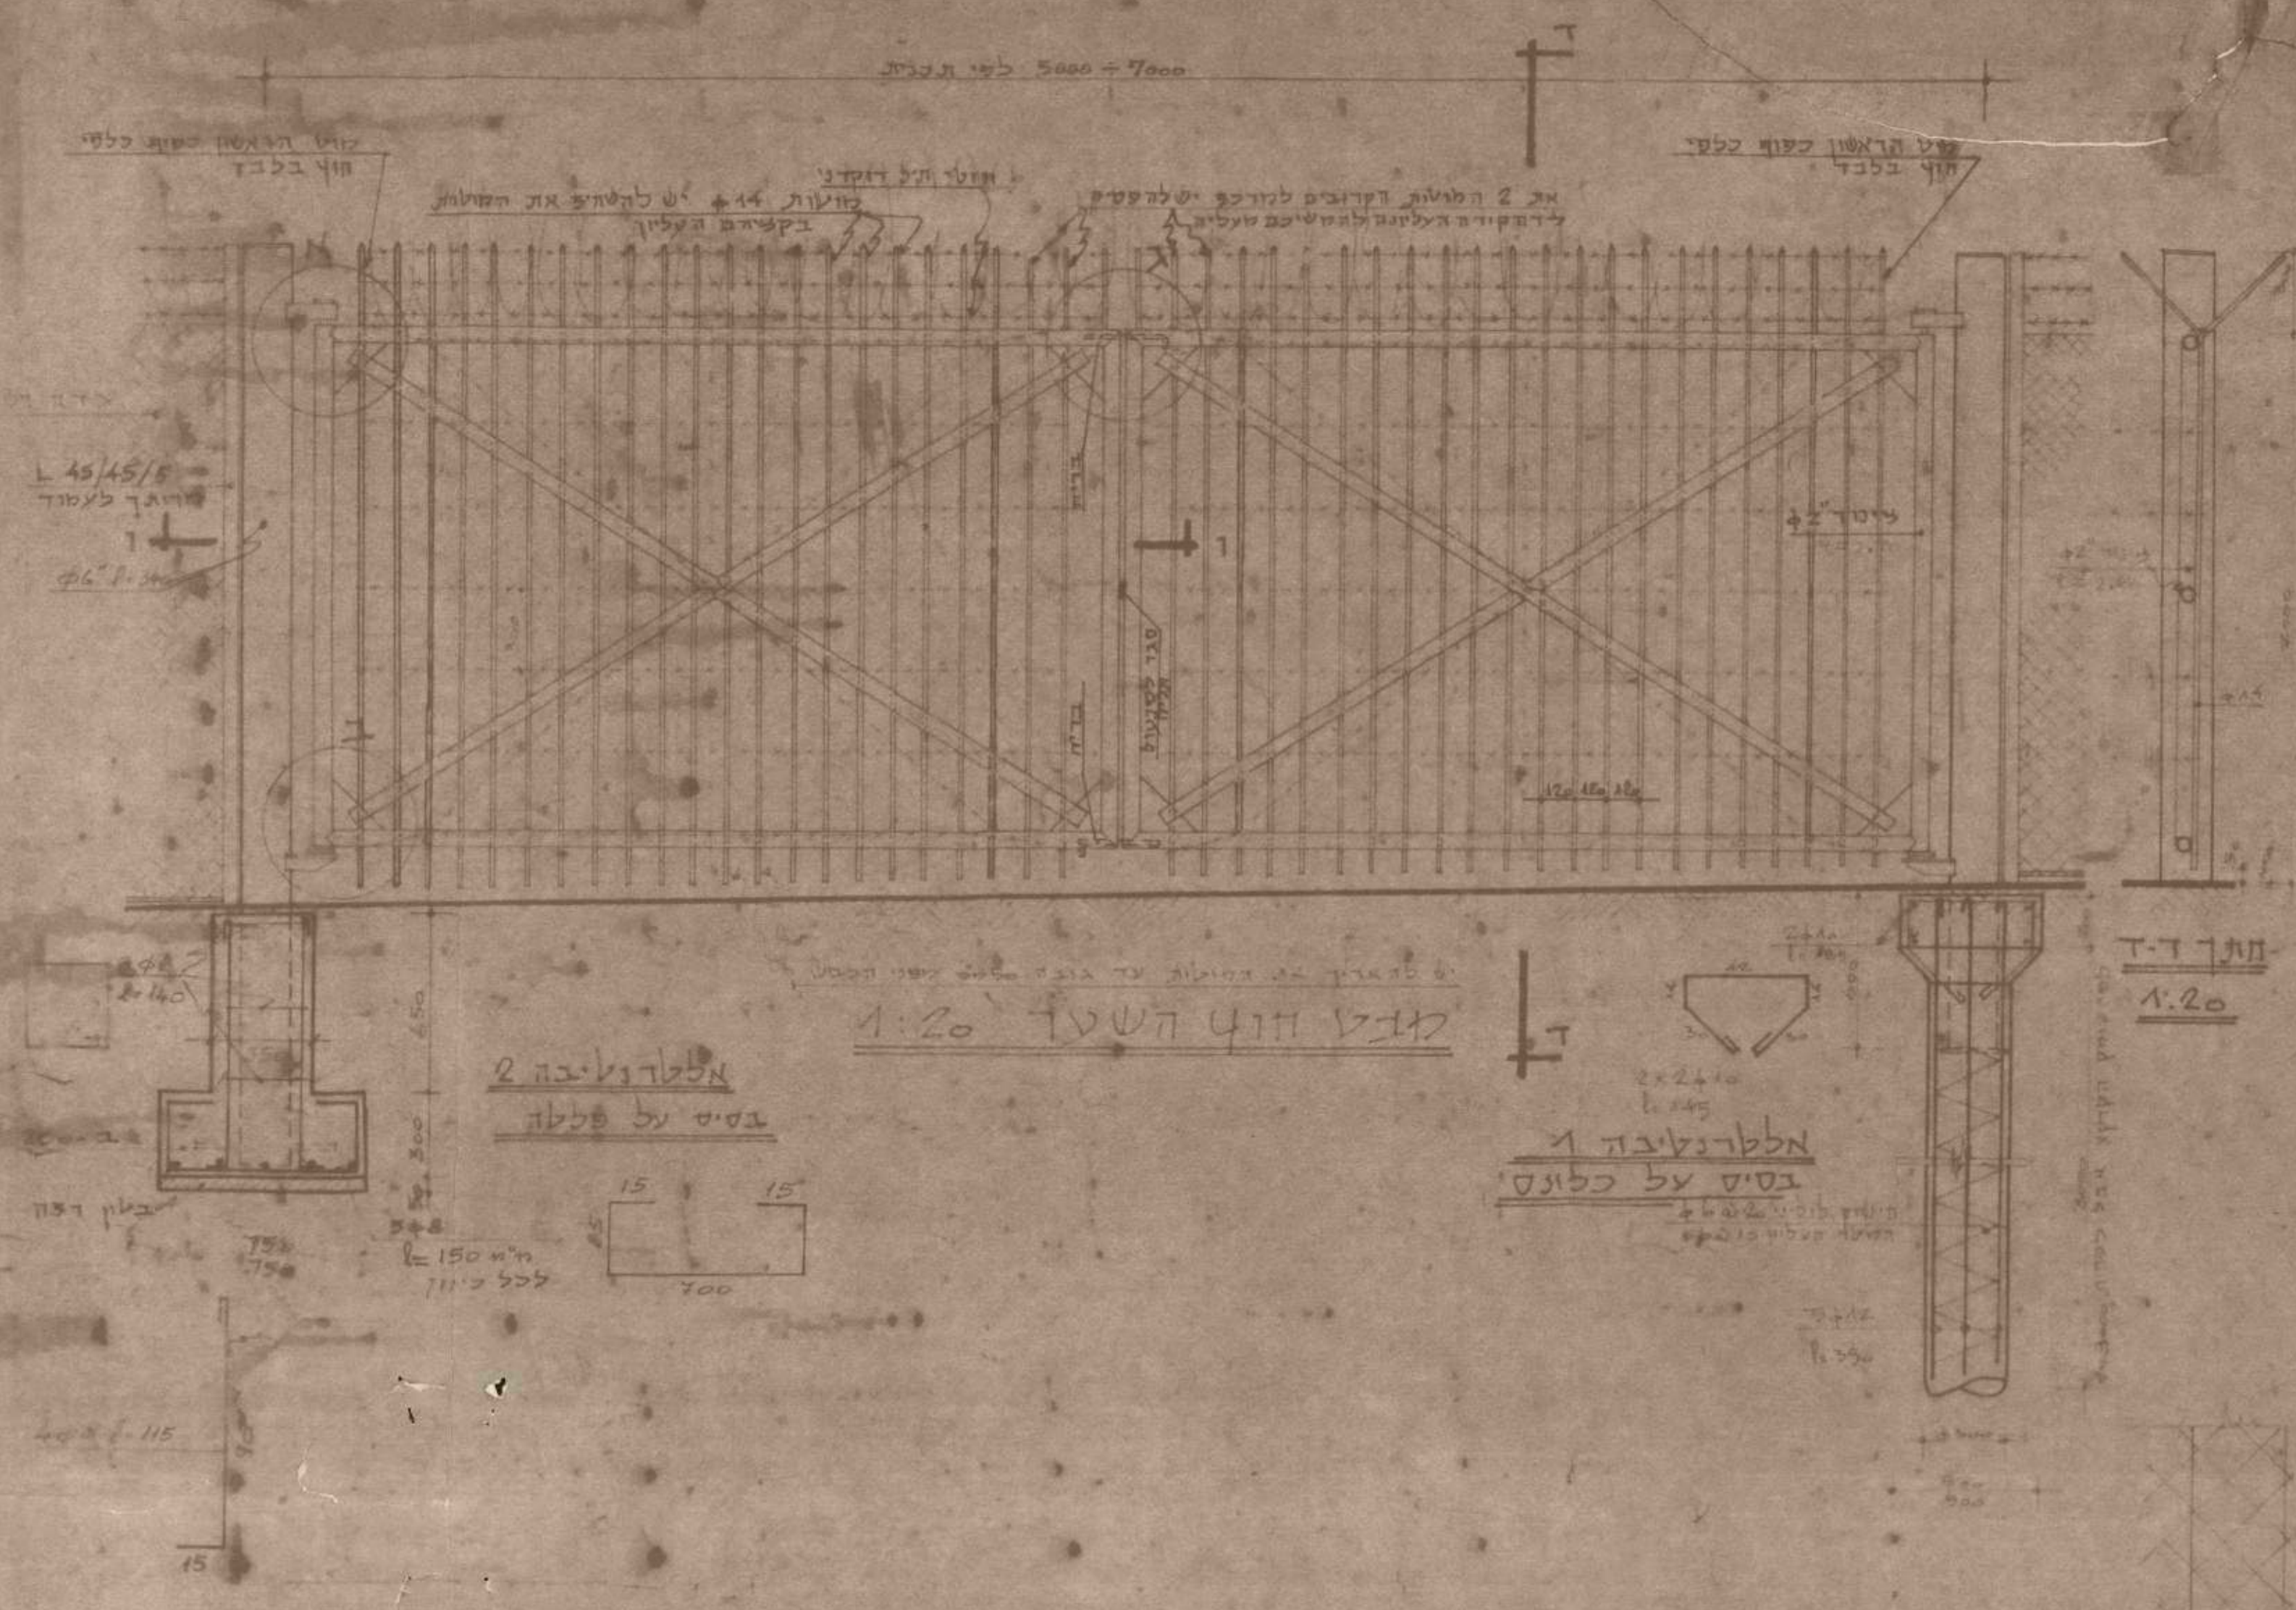


גדר דו שפועית יחיו 81328

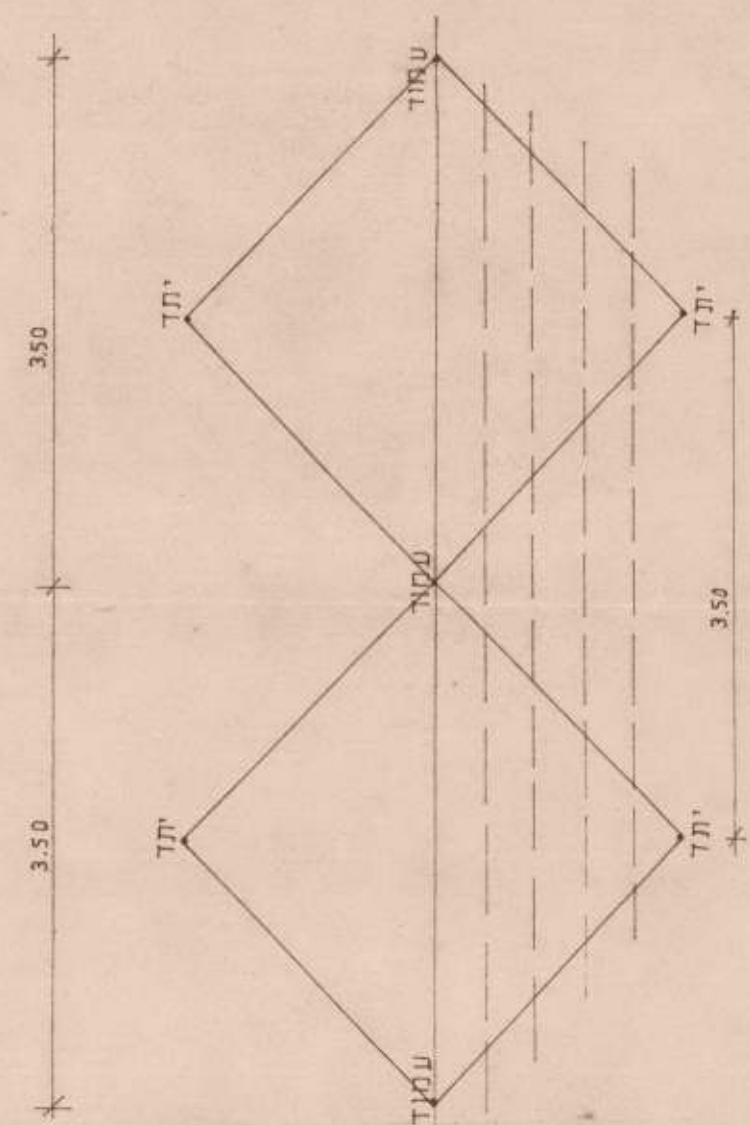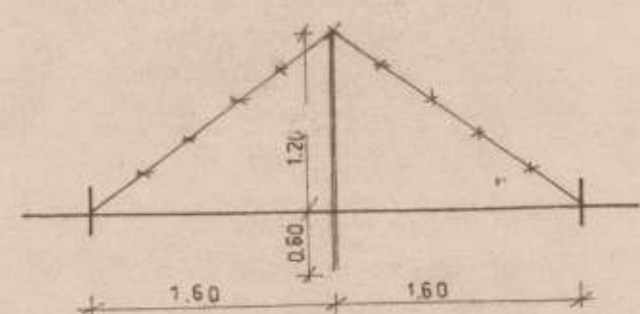


הערות

1. כל המדות נתונות בלח נאמא אם צריך אחדות
2. כל הרתובים המופיעים בתקנית בעצי 4 מ"מ

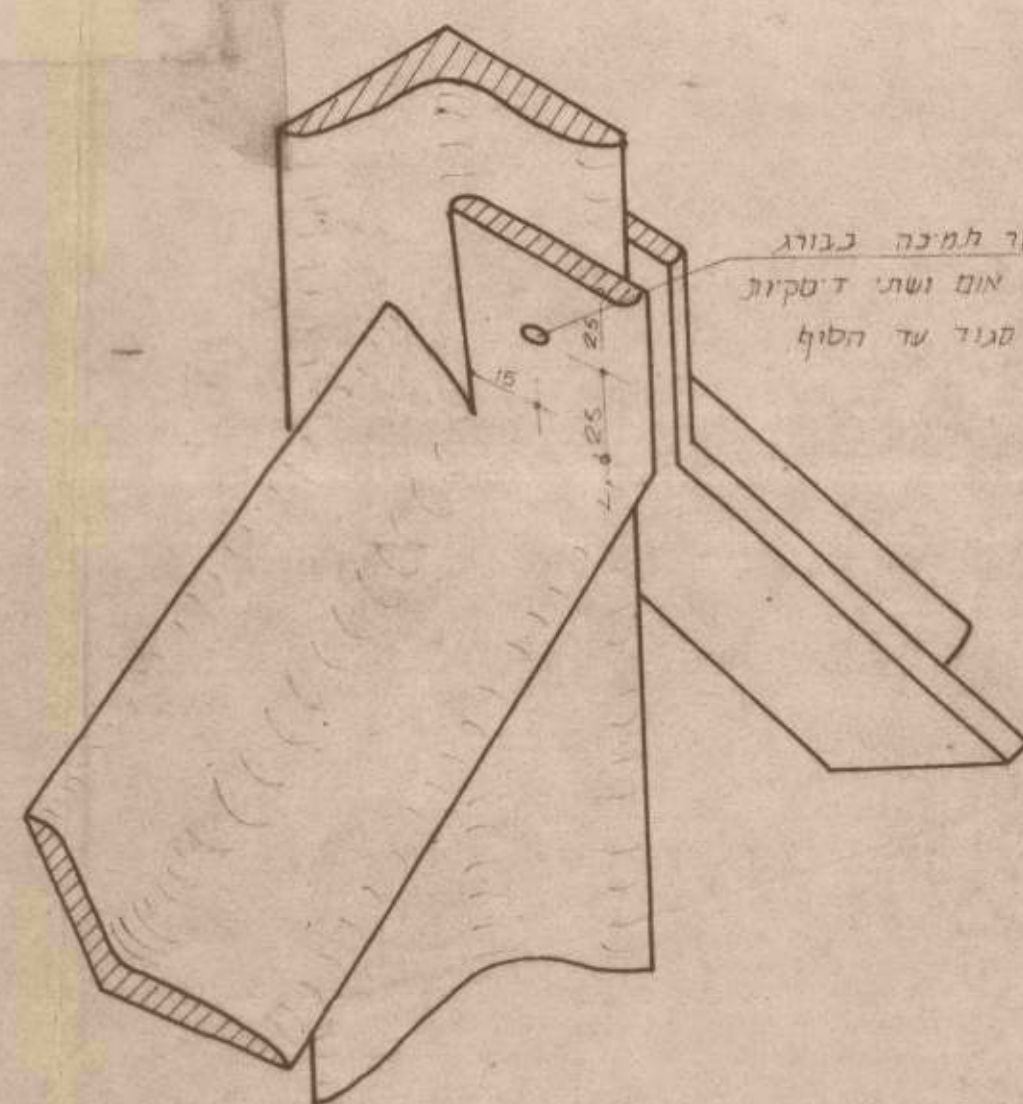


פרט יא ללא קנ"מ


דשימות כמויות לְקָמ גדר דשת

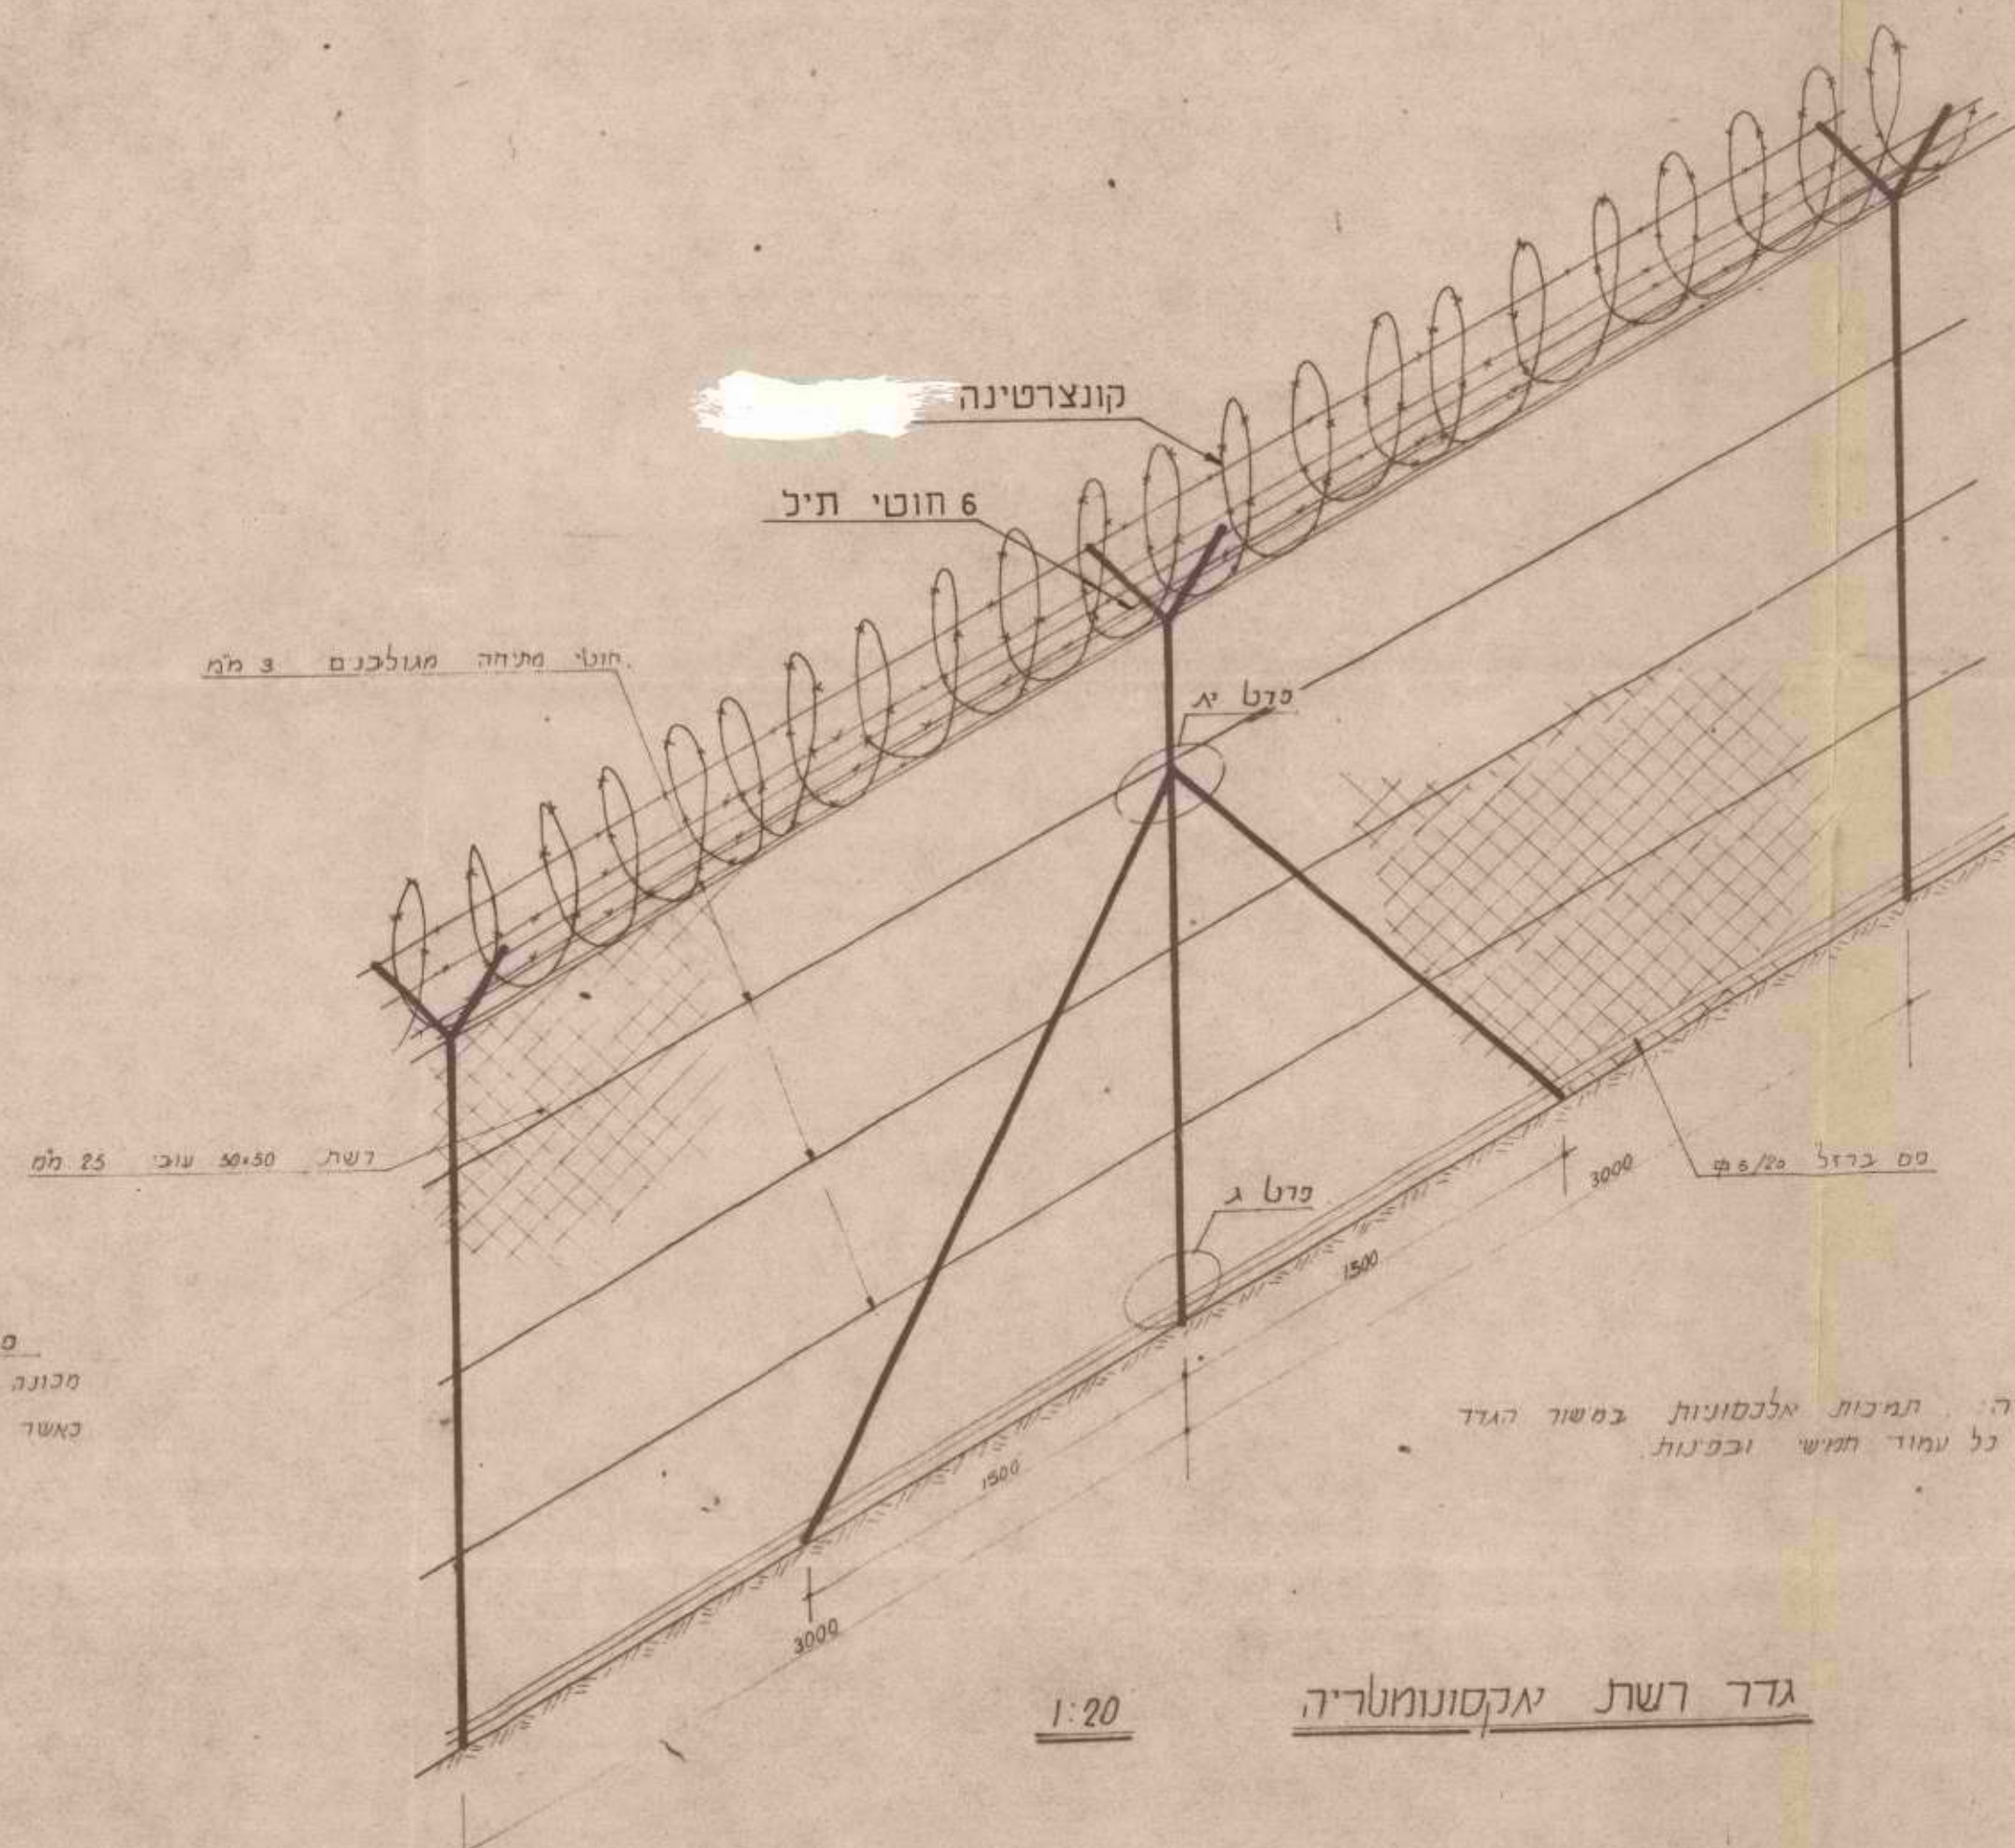[illegible][illegible]


גדר רשת יאקסונומטריה

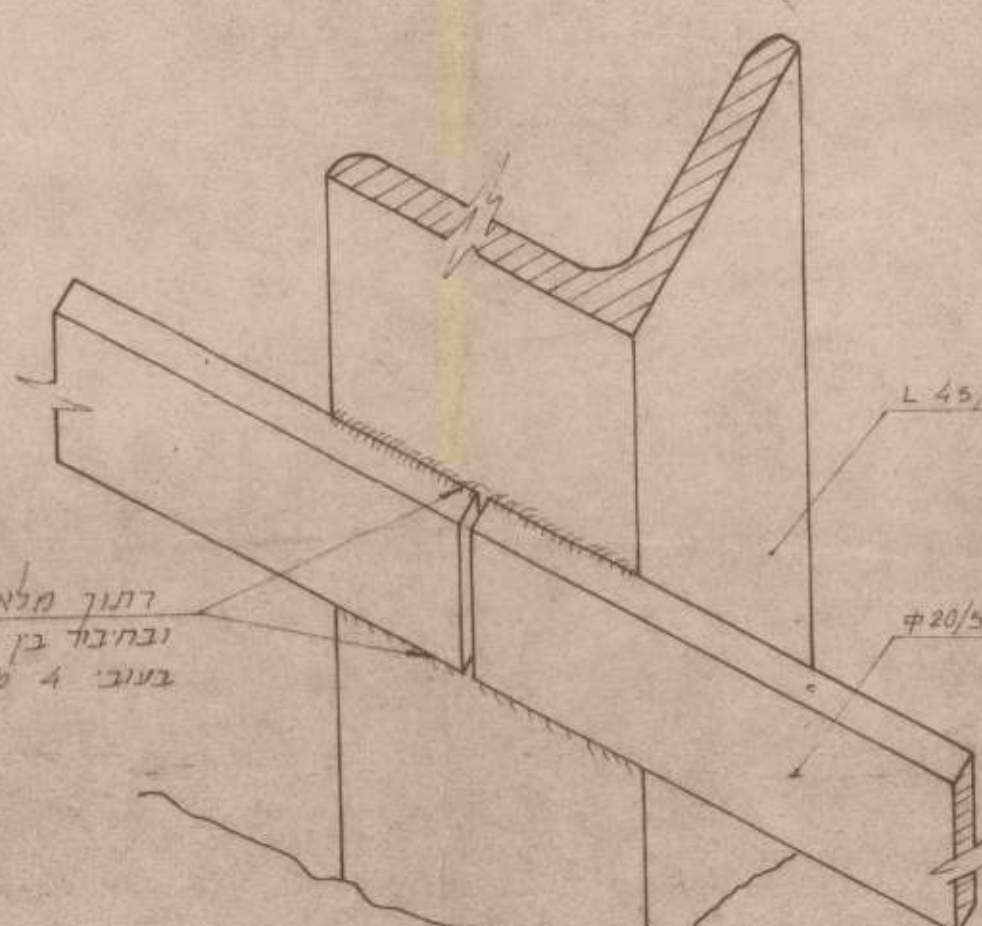


כדט ג ללא קנ"מ

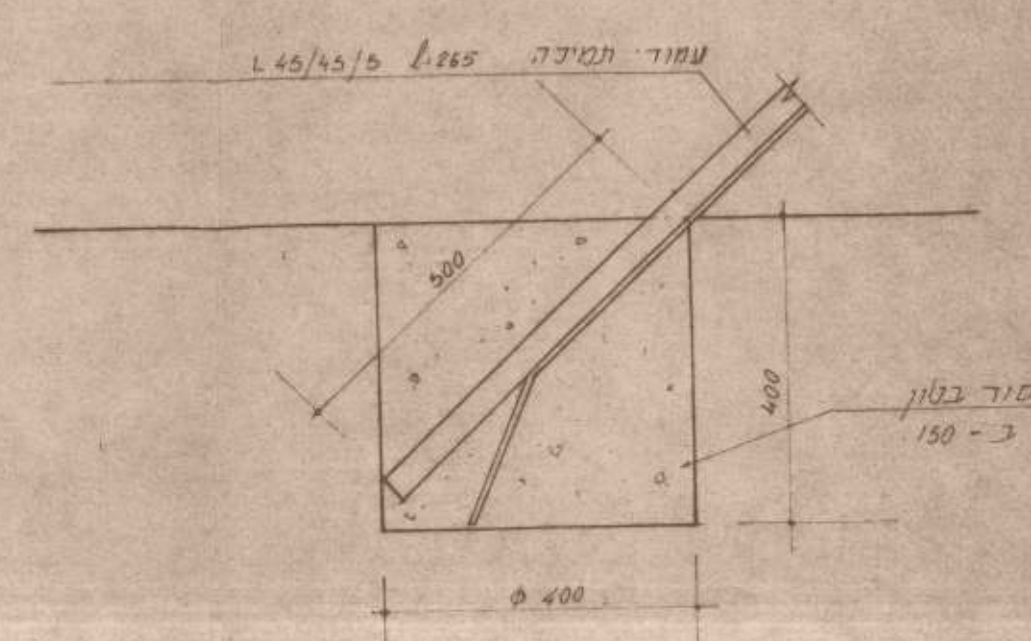


פרט ביסוס עמוד תמיכה 1:10

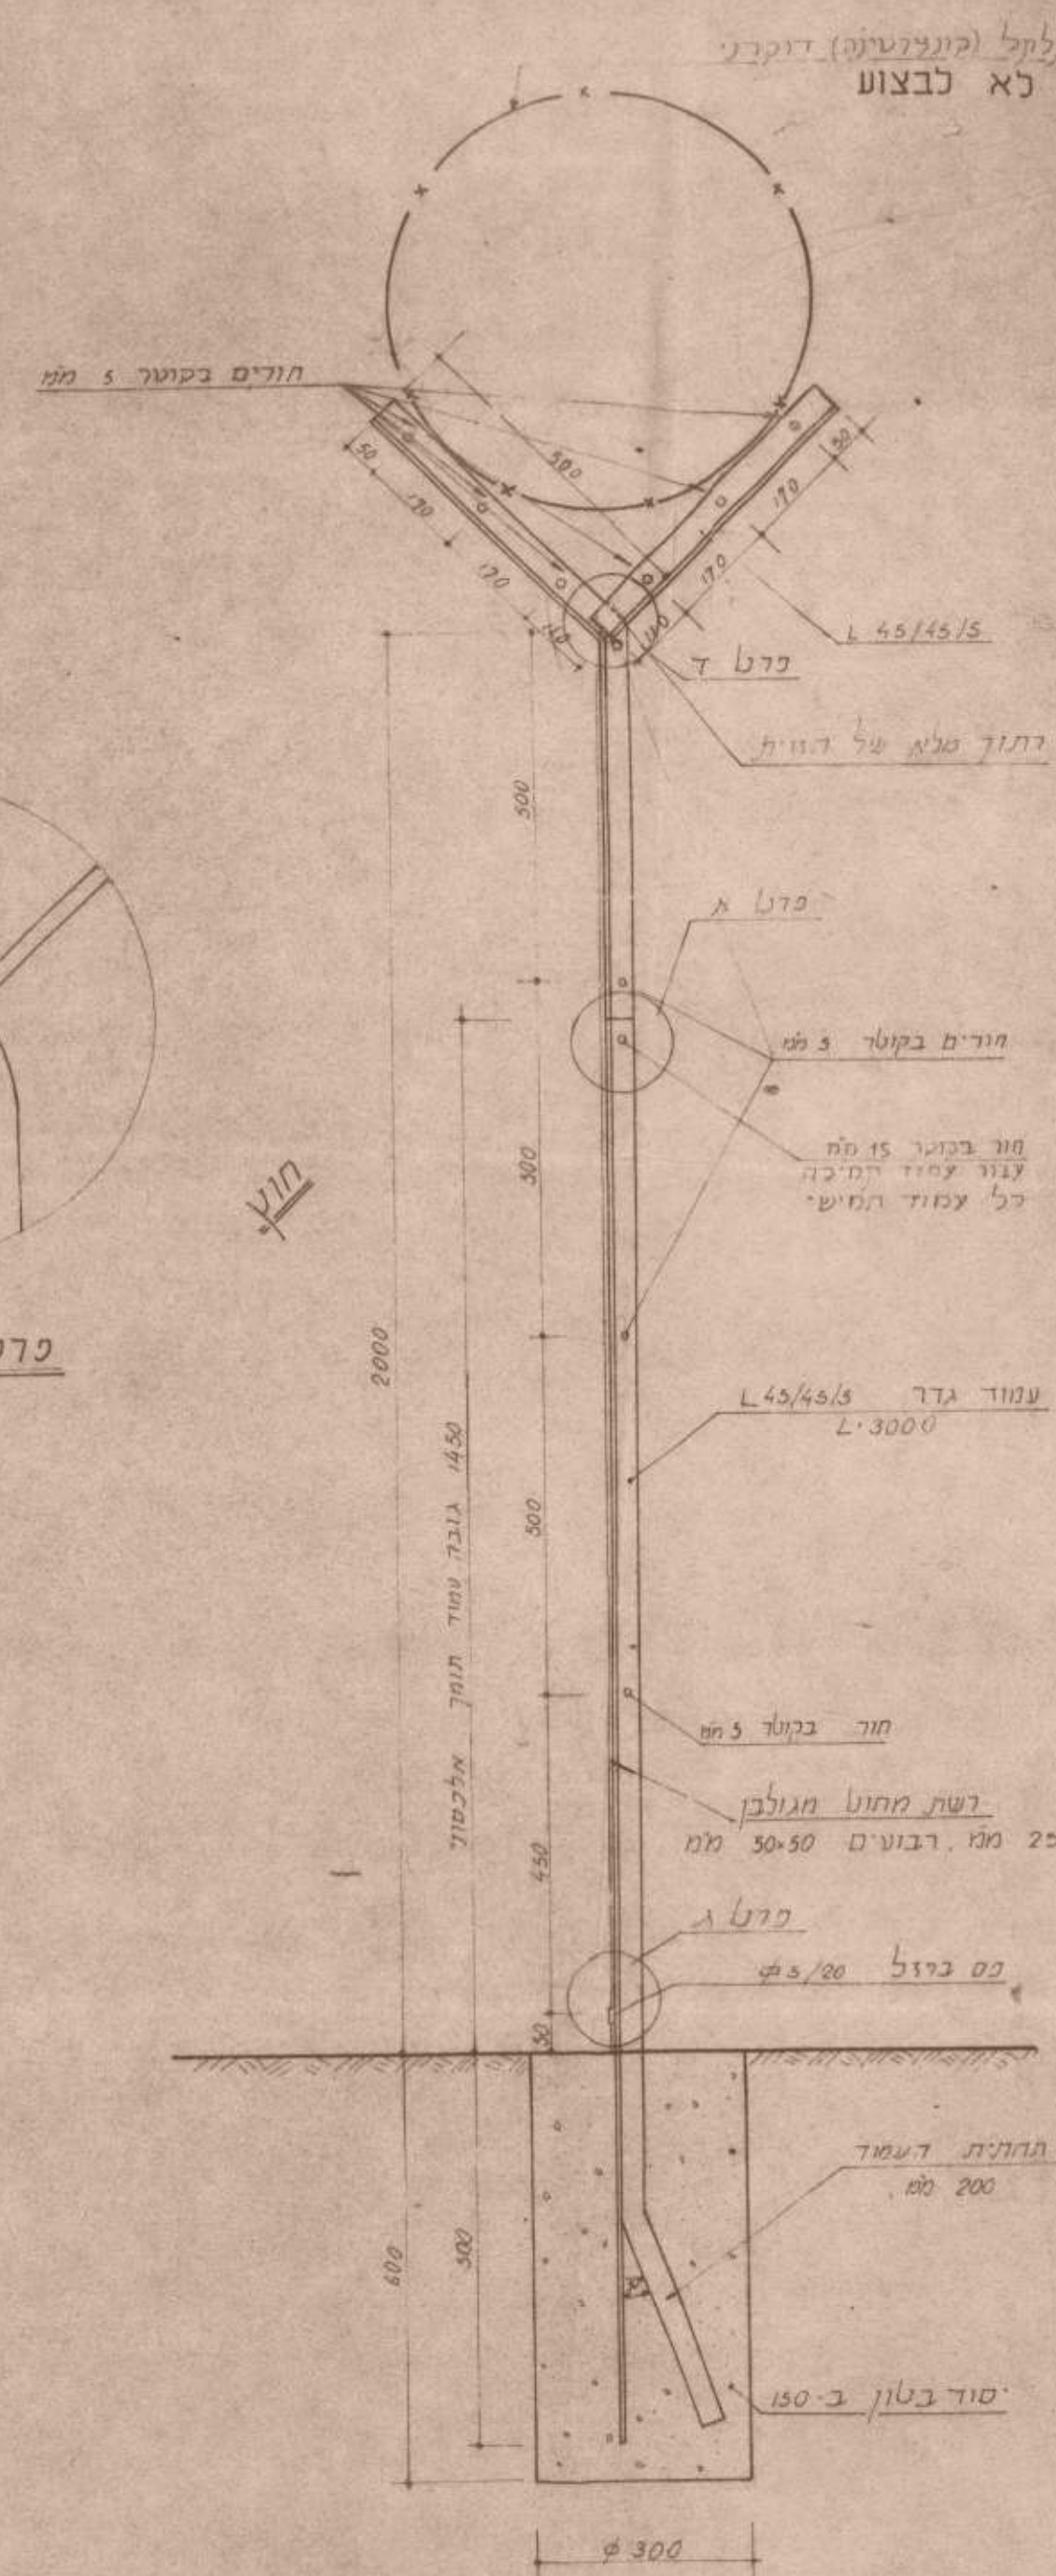

חתך אופייני - עמוד גדר דש נ"מ 1:10

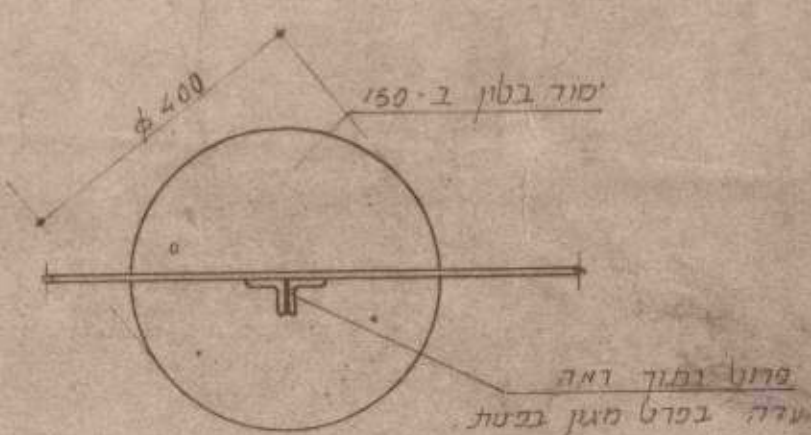

1:10 קינח 2-1 קרנ

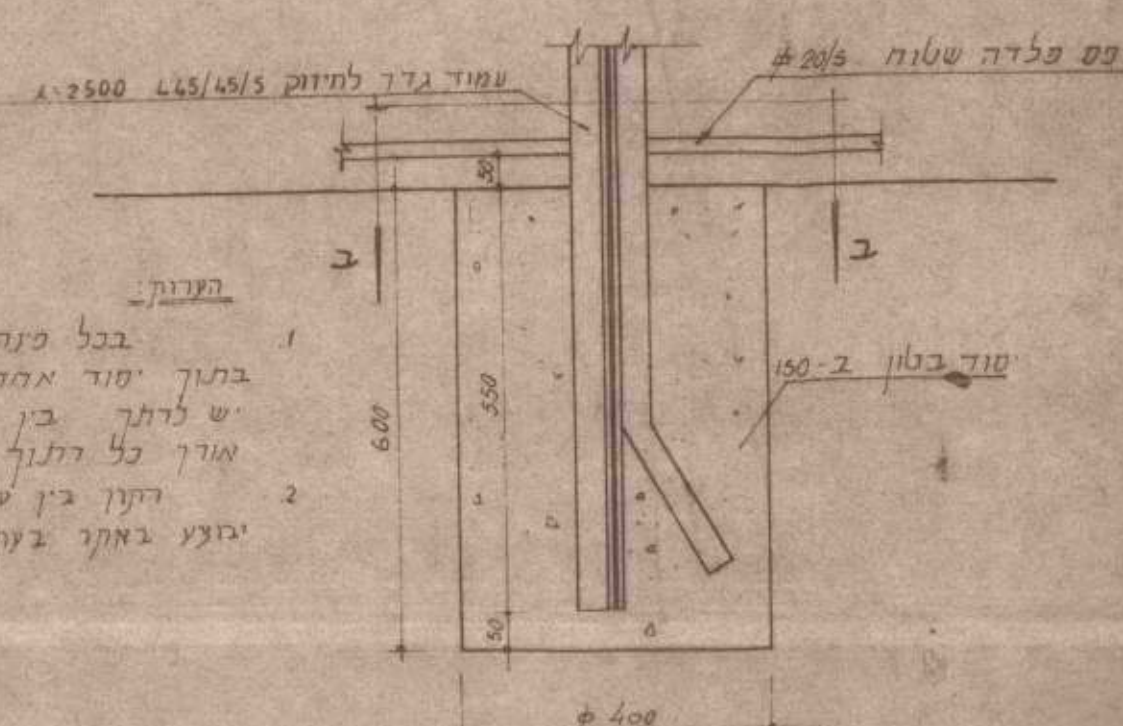

פרט מגן בפניות קנ"מ 1:10
